



**华夏工程顾问**  
HUAXIA ENGINEERING CONSULTING

南湾中部片区土地整备利益统筹项目 04-01-01 地块  
全过程造价咨询项目

投标文件

业绩文件

项目编号： 2403-440307-04-01-508630009

投标人名称： 深圳市华夏工程顾问有限公司

投标人代表： 李开臣

投标日期： 2025 年 6 月 9 日



## 2、企业业绩情况

1. 企业业绩情况表	
1. 深圳红树林湿地博物馆项目全过程造价咨询 合同金额：566.25 万元；签订时间：2023 年 5 月 18 日； 建设规模：建设总面积 45700m <sup>2</sup> ；服务内容：全过程造价咨询（概算、预算、结算）；	
2. 大运枢纽物业开发项目全过程造价咨询二标段 合同金额：799.20 万元；签订时间：2022 年 3 月 2 日； 建设规模：项目用地面积约 3 万 m <sup>2</sup> ，二标段为南地块总建筑面积约 40 万 m <sup>2</sup> ； 服务内容：全过程造价咨询（预算、中间过程、结算）；	
3. 满京华狮山项目一标段造价咨询服务 合同金额：401.07 万元；签订时间：2022 年 7 月 26 日； 建设规模：用地面积 109397.84m <sup>2</sup> ；服务内容：全过程造价咨询（预算、中间过程、结算）；	
4. 深铁前海枢纽项目 T8 盖上全专业及地下安装、深港广场全过程造价咨询 合同金额：506.1 万元；签订时间：2023 年 12 月 1 日； 建设规模：T8 地上建筑面积约 12.5 万 m <sup>2</sup> ，地下建筑面积约 5 万 m <sup>2</sup> ； 服务内容：全过程造价咨询（预算、中间过程、结算）；	
5. 前海时代项目 5 号地块全过程造价咨询 合同金额：499 万元；签订时间：2021 年 7 月 1 日； 建设规模：项目总占地面积 25707.78m <sup>2</sup> ，总建筑面积 226746m <sup>2</sup> ； 服务内容：全过程造价咨询（预算、中间过程、结算）；	
合同金额合计（万元）	2771.62



# 华夏工程顾问

HUAXIA ENGINEERING CONSULTING

## 1、深圳红树林湿地博物馆项目全过程造价咨询

### (1) 咨询合同



正本

合同编号: HSLBWG-002-2023

## 深圳市建筑工务署工程管理中心 合同协议书

项目名称: 深圳红树林湿地博物馆项目

合同名称: 深圳红树林湿地博物馆项目全过程造价咨询

承包方: 深圳市华夏工程顾问有限公司

日期: 二〇二三年五月



## 一、合同协议书

委托单位（甲方）：深圳市建筑工务署工程管理中心

咨询单位（乙方）：深圳市华夏工程顾问有限公司

按照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程全过程造价咨询工作协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称：深圳红树林湿地博物馆项目全过程造价咨询

工程地点：福田区沙头街道红树林路与白石路交汇处

工程规模及内容：建安及设备费约 87379.36 万元人民币（捌亿柒仟叁佰柒拾玖万叁仟陆佰元），预计工程工期 2023 年 6 月开工，2028 年 6 月底竣工；建筑总面积 45700 平方米。

### 二、合同价及结算价：

本项目造价咨询服务费用（暂定）为大写：伍佰陆拾陆万贰仟伍佰陆拾捌元伍角捌分（小写：¥566.256858 万元），最终以深圳市财政投资评审中心审核金额为准。

#### 1、咨询服务费按阶段计取：

##### 1.1 咨询服务费取费基数：

a、合同委托阶段：咨询服务费取费基数（暂定）按以下方式之一由发包人确定（优先批复概算，其次可研报告，再次项目建议书）：





2、**合同结算**：合同结算包括咨询服务费基本费用、绩效费用和其他费用的结算

2.1 咨询服务费结算以所承接内容的最终的批复概算（含调整）中建安费作为取费基数，总费率按照阶段取费表以计取公式重新计算结算费率。计取结算费率时有关难度、调整系数不变，但因图纸改动较大给予的难度系数可另行计取（总难度系数超过 1.3 时仍按照 1.3 封顶）；

2.2 按照“**结算取费基数×结算费率×0.9**”**结算最终基本费用**；按照“**结算取费基数×结算费率×0.1**”作为绩效费用总额，按履约评价次数平均分摊到合同期间进行的履约评价中，以最终履约评价结果**结算最终绩效费用**；

2.3 其他费用结算：奖金等，按实际发生费用予以结算；

2.4 最终结算金额以深圳市财政投资评审中心审核金额为准。

### 三、乙方工作内容

1、审核资料、协助完成项目可行性研究评审工作；**审核概算**、协助完成概算评审工作（根据具体项目，可能无此两项内容，也可能根据项目需要编制设计概算）；

2、**编制或审核工程预算**，并对预算和概算进行对比分析，建立项目全过程动态投资控制台帐；

3、协助招标人编制招标文件，特别是招标文件中投标报价规定和特别条款；在造价工程师的指导下负责完成招标过程中商务标文件、工程控制价文件的编制和电子生成工作；



4、编制工程量清单及招标控制价，并提供综合单价分析表；在工程量清单和标的编制过程中书面提出设计和招标文件的问题，提醒甲方工程中采用的新材料、新工艺，并拟定计价方案供甲方决策；

5、提供主要材料数量及价格清单，并提交询价或计价依据；

6、提供主要设备清单及单价，并提交询价或计价依据；

7、复核中标候选人的商务标，并提出详细的造价分析报告；

8、协助甲方签订合同；

9、编制投资控制形象进度表；

10、施工过程中，参与工程量及工程进度款支付的复核工作；

11、参与工程变更及现场签证的计量、计价复核工作，及时按甲方要求编制工程变更估算、审核工程变更预算、现场签证；

12、审核工程竣工结算，协助完成结算审计工作；

13、按需要与甲方一起到工地现场解决有关造价事宜（包含材料询价等工作）；全过程成本控制，主动、及时地发现并向甲方汇报任何可能影响成本的事项，提出相关改善建议；

14、结算完成后，协助甲方进行经济技术指标分析和完成项目财务决算；

15、配合甲方对施工、设计、监理等各参建单位进行履约评价，并出具书面的评价意见；

16、根据甲方安排，配合对设计、监理单位进行绩效评价，并及时提交书面的绩效意见；

17、需要分标段拆分的项目，项目牵头单位必须负责制定项目统



一的计价计量规则、标段界面划分等牵头协调工作。

18、工程建设其它费用中的设计、监理、勘察等所有合同的造价咨询工作；

19、项目所有工程结算完毕后，出具项目投资控制总结报告，报告中应包含履约情况自我评价、投资控制情况汇报、造价指标分析、投资控制存在的问题及建议等。

20、其它有关的造价管理任务和工程造价技术咨询等。

#### 四、乙方工作时间要求

1、设计概算审查结果文件的提交时间：接到设计概算及相关资料后 15 天内提交；

2、招标项目造价文件的提交时间：接到施工图纸及相关资料后 20 天内提交工程量清单，30 天内提交标底；

3、签订施工合同后 20 天内，提交投资控制形象进度表；

4、施工招标完成后工程量清单的复核自接到相关资料后 60 天内提交；

5、施工过程的计量计价审核意见自接到相关资料后 3 天内提交；

6、工程竣工结算审核自接到相关资料后 30 天内提交。

#### 五、造价文件的编制原则和依据

1、初步设计文件及图纸；

2、施工招标文件；

3、施工合同；

4、施工图（或竣工图）及有关设计文件；



# 华夏工程顾问

HUAXIA ENGINEERING CONSULTING

发 包 人：(公章)

住 所：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开 户 银 行：

账 号：

邮 政 编 码：

承 包 人：(公章) 深圳市华夏工程顾问

住 所：深圳市福田区福华一路国际

商会大厦 B 座 401

法定代表人：

委托代理人：

电 话：0755-83023168

传 真：0755-83023861

开 户 银 行：深圳建行国会大厦支行

账 号：44250100015509888888

邮 政 编 码：518048

备案意见：

经 办 人：

备案机构 (公章)

2023 年 5 月 25 日



# 华夏工程顾问

HUAXIA ENGINEERING CONSULTING

## 2、大运枢纽物业开发项目全过程造价咨询二标段

### (1) 咨询合同

#### 大运枢纽物业开发项目全过程造价咨询 二标段合同

合同编号: STZY-ZC-DYSN2-QT004/2022

甲方: 深圳市地铁集团有限公司  
乙方: 深圳市华夏工程顾问有限公司

二〇二二年





## 第一部分 合同协议书

深圳市地铁集团有限公司（以下简称“甲方”）通过公开招标选择深圳市华夏工程顾问有限公司（以下简称“乙方”）承担大运枢纽物业开发项目全过程造价咨询二标段工作。

一、本协议书中所用术语的含义与下文提到合同条款中相应术语的含义相同。

二、本合同文件组成及解释顺序：

组成合同的各个文件应该是一个整体，彼此相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1. 合同协议书；
2. 中标通知书；
3. 合同条款；
4. 投标函；
5. 造价咨询任务单；
6. 招标文件、投标文件及其澄清文件（如果有）。

三、上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前者为准。

四、本合同暂定含税总价款为 7992000 元（大写：柒佰玖拾玖万贰仟元整），其中不含税价款 7539622.64 元，增值税税额为 452377.36 元，增值税税率 6%（合同增值税率根据国家税收法规政策变动而调整，不含税价不随增值税率的变化进行调整），最终结算价按甲方发放的任务单和合同条款第五条计取。

五、服务期限：自合同签订之日起至本合同全部工作完成之日止。

六、乙方保证全部按照本合同规定向甲方提供成果和服务，甲方付款前乙方需提供等额的增值税专用发票，如果乙方不能提供等额合法发票，甲方有权拒绝支付。

七、因本合同产生的一切争议，双方应协商解决，协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、合同份数：本合同正本一式贰份，双方各执壹份，副本一式壹拾份，甲方执玖份，乙方执壹份。





# 华夏工程顾问

HUAXIA ENGINEERING CONSULTING

九、本合同文本制作费用由乙方承担。

十、本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):

深圳市地铁集团有限公司

法定代表人  
或授权代表:



住 所:

深圳市福田区福中一路  
1016号地铁大厦

电 话:

0755-23992674

传 真:

0755-23992555

开户银行:

招商银行深圳分行益田  
支行

开户全名:

深圳市地铁集团有限公司

账 号:

755904924410506

邮政编码:

518026

项目主管部门经办  
人及电话:

贺文娜: 89986721

项目主管部门  
审核人:

合约部门经办人及  
电话:

张格: 89987504

合约部门审核  
人:

乙方(盖章):

深圳市华夏工程顾问有限公司

法定代表人  
或授权代表:



住 所:

深圳市福田区福华一路  
国际商会大厦B座401室

电 话:

83023168-152  
15013618750

传 真:

开户银行:

中国建设银行股份有限公司深圳商会大厦支行

开户全名:

深圳市华夏工程顾问有限公司

账 号:

44250100015509888888

邮政编码:

518048

承包商经办人:

黄立立

承包商经办人 15013618750  
电话:

合同签署地点:

时 间:

2022年3月2日







## 第三部分 合同条款

甲方：深圳市地铁集团有限公司

乙方：深圳市华夏工程顾问有限公司

通过公开招标，由深圳市地铁集团有限公司（以下简称“甲方”）选择深圳市华夏工程顾问有限公司（以下简称“乙方”）承担大运枢纽物业开发项目全过程造价咨询二标段服务工作。根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规、规章的规定，结合该工程的具体情况，经充分协商，签署本合同。

### 第一条 服务的工程范围

项目概况：大运城市综合交通枢纽为深圳地铁既有3号线、规划14号线、16号线和中深惠城际（33号）四线换乘关系，集交通枢纽、商业办公、商品房、人才房于一体的城市综合体。大运枢纽物业开发项目用地面积约3万㎡，位于龙飞大龙岗大道交叉处，被龙飞大道割裂为南北两个地块。二标段为南地块总建筑面积约40万㎡，包含住宅约5万㎡，商业约7万㎡，停车场约10万㎡，超高层塔楼约17万㎡。

服务范围：本次大运枢纽物业开发项目全过程造价咨询二标段服务招标范围包括不限于各地块用地范围内所有专业工程以及红线外配套工程等全部内容。

上述咨询范围内的项目，甲方可另行招标或委托其他咨询公司。

### 第二条 造价咨询的内容

一、乙方提供的项目全过程（含精装）造价控制咨询，具体工作内容如下：

#### （一）招标、预算、施工阶段

1. 协助甲方编制建安目标成本，配合甲方进行各项经济指标测算和分析，提出限额设计指标，并向甲方提出有关造价管理、成本优化及控制等方面的合理化建议，提供其他类似项目的工程技术经济指标。
2. 编制工程量清单（含模拟工程量清单编制及修订）、标底、控制价，对技术经济指标提出成本优化建议；
3. 协助招标人编制招标文件，特别是招标文件中投标报价规定和特别条款；在造价工程师的指导下负责完成招标过程中商务标文件、工程控制价文件的编制和电子生成工作；
4. 施工合同签订后，根据甲方要求，对正式施工图进行清单更新和施工图预算编制。







负责与施工单位核对并出具成果文件。

5. 甲方委托造价复审单位对上述成果文件进行审核，乙方参与核对并确认。

6. 项目进度款、验工计价审核。

7. 提供工程变更方案的测算，工程变更、签证及各类索赔的立项估算。

8. 负责工程变更、签证及各类索赔工程量清单和预算的编制，负责与施工单位核对；变更费用审核阶段，负责与施工单位/复审单位核对；参与甲方与施工单位变更签证洽商，协助甲方处理索赔事项；配合内外审计工作。

9. 对施工单位上报的合同外工程报价和材料报价进行审核，并提交成果文件，参与甲方与施工单位的洽商。

10. 参与监理方组织的询价或按甲方要求组织询价工作。

11. 项目施工过程中与造价相关的其他工作业务。

咨询服务范围包括各类甲方分包工程以及甲供材料等，提供有关工程造价信息资料和造价指标分析表等。

## （二）竣工结算阶段

1. 依据甲方规章制度、作业指引、模板格式的要求，编制和审核工程结算书，出具结算审核报告，与施工、复审单位核对确认，办理送审及配合深圳市财政投资评审中心、深圳市建设工程造价管理站等政府部门的审计工作。

2. 在甲方规定的时限协助办理并取得深圳市建设工程造价管理站出具的竣工结算审核表，其费用已在合同价中综合考虑，不再另计。

3. 项目竣工结算完成后，对整个项目发生的成本进行的全面的、系统的评价和分析总结，包括建安工程各项经济指标测算和分析等成本分析，形成成本后评估报告。

4. 建设过程中与工程结算相关的其他工作业务。

## （三）造价人员驻场要求

项目全过程造价控制咨询，乙方需按甲方工作需要及专业要求派驻两名专职造价人员（至少有五年以上造价工作经验）提供咨询服务，驻场造价人员由甲方调配，办公地点与派驻时间具体以甲方通知为准（派驻人员费用已包含在咨询费中，不另计算）。

二、项目建设过程中有关造价相关的工作业务，具体任务应以按届时甲方正式所填发的“造价咨询任务单”（格式详见本合同附件）中所规定的内容及要求为准。甲方根据项目的需要，有权取消某个阶段的造价咨询工作。

注：各阶段与其他造价咨询单位及施工方核实时，工作地点为甲方指定的地点，乙方





# 华夏工程顾问


HUAXIA ENGINEERING CONSULTING

## 3、满京华狮山项目一标段造价咨询服务

### (1) 咨询合同

mjh 满京华

编号: MJHZY-SS-合同部-合同(一标段/造价咨询/华夏)-20220713



## 满京华狮山项目一标段 造价咨询服务合同

项目名称: 满京华狮山项目一标段造价咨询服务

工程地点: 深圳市光明区狮山工业区

甲方单位: 深圳市满京华置业投资有限公司

乙方单位: 深圳市华夏工程顾问有限公司

2022 年 7 月 26 日



## 满京华狮山项目一标段造价咨询服务合同

深圳市满京华置业投资有限公司(以下简称甲方)与深圳市华夏工程顾问有限公司(以下简称乙方)经过双方协商一致,依据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则签订本合同。

### 一、甲方委托乙方为以下项目提供建设工程造价咨询服务

- 1、项目名称: 狮山项目一标段
- 2、项目地点: 深圳市光明区狮山工业区
- 3、项目概况: 本项目为城市更新项目,初步命名为:满京华狮山项目。共七个地块,分为三个标段,具体划分如下:
  - 一标段: 05-09 地块、05-10 地块、05-13 地块;
  - 二标段: 05-03 地块、05-05 地块;
  - 三标段: 06-04 地块、06-06 地块;本合同为一标段。

### 4、项目经济技术指标详见下表(暂定):

狮山项目方案地块指标									
地块编号	05-03	05-05	05-09	05-10	05-13	06-04	06-06	总指标	
性质代码	R2	C1	R2	R2	R2	R2	R2		
用地性质	二类居住用地	商业服务业用地	二类居住用地	二类居住用地	二类居住用地	二类居住用地	二类居住用地		
用地面积(m <sup>2</sup> )	14035.16	16532.58	8819.94	22841.91	11250.44	26137.77	9780.04		
总建筑面积(m <sup>2</sup> )	116363.1	102552.28	73877.36	196253.09	98920.64	206693.4	71610.23	用地面积(m <sup>2</sup> )	109397.84
计容建筑面积(m <sup>2</sup> )	83431	76629.59	51902.36	141438.09	72163.64	151500.16	47111.63	计容建筑面积(m <sup>2</sup> )	624176.47
不计容建筑面积(m <sup>2</sup> )	32932.1	25922.69	21975	54815	26757	55193.24	24498.6		
容积率	5.4	4.5	5.7	6.0	6.2	5.6	4.7	综合容积率	5.45



# 华夏工程顾问

HUAXIA ENGINEERING CONSULTING

mjh 满京华

编号: MJHZY-SS-合同部-合同(一标段/造价咨询/华夏)-20220713

居住	72033	0	46308	121894	66600	129879	45864	居住总量	482578
其中	住宅	72033	0	46308	121894	66600	129879		
	保障房	0	0	0	0	0	45864		
商业、办公	1648	73324	2438	6416	0	6836	0	商业、办公	90662
其中	商业(地上)	1648	13642	2438	6416	0	6836	商业总量	31980
	商业(地下)	0	1000	0	0	0	0		
	办公	0	58682	0	0	0	0	办公总量	58682
配套	1880	685	1855	8740	3400	10280	60	配套总量	26900
其中	社区管理用房	—	—	300	300	—	300		
	社区警务室	—	—	—	50	—	50		
	便民服务站	—	—	—	500	—	500		
	社区菜市场	—	—	—	1000	—	1000		
	文化活动室	1500	—	—	—	—	1500		
	幼儿园	—	—	—	4200	3300	6200		
	老人照料中心	—	—	1200	—	—	—		
	公交首末站	—	—	—	—	—	—		
	邮政所	—	150	—	—	—	—		
	公厕	—	160	100	—	—	—		
	社康中心	—	—	—	2000	—	—		
	idea空间	380	375	255	690	100	730		

备注: 上述经济技术指标为方案阶段测算指标, 最终以政府最终审批文件为准。



## 二、造价咨询服务阶段及范围

### 1、招标阶段: 提供招标工程量清单、预算价;

- 总包工程: 总包工程招标模拟清单、总包工程预算价。预算价是指经甲方审核确定后的模拟工程量(与投标人模拟工程量一致)、套深圳市定额消耗量标准、招标期信息价(2022年9月份)及计价规范计算。总包工程范围: 承台、地梁、地下室底板、结构、建筑(墙体砌筑、抹灰)、防水、建筑物室内外给排水(不含室外工程给排水)、室内照明及电线电缆管的预埋、穿线等(不含高低压配电及弱电穿线)。
- 分包工程: 招标工程量清单, 招标控制价。分包工程名称: 基坑支护、桩基、幕墙(铝合金门窗及外立面)、消防、人防、防火门、高低压变配电、智能化、燃气、楼体灯光、空调、弱电、园林景观、室外管网、标识标牌等;

### 2、结算阶段: 按施工图及设计变更或竣工图编制总包工程量并与总包单位核对;

### 3、其他服务内容: 总包报建预算书(办理施工许可证用)、工程三算审查表(造价咨询单位盖章)、居委会等政府或事业、企业单位回购的造价预算书。

## 三、编制依据

### 1、地块内具体工作内容

- ①、狮山项目项目方案设计、扩初图、施工图;
- ②、建造标准、材料设备选型、设计规范及要求等;
- ③、总包工作界面划分、总工期及关键节点计划、施工顺序及简易方案、施工规范及要求、构造做法等;
- ④、招标文件、综合单价计价规则、材料设备品牌、规格、型号等;

### 2、总包工程量计算及与总包单位工程量的核对

- ①、总包工程量计算前, 甲、乙方及总包单位三方确定同一版图纸、变更资料、工作联系单等;
- ②、按施工图纸及设计变更、工程指令、联系单等计算总包工程图纸工程量, 乙方按甲方审核确定的工程量与总包单位计算的工程量进行核对, 并达成一致意见;
- ③、依据甲方与总包单位签订的《狮山项目工程总包工程施工合同》;
- ④、甲方提供的其他与工程量计算及核对有关的文件、答疑、函件及相关要求等;
- ⑤、甲方、乙方及总包施工单位的计量及计价软件由甲方规定使用同一种软件, 计量软件用广联达, 计价、组价软件用清华斯维尔;
- ⑥、乙方与总包单位核对工程量时, 双方核对的工作内容、时间及人员进行签字、并在下班前发给甲方专业工程师。

### 3、所有分包工程招标工程量清单及招标控制价的编制

- ①、按狮山项目地块上甲方所有分包工程招标图纸范围内的工程量计算及招标控制价的编制;
- ②、分包工程包括但不限于: 基坑支护、桩基、幕墙(铝合金门窗及外立面)、消防、人防、





- ①、总包土建工程:按地下室(结构、建筑)、裙楼(结构、建筑)、各栋塔楼(结构、建筑)分类编制工程造价明细及汇总表。
- ②、总包安装工程:按给水、排水、电气分类编制造价明细及汇总表(分类同土建)。
- ③、分包工程:按分包工程招标界面、招标文件、图纸要求编制工程量清单及招标控制价,并根据造价咨询经验及其他委托单位的常规做法,对专业性较强的分包工程提供图纸优化建议。
- 2、定额明细工程量分层统计表:地下室、裙楼、塔楼、屋面层,将工程造价计算书中的定额明细工程量填入以上对应层数中(不同塔楼量须分列);
- 3、技术经济指标分析表统计要求:按甲方提供的技术经济指标附件格式(咨询过程中提供);
- 4、给排水管、电线、电缆、管材、开关、插座及灯具等均按图纸回路编号提供工程量计算底稿,跨地上、地下的回路以±0为界。

## 六、核对要求及违约责任

- 1、乙方需要编制核对后的定额分部分项明细增减统计表(包括量价),并且须在表中对增减的原因进行说明。
- 2、乙方提交给甲方的成果资料应通过内部三级审核,提交给甲方的成果误差应控制在合同约定的范围内,即①总包工程模拟工程量清单的模拟工程量误差率应控制在±10%以内。②乙方提交的总包工程施工图及设计变更工程量计算书及分包工程量清单(已经甲方审核认可并作为与总包单位进行核对的依据)与最终核对确定并经委托、总包单位认可的工程造价误差率应控制在±1%以内(含±1%)。误差率超过±1%,需扣减相应的造价咨询服务费作为违约金:误差率±1%~±3%扣减造价咨询服务费的10%作为违约金,误差率±4%~±6%扣减造价咨询服务费的20%作为违约金,误差率超过±7%扣减造价咨询服务费的50%作为违约金。
- 3、甲方将对乙方提供的中间和最终成果文件进行抽查,每发现一处工程量与双方确认值相差3%以上的,扣咨询费1000元。
- 4、项目施工过程中,乙方必须建立严格的保密制度和其他廉政公约,如发现有泄密、串通、勾结,妨碍其公平、公正地进行造价咨询,甲方可随时解除与乙方的合同关系,并要求乙方承担合同总价50%的违约金,造成甲方其他损失的,还应承担甲方的损失赔偿责任。
- 5、乙方与总承包单位的核对结果以甲方最终确认为准。
- 6、以上违约金均在当期进度款中扣减。

## 七、咨询服务费

本项目咨询服务费总价款为 RMB 4,010,751.77 元(大写人民币:肆佰零壹万零柒佰伍拾壹元柒角柒分),其中,不含税金额为:¥3,783,728.09 元,增值税金额为:¥227,023.68 元,增值税税率 6%。咨询费用(以“面积”为单位的项目单价包干,以“项”为单位的项目总价包干)组成详见下表:



mjh 满京华

编号: MJHZY-SS-合同部-合同(一标段/造价咨询/华夏)-20220713

不正当的手段行贿甲方职员等不正当竞争行为的,甲方有权根据具体情节和造成的后果追究乙方合同暂定总价 5% 的违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。甲方有权解除合同。

## 十八、争议解决条款

对本合同的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。凡因本合同的签订、履行而发生的或与本合同有关的一切争议,合同双方应友好协商解决;协商不成的,可选择以下第(1)种方式解决:

- (1) 向甲方项目所在地人民法院提起诉讼;
- (2) 提交深圳市仲裁委员会,依其仲裁之时的仲裁规则进行仲裁,裁决效力对双方具有最终约束力。

## 十九、其他

- 1、本合同壹式肆份,甲乙双方各执贰份,具同等法律效力,自双方签字并盖章之日起生效。
- 2、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
- 3、双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

### 附件一:项目组人员一览表

甲方:深圳市满京华置业投资有限公司

法定代表人

(授权签约人):



乙方:深圳市华夏工程顾问有限公司

法定代表人

(授权签约人):



合同签订时间:2022年7月16日



# 华夏工程顾问

HUAXIA ENGINEERING CONSULTING

## 4、深铁前海枢纽项目 T8 盖上全专业及地下安装、深港广场全过程造价咨询

### (1) 咨询合同

#### 深铁前海枢纽项目 T8 盖上全专业及地下安装、深港广场全过程造价咨询合同

合同编号：STZY-0967/2023

甲方：深圳地铁前海国际发展有限公司  
乙方：深圳市华夏工程顾问有限公司

二〇二三年十二月







## 第一部分 合同协议书

深圳地铁前海国际发展有限公司（以下简称“甲方”）通过公开招标选择深圳市华夏工程顾问有限公司（以下简称“乙方”）承担深铁前海枢纽项目 T8 盖上全专业及地下安装、深港广场全过程造价咨询工作。

一、本协议书中所用术语的含义与下文提到合同条款中相应术语的含义相同。

二、本合同文件组成及解释顺序：

组成合同的各个文件应该是一个整体，彼此相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1. 合同协议书；
2. 中标通知书；
3. 合同条款；
4. 投标函；
5. 造价咨询任务单；
6. 招标文件、投标文件及其澄清文件（如果有）。

三、上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前者为准。

四、本合同暂定含税总价款为¥5,061,000.00 元（大写：伍佰零陆万壹仟元整），其中不含税价款¥4,774,528.30 元，增值税税额为¥286,471.70 元，增值税税率 6%（合同增值税率根据国家税收法规政策变动而调整，不含税价不随增值税率的变化进行调整）。

最终结算价按甲方发放的任务单和合同条款第五条计取。

五、服务期限：自合同签订之日起至本合同全部工作完成之日止。

六、乙方保证全部按照本合同规定向甲方提供成果和服务。甲方付款前乙方需提供等额的增值税专用发票，如果乙方不能提供等额合法发票，甲方有权拒绝支付。

七、因本合同产生的一切争议，双方应协商解决，协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、合同份数，本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，均具有同等法律效力。





# 华夏工程顾问

HUAXIA ENGINEERING CONSULTING

九、本合同文本制作费用由乙方承担。

十、本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):	深圳地铁前海国际发展有限公司	法定代表人或授权代表:	刘宇峰印
住 所:	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A201室		
电 话:	0755-89987550	传 真:	0755-89987550
开户银行:	建行深圳分行营业部	开户全名:	深圳地铁前海国际发展有限公司
账 号:	44201501100052560514	邮政编码:	518000
项目主管部门经办人及电话:	夏静 15338838368	项目主管部门审核人:	段计先
合约部门经办人及电话:	王强 15216184016	合约部门审核人:	刘天晨
乙方(盖章):	深圳市华夏工程顾问有限公司	法定代表人或授权代表:	李开臣印
住 所:	深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座401		
电 话:	0755-83023168	传 真:	
开户银行:	深圳建行国会大厦支行	开户全名:	深圳市华夏工程顾问有限公司
账 号:	44250100015509888888	邮政编码:	
承包商经办人:	甘梅	承包商经办人电话:	13480800615
合同签署地点:	深圳		

时 间: 2023 年 12 月 1 日





## 第三部分 合同条款

甲方：深圳地铁前海国际发展有限公司

乙方：深圳市华夏工程顾问有限公司

通过公开招标，由深圳地铁前海国际发展有限公司（以下简称“甲方”）选择深圳市华夏工程顾问有限公司（以下简称“乙方”）承担深铁前海枢纽项目 T8 盖上全专业及地下安装、深港广场全过程造价咨询服务工作。根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规、规章的规定，结合该工程的具体情况，经充分协商，签署本合同。

**项目概况：**深铁前海国际枢纽中心项目位于前海合作区桂湾片区，本项目占地约 20 公顷。本项目具体包含：T1-T4 及 T10 区域，T5、T6 及 T8 区域，T7、T9 及集中商业区域（含口岸 port）：

本合同范围为深铁前海枢纽项目 T8 盖上全专业及地下安装、深港广场全过程造价咨询。其中 T8 地上建筑面积约 12.5 万平方米，地下建筑面积约 5 万平方米。深港广场（原 T7）地下建筑面积约 5 万平方米。

**服务范围：**全过程造价咨询服务招标范围包括但不限于各地块用地范围内所有专业工程以及红线外配套工程等全部内容。

## 第二条 造价咨询的内容

一、乙方提供的项目全过程（含精装）造价控制咨询，具体工作内容如下：

全过程造价咨询服务招标范围包括但不限于各地块用地范围内所有专业工程以及红线外配套工程等全部内容，（含精装修及批量精装修）。

### （一）招标、预算、施工阶段

1. 协助甲方编制建安目标成本，配合甲方进行各项经济指标测算和分析，提出限额设计指标，并向甲方提出有关造价管理、成本优化及控制等方面的合理化建议，提供其他类似项目的工程技术经济指标。

2. 编制工程量清单（含模拟工程量清单编制及修订）、标底、控制价，对技术经济指标提出成本优化建议；

3. 协助甲方编制招标文件，特别是招标文件中投标报价规定和特别条款；在造价工程师的指导下负责完成招标过程中商务标文件、工程控制价文件的编制和电子生成工作；





4. 施工合同签订后，根据甲方要求，对正式施工图进行清单更新和施工图预算编制，负责与施工单位核对并出具成果文件。
  5. 甲方委托造价复审单位对上述成果文件进行审核，乙方参与核对并确认。
  6. 项目进度款、验工计价审核。
  7. 提供工程变更方案的测算，工程变更、签证及各类索赔的立项估算。
  8. 负责工程变更、签证及各类索赔工程量清单和预算的编制，负责与施工单位核对；变更费用审核阶段，负责与施工单位/复审单位核对；参与甲方与施工单位变更签证洽商，协助甲方处理索赔事项；配合内外审计工作。
  9. 对施工单位上报的合同外工程报价和材料报价进行审核，并提交成果文件，参与甲方与施工单位的洽商。
  10. 参与监理方组织的询价或按甲方要求组织询价工作。
  11. 项目施工过程中与造价相关的其他工作业务。
- 咨询服务范围包括各类甲方分包工程以及甲供材料等，提供有关工程造价信息资料和造价指标分析表等。

## （二）竣工结算阶段

1. 依据甲方规章制度、作业指引、模板格式的要求，编制和审核工程结算书，出具结算审核报告，与施工、复审单位核对确认，办理送审及配合深圳市财政投资评审中心、深圳市建设工程造价管理站等政府部门的审计工作。
2. 在甲方规定的时限协助办理并取得深圳市建设工程造价管理站出具的竣工结算审核表，其费用已在合同价中综合考虑，不再另计。
3. 项目竣工结算完成后，对整个项目发生的成本进行的全面的、系统的评价和分析总结，包括建安工程各项经济指标测算和分析等成本分析，形成成本后评估报告。
4. 建设过程中与工程结算相关的其他工作业务。

## （三）造价人员驻场要求

乙方按甲方工作需要应派驻两名专职造价人员（一名专职造价人员在项目现场办公，一名专职造价人员在置业大厦办公）在项目现场办公人员需完成现场成本管理工作及甲方安排的其他项目工作，在置业大厦办公人员需完成甲方指定安排成本管理工作及其他工作（具体工作由甲方人员指定，不限于该项目）。派驻的造价人员要求：有5年及以上地产成本相关工作经验；派驻时间要求：驻场人员暂定4年，具体驻场时间以实际服务时间为准；派驻地址要求：一名原则上项目现场办公，一名原则上在置业大厦办公，具体驻场地






# 华夏工程顾问

HUAXIA ENGINEERING CONSULTING

## 5、前海时代项目 5 号地块全过程造价咨询

### (1) 咨询合同

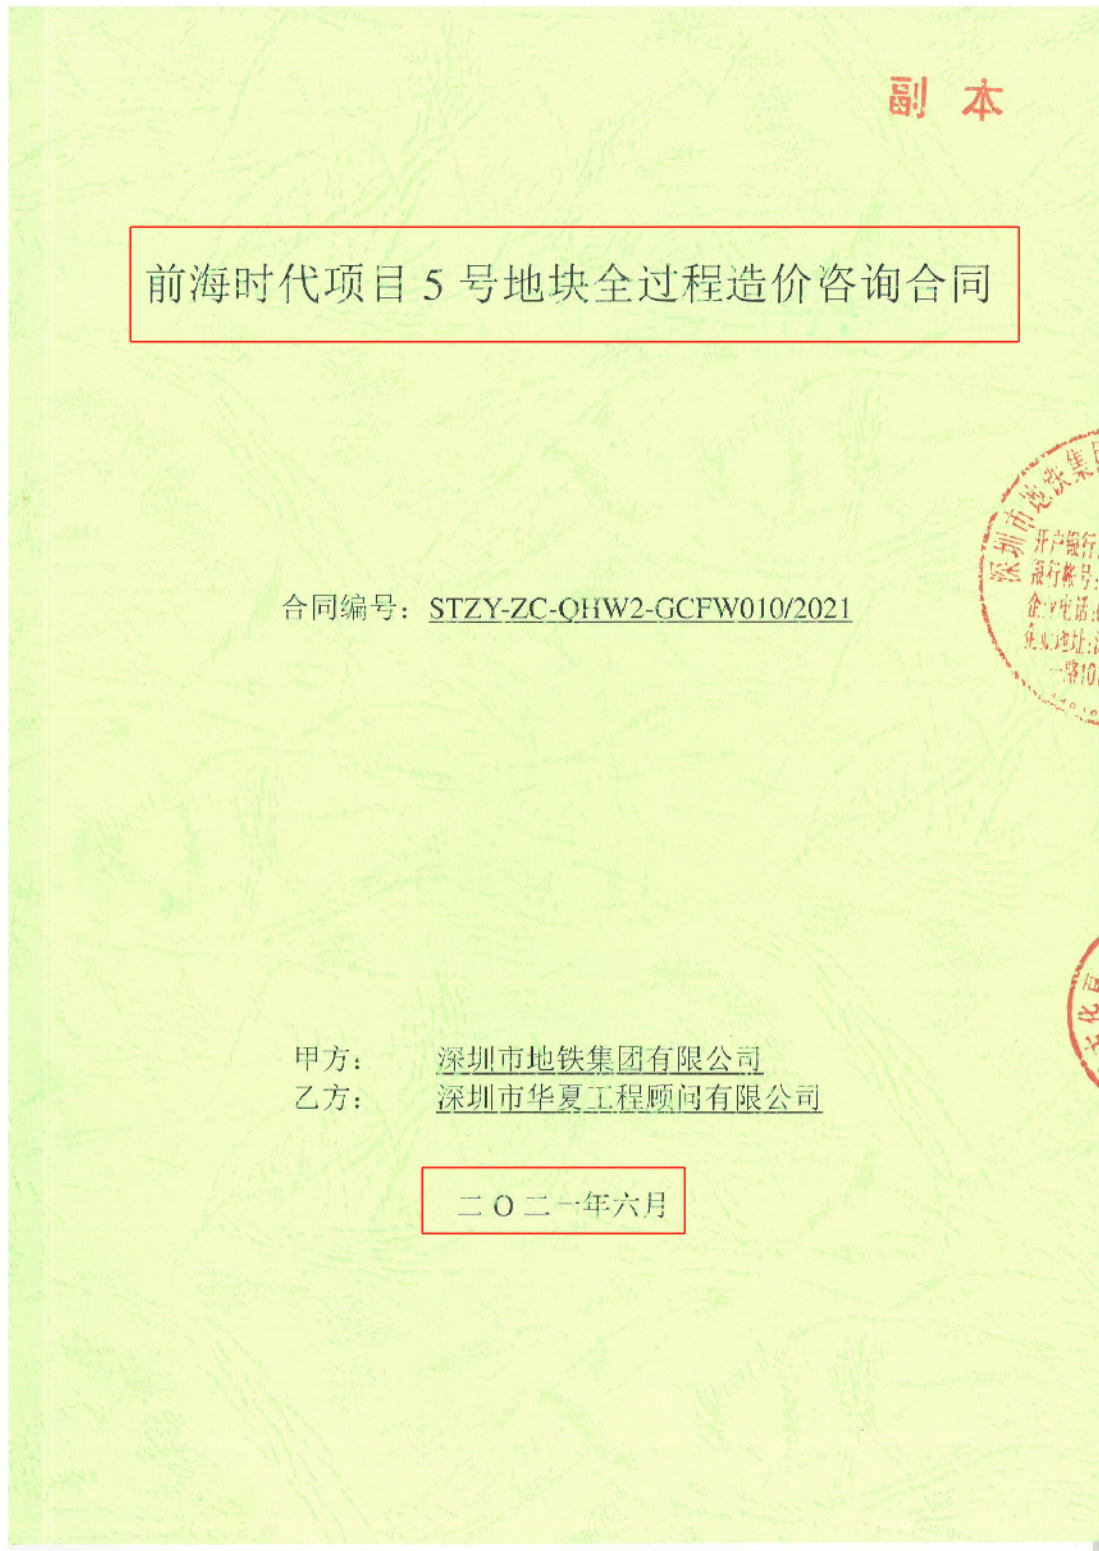





## 第一部分 合同协议书

深圳市地铁集团有限公司（以下简称“甲方”）通过公开招标选择深圳市华夏工程顾问有限公司（以下简称“乙方”）承担前海时代项目5号地块全过程造价咨询工作。

一、本协议书中所用术语的含义与下文提到合同条款中相应术语的含义相同。

二、本合同文件组成及解释顺序：

组成合同的各个文件应该是一个整体，彼此相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1. 合同协议书；
2. 中标通知书；
3. 合同条款；
4. 投标函；
5. 造价咨询任务单；
6. 招标文件、投标文件及其澄清文件（如果有）。

三、上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前者为准。

四、本合同暂定含税总价款为 4,990,000.00 元，其中不含税价款 4,707,547.17 元，增值税税额为 282,452.83 元，增值税税率 6%（合同增值税率根据国家税收法规政策变动而调整，不含税价不随增值税率的变化进行调整）。最终结算价按甲方发放的任务单和合同条款第五条计取。

五、服务期限：自合同签订之日起至本合同全部工作完成之日止。

六、由于甲方将按合同条款所述向乙方支付费用，乙方保证全部按照本合同规定向甲方提供成果和服务。甲方付款前乙方需提供等额的增值税专用发票，如果乙方不能提供等额合法发票，甲方有权拒绝支付。

七、因本合同产生的一切争议，双方应协商解决，协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、合同份数，本合同正本一式贰份，双方各执壹份，副本一式壹拾份，甲方执玖份，



# 华夏工程顾问

HUAXIA ENGINEERING CONSULTING

乙方执壹份。

九、本合同文本制作费用由乙方承担。

十、本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):  法定代表人  
或授权代表: 

住 所: 深圳市福田区福中一路  
1016号地铁大厦

电 话: 0755-23992674

传 真: 0755-23992555


开户银行: 招商银行深圳分行益田支行 开户全名: 深圳市地铁集团有限公司

账 号: 755904924410506 邮政编码: 518026

项目主管部门经办  
人及电话:

合约部门经办人及 郑锋  
电话: 13510741947

项目主管部门  
审核人:

合约部门审核  
人: 

乙方(盖章):  法定代表人  
或授权代表: 

住 所: 福田区福华一路国际商  
会大厦B座401室

电 话: 0755-83023168

传 真: 无

开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行 开户全名: 深圳市华夏工程顾问有限公司

账 号: 4425010001550988888 邮政编码: 518048

承包商经办人: 黄立立 承包商经办人  
电话: 15013618750

合同签署地点: 深圳

时 间: 2021年7月1日



## 第三部分 合同条款

甲方：深圳市地铁集团有限公司

乙方：深圳市华夏工程顾问有限公司

通过公开招标，由深圳市地铁集团有限公司（以下简称“甲方”）委托深圳市华夏工程顾问有限公司（以下简称“乙方”）承担前海时代 5 号地块全过程造价咨询服务工作。根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规、规章的规定，结合该工程的具体情况，经充分协商，签署本合同。

### 第一条 服务的工程范围

项目概况：前海时代 5 号地块项目，项目总占地面积 25707.78 m<sup>2</sup>，总建筑面积 226746 m<sup>2</sup>，容积率为 6.46。拟建超高层住宅（1 栋、约 44 层、地上建筑面积 50084.1 m<sup>2</sup>、高度 200 米以内）、精品住宅（2 栋、约 44 层、地上建筑面积 27459.9 m<sup>2</sup>、高度 200 米以内）、裙房商业（3 层、建筑面积 13099 m<sup>2</sup>）、酒店及商务公寓（1 栋、约 43 层，地上建筑面积 47720 m<sup>2</sup>，高度 200 米以内），地下室 3 层、建筑面积 60774 m<sup>2</sup>；

服务范围：前海时代项目 5 号地块范围内全过程（含精装）造价控制咨询。

上述咨询范围内的项目，甲方可另行招标或委托其他咨询公司。

### 第二条 造价咨询的内容

一、乙方提供的项目全过程（含精装）造价控制咨询，具体工作内容如下：

#### （一）招标、预算、施工阶段

1. 协助甲方编制建安目标成本，配合甲方进行各项经济指标测算和分析，提出限额设计指标，并向甲方提出有关造价管理、成本优化及控制等方面的合理化建议，提供其他类似项目的工程技术经济指标。
2. 编制工程量清单（含模拟工程量清单编制及修订）、标底、控制价，对技术经济指标提出成本优化建议；
3. 协助招标人编制招标文件，特别是招标文件中投标报价规定和特别条款；在造价工程师的指导下负责完成招标过程中商务标文件、工程控制价文件的编制和电子生成工作；
4. 施工合同签订后，根据甲方要求，对正式施工图进行清单更新和施工图预算编制，负责与施工单位核对并出具成果文件。
5. 甲方委托造价复审单位对上述成果文件进行审核，乙方参与核对并确认。





6. 项目进度款、验工计价审核。
  7. 提供工程变更方案的测算，工程变更、签证及各类索赔的立项估算。
  8. 负责工程变更、签证及各类索赔工程量清单和预算的编制，负责与施工单位核对；变更费用审核阶段，负责与施工单位/复审单位核对；参与甲方与施工单位变更签证洽商，协助甲方处理索赔事项；配合内外审计工作。
  9. 对施工单位上报的合同外工程报价和材料报价进行审核，并提交成果文件，参与甲方与施工单位的洽商。
  10. 参与监理方组织的询价或按甲方要求组织询价工作。
  11. 项目施工过程中与造价相关的其他工作业务。
- 咨询服务范围包括各类甲方分包工程以及甲供材料等，提供有关工程造价信息资料和造价指标分析表等。

## （二）竣工结算阶段

1. 依据甲方规章制度、作业指引、模板格式的要求，编制和审核工程结算书，出具结算审核报告，与施工、复审单位核对确认，办理送审及配合深圳市财政投资评审中心、深圳市建设工程造价管理站等政府部门的审计工作。
2. 在甲方规定的时限协助办理并取得深圳市建设工程造价管理站出具的竣工结算审核表，其费用已在合同中综合考虑，不再另计。
3. 项目竣工结算完成后，对整个项目发生的成本进行的全面的、系统的评价和分析总结，包括建安工程各项经济指标测算和分析等成本分析，形成成本后评估报告。
4. 建设过程中与工程结算相关的其他工作业务。

## （三）造价人员驻场要求

项目全过程造价控制咨询，乙方需按甲方工作需要及专业要求派驻一名专职造价人员（至少有五年以上造价工作经验）提供咨询服务。驻场造价人员由甲方调配，办公地点与派驻时间具体以甲方通知为准（派驻人员费用已包含在咨询费中，不另计算）。

二、项目建设过程中有关造价相关的工作业务，具体任务应以按届时甲方正式所填发的“造价咨询任务单”（格式详见本合同附件）中所规定的内容及要求为准。甲方根据项目的需要，有权取消某个阶段的造价咨询工作。

注：各阶段与其他造价咨询单位及施工方核实时，工作地点为甲方指定的地点。乙方与其他造价咨询单位及施工方均不直接对接，工程资料移交、意见反馈、澄清、补充及核



### 3. 拟派项目负责人业绩情况

2. 拟派项目负责人（姓名：吴家祥）业绩情况表	
1. 前海时代项目 5 号地块全过程造价咨询 合同金额：499 万元；签订时间：2021.7.1； 建设规模：项目总占地面积 25707.78m <sup>2</sup> ，总建筑面积 226746m <sup>2</sup> ； 服务内容：全过程造价咨询（预算、结算）；	
2. 深圳金融文化中心项目全过程造价咨询 合同金额：781.2 万元；签订时间：2020.7.23； 建设规模：建筑总面积约 7.8 万 m <sup>2</sup> ；服务内容：全过程造价咨询（概算、预算、结算）；	
3. 南方科技大学医学院项目 合同金额：723.96 万元；签订时间：2020.12.25； 建设规模：总建筑面积 16.4 万 m <sup>2</sup> ；服务内容：全过程造价咨询（概算、预算、结算）；	
合同金额合计（万元）	2007.16



# 华夏工程顾问

HUAXIA ENGINEERING CONSULTING

## 1、前海时代项目 5 号地块全过程造价咨询

### (1) 咨询合同

副本

前海时代项目 5 号地块全过程造价咨询合同

合同编号: STZY-ZC-QHW2-GCFW010/2021

甲方: 深圳市地铁集团有限公司  
乙方: 深圳市华夏工程顾问有限公司

二〇二一年六月

开户银行:  
银行账号:  
企业电话:  
企业地址:  
一零一〇

华夏工程顾问有限公司



## 第一部分 合同协议书

深圳市地铁集团有限公司（以下简称“甲方”）通过公开招标选择深圳市华夏工程顾问有限公司（以下简称“乙方”）承担前海时代项目5号地块全过程造价咨询工作。

一、本协议书中所用术语的含义与下文提到合同条款中相应术语的含义相同。

二、本合同文件组成及解释顺序：

组成合同的各个文件应该是一个整体，彼此相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1. 合同协议书；
2. 中标通知书；
3. 合同条款；
4. 投标函；
5. 造价咨询任务单；
6. 招标文件、投标文件及其澄清文件（如果有）。

三、上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前者为准。

四、本合同暂定含税总价款为 4,990,000.00 元，其中不含税价款 4,707,547.17 元，增值税税额为 282,452.83 元，增值税税率 6%（合同增值税率根据国家税收法规政策变动而调整，不含税价不随增值税率的变化进行调整）。最终结算价按甲方发放的任务单和合同条款第五条计取。

五、服务期限：自合同签订之日起至本合同全部工作完成之日止。

六、由于甲方将按合同条款所述向乙方支付费用，乙方保证全部按照本合同规定向甲方提供成果和服务。甲方付款前乙方需提供等额的增值税专用发票，如果乙方不能提供等额合法发票，甲方有权拒绝支付。

七、因本合同产生的一切争议，双方应协商解决，协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、合同份数，本合同正本一式贰份，双方各执壹份，副本一式壹拾份，甲方执玖份，



# 华夏工程顾问

HUAXIA ENGINEERING CONSULTING

乙方执壹份。

九、本合同文本制作费用由乙方承担。

十、本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):  法定代表人  
或授权代表: 

住 所: 深圳市福田区福中一路  
1016号地铁大厦

电 话: 0755-23992674

传 真: 0755-23992555


开户银行: 招商银行深圳分行益田支行 开户全名: 深圳市地铁集团有限公司

账 号: 755904924410506 邮政编码: 518026

项目主管部门经办  
人及电话:

合约部门经办人及 郑锋  
电话: 13510741947

项目主管部门  
审核人:

合约部门审核  
人: 

乙方(盖章):  法定代表人  
或授权代表: 

住 所: 福田区福华一路国际商  
会大厦B座401室

电 话: 0755-83023168

传 真: 无

开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行 开户全名: 深圳市华夏工程顾问有限公司

账 号: 44250100015509888888 邮政编码: 518048

承包商经办人: 黄立立 承包商经办人  
电话: 15013618750

合同签署地点: 深圳

时 间: 2021年7月1日





## 第三部分 合同条款

甲方：深圳市地铁集团有限公司

乙方：深圳市华夏工程顾问有限公司

通过公开招标，由深圳市地铁集团有限公司（以下简称“甲方”）委托深圳市华夏工程顾问有限公司（以下简称“乙方”）承担前海时代 5 号地块全过程造价咨询服务工作。根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规、规章的规定，结合该工程的具体情况，经充分协商，签署本合同。

### 第一条 服务的工程范围

项目概况：前海时代 5 号地块项目，项目总占地面积 25707.78 m<sup>2</sup>，总建筑面积 226746 m<sup>2</sup>，容积率为 6.46。拟建超高层住宅（1 栋、约 44 层、地上建筑面积 50084.1 m<sup>2</sup>、高度 200 米以内）、精品住宅（2 栋、约 44 层、地上建筑面积 27459.9 m<sup>2</sup>、高度 200 米以内）、裙房商业（3 层、建筑面积 13099 m<sup>2</sup>）、酒店及商务公寓（1 栋、约 43 层，地上建筑面积 47720 m<sup>2</sup>，高度 200 米以内），地下室 3 层、建筑面积 60774 m<sup>2</sup>；

服务范围：前海时代项目 5 号地块范围内全过程（含精装）造价控制咨询。

上述咨询范围内的项目，甲方可另行招标或委托其他咨询公司。

### 第二条 造价咨询的内容

一、乙方提供的项目全过程（含精装）造价控制咨询，具体工作内容如下：

#### （一）招标、预算、施工阶段

1. 协助甲方编制建安目标成本，配合甲方进行各项经济指标测算和分析，提出限额设计指标，并向甲方提出有关造价管理、成本优化及控制等方面的合理化建议，提供其他类似项目的工程技术经济指标。
2. 编制工程量清单（含模拟工程量清单编制及修订）、标底、控制价，对技术经济指标提出成本优化建议；
3. 协助招标人编制招标文件，特别是招标文件中投标报价规定和特别条款；在造价工程师的指导下负责完成招标过程中商务标文件、工程控制价文件的编制和电子生成工作；
4. 施工合同签订后，根据甲方要求，对正式施工图进行清单更新和施工图预算编制，负责与施工单位核对并出具成果文件。
5. 甲方委托造价复审单位对上述成果文件进行审核，乙方参与核对并确认。



6. 项目进度款、验工计价审核。
  7. 提供工程变更方案的测算，工程变更、签证及各类索赔的立项估算。
  8. 负责工程变更、签证及各类索赔工程量清单和预算的编制，负责与施工单位核对；变更费用审核阶段，负责与施工单位/复审单位核对；参与甲方与施工单位变更签证洽商，协助甲方处理索赔事项；配合内外审计工作。
  9. 对施工单位上报的合同外工程报价和材料报价进行审核，并提交成果文件，参与甲方与施工单位的洽商。
  10. 参与监理方组织的询价或按甲方要求组织询价工作。
  11. 项目施工过程中与造价相关的其他工作业务。
- 咨询服务范围包括各类甲方分包工程以及甲供材料等，提供有关工程造价信息资料和造价指标分析表等。

## （二）竣工结算阶段

1. 依据甲方规章制度、作业指引、模板格式的要求，编制和审核工程结算书，出具结算审核报告，与施工、复审单位核对确认，办理送审及配合深圳市财政投资评审中心、深圳市建设工程造价管理站等政府部门的审计工作。
2. 在甲方规定的时限协助办理并取得深圳市建设工程造价管理站出具的竣工结算审核表，其费用已在合同价中综合考虑，不再另计。
3. 项目竣工结算完成后，对整个项目发生的成本进行的全面的、系统的评价和分析总结，包括建安工程各项经济指标测算和分析等成本分析，形成成本后评估报告。
4. 建设过程中与工程结算相关的其他工作业务。

## （三）造价人员驻场要求

项目全过程造价控制咨询，乙方需按甲方工作需要及专业要求派驻一名专职造价人员（至少有五年以上造价工作经验）提供咨询服务。驻场造价人员由甲方调配，办公地点与派驻时间具体以甲方通知为准（派驻人员费用已包含在咨询费中，不另计算）。

二、项目建设过程中有关造价相关的工作业务，具体任务应以按届时甲方正式所填发的“造价咨询任务单”（格式详见本合同附件）中所规定的内容及要求为准。甲方根据项目的需要，有权取消某个阶段的造价咨询工作。

注：各阶段与其他造价咨询单位及施工方核对时，工作地点为甲方指定的地点。乙方与其他造价咨询单位及施工方均不直接对接，工程资料移交、意见反馈、澄清、补充及核



## 附件 4：项目人员配备

人员组织架构

名称	在本项目中担任职务	姓名	执业证书	职称证书	学历	专业	从事本专业年限
1	项目负责人	吴家祥	注册造价工程师	中级	本科	土建	11
2	项目总审	陈金兰	注册造价工程师	高级	大专	土建	35
3	土建负责人	贺小英	注册造价工程师	中级	本科	土建	17
4	安装负责人	贾晓冬	注册造价工程师	高级	大专	安装	25
5	土建校审	方建	注册造价工程师	/	本科	土建	10
6	安装校审	肖小萍	注册造价工程师	高级	大专	安装	30
7	土建工程师	蔡立郡	注册造价工程师	高级	大专	土建	11
8	土建工程师	彭师成	注册造价工程师	中级	本科	土建	10
9	土建工程师	黄运展	注册造价工程师	/	本科	土建	9
10	土建工程师	吴耀南	造价员	中级	本科	土建	9
11	土建工程师	丁晓辉	造价员	中级	本科	土建	9
12	安装工程师	宋桂树	注册造价工程师	高级	本科	安装	30
14	安装工程师	贺巧凤	注册造价工程师	中级	大专	安装	26
15	安装工程师	曾祥裕	造价员	/	/	安装	14
16	安装工程师	朱天宇	造价员	中级	本科	安装	10
17	驻场人员	张旭	/	/	本科	土建	10






# 华夏工程顾问

HUAXIA ENGINEERING CONSULTING

## 2、深圳金融文化中心项目全过程造价咨询

### (1) 咨询合同



合同编号: SJRWZHX-006-2020

## 深圳市建筑工务署工程管理中心 合同协议书

项目名称: 深圳金融文化中心项目

合同名称: 深圳金融文化中心项目全过程造价咨询合同

承包方: 深圳市华夏工程顾问有限公司

日期: 二〇二〇年七月



## 深圳金融文化中心项目全过程造价 咨询合同



委托单位（甲方）：深圳市建筑工务署工程管理中心

咨询单位（乙方）：深圳市华夏工程顾问有限公司

本工程造价咨询工作由甲方于 2018 年 2 月 11 日公开预选招标，并于 2020 年 07 月 15 日在深圳市建设工程交易服务中心确定由乙方中标。按照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程造价咨询工作协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称：深圳金融文化中心项目全过程造价咨询

工程地点：福田区香蜜湖街道

工程规模及内容：总投资为 150000 万元，预计工程工期 2020 年 8 月开工，2024 年 6 月底竣工；建筑总面积约 7.8 万平方米。

根据深圳市人民政府办公厅关于研究“新十大文化设施”建设工程的会议纪要（184 号）及深圳市福田区政府办公室 2019 年 12 月 18 日关于金融博物馆和国际演艺中心专题工作汇报会会议纪要（242 号）精神，深圳金融文化中心项目已赋码登记。

深圳金融文化中心项目用地面积 2 万平方米，总建筑面积约 7.8 万平方米。建设资金按来源为福田区政府投资，总投资金额为 15 亿。

本工程造价咨询的项目包括：

工可、概算、预算、结算阶段及其它。



## 二、合同价及结算价：

本项目造价咨询服务费用（暂定）为大写：柒佰捌拾壹万贰仟元整（小写：¥ 781.2 万元），最终结算价以深圳市财政投资评审中心的评审报告或甲方指定的第三方机构审核结论为准。

### 1、咨询服务费按阶段计取；

#### 1.1 咨询服务费取费基数：

a、合同委托阶段：咨询服务费取费基数（暂定）按以下方式之一由发包人确定（优先批复概算，其次可研报告，再次项目建议书）：

☒ 批复概算中的建安费；

☒ 批复可研-☒ 建安费 或取（未单列建安费时）☒ 总投资估算 $\times 0.9$

☒ 批复项目建议书中-☒ 建安费 或取（未单列建安费时） ☒ 总投资匡算 $\times 0.9$

#### b、咨询服务费结算取费基数：

咨询服务费结算以所承接的最终批复概算（含调整）中建安费作为取费基数，费率按照取费表重新计算结算费率（有关调整系数不变）。

### 1.2 咨询服务费为按本款约定的方式计算各阶段造价咨询服务或其他工程造价咨询任务相应费用的总和；

咨询服务费=取费基数 $\times$ 工程造价咨询服务费率 $\times$ 系数（其中90%为基本费用，10%为绩效费用）+其他费用

其他费用指奖金、驻场服务费、专家咨询费等。



### 三、乙方工作内容

1、审核资料、协助完成项目可行性研究评审工作；审核概算、协助完成概算评审工作（根据具体项目，可能无此两项内容，也可能根据项目需要编制设计概算）；

2、编制或审核工程预算，并对预算和概算进行对比分析，建立项目全过程动态投资控制台帐；

3、协助招标人编制招标文件，特别是招标文件中投标报价规定和特别条款；在造价工程师的指导下负责完成招标过程中商务标文件、工程控制价文件的编制和电子生成工作；

4、编制工程量清单及招标控制价，并提供综合单价分析表；在工程量清单和标的编制过程中书面提出设计和招标文件的问题，提醒甲方工程中采用的新材料、新工艺，并拟定计价方案供甲方决策；

5、提供主要材料数量及价格清单，并提交询价或计价依据；

6、提供主要设备清单及单价，并提交询价或计价依据；

7、复核中标候选人的商务标，并提出详细的造价分析报告；

8、协助甲方签订合同；

9、编制投资控制形象进度表；

10、施工过程中，参与工程量及工程进度款支付的复核工作；

11、参与工程变更及现场签证的计量、计价复核工作，及时按甲方要求编制工程变更估算、审核工程变更预算、现场签证；

12、审核工程竣工结算，协助完成结算审计工作；

13、按需要与甲方一起到工地现场解决有关造价事宜（包含材料



询价等工作); 全过程成本控制, 主动、及时地发现并向甲方汇报任何可能影响成本的事项, 提出相关改善建议;

14、结算完成后, 协助甲方进行经济技术指标分析和完成项目财务决算;

15、配合甲方对施工、设计、监理等各参建单位进行履约评价, 并出具书面的评价意见;

16、如有需要, 招标人可要求各入围造价咨询单位指派造价工程师组成招标人造价咨询专家库, 负责材料、设备价格、分部分项综合单价合理性的审查工作(项目委托范围以外的), 或接受招标人委托的其他造价咨询工作, 以不超过 1000 元/人天计酬(按签证方式, 在结算时统一支付给造价咨询单位);

17、根据甲方安排, 配合对设计、监理单位进行绩效评价, 并及时提交书面的绩效意见;

18、需要分标段拆分的项目, 项目牵头单位必须负责制定项目统一的计价计量规则、标段界面划分等牵头协调工作。

19、驻场咨询服务: 各入围造价咨询单位应按招标人项目组要求派责任心及沟通组织协调能力均较强的造价咨询人员驻工地现场办公。

19.1 服务内容: 包括现场签证和进度款的审核、设计变更的估算编制或预算审核、变更台账的建立与管理以及完成招标人交办的该项目造价咨询工作;

19.2 具体驻现场人员的资格、人数、期限及方式等要求由招标人项目组根据工程重要性、技术复杂程度、预计变更量及工期等情况



在任务委托前确定；

19.3 咨询驻场服务补贴采用单价包干的形式，以不超过 12000 元/月·人计酬（具体薪酬等级分初级职称 6000 元/月·人，中级及以上职称 8000 元/月·人，注册造价工程师按 12000 元/月·人，按驻场人员考勤情况一年一付），服务期从驻场人员进驻项目现场之日起计至招标人书面通知其退场为止，少于 10 天不计，10~15 天按半个月计，超出 15 天按一个月计。

20、工程建设其它费用中的设计、监理、勘察等所有合同的造价咨询工作；

21、项目所有工程结算完毕后，出具项目投资控制总结报告，报告中应包含履约情况自我评价、投资控制情况汇报、造价指标分析、投资控制存在的问题及建议等。

22、其它有关的造价管理任务和工程造价技术咨询等。

#### 四、乙方工作时间要求

1、设计概算审查结果文件的提交时间：接到设计概算及相关资料后 15 天内提交；

2、招标项目造价文件的提交时间：接到施工图纸及相关资料后 20 天内提交工程量清单，30 天内提交标底；

3、签订施工合同后 20 天内，提交投资控制形象进度表；

4、施工招标完成后工程量清单的复核自接到相关资料后 60 天内提交；

5、施工过程的计量计价审核意见自接到相关资料后 3 天内提交；

6、工程竣工结算审核自接到相关资料后 30 天内提交。





# 华夏工程顾问

HUAXIA ENGINEERING CONSULTING

甲方：深圳市建筑工务署  
工程管理中心

地址：鸿昌广场6楼、46、47楼

法定代表人：

或 委托代理人：

开户银行：

帐号：

邮政编码：518031

乙方：深圳市华夏工程顾问

有限公司

地址：福田区福华一路国际

商会大厦B座401

法定代表人：

或 委托代理人：

开户银行：招商银行股份有限公司

深圳滨河时代支行

帐号：819382003810001

邮政编码：518048

合同订立时间：2020年7月23日



# 华夏工程顾问

HUAXIA ENGINEERING CONSULTING

## (2) 甲方出具体现项目负责人的对应文件

### 证 明

深圳市华夏工程顾问有限公司为我中心履约单位，以下全过程项目（详见附表）由深圳市华夏工程顾问有限公司承接。

附表：

序号	项目名称	委托单位	咨询内容	合同签订时间	项目负责人
1	深圳市第三儿童医院项目	深圳市建筑工务署工程管理中心	全过程造价咨询	2020-6-24	吴家祥
2	深圳市人民医院改扩建工程（一期）全过程造价咨询	深圳市建筑工务署工程管理中心	全过程造价咨询	2019-6-28	牟金桥
3	深圳市龙华区人民法院审判法庭建设项目	深圳市建筑工务署工程管理中心	全过程造价咨询	2020-5-27	陈达飞
4	深圳金融文化中心项目	深圳市建筑工务署工程管理中心	全过程造价咨询	2020-7-23	吴家祥
5	深圳市老干部活动中心整体改造提升智能化改造工程	深圳市建筑工务署工程管理中心	全过程造价咨询	2020-4-24	潘峰
6	南方科技大学医学院项目	深圳市建筑工务署工程管理中心	全过程造价咨询	2020-12-25	吴家祥
7	荔香路大院片区功能完善及建筑安全隐患整治工程、荔香路综合文体中心	深圳市建筑工务署工程管理中心	全过程造价咨询	2021-5-10	陈金兰

深圳市建筑工务署工程管理中心

2022年9月5日





# 华夏工程顾问

HUAXIA ENGINEERING CONSULTING

## 3、南方科技大学医学院项目

### (1) 咨询合同



合同编号: NFKJDXYY-004-2020

## 深圳市建筑工务署工程管理中心 合同协议书

项目名称: 南方科技大学医学院项目

合同名称: 南方科技大学医学院项目造价咨询合同

承包方: 深圳市华夏工程顾问有限公司

日期: 二〇二〇年十二月



## 南方科技大学医学院项目造价咨询合同

委托单位（甲方）：深圳市建筑工务署工程管理中心

咨询单位（乙方）：深圳市华夏工程顾问有限公司

本工程造价咨询工作由甲方于 2020 年 11 月 25 日公开预选招标,并于 2020 年 12 月在深圳市建设工程交易服务中心确定由乙方中标。按照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、规章,并结合深圳市有关规定及本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程造价咨询工作协商一致,订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称：南方科技大学医学院项目

工程地点：南方科技大学医学院

工程规模及内容：建安及设备费约 133200 万元人民币,预计工期 2022 年 7 月开工, 2025 年 12 月底竣工;建筑总面积 16.4 万平方米。

本工程造价咨询的项目包括：全过程造价咨询服务。

### 二、合同价及结算价：

本项目造价咨询服务费用（暂定）为大写：柒佰贰拾叁万玖仟陆佰元整（小写：¥ 723.96 万元），最终结算价以深圳市财政投资评审中心的评审报告或委托单位（甲方）指定的第三方机构审核结论为准。。

#### 1、咨询服务费按阶段计取：

##### 1.1 咨询服务费取费基数：

a、合同委托阶段：咨询服务费取费基数（暂定）按以下方式之



中建安费作为取费基数，总费率按照阶段取费表以计取公式重新计算结算费率。计取结算费率时有关难度、调整系数不变，但因图纸改动较大给予的难度系数可另行计取（总难度系数超过 1.3 时仍按照 1.3 封顶）；

2.2 按照“ $\text{结算取费基数} \times \text{结算费率} \times 0.9$ ”结算最终基本费用；按照“ $\text{结算取费基数} \times \text{结算费率} \times 0.1$ ”作为绩效费用总额，按履约评价次数平均分摊到合同期间进行的履约评价中，以期中履约评价结果结算最终绩效费用；

2.3 其他费用结算：奖金、驻场服务费、专家咨询费等，按实际发生费用予以结算；

2.4 最终结算价以深圳市财政投资评审中心的评审报告或委托单位（甲方）指定的第三方机构审核结论为准。

### 三、乙方工作内容

1、审核资料、协助完成项目可行性研究评审工作；审核概算、协助完成概算评审工作（根据具体项目，可能无此两项内容，也可能根据项目需要编制设计概算）；

2、编制或审核工程预算，并对预算和概算进行对比分析，建立项目全过程动态投资控制台帐；

3、协助招标人编制招标文件，特别是招标文件中投标报价规定和特别条款；在造价工程师的指导下负责完成招标过程中商务标文件、工程控制价文件的编制和电子生成工作；

4、编制工程量清单及招标控制价，并提供综合单价分析表；在





工程量清单和标的编制过程中书面提出设计和招标文件的问题，提醒甲方工程中采用的新材料、新工艺，并拟定计价方案供甲方决策；

5、提供主要材料数量及价格清单，并提交询价或计价依据；

6、提供主要设备清单及单价，并提交询价或计价依据；

7、复核中标候选人的商务标，并提出详细的造价分析报告；

8、协助甲方签订合同；

9、编制投资控制形象进度表；

10、施工过程中，参与工程量及工程进度款支付的复核工作；

11、参与工程变更及现场签证的计量、计价复核工作，及时按甲方要求编制工程变更估算、审核工程变更预算、现场签证；

12、审核工程竣工结算，协助完成结算审计工作；

13、按需要与甲方一起到工地现场解决有关造价事宜（包含材料询价等工作）；全过程成本控制，主动、及时地发现并向甲方汇报任何可能影响成本的事项，提出相关改善建议；

14、结算完成后，协助甲方进行经济技术指标分析和完成项目财务决算；

15、配合甲方对施工、设计、监理等各参建单位进行履约评价，并出具书面的评价意见；

16、如有需要，招标人可要求各入围造价咨询单位指派造价工程师组成招标人造价咨询专家库，负责材料、设备价格、分部分项综合单价合理性的审查工作（项目委托范围以外的），或接受招标人委托的其他造价咨询工作，以不超过 1000 元/人天计酬（按签证方式，在





结算时统一支付给造价咨询单位)；

17、根据甲方安排，配合对设计、监理单位进行绩效评价，并及时提交书面的绩效意见；

18、需要分标段拆分的项目，项目牵头单位必须负责制定项目统一的计价计量规则、标段界面划分等牵头协调工作。

19、驻场咨询服务：各入围造价咨询单位应按招标人项目组要求派责任心及沟通组织协调能力均较强的造价咨询人员驻工地现场办公。

19.1 服务内容：包括现场签证和进度款的审核、设计变更的估算编制或预算审核、变更台账的建立与管理以及完成招标人交办的该项目造价咨询工作；

19.2 具体驻现场人员的资格、人数、期限及方式等要求由招标人项目组根据工程重要性、技术复杂程度、预计变更量及工期等情况在任务委托前确定；

19.3 咨询驻场服务补贴采用单价包干的形式，以不超过 12000 元/月·人计酬（具体薪酬等级分初级职称 6000 元/月·人，中级及以上职称 8000 元/月·人，注册造价工程师按 12000 元/月·人，按驻场人员考勤情况一年一付），服务期从驻场人员进驻项目现场之日起计至招标人书面通知其退场为止，少于 10 天不计，10~15 天按半个月计，超出 15 天按一个月计。

20、工程建设其它费用中的设计、监理、勘察等所有合同的造价咨询工作；

21、项目所有工程结算完毕后，出具项目投资控制总结报告，报告中应包含履约情况自我评价、投资控制情况汇报、造价指标分析、



投资控制存在的问题及建议等。

22、其它有关的造价管理任务和工程造价技术咨询等。

#### 四、乙方工作时间要求

1、设计概算审查结果文件的提交时间：接到设计概算及相关资料后 15 天内提交；

2、招标项目造价文件的提交时间：接到施工图纸及相关资料后 20 天内提交工程量清单，30 天内提交标底；

3、签订施工合同后 20 天内，提交投资控制形象进度表；

4、施工招标完成后工程量清单的复核自接到相关资料后 60 天内提交；

5、施工过程的计量计价审核意见自接到相关资料后 3 天内提交；

6、工程竣工结算审核自接到相关资料后 30 天内提交。

上述工作时限与甲方项目组下达的《工程造价咨询任务书》不一致时，以《工程造价咨询任务书》规定的时限为准。

#### 五、造价文件的编制原则和依据

1、初步设计文件及图纸；

2、施工招标文件；

3、施工合同；

4、施工图（或竣工图）及有关设计文件；

5、工程变更；

6、材料及设备价格参考施工招标期间的《深圳建设工程价格信息》及相应时期的市场价格；



### 十三、奖励

发包人根据乙方在本项目的最终履约评价（指完成该项目决算审计后进行的综合履约评价）结果进行奖励：

最终履约评价为优秀的，奖励\_\_\_/\_\_\_万元，最终履约评价为良好及以下的不奖励。（奖励总金额不超过合同咨询服务费的 5%，若咨询服务费小于 10 万元，具体奖罚款数额应调整）。

### 十四、其他

本合同未尽事宜双方协商解决。

### 十五、合同份数

本合同一式八份，甲方六份，乙方两份，具同等法律效力。

附件：中标通知书

甲方：深圳市建筑工务署工程管理中心 乙方：

地址：上步中路 1023 号市府二办

地址：

法定代表人：

法定代表人：

或 委托代理人：

或 委托代理人：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

邮政编码：518031

邮政编码：

合同订立时间： 2020 年 12 月 25 日



# 华夏工程顾问

HUAXIA ENGINEERING CONSULTING

## (2) 甲方出具体现项目负责人的对应文件

### 证 明

深圳市华夏工程顾问有限公司为我中心履约单位，以下全过程项目（详见附表）由深圳市华夏工程顾问有限公司承接。

附表：

序号	项目名称	委托单位	咨询内容	合同签订时间	项目负责人
1	深圳市第三儿童医院项目	深圳市建筑工务署工程管理中心	全过程造价咨询	2020-6-24	吴家祥
2	深圳市人民医院改扩建工程（一期）全过程造价咨询	深圳市建筑工务署工程管理中心	全过程造价咨询	2019-6-28	牟金桥
3	深圳市龙华区人民法院审判法庭建设项目	深圳市建筑工务署工程管理中心	全过程造价咨询	2020-5-27	陈达飞
4	深圳金融文化中心项目	深圳市建筑工务署工程管理中心	全过程造价咨询	2020-7-23	吴家祥
5	深圳市老干部活动中心整体改造提升智能化改造工程	深圳市建筑工务署工程管理中心	全过程造价咨询	2020-4-24	潘峰
6	南方科技大学医学院项目	深圳市建筑工务署工程管理中心	全过程造价咨询	2020-12-25	吴家祥
7	荔香路大院片区功能完善及建筑安全隐患整治工程、荔香路综合文体中心	深圳市建筑工务署工程管理中心	全过程造价咨询	2021-5-10	陈金兰

深圳市建筑工务署工程管理中心

2022年9月5日





4. 企业获奖情况

3. 企业获奖情况表
1. 深圳金融文化中心建设工程施工总承包工程 获奖奖项：2022 年度深圳市优秀工程造价成果二等奖；奖项级别：市级； 获奖时间：2023 年 3 月；
2. 深圳市第三儿童医院项目施工总承包工程 获奖奖项：：2022 年度深圳市优秀工程造价成果三等奖；奖项级别：市级； 获奖时间：2023 年 3 月；
3. 大浪北路市政工程 获奖奖项：2022 年度深圳市优秀工程造价成果三等奖；奖项级别：市级； 获奖时间：2023 年 3 月；
4. 深圳市龙华区人民法院审判法庭建设项目施工总承包 获奖奖项：深圳市优秀工程造价成果一等奖；奖项级别：市级；获奖时间：2022 年 6 月；
5. 前海深港设计创意产业园项目总承包工程 获奖奖项：深圳市优秀工程造价成果二等奖；奖项级别：市级；获奖时间：2022 年 6 月；





# 华夏工程顾问

HUAXIA ENGINEERING CONSULTING

## 1、深圳金融文化中心建设工程施工总承包工程

### (1) 获奖证书





# 华夏工程顾问

HUAXIA ENGINEERING CONSULTING

## 2、深圳市第三儿童医院项目施工总承包工程

### (1) 获奖证书





# 华夏工程顾问

HUAXIA ENGINEERING CONSULTING

## 3、大浪北路市政工程

### (1) 获奖证书





# 华夏工程顾问

HUAXIA ENGINEERING CONSULTING

## 4、深圳市龙华区人民法院审判法庭建设项目施工总承包

### (1) 获奖证书







# 华夏工程顾问

HUAXIA ENGINEERING CONSULTING

## 5、前海深港设计创意产业园项目总承包工程

### (1) 获奖证书







# 华夏工程顾问

HUAXIA ENGINEERING CONSULTING

## 5. 中小企业声明函

深圳市华夏工程顾问有限公司参加（深圳市特发新邦置业发展有限公司）的（南湾中部片区土地整备利益统筹项目 04-01-01 地块全过程造价咨询）招标投标活动，工程服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

深圳市华夏工程顾问有限公司 从业人员 111 人，营业收入为 3675.085261 万元，资产总额为 3651.969498 万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的划分标准，属于（商务服务类）行业的（小型企业）。

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：深圳市华夏工程顾问有限公司

日期：2025 年 6 月 9 日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。招标人同等条件下优先选择符合条件的中小企业中标的，投标人属于招标项目所属行业中小企业且提供声明函后，方可适用该条款。



**华夏工程顾问**  
HUAXIA ENGINEERING CONSULTING

**其他**

其他 1

（投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明）
