



深圳市三合和工程项目管理有限公司

蛇口影剧院升级改造工程项目全过程造 价咨询项目

投标文件

资信标书

项目编号：2312-440305-04-01-166125004001

投标人名称：深圳市三合和工程项目管理有限公司

投标人代表：何易

投标日期：2024年12月04日





投标函

致 深圳市南山区建筑工务署：

根据已收到贵方的 蛇口影剧院升级改造工程项目全过程造价咨询 招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以招标文件前附表规定的付费方法及标准，接受贵方招标文件所提出的任务要求。

1. 我方已详细审核了全部招标文件，包括澄清、修改、补充文件（如有时）及有关附件，对招标文件的要求完全理解。

2. 我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收。

4. 我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我单位承担。

5. 如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的时间完成任务，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6. 如果我方中标，我方将按照投标文件承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作。如未经招标人同意更换项目组成员，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我单位承担。

7. 如果我方中标，我方将按照招标文件中规定的金额提交经招标人认可的履约保函。

8. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评定标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

9. 在正式合同签署并生效之前，贵方的中标通知书和本投标函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称：深圳市三合和工程项目管理有限公司

法定代表人：何易

授权委托人：何易

单位地址：深圳市南山区南头街道大汪山社区南山大道 2068 号南侨花园住宅楼 G 栋 502

邮编：518052

联系电话：0755-86054599 传真：0755-86054699

日期：2024 年 12 月 04 日



1、企业营业执照（原件扫描件）



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

信息分类：**企业信用信息公示** 经营异常名录 严重违法失信名单

企业状态：**全部** 存续（在营、开业、在册） 吊销，未注销 吊销，已注销 注销 迁出 歇业 责令关闭

成立年限：**全部** 成立1年内 成立1-5年 成立5-10年 成立10-15年 成立15年以上

登记机关：**全部** 总局 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 **展开**

高级筛选：**全部** 有行政许可信息 无行政许可信息 有行政处罚信息 无行政处罚信息
有动产抵押登记信息 无动产抵押登记信息 有商标注册信息 无商标注册信息

收起筛选条件^

用时0.031秒，查询到1条信息

深圳市三合和工程项目管理有限公司 存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码：91440300MA5G3BJ913 法定代表人：何易 成立日期：2020年03月16日

注册号：

首页 上一页 1 下一页 末页



登记通知书

业务流程号:22410654333

深圳市三合和工程项目管理有限公司:

你单位提交的变更登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。



注:

- 1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;
- 2、名称变更登记的,各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容,但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容。
- 3、公司因合并分立申请登记的,各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。



深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)

深圳市三合和工程项目管理有限公司 2024年11月20日 的变更信息


变更前负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)	敖春兰
变更后负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)	何易
变更前投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)	敖春兰 210.0 (万元) 王炎武 90.0 (万元)
变更后投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)	何易 300.0 (万元)
变更前成员	敖春兰(总经理),敖春兰(执行董事),王炎武(监事)
变更后成员	何易(董事),何易(经理)
变更前市场主体类型	有限责任公司
变更后市场主体类型	有限责任公司(自然人独资)
变更前指定联系人	敖春兰
变更后指定联系人	何易
变更前章程或章程修正案通过日期	2022-06-27
变更后章程或章程修正案通过日期	2024-11-14

打印时间: 2024年11月20日18:7:2

版权所有: 深圳市市场监督管理局
地址: 福田区深南大道7010号工商物价大厦



组织架构图

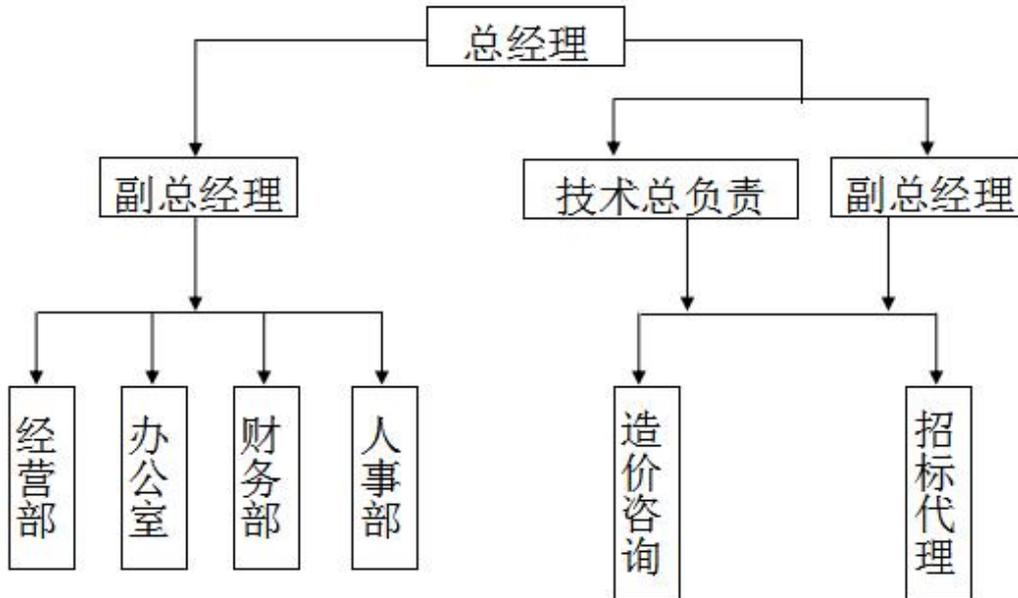



投标人根据《资信标要求一览表》内容及要求编制资信标，并按以下投标文件 格式进行填写并提供相关证明资料。

拟投入本项目人员情况汇总表

序号	姓名	项目拟任岗位	性别	年龄	执业资格	社保情况
1	王炎武	项目负责人	男	57	一级注册造价工程师 工程师	2023.10-2024.11
2	余丽芸	土建负责人	女	31	一级注册造价工程师 工程师	2024.9-2024.11
3	赵远	项目经理	男	43	一级注册造价工程师 工程师	2024.9-2024.11
4	李东	项目经理	男	58	一级注册造价工程师 工程师	2024.9-2024.11
5	颜国强	预算员	男	46	二级注册造价工程师 工程师	2024.9-2024.11
6	朱熙锦	预算员	男	27	二级注册造价工程师 助理工程师	2024.9-2024.11
7	李正人	安装负责人	女	27	二级注册造价工程师 助理工程师	2024.9-2024.11
8	汤怀平	预算员	男	42	工程师	2024.9-2024.11
9	崔梦	预算员	女	29	造价员	2024.9-2024.11
10	张天	预算员	男	27	造价员	2024.9-2024.11
11	韦建丞	预算员	男	28	造价员	2024.9-2024.11
12	李香	预算员	女	21	造价员	2024.9-2024.11
13	戴光玉	资料员	女	34	资料员	2024.9-2024.11



项目负责人简历表

姓名	王炎武	性别	男	年龄	57
职务	项目负责人	职称	工程师	学历	本科
参加工作 时间	1989.09		从事本职业 年限	35	
资格证书 编号	建[造]11014400010236		在本项目拟 任职务	项目负责人	
项目负责人近5年具有同类工程业绩情况					
起止时间	建设单位	担任职务	工程名称	合同金额	竣工时间
2023	深圳市南山区 建筑工务署	项目负责人	创业路科苑南路人行 天桥全过程造价咨询	110.78	2025
2024	深圳市南山区 建筑工务署	项目负责人	桃源中学改扩建工程 项目全过程造价咨询	271.30	2026
2024	深圳市南山区 建筑工务署	项目负责人	中山大学深圳产学研 大楼东北侧地块建设 羽毛球馆项目-全过程 造价咨询	56.80	2025
2024	深圳市南山区 建筑工务署	项目负责人	麒麟山庄安全隐患整 治环境提升项目全过 程造价咨询	47.73	2024
2023	深圳市南山区 建筑工务署	项目负责人	跨后海滨路天桥二期 建设项目全过程造价 咨询	33.58	2024
2023	深圳市南山区 建筑工务署	项目负责人	田厦社康中心升级社 区医院改造工程全过 程造价咨询服务	10.68	2024
2023	深圳市南山区 建筑工务署	项目负责人	峰景社康中心改造项 目全过程造价咨询	7.81	2024
2023	深圳市南山区 建筑工务署	项目负责人	区医疗集团总部金众 麒麟公馆社区健康服 务站改造工程全过程 造价咨询服务	5.40	2024
2023	深圳市南山区 建筑工务署	项目负责人	220kV 研创变电站两通 一平工程全过程造价 咨询	4.90	2024

提示：要求附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）。



拟派人员简历及证书

1、王炎武

	姓名: <u>王炎武</u> 身份证号码: <u>440106196705141894</u> 性别: <u>男</u> 专业: <u>土木建筑</u> 聘用单位: <u>深圳轩明达工程项目管理有限公司</u>
证书编号: <u>建[造]11014400010236</u> 初始注册日期: <u>2001</u> 年 <u>01</u> 月 <u>01</u> 日	颁发机关盖章:  发证日期: <u>2021</u> 年 <u>标准定额司</u> 月 <u>6</u> 日

变更注册登记栏		变更注册登记栏	
现聘用单位:	现聘用单位:	现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日
现聘用单位:	现聘用单位:	现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公 章 年 月 日	 注册受理机关 公 章 年 月 日 <u>2022 9 30</u> 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员查询 > 人员列表 >

手机查看

王炎武


证件类型	居民身份证	证件号码	440106*****94	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市三合和工程项目管理有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位: 深圳市三合和工程项目管理有限公司 证书编号: 建(造)11014400010236 注册编号/执业印章号: 811014400010236

注册专业: 土建 有效期: 2025年12月31日

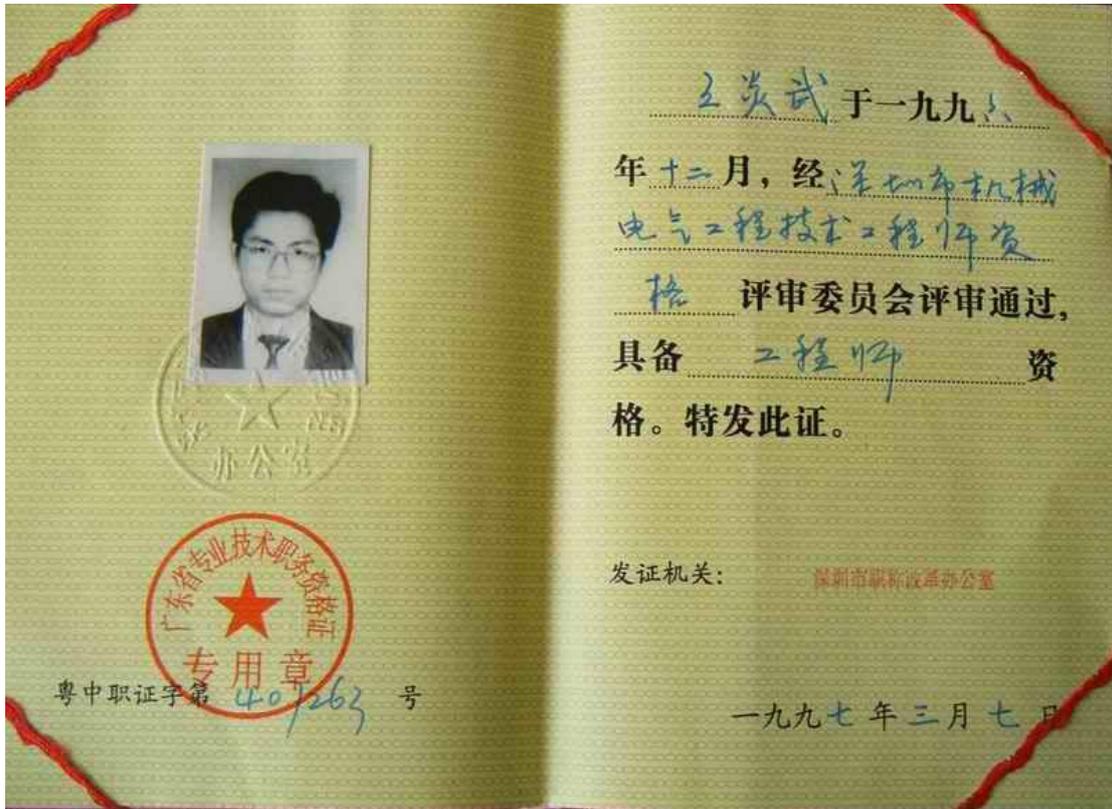





印章已用

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的注册资格。

This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Cost Engineer.



编号: 粤执造证(97)1465
No. 0990386



姓名: 王炎武
Full Name _____
性别: 男
Sex _____
出生年月: 1967年05月
Date of Birth _____
工作单位: _____
Employer _____
批准日期: 1997年10月12日
Approval Date _____

持证人签名:
Signature of the Bearer

签发单位盖章:
Issued by _____
签发日期: 1998年10月11日
Issued on _____



2011(中)第011号
0880000



2、余丽芸

姓名	余丽芸	性别	女	出生年月	1993.08
文化程度	本科	专业	工程造价	政治面貌	群众
现任职务	土建负责人	技术职称	工程师	聘任时间	2024.2
在本单位从业年限	1年				
注册证书及注册号	序号	证书名	证书号		
	1	一级造价工程师	建[造]11234400023139		
	2	二级造价工程师	建【造】21214400002233		
	3	工程师	2403003207524		
	4	注册造价员	粤 150001278		
主要经历和业绩	工作起止时间		经历及主要业绩		
	2015.12—2016.10		在广州工建工程咨询有限公司工作。与业主前期沟通工作，起草签订招标代理合同。编制、发布招标公告，发售招标文件，开标前的工作安排及准备事项，开、评标现场服务协调各方关系等招标工作及处理开标后续工作。负责每个项目结束之后的资料收集、整理及归档。		
	2016.11—2018.2		在深圳全至咨询有限公司惠州分公司造价部工作。投资估算的编制、审核（土建、市政）。概算、预算、结算、竣工决算、工程招标标底价、投标报价的编制、审核（土建、市政）。		
	2018.3—2024.2		深圳轩明达工程项目管理有限公司 项目负责人，参与项目：万丰海岸城项目展示中心装饰工程；碧桂园群峰花园项目万丰海岸城项目一期（全过程造价咨询）；保利·阳光城项目（四期）建设工程造价咨询（全过程造价咨询）；琳珠珊海湾（全过程造价咨询）；保利水口项目造价咨询（全过程造价咨询）；华智新能源智能设备产业基地项目（全过程造价咨询）等等。		
	2024.2—至今		深圳市三合和工程项目管理有限公司；担任土建负责人参与项目：创业路科苑南路人行天桥全过程造价咨询；桃源中学改扩建工程项目全过程造价咨询；跨前海滨路天桥二期建设项目全过程造价咨询；好美佳智能科技产业园全过程造价咨询服务；区医疗集团总部金众麒麟公馆社区健康服务站改造工程全过程造价咨询服务；峰景社康中心改造项目全过程造价咨询等等。		



姓名: 余丽芸
 身份证号码: 441523199308247583
 性别: 女
 专业: 土木建筑
 聘用单位: 深圳轩明达工程项目管理有限公司

证书编号: 建[造]11234400023139
 初始注册日期: 2023 年 07 月 10 日

颁发机关盖章: 
 发证日期: 2023 年 10 月 10 日

变更注册登记栏

现聘用单位: _____ 现聘用单位: _____
 注册受理机关
 公 章
 年 月 日

现聘用单位: _____ 现聘用单位: 余丽芸

 注册受理机关
 公 章
 年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位: _____ 现聘用单位: _____
 注册受理机关
 公 章
 年 月 日

现聘用单位: _____ 现聘用单位: _____
 注册受理机关
 公 章
 年 月 日



余丽芸

证件类型	居民身份证	证件号码	441523*****83	性别	女
注册证书所在单位名称	深圳市三合和工程项目管理有限公司				

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司

证书编号：建[造]11234400023139

注册编号/执业印章号：B11234400023139

注册专业：土建

有效期：2027年07月09日

查看证书变更记录 (1) ▾

二级注册造价工程师

注册单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司

证书编号：建[造]21214400002233

注册编号/执业印章号：B21214400002233

注册专业：土建

有效期：2025年09月14日

暂无证书变更记录



广东省职称证书

姓名：余丽芸

身份证号：441523199308247583



职称名称：工程师

专业：工程造价

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年4月21日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003207524

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日





使用有效期：2024年03月
08日-2024年09月04日



中华人民共和国 二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓名：余丽芸

性别：女

出生日期：1993年08月24日

专业：土木工程

证书编号：建[造]21214400002233

有效期：2021年09月15日-2025年09月14日

聘用单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司



余丽芸



个人签名：

签名日期：



全国建设工程造价员资格证书
National Certification of Construction
Cost Estimator Qualification



姓名: 余丽芸
专业: 建筑与装饰工程
证书号: 粤150001278
工作单位:



签发单位(盖章)

年 月 日



17118111

No.01- 1705470871



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：余丽芸 社保电脑号：632661360 身份证号码：441523199308247583 页码：1
参保单位名称：深圳市三合和工程项目管理有限公司 单位编号：30265169 打印单位：元

Table with columns for year, month, unit number, and various insurance types (Pension, Medical, Maternity, Work Injury, Unemployment). Rows show data for 2024 (months 09, 10, 11) and a total row.



备注：

- 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验证码（ 33916137b3574dew ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称： 单位名称 深圳市三合和工程项目管理有限公司





3、赵远

姓名	赵远	性别	男	出生年月	1981. 10
文化程度	本科	专业	土木工程	政治面貌	群众
现任职务	项目经理	技术职称	工程师	聘任时间	2024. 10
在本单位从业年限	1 年				
注册证书及注册号	序号	证书名	证书号		
	1	一级造价工程师	建[造]11204400022024		
	2	工程师	鲁 200600433300223		
	3	BIM 证书	2201001023015707		
主要经历和业绩	工作起止时间	经历及主要业绩			
	2004. 04-2007. 04	在烟台中信工程造价事务所，土建造价员 万科集团/烟台翡翠湾全过程咨询项目；万科集团/烟台万科城市之光二期全过程咨询项目；			
	2007. 04-2017. 03	在烟台方正建筑工程造价咨询有限公司，造价工程师。 万科集团/烟台万科翡翠公园全过程咨询项目； 万达集团/烟台芝罘万达广场全过程咨询项目；			
	2017. 03-2019. 03	深江苏建瑞工程咨询有限公司，造价工程师 华发集团/观山水全过程咨询项目；江苏常州新建高导材料研发及产业化项目一期工程全过程造价咨询 中洲控股（上海）经营管理审计工程类协审服务 中洲控股上海新场镇 01 单元 C-02、C-03 地块商业和住宅项目结算审计等等。			
	2024. 10-至今	深圳市三合和工程项目管理有限公司；担任项目经理 参与项目：创业路科苑南路人行天桥全过程造价咨询；桃源中学改扩建工程项目全过程造价咨询；跨后海滨路天桥二期建设项目全过程造价咨询；好美佳智能科技产业园全过程造价咨询服务；区医疗集团总部金众麒麟公馆社区健康服务站改造工程全过程造价咨询服务；峰景社康中心改造项目全过程造价咨询等等。			



75



姓名: 赵远
 身份证号码: 370602198110301812
 性别: 男
 专业: 土木建筑
 聘用单位: 深圳轩明达工程项目管理有限公司

证书编号: 建[造]11244400033851

初始注册日期: 2024 年 09 月 14 日

颁发机关盖章:



发证日期: 2024 年 09 月 14 日

变更注册登记栏

现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日

现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 2024年10月23日



变更注册登记栏

现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日

现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看 退出

赵远

证件类型	居民身份证	证件号码	370602*****12	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市三合和工程项目管理有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司 证书编号：建(建)11244400033851 注册编号/执业印章号：B11244400033851

注册专业：土建 有效期：2028年09月13日

2024-10-16 - 机构内变更
 深圳市三合和工程项目管理有限公司





山东省中级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力

姓名：赵远

性别：男

从事专业：建设工程

系列（专业）名称：工程技术

资格名称：工程师

评审时间：2020年11月20日

评审委员会：烟台市莱山区工程技术职务中级评审委员会

身份证号：370602198110301812

证书编号：鲁200600433300223

公布文号：烟莱人社〔2020〕17号

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台
(<http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps>)

在线验证码：125FSZIV



核准公布部门（章）

公布时间：2020年12月30日





本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号: ZT 00129796
No.



持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号:
File No. 2013023440230000002311440113

姓名: 赵远
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1981年10月
Date of Birth
专业类别: 土建
Professional Type
批准日期: 2013年10月20日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by
签发日期: 2014年 02月 20日
Issued on





BIM

全国 BIM 技能等级考试
二级证书



赵远 参加 2021 年 12 月全国 BIM 技能等级考试

BIM高级建模师（结构设计专业），成绩良好，特发此证。

身份证号: 370602198110301812

证书编号: 2201001023015707

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST

Level II

ID Number: 370602198110301812

Certificate Number: 2201001023015707

中国图学会
China Graphics Society



BIM

证书唯一序列号:



A1200006018



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 赵远 社保电脑号: 812256485 身份证号码: 370602198110301812
参保单位名称: 深圳市三合和工程项目管理有限公司 单位编号: 30265169

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2024	10	30265169	0.0									2360	4.72				
2024	11	30265169	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	4.72	2360	18.88	4.72
合计				528.45	281.84			97.13	32.38			32.38		9.44	18.88		4.72



备注:

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (33916137b357905n) 核查, 验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
- 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
- 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称:
单位编号 30265169 单位名称 深圳市三合和工程项目管理有限公司





深圳市三合和工程项目管理有限公司

赵远劳动合同

深圳市三合和工程项目管理有限公司

劳
动
用
工
合
同





甲方(用人单位)	乙方(员工)
名称 <u>深圳市三合和工程项目管理有限公司</u>	姓名 <u>赵远</u>
住所 <u>深圳市南山区</u>	性别 <u>男</u>
法定代表人	身份证(护照)
(主要负责人) <u>王炎武</u>	号码 <u>370602198110301812</u>
联系人 <u>王炎武</u>	通讯住址 <u>深圳市南山区</u>
联系电话 <u>13502877311</u>	联系电话 <u>15615551616</u>

根据《中华人民共和国劳动法》(以下简称《劳动法》)、《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》)等有关法律法规的规定,甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则,签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

一、合同期限

1、试用期为 1 个月,从 2020 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 8 日止。试用期间,乙方达不到甲方工作要求或者乙方由于自身原因离开的,可随时解除合同,做自动离职处理。

2、固定期限:试用期满后从 2020 年 10 月 8 日起至 2026 年 10 月 8 日止。若某一方需解除合同则应提前一个月书面向对方申请。

二、工作内容和工作地点

乙方的工作内容(岗位或工种) 完场甲方安排的工程项目预结算的编制、审核等工作,并满足质量要求。

乙方的工作地点 浙江·宁波、四川·眉山、深圳·南山。



三、工作时间和休息休假

1、标准工时制，即每日工作 7.5 小时（不超过8小时），每周工作 40 小时（不超过40小时），每周至少休息一日。

2、甲方由于生产经营需要延长工作时间的，按《劳动法》第四十一条执行。

3、乙方依法享有法定节假日、婚假、产假、丧假等假期。

4、乙方的其他休息休假安排 加班换休制 。

四、劳动报酬

（一）甲方依法制定工资分配制度，并告知乙方。甲方支付给乙方的工资不得低于市政府公布的当年度最低工资。

（二）乙方每月基本工资 6000 元（其中试用期每月工资 元）或按公司工资制度执行。工资包括：基本工资+效益提成+其它工资 执行。

（三）甲方每月 15 日发放工资。甲方至少每月以货币形式向乙方支付一次工资。

（四）甲乙双方对工资的其它约定 。

五、社会保险和福利待遇

（一）甲乙双方按照国家和省、市有关规定，参加社会保险，缴纳社会保险费。

（二）乙方患病或非因工负伤，甲方应按国家和省、市的有关规定给予乙方享受医疗期和医疗期待遇。

（三）乙方患职业病、因工负伤的，甲方按《职业病防治法》、



《工伤保险条例》等有关法律法规的规定执行。

(四) 甲方为乙方提供以下福利待遇_____。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

(一) 甲方按国家和省、市有关劳动保护规定，提供符合国家安全卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品，切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。

(二) 甲方按国家和省、市有关规定，做好女员工和未成年工的特殊劳动保护工作。

(三) 每两年组织乙方健康检查壹次。

七、规章制度

(一) 甲方依法制定的规章制度，应当告知乙方。

(二) 乙方应遵守国家和省、市有关法律法规和甲方依法制定的规章制度，按时完成工作任务，提高职业技能，遵守安全操作规程和职业道德。

(三) 乙方自觉遵守国家和省、市计划生育的有关规定。

八、合同变更

甲乙双方经协商一致，可以变更合同。变更合同应采用书面形式。变更后的合同文本双方各执一份。

九、合同解除和终止

(一) 甲乙双方协商一致，可以解除合同。

(二) 乙方提前三十日以书面形式通知甲方，可以解除劳动合同；乙方试用期内提前三日通知甲方，可以解除劳动合同。



3、乙方离职前一天应将公司财物完好交还给甲方，包括计价软件、办公设备、生活设施等。未予上交的，甲方有权从乙方工资中扣除。

4、乙方离职前必须将自身完成和未完成的业务进行交接，离职后有配合甲方处理解决自身业务的义务，否则甲方有权追诉乙方赔偿由此造成的经济损失。

十三、其它

(一) 本合同未尽事宜或合同条款与现行法律法规规定有抵触的，按现行法律法规执行。

(二) 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，涂改或未经书面授权代签无效。

(三) 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）



乙方：（签名）

法定代表人（负责人）：

2024年10月8日

年 月 日



4、李东

姓名	李东	性别	男	出生年月	1966. 10
文化程度	本科	专业	工程管理	政治面貌	群众
现任职务	项目经理	技术职称	工程师	聘任时间	2024. 9
在本单位从业年限	1 年				
注册证书及注册号	序号	证书名	证书号		
	1	一级造价工程师	建【造】11244400034577		
	2	工程师	赣中(工程)6397044		
主要经历和业绩	工作起止时间	经历及主要业绩			
	2003. 03-2019. 02	在佛山市顺德建设监理有限公司，担任项目总监，参与项目：南沙街大涌村新村街地块更新改造项目			
	2020. 09-2024. 8	在广州联嘉建设监理有限公司，担任项目总监，参与项目：惠州星河丹堤花园配建九年一贯制学校项；惠州云昱花园四期一、二标段工程项目。			
	2024. 09-至今	深圳市三合和工程项目管理有限公司；担任项目经理参与项目：创业路科苑南路人行天桥全过程造价咨询；桃源中学改扩建工程项目全过程造价咨询；跨后海滨路天桥二期建设项目全过程造价咨询；好美佳智能科技产业园全过程造价咨询服务；区医疗集团总部金众麒麟公馆社区健康服务站改造工程全过程造价咨询服务；峰景社康中心改造项目全过程造价咨询等等。			

李东一级注册造价师正在办理注册中，注册资料已审核通过。



审批结果：通过

延续注册

上报时间：2017年10月18日

证书编号：建[造]01440003113

单位名称：佛山市顺德建设监理有限公司

审批结果：通过

注销注册

上报时间：2019年02月15日

证书编号：建[造]01440003113

单位名称：佛山市顺德建设监理有限公司

审批结果：通过

初始注册

上报时间：2024年10月23日

证书编号：建[造]01440003113

单位名称：深圳市三合和工程项目管理有限公司

审批结果：审核通过

基本信息

信息修改

业务申报及
查询说明

进度查询

操作手册

常见问题

收起

返回



本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的注册资格。
This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Cost Engineer.



编号:
No.

赣 2000-351
0012489



持证人签名:
Signature of the Bearer

李东

姓名:

Full Name 李东

性别:

Sex 男

出生年月:

Date of Birth 1966年10月

专业类别:

Professional Type 土建

批准日期:

Approval Date 2000年10月15日


签发单位盖章:

Issued by

签发日期: 2000年10月17日

Issued on



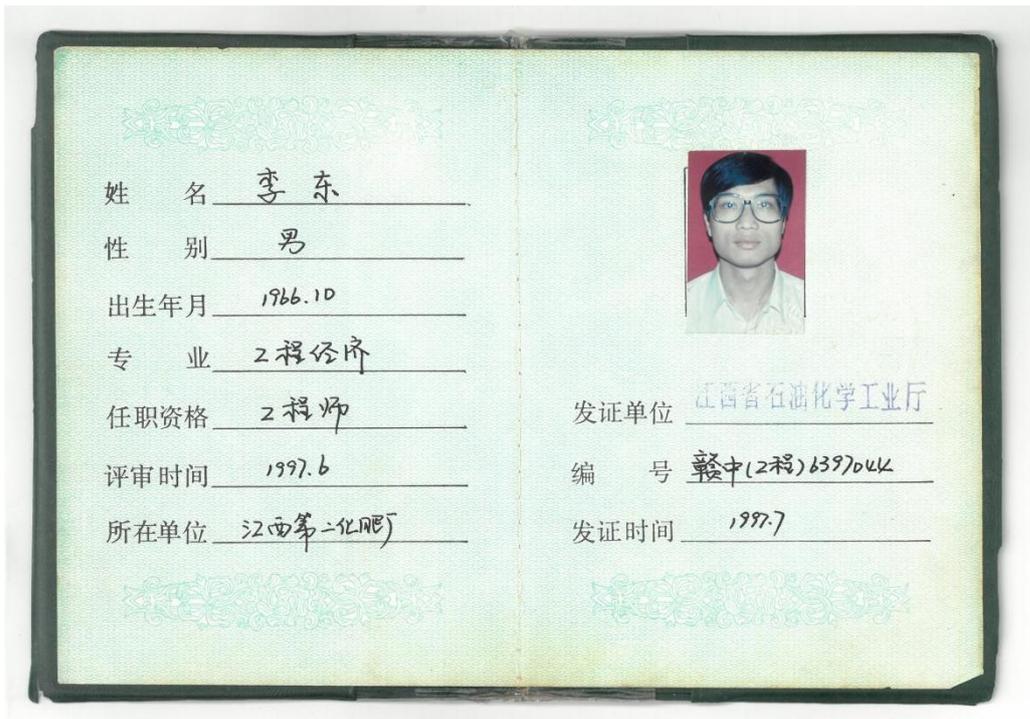



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 李东 社保电脑号: 634999155 身份证号码: 360502196610110012 页码: 1
参保单位名称: 深圳市三合和工程项目管理有限公司 单位编号: 30265169 缴费单位: 元

Table with columns for year, month, unit number, and various insurance types (Pension, Medical, Maternity, Work Injury, Unemployment) with sub-columns for base, unit contribution, and individual contribution.

备注:

- 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: https://sipub.sz.gov.cn/vp/... 3. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。 4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。 5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。 6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。 7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。 8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 30265169 单位名称 深圳市三合和工程项目管理有限公司





5、颜国强

姓名	颜国强	性别	男	出生年月	1978.10
文化程度	本科	专业	土木工程	政治面貌	群众
现任职务	土建技术人员	技术职称	工程师	聘任时间	2023.7
在本单位从业年限	2年				
注册证书及注册号	序号	证书名	证书号		
	1	二级造价工程师	建【造】21234400013890		
	2	注册造价员	粤 090B00205		
	3	工程师	2303003131249		
主要经历和业绩	工作起止时间	经历及主要业绩			
	2003.03-2018.07	深圳轩明达工程项目管理有限公司 工程预结算、招标控制价编制			
	2018.08-2023.06	深圳市保利房地产开发有限公司 项目目标成本编制、动态成本控制、项目结算审核。			
	2024.2-至今	深圳市三合和工程项目管理有限公司；担任土建负责人参与项目：创业路科苑南路人行天桥全过程造价咨询；桃源中学改扩建工程项目全过程造价咨询；跨后海滨路天桥二期建设项目全过程造价咨询；好美佳智能科技产业园全过程造价咨询服务；区医疗集团总部金众麒麟公馆社区健康服务站改造工程全过程造价咨询服务；峰景社康中心改造项目全过程造价咨询等等。			



使用有效期：2024年03月
08日-2024年09月04日



中华人民共和国 二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓名： 颜国强
性别： 男
出生日期： 1978年10月19日
专业： 土木建筑工程
证书编号： 建[造]21234400013890
有效期： 2023年11月14日-2027年11月13日
聘用单位： 深圳市三合和工程项目管理有限公司



颜国强

个人签名：

签名日期：



发证日期：2023年11月14日



全国建设工程造价员资格证书

National Certification of Construction
Cost Estimator Qualification



姓 名：颜国强

专 业：装饰装修工程

证书号：粤090B00205

工作单位：深圳市轩明达工程造价咨询
有限公司

签发单位 (盖章)

2009 年 11 月 3 日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

颜国强

证件类型	居民身份证	证件号码	440402*****15	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市三合和工程项目管理有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 不良行为 良好行为 黑名单记录

二级注册造价工程师

注册单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司

证书编号：建(建)21234400013890

注册编号/执业印章号：B21234400013890

注册专业：土建

有效期：2027年11月13日

暂无证书变更记录





广东省职称证书

姓名：颜国强

身份证号：440402197810190415



职称名称：工程师

专业：工程造价

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月23日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003131249

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月13日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 颜国强 社保电脑号: 610595251 身份证号码: 440402197810190415 页码: 1
参保单位名称: 深圳市三合和工程项目管理有限公司 单位编号: 30265169 单位: 元

Table with columns for year, month, unit number, pension insurance, medical insurance, childbirth, work-related insurance, and unemployment insurance. Includes a total row at the bottom.



备注:

- 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: https://sipub.sz.gov.cn/vp/, 输入下列验证码(33916137b357588f)核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称: 单位名称 深圳市三合和工程项目管理有限公司





6、朱熙锦

姓名	朱熙锦	性别	男	出生年月	1997.08
文化程度	大专	专业	工程造价	政治面貌	群众
现任职务	土建技术人员	技术职称	助理工程师	聘任时间	2024.10
在本单位从业年限	1年				
注册证书及注册号	序号	证书名	证书号		
	1	二级造价工程师	建[造]21224400009617		
	2	助理工程师	2303006132416		
主要经历和业绩	工作起止时间		经历及主要业绩		
	2018.04-2018.07		南京双楼建设有限公司，土建施工员（实习生）		
	2018.08-2019.09		深圳市建工集团股份有限公司，驻场土建预算员 参与项目：清远市东华碧桂园一期总承包工程一期（建面10万平）、深圳市文燊威大厦总承包工程（建面8万平）等等。		
	2019.10-2024.09		深圳轩明达工程项目管理有限公司 担任预算员，参与项目：万丰海岸城项目展示中心装饰工程；万丰海岸城项目一期（全过程造价咨询）；保利·阳光城项目（四期）建设工程造价咨询（全过程造价咨询）等等。		
	2024.10-至今		深圳市三合和工程项目管理有限公司；担任预算员参与项目：创业路科苑南路人行天桥全过程造价咨询；桃源中学改扩建工程项目全过程造价咨询；跨后海滨路天桥二期建设项目全过程造价咨询；等等。		



使用有效期：2024年10月
25日-2025年04月23日



中华人民共和国 二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓名：朱熙锦
性别：男
出生日期：1997年08月29日
专业：土木工程
证书编号：建[造]21224400009617
有效期：2022年12月26日-2026年12月25日
聘用单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司



朱熙锦

个人签名：

签名日期：



发证日期：2022年12月26日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

朱熙锦

证件类型	居民身份证	证件号码	321088*****16	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市三合和工程项目管理有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

二级注册造价工程师

注册单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司 证书编号：建(造)121224400009617 注册编号/执业印章号：B21224400009617

注册专业：土建 有效期：2026年12月25日

暂无证书变更记录





广东省职称证书

姓名：朱熙锦
身份证号：321088199708295916



职称名称：助理工程师

专业：工程造价

级别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2023年04月23日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006132416

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月13日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



7、李正人

姓名	李正人	性别	女	出生年月	1997.10
文化程度	本科	专业	工程造价	政治面貌	群众
现任职务	安装负责人	技术职称	助理工程师	聘任时间	2024.10
在本单位从业年限	1年				
注册证书及注册号	序号	证书名	证书号		
	1	二级造价工程师	建[造]24224400004502		
	2	助理工程师	2003056007986		
主要经历和业绩	工作起止时间	经历及主要业绩			
	2017.07-2017.09	衡阳市蒸湘区财政局财政评审投资中心 助理造价师 负责蒸湘区长湖乡村办公楼——整栋楼层建筑、安装的计量。			
	2018.07-2018.09	中建一局市政公司项目部，BIM工程师；独立完成衡阳市虚拟大学城4B#栋Revit结构与建筑模型)等等。			
	2019.02-2020.05	深圳市华阳国际工程造价有限公司 助理造价师负责工程项目的估算、概算、预算及结算任务中安装专业的工作			
	2019.10-2024.09	深圳轩明达工程项目管理有限公司 担任预算员，参与项目：万丰海岸城项目展示中心装饰工程；万丰海岸城项目一期（全过程造价咨询）；保利·阳光城项目（四期）建设工程造价咨询（全过程造价咨询）等等。			
	2024.10-至今	深圳市三合和工程项目管理有限公司；担任安装项目负责人参与项目：创业路科苑南路人行天桥全过程造价咨询；桃源中学改扩建工程项目全过程造价咨询；跨后海滨路天桥二期建设项目全过程造价咨询；等等。			



使用有效期：2024年11月
01日-2025年04月30日



中华人民共和国 二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓名：李正人
性别：女
出生日期：1997年10月13日
专业：安装工程
证书编号：建[造]24224400004502
有效期：2022年03月24日-2026年03月23日
聘用单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司



李正人

个人签名：

签名日期：



发证日期：2022年03月24日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

李正人

证件类型	居民身份证	证件号码	430422*****2X	性别	女
注册证书所在单位名称	深圳市三合和工程项目管理有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

二级注册造价工程师

注册单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司 证号：建[造]24224400004502 注册编号/执业印章号：B24224400004502

注册专业：安装 有效期：2026年03月23日

暂无证书变更记录





广东省职称证书

姓名：李正人
身份证号：43042219971013462X



职称名称：助理工程师
专业：工程造价
级别：助理级
取得方式：考核认定
通过时间：2020年12月04日
评审组织：深圳市南山区人力资源局

证书编号：2003056007986
发证单位：深圳市人力资源和社会保障局
发证时间：2020年12月10日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



8、汤怀平

姓名	汤怀平	性别	男	出生年月	1980.11
文化程度	大专	专业	土木工程	政治面貌	群众
现任职务	土建技术人员	技术职称	工程师	聘任时间	2022.6
在本单位从业年限	3年				
注册证书及注册号	序号	证书名	证书号		
	1	工程师证	1903003027039		
主要经历和业绩	工作起止时间	经历及主要业绩			
	2003.03-2022.6	江苏神龙海洋工程集团有限公司深圳分公司-预算员 新安六路蓝湾海岸大厦项目			
	2024.2-至今	深圳市三合和工程项目管理有限公司；担任土建负责人参与项目：跨后海滨路天桥二期建设项目全过程造价咨询；好美佳智能科技产业园全过程造价咨询服务；区医疗集团总部金众麒麟公馆社区健康服务站改造工程全过程造价咨询服务；峰景社康中心改造项目全过程造价咨询等等。			



广东省职称证书

姓名: 汤怀平

身份证号: 340321198011023471



职称名称: 工程师

专业: 工程造价

级别: 中级

取得方式: 职称评审

通过时间: 2018年12月30日

评审组织: 深圳市建筑专业中级专业技术资格第二评审委员会

证书编号: 1903003027039

发证单位: 深圳市人力资源和社会保障局

发证时间: 2019年04月29日



查询网址: <http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



西安交通大学

毕业证书



学生汤怀平 性别男，一九八〇年十一月二日生，于一〇一四年九月
至二〇一七年一月在本校网络教育学院 土木工程 专业
专科起点本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：西安交通大学 校长：王树国

证书编号：106987201705006769

二〇一七年一月十日



9、崔梦

姓名	崔梦	性别	女	出生年月	1995.5
文化程度	大专	专业	工程造价	政治面貌	群众
现任职务	预算员	技术职称	/	聘任时间	2022.7
在本单位从业年限	2年				
注册证书及注册号	序号	证书名	证书号		
	1	毕业证	106745202006000952		
主要经历和业绩	工作起止时间	经历及主要业绩			
	2020.03-2022.6	广州市恒域建筑工程有限公司-预算员 碧桂园、美的等项目的预结算项目			
	2022.7-至今	深圳市三合和工程项目管理有限公司；担任预算员参与项目：创业路科苑南路人行天桥全过程造价咨询；桃源中学改扩建工程项目全过程造价咨询；跨后海滨路天桥二期建设项目全过程造价咨询；好美佳智能科技产业园全过程造价咨询服务；区医疗集团总部金众麒麟公馆社区健康服务站改造工程全过程造价咨询服务；峰景社康中心改造项目全过程造价咨询等等。			



成人高等教育 毕业证书



学生 **崔梦** 性别 **女**，一九九五年
五月二十二日生，于二〇一七年三月
至二〇二〇年一月在本校(院)
工程造价 专业
函授 学习，修完 **专** 科
教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。

校(院)长:

学校(院): **昆明理工大学**

二〇二〇年一月十五日

批准文号: 国家教委(87)教高三字022号

注册号: 106745202006000952

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>; gjc.ynjy.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

姓名: 崔梦 社保电脑号: 647419841 身份证号码: 440923199505226344 页码: 1
参保单位名称: 深圳市三合和工程项目管理有限公司 单位编号: 30265169

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险					
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2024	09	30265169	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	4.72	2360	18.88	4.72
2024	10	30265169	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	4.72	2360	18.88	4.72
2024	11	30265169	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	4.72	2360	18.88	4.72
合计			1585.35	845.52				291.39	97.14			97.14		14.16	36.64		14.16

备注:

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>; 输入下列验证码(33916137b357532d) 核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档)，“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
- 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称:
单位编号 30265169 单位名称 深圳市三合和工程项目管理有限公司



10、张天

姓名	张天	性别	男	出生年月	1998.01
文化程度	大专	专业	工程造价	政治面貌	群众
现任职务	预算员	技术职称	助理工程师	聘任时间	2024.3
在本单位从业年限	1年				
注册证书及注册号	序号	证书名	证书号		
	1	毕业证	129821201806284302		
主要经历和业绩	工作起止时间	经历及主要业绩			
	2018.7-2024.2	<p>深圳市国福工程管理有限公司广西分公司，担任预算员，从事工程预算、结算等咨询服务，担任预算员。参与各项目经理、安装部门经理与负责人沟通协调，配合各部门工作运转。</p> <ul style="list-style-type: none"> 与总公司、其他分公司沟通联系，配合处理外省工作。 与直接负责项目的甲方领导联系沟通并协调工作，与甲方共同处理地产集团审计，出差处理三审 直接参与协助后台项目工作内容如，招标清单修改、各项目地下室、大型综合体等复杂结构的算量与对数。 协助各项目的成本规划、目标成本、模拟清单编制等 询等等。 			
	2024.3-至今	<p>深圳市三合和工程项目管理有限公司；担任预算员</p> <p>参与项目：跨后海滨路天桥二期建设项目全过程造价咨询；好美佳智能科技产业园全过程造价咨询服务；区医疗集团总部金众麒麟公馆社区健康服务站改造工程全过程造价咨询服务；峰景社康中心改造项目全过程造价咨询等等。</p>			





11、韦建丞

姓名	韦建丞	性别	男	出生年月	1996.11
文化程度	大专	专业	工程造价	政治面貌	群众
现任职务	预算员	技术职称	/	聘任时间	2024.4
在本单位从业年限	1年				
注册证书及注册号	序号	证书名		证书号	
	1	毕业证		139201201806000489	
主要经历和业绩	工作起止时间		经历及主要业绩		
	2018.7-2024.3		深圳市建星项目管理顾问有限公司 担任：预算员，参与项目：罗湖中医院施工总承包工程（桩基础、地下室、土石方）结算；坪山新建监狱项目地下室招标控制价永润丰大厦项目地下室过程结算、塔楼一单元和二单元预算；龙岗街道创星九年一贯制学校新建工程地下室、裙房、塔楼概算景田北社区医院装修改造工程预算；等等。		
	2024.4-至今		深圳市三合和工程项目管理有限公司；担任预算员参与项目：桃源中学改扩建工程项目全过程造价咨询；跨后海滨路天桥二期建设项目全过程造价咨询；好美佳智能科技产业园全过程造价咨询服务；区医疗集团总部金众麒麟公馆社区健康服务站改造工程全过程造价咨询服务；峰景社康中心改造项目全过程造价咨询等等。		



中华人民共和国国家教育委员会网站：<http://www.chsi.com.cn>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：韦建丞 社保电脑号：805503321 身份证号码：452124199611050019 页码：1
 参保单位名称：深圳市三合和工程项目管理有限公司 单位编号：30265169 打印单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2024	09	30265169	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	4.72	2360	18.88	4.72
2024	10	30265169	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	4.72	2360	18.88	4.72
2024	11	30265169	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	4.72	2360	18.88	4.72
合计			1585.35	845.52				291.39	97.14			97.14		14.16	36.64		14.16

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>；输入下列验证码（ 33916137b35735bz ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗保险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号 30265169 单位名称 深圳市三合和工程项目管理有限公司





12、李香

姓名	李香	性别	女	出生年月	2003. 2
文化程度	大专	专业	工程造价	政治面貌	群众
现任职务	预算员	技术职称	/	聘任时间	2024. 3
在本单位从业年限	1 年				
注册证书及注册号	序号	证书名	证书号		
	1	毕业证	36360005370120220678		
主要经历和业绩	工作起止时间	经历及主要业绩			
	2023. 7-2024. 1	深圳轩明达工程项目管理有限公司 造价与, 从事工程预算、结算等咨询服务, 担任预算员。参与项目: 峰荟时代科技工程; 保利·阳光城项目(四期)建设工程造价咨询(全过程造价咨询); 琳珠珊海湾(全过程造价咨询); 保利水口项目造价咨询(全过程造价咨询); 华智新能源智能设备产业基地项目(全过程造价咨询); 厦门泉州麓城项目(全过程造价咨询); 等等。			
	2024. 3-至今	深圳市三合和工程项目管理有限公司; 担任预算员 参与项目: 跨后海滨路天桥二期建设项目全过程造价咨询; 好美佳智能科技产业园全过程造价咨询服务; 区医疗集团总部金众麒麟公馆社区健康服务站改造工程全过程造价咨询服务; 峰景社康中心改造项目全过程造价咨询等等。			





13、戴光玉

姓名	戴光玉	性别	女	出生年月	1990.12
文化程度	大专	专业	工程造价	政治面貌	群众
现任职务	资料员	技术职称	/	聘任时间	2022.12
在本单位从业年限	2年				
注册证书及注册号	序号	证书名	证书号		
	1	毕业证	100765201406077904		
主要经历和业绩	工作起止时间	经历及主要业绩			
	2011.7-2022.12	深圳轩明达工程项目管理有限公司 资料员，与业主前期沟通工作，起草签订招标代理合同。编制、发布招标公告，发售招标文件，开标前的工作安排及准备事项，开、评标现场服务协调各方关系等招标工作及处理开标后续工作。负责每个项目结束之后的资料收集、整理及归档等等。			
	2024.2-至今	深圳市三合和工程项目管理有限公司；资料员，与业主前期沟通工作，起草签订招标代理合同。编制、发布招标公告，发售招标文件，开标前的工作安排及准备事项，开、评标现场服务协调各方关系等招标工作及处理开标后续工作。负责每个项目结束之后的资料收集、整理及归档等等。			



成人高等教育

毕业证书



学生 **戴光玉**，性别女，一九九〇年十二月二十日生，于一〇一二年三月至二〇一四年六月在本校 **工程造价** 专业函授学习，修完 2.5 年制 **专** 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长

哈明虎

校(院)名:

河北工程大学



证书编号: 100765201406077904

二〇一四年六月二十五日



投标人近 5 年类似全过程造价咨询服务业绩一览表

序号	项目名称	合同价 (万元)	项目所在地	工程决(结) 算的造价书封面所载明的日期
1	创业路科苑南路人行天桥全过程造价咨询	110.78	南山区	2024.4.12
2	桃源中学改扩建工程项目全过程造价咨询	271.30	南山区	进行中
3	中山大学深圳产学研大楼东北侧地块建设羽毛球馆项目-全过程造价咨询	56.80	南山区	进行中
4	麒麟山庄安全隐患整治环境提升项目全过程造价咨询	47.73	南山区	2024.6.11
5	跨后海滨路天桥二期建设项目全过程造价咨询	33.58	南山区	2023.12.7
6	田厦社康中心升级社区医院改造工程全过程造价咨询服务	10.68	南山区	2023.12.25
7	峰景社康中心改造项目全过程造价咨询	7.81	南山区	2024.1.30
8	区医疗集团总部金众麒麟公馆社区健康服务站改造工程全过程造价咨询服务	5.40	南山区	2024.1.30
9	220kV 研创变电站两通一平工程全过程造价咨询	4.90	南山区	2023.11.1



业绩证明:

1、创业路科苑南路人行天桥全过程造价咨询

中标通知书

标段编号: 2201-440305-04-01-907733002001

标段名称: 创业路科苑南路人行天桥全过程造价咨询

建设单位: 深圳市南山区建筑工务署

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市三合和工程项目管理有限公司

中标价: 110.78万元

中标工期: 按招标文件执行

项目经理(总监):

本工程于 2023-07-11 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2023-08-16 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2023-08-17

查验码: 4256293398673329 查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>



合同编号：2023S419005

深圳市南山区建筑工务署建设工程
全过程造价咨询合同
(修订稿)

工程名称：创业路科苑南路人行天桥

工程地点：深圳市南山区

委托单位：深圳市南山区建筑工务署

咨询单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司





委托单位（甲方）：深圳市南山区建筑工务署

咨询单位（乙方）：深圳市三合和工程项目管理有限公司

甲方于2023年08月采用公开招标方式确定乙方为创业路科苑南路人行天桥工程全过程造价咨询工作中标单位。按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程全过程造价咨询工作协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：创业路科苑南路人行天桥

2. 工程概况：项目位于南山区后海中心区，中轴景观桥起于创业路中轴景观绿化带，跨越科苑南路，与深圳湾文化广场中央草坪活动区连接，长约 219 米。中轴景观桥两侧修建腾创、恒大连桥，腾创连桥长约 40 米；恒大连桥长约 20 米。工程内容主要包括桥梁、交通、给排水、通讯、电力、防雷、管线、景观、照明等工程。

3. 工程投资：14383 万元

二、乙方工作内容

本工程全过程造价咨询合同工作内容包括但不限于：概算编制或审核、施工阶段全过程造价控制（招标工程量清单编制开始到工程结算审核的造价咨询服务）、竣工决算编制等全过程造价咨询。工作内容包括但不限于如下方面：

（一）概算编制或审核阶段咨询工作内容

1. 编制或审核概算，出具书面工程概算书或工程概算审核报告。
2. 协助甲方完成工程概算评审工作。
3. 进行报送工程概算和批复概算的对比分析并出具书面分析报告，提出批复概算中未包含的工程内容，以及下一步造价控制中应注意的事项。

（二）施工阶段全过程造价控制咨询工作内容

1. 工程量清单编制、标底编制阶段造价咨询工作内容



应从造价咨询角度对甲方提交的图纸等相关资料进行全面会审复核并在 1~3 天提出书面的复核意见。并根据项目的不同情况，须针对性地组织安排对现场的核实与了解工作。

11. 若甲方连续三次通知分派任务，乙方均未参加，甲方将有权拒绝其参加其他任何项目并要求乙方承担违约责任。

12. 乙方若在工作中出现重大工作失误，甲方将有权收回该项目并委托他人完成。

13. 乙方参与本项目的工作人员若与本项目承包单位的员工有亲属关系或存在其他利害关系的，必须主动提出回避，若被甲方发现，将记入不良履约行为记录并承担违约责任。

14. 乙方应自行准备造价审核的办公场所、用品、设备、软件及国家、部委、省市颁布的有关定额及工程造价规定。

15. 未经甲方书面同意，乙方不得部分转让其应履行的合同义务。任何情况下，乙方不得转包本合同的义务，否则甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。

16. 乙方应安排至少 1 名固定的工作人员负责与甲方对接工作，汇总工作进度及问题，乙方应确保对接人员的稳定，如必要情况下必须更换需提前至少一周书面通知甲方，并做好工作交接。甲方有权观察并评估乙方服务团队主要人员的工作能力和表现，并有权要求乙方及时替换工作表现不佳的人员。

九、 合同价、支付方式及结算方式

(一) 合同价

本项目全过程造价咨询服务酬金暂定为人民币：壹佰壹拾万零柒仟捌佰元整（大写），即 RMB 110.78 万元（含税价）。

全过程造价咨询费用计费规则：取费参照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》（深价协〔2017〕14号）计取，下浮率按 20% 执行。计算过程如下：

1. 工程概算编制或审核阶段咨询服务酬金 $A1 = 14.192$ 万元（暂定）。

其中：基本酬金 $B1 = A1 \times 80\%$ ；绩效酬金 $C1 = A1 \times 20\%$ 。

2. 施工阶段全过程造价控制咨询服务酬金 $A2 = 93.824$ 万元（暂定）。

其中：基本酬金 $B2 = A2 \times 80\%$ ；绩效酬金 $C2 = A2 \times 20\%$ 。



3. 工程竣工决算编制审核咨询服务酬金 $A_3 = 2.76$ 万元（暂定）。其中：
基本酬金 $B_3 = A_3 \times 80\%$ ；绩效酬金 $C_3 = A_3 \times 20\%$ 。

4. 全过程造价咨询服务酬金合计暂定 A ： $A = A_1 + A_2 + A_3 = 110.78$ 万元。其中：
基本酬金合计暂定 $B = B_1 + B_2 + B_3$ ；绩效酬金合计暂定 $C = C_1 + C_2 + C_3$ 。

5. 计算本项目施工阶段全过程造价咨询费用时，若乙方未核对设计变更和现场签证、未复核工程进度款支付等，则应分阶段进行取费，分为预算编制（审核）和结算审核两个阶段进行取费。

6. 结算绩效收费不能高于基本收费，决算编制计费基数为扣除建安费之外的其他费为决算额计取；最终咨询服务费执行合同计费规则及下浮率，以区造价站质量复核结论为准。

7. 咨询酬金包含乙方为完成本咨询服务所发生的一切费用。乙方的人员工资、福利费、工会经费、教育经费、养老保险、住房公积金、办公费、差旅费、通讯费、交通费、加班费、医疗费、现场补贴、公司管理费、各种税费保险、现场必备的检测设备、办公用品和交通工具合理的购置及使用费用和现场的住宿费、电话费、外出考察费、保险费、返工费以及按照甲方要求进行的补充、修改、完善等为完成本咨询服务所需的全部费用均含在此合同价内。

（二）支付方式

1. 概算编制或审核费用支付



概算通过政府主管部门审查批复，乙方向甲方提出书面付款申请且甲方完成当期节点履约评价后，甲方支付工程概算编制或审核阶段咨询服务酬金的基本酬金 $B_1 \times 100\% +$ 绩效酬金 $C_1 \times$ 当期节点履约评价支付比例 - 当期违约金（赔偿金）。计费基数为批复概算价。

2. 施工阶段全过程造价控制咨询费用支付

（1）标底、工程量清单编制费用支付

标底经区造价站审定，完成招标及协助甲方完成施工合同签订后，乙方向甲方提出书面付款申请，甲方支付施工阶段全过程造价控制咨询服务酬金的基本酬金 $B_2 \times 30\% +$ 绩效酬金 $C_2 \times 30\% \times$ 当期节点履约评价支付比例 - 当期违约金（赔偿金）。计费基数为批复概算价。



委托单位：深圳市南山区建筑工务署  (公章)	咨询单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  (签字)	法定代表人或其委托代理人：  (签字)
地址：深圳市南山区前海路爱心大厦12-14楼	地址：深圳市南山区南头街道大汪山社区南山大道2068号南侨花园住宅楼G栋502
统一社会信用代码：12440305634798694R	统一社会信用代码：91440300MA5G3BJ913
	开户银行：中国民生银行深圳南山支行 账号：161580387
签订日期： 2023 年 8 月 30 日	联系人及 联系方式：戴光玉 15012472380



初步设计概算书

工程名称: 创业路科苑南路人行天桥项目

建设单位: 深圳市南山区建筑工务署

代建单位: 华润置地城市运营管理(深圳)有限公司

设计单位: 林同棧国际工程咨询(中国)有限公司

工程造价: 人民币(大写)壹亿零玖佰肆拾捌万柒仟柒佰贰拾肆元贰角叁分
(¥109487724.23元)

编制单位:



林同棧国际工程咨询
(中国)有限公司
(单位盖章)

复核单位:

深圳市三合和工程项目
管理有限公司
(单位公章/资质专用章)

编制人:

陈松柏
(造价人员签字专用章)

复核人:



王彦彦
B11014400010256
深圳市三合和工程项目
管理有限公司
有效期至:2025年12月31日

编制时间:

复核时间:



深圳市南山区工程造价管理站

(预算、标底)

编号: 标2024105改

2201-440305-04-01-907733

工程造价审定书

工程名称: 创业路科苑南路人行天桥工程施工总承包

建设单位: 深圳市南山区建筑工务署

咨询单位: 深圳市三合和工程项目管理有限公司

代建单位: 华润置地城市运营管理(深圳)有限公司

建设单位报送造价: 67,551,481.99 元

单位造价:

区造价站审定造价: 64,310,517.86 元

单位造价:

核 减 额: 3,240,964.13 元

安全文明施工措施费: 2,145,058.88 元

暂列金额: 5,300,000.00 元

主 审 人: 李仕能 李琪胜

总 审: 刘良荣

复 核 人: 贺小勇

副 站 长: 刘良荣

审核组组长: 贺小勇

站 长: 刘良荣

建设单位报送日期:

区造价站审定日期: 2024年8月2日



2、桃源中学改扩建工程项目全过程造价咨询

中标通知书

标段编号: 2212-440305-04-01-830293002001

标段名称: 桃源中学改扩建工程项目全过程造价咨询

建设单位: 深圳市南山区建筑工务署

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市三合和工程项目管理有限公司

中标价: 271.30万元

中标工期: 按招标文件要求执行

项目经理(总监):

本工程于 2023-08-11 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2023-09-27 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

袁特说


招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2023-10-26





合同编号：2022F175006

深圳市南山区建筑工务署建设工程 全过程造价咨询合同

工程名称：桃源中学改扩建工程项目全过程造价咨询

工程地点：深圳市南山区龙珠大道49号

委托单位：深圳市南山区建筑工务署

咨询单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司



合同编号：2022F175006

深圳市南山区建筑工务署建设工程 全过程造价咨询合同

工程名称：桃源中学改扩建工程项目全过程造价咨询

工程地点：深圳市南山区龙珠大道49号

委托单位：深圳市南山区建筑工务署

咨询单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司



委托单位（甲方）：深圳市南山区建筑工务署

咨询单位（乙方）：深圳市三合和工程项目管理有限公司

甲方于 2023 年 9 月采用公开招标方式确定乙方为桃源中学改扩建工程项目全过程造价咨询工程全过程造价咨询工作中标单位。按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程全过程造价咨询工作协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：桃源中学改扩建工程项目全过程造价咨询

2. 工程概况：项目位于深圳市南山区龙珠大道 49 号。桃源中学建于 1999 年，现有 24 班，建筑面积 13053 平方米。本项目拟将桃源中学由 24 班扩建至 48 班、2400 个学位的标准中学，总占地面积 19861 平方米，改扩建后总建筑面积 57028 平方米，主要建设内容包括：（一）新建工程：新建建筑面积 43975 平方米，包括教学综合楼、地下车库（面积 9390 平方米）、教职工宿舍（面积 3185 平方米）、体育馆、报告厅、立体运动场等，功能主要设为普通教室、机动教室、专业教室、公共教学用房、办公用房、食堂、教职工宿舍、地下车库、游泳池、篮球场、报告厅、设备用房、架空层、跑道等。（二）改造工程：对原有建筑整体改造，总改造建筑面积 13053 平方米，改造内容包括室内装饰、安装、外立面等，改造后功能设为专业教室、图书馆、行政办公室等。

3. 工程投资：38816 万元

二、乙方工作内容

本工程全过程造价咨询合同工作内容包括但不限于：概算编制或审核、施工阶段全过程造价控制（招标工程量清单编制开始到工程结算审核的造价咨询服务）、竣工决算编制等全过程造价咨询。工作内容包括但不限于如下方面：

（一）概算编制或审核阶段咨询工作内容



1. 编制或审核概算，出具书面工程概算书或工程概算审核报告。
2. 协助甲方完成工程概算评审工作。
3. 进行报送工程概算和批复概算的对比分析并出具书面分析报告，提出批复概算中未包含的工程内容，以及下一步造价控制中应注意的事项。

(二) 施工阶段全过程造价控制咨询工作内容

1. 工程量清单编制、标底编制阶段造价咨询工作内容

- (1) 编制工程预算。
- (2) 协助甲方审核招标文件和设计图纸。
- (3) 编制工程量清单及标底，计算标准工期，并提供综合单价分析表、措施费项目分析表、主要材料设备的数量、价格(包括暂定价)清单及定价依据；按甲方要求到现场踏勘。
- (4) 协助甲方完成标底、预算审核工作，进行报送标底、预算和批复概算、审定标底、预算的对比分析，说明报送标底、预算和批复概算、审定标底、预算的差额原因，以及下一步造价控制中应注意的事项。

2. 施工(含施工准备)阶段造价咨询工作内容

- (1) 协助甲方进行招投标答疑。
- (2) 本工程公开招标的标段，如施工招标等，乙方需对评标报告进行复核、对投标文件进行清标，并出具书面签字确认的清标报告。
- (3) 按照项目施工招标文件要求复核和修正中标候选人的商务标，并出具详细的造价分析报告；核对中标人投标文件商务标电子版并打印纸质文件。
- (4) 协助甲方审核、签订各类工程合同。
- (5) 参与图纸会审并提出合理化建议。
- (6) 施工过程中，参与工程量计量及工程进度款支付的复核工作。
- (7) 及时按甲方要求进行工程变更及现场签证的计量、计价审核；根据甲方需要对现场拟进行工程变更及现场签证的工程费用进行预评估，并在甲方要求时间范围内提供书面报告；根据政府规定配合甲方及时报审工程变更。
- (8) 参与工程暂定价定价工作，并根据甲方要求出具书面报告。
- (9) 施工合同及工程相关合同争议的鉴定与索赔等，并根据甲方要求出



该工程全过程造价控制情况；直接与甲方进行工作对接；根据甲方的需要及安排参加项目工程例会，未经甲方同意不得缺席。

10. 工程概算、预算及结算的编制（含暂定价、工程变更等）或审核前，应从造价咨询角度对甲方提交的图纸等相关资料进行全面会审复核并在 1~3 天提出书面的复核意见。并根据项目的不同情况，须针对性地组织安排对现场的核实与了解工作。

11. 若甲方连续三次通知分派任务，乙方均未参加，甲方将有权拒绝其参加其他任何项目并要求乙方承担违约责任。

12. 乙方若在工作中出现重大工作失误，甲方将有权收回该项目并委托他人完成。

13. 乙方参与本项目的工作人员若与本项目承包单位的员工有亲属关系或存在其他利害关系的，必须主动提出回避，若被甲方发现，将记入不良履约行为记录并承担违约责任。

14. 乙方应自行准备造价审核的办公场所、用品、设备、软件及国家、部委、省市颁布的有关定额及工程造价规定。

15. 未经甲方书面同意，乙方不得部分转让其应履行的合同义务。任何情况下，乙方不得转包本合同的义务，否则甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。

16. 乙方应安排至少 1 名固定的工作人员负责与甲方对接工作，汇总工作进度及问题，乙方应确保对接人员的稳定，如必要情况下必须更换需提前至少一周书面通知甲方，并做好工作交接。甲方有权观察并评估乙方服务团队主要人员的工作能力和表现，并有权要求乙方及时替换工作表现不佳的人员。

九、 合同价、支付方式及结算方式

（一）合同价

本项目全过程造价咨询服务酬金暂定为人民币： 贰佰柒拾壹万叁仟元整（大写），即 RMB 271.30 万元（含税价）。

全过程造价咨询费用计费规则：取费参照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》（深价协〔2017〕14 号）计取，下浮率按 20% 执行。计算过程如下：



(1)、工程概算的编制或审核： $100*2\%+400*1.8\%+500*1.6\%+4000*1.3\%+5000*1.2\%+28816*1.1\%=44.62$ （万元）

(2)、施工阶段全过程造价控制： $100*12\%+400*11\%+500*10\%+4000*9\%+5000*8\%+28816*7\%=288.3$ （万元）

(3)、工程竣工决算编制： $100*2\%+400*1.4\%+500*1.1\%+4000*1\%+1000*0.9\%=6.21$ （万元）

合计费用： $44.62+288.3+6.21=339.13$ （万元），下浮 20%后费用为：271.30（万元）

1. 工程概算编制或审核阶段咨询服务酬金 $A1=35.70$ 万元（暂定）。其中：基本酬金 $B1=A1*80\%$ ；绩效酬金 $C1=A1*20\%$ 。

2. 施工阶段全过程造价控制咨询服务酬金 $A2=230.64$ 万元（暂定）。其中：基本酬金 $B2=A2*80\%$ ；绩效酬金 $C2=A2*20\%$ 。

3. 工程竣工决算编制审核咨询服务酬金 $A3=4.97$ 万元（暂定）。其中：基本酬金 $B3=A3*80\%$ ；绩效酬金 $C3=A3*20\%$ 。


4. 全过程造价咨询服务酬金合计暂定 A ： $A=A1+A2+A3=271.30$ 万元。其中：基本酬金合计暂定 $B=B1+B2+B3$ ；绩效酬金合计暂定 $C=C1+C2+C3$ 。

5. 计算本项目施工阶段全过程造价咨询费用时，若乙方未核对设计变更和现场签证、未复核工程进度款支付，则应分阶段进行取费，分为预算编制（审核）和结算审核两个阶段进行取费。

6. 结算绩效收费不能高于基本收费，决算编制计费基数为扣除建安费之外的其他费为决算额计取；最终咨询服务费执行合同计费规则及下浮率，以区造价站质量复核结论为准。

7. 咨询酬金包含乙方为完成本咨询服务所发生的一切费用。乙方的人员工资、福利费、工会经费、教育经费、养老保险、住房公积金、办公费、差旅费、通讯费、交通费、加班费、医疗费、现场补贴、公司管理费、各种税费保险、现场必备的检测设备、办公用品和交通工具合理的购置及使用费用和现场的住宿费、



委托单位：深圳市南山区建筑工务署  (公章)	咨询单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  (签字)	法定代表人或其委托代理人：  (签字)
地址：深圳市南山区前海路爱心大厦 12-14 楼	地址：深圳市南山区南头街道大汪山社区南山大道 2068 号南侨花园住宅楼 G 栋 502
统一社会信用代码：12440305634798694R	统一社会信用代码：91440300MA563BJ913
	开户银行：中国民生银行深圳南山支行 账号：161580387
签订日期： 2023 年 10 月 11 日	联系人及：戴光玉 联系方式：15012472380



3、中山大学深圳产学研大楼东北侧地块建设羽毛球馆项目-全过程造价咨询

中标通知书

工程编号：NSGWS20240909009

工程名称：中山大学深圳产学研大楼东北侧地块建设羽毛球馆项目

招标工程名称：中山大学深圳产学研大楼东北侧地块建设羽毛球馆项目-全过程造价咨询

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

中标单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司

中标金额：56.800000（万元）


备注信息：最终结算价超过50万元需下浮10%，最终结算价不得超过99.8万元。

本工程于 2024年9月9日 09:00 在南山区政府网站进行公开招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 10 日内按照招标公告和招标人签订本项目的发包合同，如为代建项目中标人则需和代建单位签订合同。

招标人（盖章）：

日期：2024年9月24日



合同编号: 2024F238003

深圳市南山区建筑工务署建设工程
全过程造价咨询合同

工程名称: 中山大学深圳产学研大楼东北侧地块建设羽
毛球馆项目

合同名称: 中山大学深圳产学研大楼东北侧地块建设羽
毛球馆项目全过程造价咨询合同

委托单位: 深圳市南山区建筑工务署

咨询单位: 深圳市三合和工程项目管理有限公司





委托单位（甲方）：深圳市南山区建筑工务署

咨询单位（乙方）：深圳市三合和工程项目管理有限公司

经南山区建筑工务署小型建设工程交易及履约评价管理系统公开招标，确定乙方为中山大学深圳产学研大楼东北侧地块建设羽毛球馆项目全过程造价咨询工作中标单位。按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程全过程造价咨询工作协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：中山大学深圳产学研大楼东北侧地块建设羽毛球馆项目

2. 工程概况：项目位于粤兴四道东侧，粤兴四道与粤兴三道交界处的北侧，为临时用地，现状为停车场及临时建筑，用地面积为6098.20 平方米。场地毗邻深圳虚拟大学园院校产业化综合楼、中山大学深圳产学研大楼、湾区创新大厦、华中科技大学深圳产学研基地大楼、南京大学深圳产学研基地。主要建设内容包括：新建一栋地上两层羽毛球综合馆，1 层为停车库，2 层及夹层为羽毛球区；配套建设岗亭、绿化景观、道路广场（地面停车场）、化粪池等设施。

3. 工程投资：项目估算为 6091 万元。其中建安工程费 4828 万元，工程建设其他费 627 万元，预备费 436 万元，开办费 200 万元。（深南发改批〔2024〕324 号）

二、乙方工作内容

本工程全过程造价咨询合同工作内容包括但不限于：概算审核、施工阶段全过程造价控制（招标工程量清单编制开始到工程结算审核的造价咨询服务）、竣工决算编制等全过程造价咨询。工作内容包括但不限于如下方面：

（一）概算审核阶段咨询工作内容



前，应从造价咨询角度对甲方提交的图纸等相关资料进行全面会审复核并在1~3天提出书面的复核意见。并根据项目的不同情况，须针对性地组织安排对现场的核实与了解工作。

11. 若甲方连续三次通知分派任务，乙方均未参加，甲方将有权拒绝其参加其他任何项目并要求乙方承担违约责任。

12. 乙方若在工作中出现重大工作失误，甲方将有权收回该项目并委托他人完成。

13. 乙方参与本项目的工作人员若与本项目承包单位的员工有亲属关系或存在其他利害关系的，必须主动提出回避，若被甲方发现，将记入不良履约行为记录并承担违约责任。

14. 乙方应自行准备造价审核的办公场所、用品、设备、软件及国家、部委、省市颁布的有关定额及工程造价规定。

15. 未经甲方书面同意，乙方不得部分转让其应履行的合同义务。任何情况下，乙方不得转包本合同的义务，否则甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。

16. 乙方应安排至少1名固定的工作人员负责与甲方对接工作，汇总工作进度及问题，乙方应确保对接人员的稳定，如必要情况下必须更换需提前至少一周书面通知甲方，并做好工作交接。甲方有权观察并评估乙方服务团队主要人员的工作能力和表现，并有权要求乙方及时替换工作表现不佳的人员。

九、合同价、支付方式及结算方式

(一) 合同价

本项目全过程造价咨询服务酬金暂定为人民币：伍拾陆万捌仟元整（大写），即RMB 568000.00元（含税价）。按甲方的履约评价管理办法，本酬金由基本酬金与绩效酬金两部分组成，其中基本酬金占90%，绩效酬金占10%。

全过程造价咨询费用计费规则：取费参照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》（深价协（2017）14号）计取。按照《南山区建筑工务署小型建设工程招标投标暂行办法（第一次修订版）》（2022年3月）的规定：造价咨询合同额在50万以上上浮10%（但概算审核阶段需在此基础上再上浮20%），在50万以下不下浮（但概算审核阶段需下浮20%），且最低价为3000元。计算过



程如下:

本项目投资匡算(或估算) 6091 万元, 建安工程费为 4828 万元。

1. 工程概算审核阶段咨询服务酬金

$A1 = (100 \times 0.2\% + (500 - 100) \times 0.18\% + (1000 - 500) \times 0.16\% + (5000 - 1000) \times 0.13\% + (6091 - 5000) \times 0.12\%) \times (1 - 20\%) \times (1 - 10\%) = 5.92$ 万元(暂定)。其中: 基本酬金 $B1 = A1 \times 90\%$; 绩效酬金 $C1 = A1 \times 10\%$ 。

2. 施工阶段全过程造价控制咨询服务酬金

$A2 = 100 \times 1.2\% + (500 - 100) \times 1.1\% + (1000 - 500) \times 1\% + (5000 - 1000) \times 0.9\% + (6091 - 5000) \times 0.8\% \times (1 - 10\%) = 49.79$ 万元(暂定)。其中: 基本酬金 $B2 = A2 \times 90\%$; 绩效酬金 $C2 = A2 \times 10\%$ 。

3. 工程竣工决算编制审核咨询服务酬金

$A3 = (100 \times 0.2\% + (500 - 100) \times 0.14\% + (6091 - 6091 \times 0.85 - 500) \times 0.11\%) \times (1 - 10\%) = 1.09$ 万元(暂定)。其中: 基本酬金 $B3 = A3 \times 90\%$; 绩效酬金 $C3 = A3 \times 10\%$ 。

4. 全过程造价咨询服务酬金合计暂定 A:

$A = A1 + A2 + A3 = 5.92 + 49.79 + 1.09 = 56.80$ 万元。其中: 基本酬金合计暂定 $B = B1 + B2 + B3$; 绩效酬金合计暂定 $C = C1 + C2 + C3$ 。

5. 咨询酬金包含乙方为完成本咨询服务所发生的一切费用。乙方的人工工资、福利费、工会经费、教育经费、养老保险、住房公积金、办公费、差旅费、通讯费、交通费、加班费、医疗费、现场补贴、公司管理费、各种税费保险、现场必备的检测设备、办公用品和交通工具合理的购置及使用费用和现场的住宿费、电话费、外出考察费、保险费、返工费以及按照甲方要求进行的补充、修改、完善等为完成本咨询服务所需的全部费用均含在此合同价内。



(二) 支付方式

1. 概算审核费用支付

概算通过政府主管部门审查批复, 乙方向甲方提出书面付款申请且甲方完成当期节点履约评价后, 甲方支付工程概算审核阶段咨询服务酬金的基本酬金 B1



(本页为《中山大学深圳产学研大楼东北侧地块建设羽毛球馆项目全过程造价咨询合同》的盖章页。)

 委托单位：深圳市南山区建筑工务署 (公章)	 咨询单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司 (公章)
法定代表人或其委托代理人：  (签字)	法定代表人或其委托代理人：  (签字)
地址：深圳市南山区前海路爱心大厦 12-14 楼	地址：深圳市南山区南头街道大汪山社 区南山大道 2068 号南侨花园住宅楼 G 栋 502
统一社会信用代码：12440305634798694R	统一社会信用代码：91440300MA563BJ913
	开户银行：中国民生银行深圳南山支行 账号：161580387
签订日期： 2024 年 10 月 14 日	联系人及 联系方式：戴光玉/15012472380



4、麒麟山庄安全隐患整治环境提升项目全过程造价咨询

正本

合同编号：2024S437002

深圳市南山区建筑工务署建设工程 全过程造价咨询合同

工程名称：麒麟山庄安全隐患整治环境提升项目

合同名称：麒麟山庄安全隐患整治环境提升项目
全过程造价咨询合同

委托单位：深圳市南山区建筑工务署

咨询单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司



委托单位（甲方）：深圳市南山区建筑工程署

咨询单位（乙方）：深圳市三合和工程项目管理有限公司

本项目为应急工程，甲方确定乙方为麒麟山庄安全隐患整治环境提升项目工程全过程造价咨询工作中标单位。按照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程全过程造价咨询工作协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：麒麟山庄安全隐患整治环境提升项目

2. 工程概况：麒麟山庄安全隐患整治环境提升项目位于深圳市南山区沁园路4599号，背靠麒麟山，面向天鹅湖，东南被麒麟山、野生动物园、西丽高尔夫球场和深圳大学城等环抱，占地范围约为77.7万平方米。本次安全隐患整治及环境提升范围包括：麒麟山庄九号楼、二号楼、三号楼、四号楼、五号楼的外立面翻新、室外配套设施设备换新，办公楼及三层楼的结构加固和翻新，山庄机动车道、人行道及室外停车场的翻新及配套设施设备换新，彩麟湖（麒麟苑旁）湖边栈道翻新及延长等。

3. 工程投资：初步匡算总投资为4985.68万元，建安费为4214.99万元（建筑提升约937.79万元，景观类提升约3277.2万元）。

二、乙方工作内容

本工程全过程造价咨询合同工作内容包括但不限于：概算审核、施工阶段全过程造价控制（招标工程量清单编制开始到工程结算审核的造价咨询服务）、竣工决算编制等全过程造价咨询。工作内容包括但不限于如下方面：

（一）概算审核阶段咨询工作内容

1. 审核概算，出具书面工程概算审核报告。
2. 协助甲方完成工程概算评审工作。
3. 进行报送工程概算和批复概算的对比分析并出具书面分析报告，提出批复



13. 乙方参与本项目的工作人员若与本项目承包单位的员工有亲属关系或存在其他利害关系的，必须主动提出回避，若被甲方发现，将记入不良履约行为记录并承担违约责任。

14. 乙方应自行准备造价审核的办公场所、用品、设备、软件及国家、部委、省市颁布的有关定额及工程造价规定。

15. 未经甲方书面同意，乙方不得部分转让其应履行的合同义务。任何情况下，乙方不得转包本合同的义务，否则甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。

16. 乙方应安排至少1名固定的工作人员负责与甲方对接工作，汇总工作进度及问题，乙方应确保对接人员的稳定，如必要情况下必须更换需提前至少一周书面通知甲方，并做好工作交接。甲方有权观察并评估乙方服务团队主要人员的工作能力和表现，并有权要求乙方及时替换工作表现不佳的人员。

九、合同价、支付方式及结算方式

(一) 合同价

本项目全过程造价咨询服务酬金暂定为人民币：肆拾柒万柒仟叁佰捌拾元整（大写），即 RMB 477380.00 元（含税价）。按甲方的履约评价管理办法，本酬金由基本酬金与绩效酬金两部分组成，其中基本酬金占 90%，绩效酬金占 10%。

全过程造价咨询费用计费规则：取费参照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》（深价协〔2017〕14号）计取，上下浮率分阶段设置，在100万以上上下浮20%（但概算审核阶段需在此基础上再下浮30%），在50万以上上下浮10%（但概算审核阶段需在此基础上再下浮20%），在50万以下不下浮（但概算审核阶段需下浮20%）。计算过程如下：

本项目投资匡算（或估算）暂定为 4985.68 万元，建安工程费暂定为 4214.99 万元。

1. 工程概算审核阶段咨询服务酬金 $A1 = (100 \times 2\% + (500 - 100) \times 1.8\% + (1000 - 500) \times 1.6\% + (4985 - 1000) \times 1.3\%) \times (1 - 20\%) = 5.5204$ 万元（暂定），其中：基本酬金 $B1 = A1 \times 90\%$ ；绩效酬金 $C1 = A1 \times 10\%$ 。



2. 施工阶段全过程造价控制咨询服务酬金 $A_2=100 \times 12\% + (500-100) \times 11\% + (1000-500) \times 10\% + (4985-1000) \times 9\% = 46.465$ 万元（暂定）。其中：基本酬金 $B_2=A_2 \times 90\%$ ；绩效酬金 $C_2=A_2 \times 10\%$ 。

3. 工程竣工决算编制审核咨询服务酬金 $A_3=100 \times 2\% + (500-100) \times 1.4\% + (4985-4215-500) \times 1.1\% = 1.057$ 万元（暂定）。其中：基本酬金 $B_3=A_3 \times 90\%$ ；绩效酬金 $C_3=A_3 \times 10\%$ 。

4. 全过程造价咨询服务酬金合计暂定 A： $A=A_1+A_2+A_3=(5.5204+46.465+1.057) \times (1-10\%) = 47.738$ 万元。其中：基本酬金合计暂定 $B=B_1+B_2+B_3$ ；绩效酬金合计暂定 $C=C_1+C_2+C_3$ 。

5. 咨询酬金包含乙方为完成本咨询服务所发生的一切费用。乙方的人员工资、福利费、工会经费、教育经费、养老保险、住房公积金、办公费、差旅费、通讯费、交通费、加班费、医疗费、现场补贴、公司管理费、各种税费保险、现场必备的检测设备、办公用品和交通工具合理的购置及使用费用和现场的住宿费、电话费、外出考察费、保险费、返工费以及按照甲方要求进行的补充、修改、完善等为完成本咨询服务所需的全部费用均含在此合同价内。

（二）支付方式

1. 概算审核费用支付

概算通过政府主管部门审查批复，乙方向甲方提出书面付款申请且甲方完成当期节点履约评价后，甲方支付工程概算审核阶段咨询服务酬金的基本酬金 $B_1 \times 100\% +$ 绩效酬金 $C_1 \times$ 当期节点履约评价支付比例 - 当期违约金（赔偿金）。计费基数为批复概算总投资。


2. 施工阶段全过程造价控制咨询费用支付

（1）标底、工程量清单编制费用支付

标底经区造价站审定，完成招标及协助甲方完成施工合同签订后，乙方向甲方提出书面付款申请，甲方支付施工阶段全过程造价控制咨询服务酬金的基本酬金 $B_2 \times 30\% +$ 绩效酬金 $C_2 \times 30\% \times$ 当期节点履约评价支付比例 - 当期违约金（赔偿金）。计费基数为造价站审定标底。

若项目以单项工程报送标底或预算，则以每次造价站审定的单项工程的标底



委托单位：深圳市南山区建筑工务署  (公章)	咨询单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  (签字)	法定代表人或其委托代理人：  (签字)
地址：深圳市南山区前海路爱心大厦 12-14楼	地址：南山区光彩新天地 13楼 B1
统一社会信用代码：12440305634798694R	统一社会信用代码：91440300MA563BJ913
	开户银行：中国民生银行深圳南山支行
	账号：161580387
签订日期： 2024年4月19日	联系人及 联系方式：戴光玉/15012472380



建安工程概算造价书

工程名称：麒麟山庄安全隐患整治环境提升项目

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

工程造价：48481989.79元 单位造价：

金额大写：肆仟捌佰肆拾捌万壹仟玖佰捌拾玖元柒角玖分

编制单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司

编制人：吴廷廷

资格证号：

复核人：余丽芸

资格证号

主管：王炎武





建安工程 预算造价书

工程名称：麒麟山庄安全隐患整治环境提升项目

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

工程造价：41301277.38元 单位造价：

金额大写：肆仟壹佰叁拾万壹仟贰佰柒拾柒元叁角捌分

编制单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司

编制人：崔梅

资格证号：

复核人：余丽蓉

资格证号：

主管：王炎武



本项为隐蔽工程，本工程造价经审核核算。
林伟 2024.11.6



5、跨后海滨路天桥二期建设项目全过程造价咨询

中标通知书

工程编号：NSGWS20230621002

工程名称：跨后海滨路天桥二期建设项目全过程造价咨询

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

中标单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司

中标金额：33.578000（万元）

备注信息：最终结算价超过50万元需下浮10%，最终结算价不得超过99.8万元。

本工程于 2023年6月21日 09:00 在南山区政府网站进行公开招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 10 日内按照招标公告和招标人签订本项目的发包合同。

招标人（盖章）：

日期：2023年6月28日





合同编号: 2018SS236001

跨后海滨路天桥二期建设项目
全过程造价咨询合同



委托单位: 深圳市南山区建筑工务署

咨询单位: 深圳市三合和工程项目管理有限公司



委托单位（甲方）：深圳市南山区建筑工务署

咨询单位（乙方）：深圳市三合和工程项目管理有限公司

经南山区建筑工务署小型建设工程交易及履约评价管理系统公开招标，确定乙方为跨后海滨路天桥二期建设项目工程全过程造价咨询工作中标单位。按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程全过程造价咨询工作协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：跨后海滨路天桥二期建设项目

2. 工程概况：跨后海滨路天桥位于南山区粤海街道后海滨路与海德二道相交处，全长约70m，宽为12m，主要功能为连接后海滨路西侧的深圳湾大街及东侧的深圳湾大街东延段。

3. 工程投资：总投资 2997 万元（估）（深南发改〔2019〕6 号）

二、乙方工作内容

本工程全过程造价咨询合同工作内容包括但不限于：概算编制或审核、施工阶段全过程造价控制（招标工程量清单编制开始到工程结算审核的造价咨询服务）、竣工决算编制等全过程造价咨询。工作内容包括但不限于如下方面：

（一）概算编制或审核阶段咨询工作内容

1. 编制或审核概算，出具书面工程概算书或工程概算审核报告。
2. 协助甲方完成工程概算评审工作。
3. 进行报送工程概算和批复概算的对比分析并出具书面分析报告，提出批复概算中未包含的工程内容，以及下一步造价控制中应注意的事项。

（二）施工阶段全过程造价控制咨询工作内容

1. 工程量清单编制、标底编制阶段造价咨询工作内容

（1）编制工程预算。



(一) 合同价

本项目全过程造价咨询服务酬金暂定为人民币：叁拾叁万伍仟柒佰捌拾元整（大写），即 RMB 335780.00 元（含税价）。

全过程造价咨询费用计费规则：取费参照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》（深价协（2017）14号）计取。按照《南山区建筑工务署小型建设工程招标投标暂行办法（第一次修订版）》（2022年3月）的规定：造价咨询合同额在50万以上上浮10%，在50万以下不下浮，且最低价为3000元。计算过程如下：

1. 工程概算编制或审核阶段咨询服务酬金 A1

$=1000000*2/1000+4000000*1.8/1000+5000000*1.6/1000+(29970000-10000000)*1.3/1000 = 43161.00$ 元（暂定）。其中：基本酬金 $B1=A1*80%$ ；绩效酬金 $C1=A1*20%$ 。

2. 施工阶段全过程造价控制咨询服务酬金 A2

$=1000000*12/1000+4000000*11/1000+5000000*10/1000+(29970000-10000000)*9/1000 = 285730.00$ 元（暂定）。其中：基本酬金 $B2=A2*80%$ ；绩效酬金 $C2=A2*20%$ 。


3. 工程竣工决算编制审核咨询服务酬金 A3

$=[(29970000-29970000*0.85)-1000000]*1.4/1000+1000000*2/1000=6893.70$ 元（暂定）。其中：基本酬金 $B3=A3*80%$ ；绩效酬金 $C3=A3*20%$ 。

4. 全过程造价咨询服务酬金合计暂定 A： $A=A1+A2+A3= 335784.70$ 元 ≈ 335780.00 元。其中：基本酬金合计暂定 $B=B1+B2+B3$ ；绩效酬金合计暂定 $C=C1+C2+C3$ 。

5. 计算本项目施工阶段全过程造价咨询费用时，若乙方未核对设计变更和现场签证、未复核工程进度款支付等，则应分阶段进行取费，分为预算编制（审核）和结算审核两个阶段进行取费。



委托单位：深圳市南山区建筑工务署  (公章)	咨询单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  (签字)	法定代表人或其委托代理人：  (签字)
地址：深圳市南山区前海路爱心大厦 12-14楼	地址：深圳市南山区南头街道大汪山社区 南山大道2068号南侨花园住宅楼G栋 502
统一社会信用代码：12440305634798694R	统一社会信用代码：91440300MA5G3BI913
	开户银行：中国民生银行深圳南山支行
	账号：161580387
签订日期： 2023年6月30日	联系人及 联系方式：戴光玉 15012472380



市政工程 招标控制价

工程名称：跨后海滨路天桥（二期）项目地铁安全影响评估

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

工程造价：184200.00元

金额大写：壹拾捌万肆仟贰佰元整

编制单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司



编制人：林廷弘

资格证号：

复核人：汤怀平

资格证号：

主管：王炎武



日期：二〇二三年八月二十一日



工程预算书

工程名称：跨后海滨路天桥（二期）工程施工总承包

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

工程造价：25615697.10(元)

工程造价（大写）：贰仟伍佰陆拾壹万伍仟陆佰玖拾柒元壹角

编制单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司

编制人：栢华集 资格证号：

复核人：汤小祥 资格证号：

主管：王炎武



日期：2023年12月07日



深圳市南山区工程造价管理站

(预算、标底)

编号: 标2024005

2014-440305-78-01-701653

工程造价审定书

工程名称: 跨前海滨路天桥(二期)施工总承包工程

建设单位: 深圳市南山区建筑工务署

咨询单位: 深圳市三合和工程项目管理有限公司

代建单位: 华润(深圳)有限公司

建设单位报送造价: 25,615,697.10 元

单位造价:

区造价站审定造价: 24,385,272.90 元

单位造价:

核 减 额 : 1,230,424.20 元

安全文明措施费: 577,347.97 元

暂列金额: 1,380,000.00 元

主 审 人: 张明 李进

总 审: _____

复 核 人: 1

副 站 长: 刘良

审核组组长: 贺小勤

站 长: 蒋

建设单位报送日期:

区造价站审定日期: 2024年1月26日



6、田厦社康中心升级社区医院改造工程全过程造价咨询服务

合同编号：2022F153001

田厦社康中心升级社区医院改造工程
全过程造价咨询服务合同



甲方：深圳市南山区建筑工务署

乙方：深圳市三合和工程项目管理有限公司



甲方：深圳市南山区建筑工务署

乙方：深圳市三合和工程项目管理有限公司

经南山区建筑工务署小型建设工程交易及履约评价管理系统公开招标，确定乙方为田厦社康中心升级社区医院改造工程造价咨询中标单位。按照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程造价咨询工作协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：田厦社康中心升级社区医院改造工程

2、工程概况：项目位于深圳市南山区南新路2030-19号（福祥阁沿街商业-2F），拟对田厦社康中心进行升级改造为社区医院，总改造面积约859平方米。建设内容包括对首层社康中心旧址进行拆除，改造为社区医院发热门诊和住院区，增加病床30床，重新规划平面布局，改造面积为478.55平方米；对二层局部用房进行装修改造，以满足社区医院的功能要求，改造面积为380.83平方米；对建筑物一、二层外立面统一翻新；对一、二层整体智能化系统设备设施进行升级改造等。

主要改造内容包括：拆除、装饰、外立面、给排水、智能化、电气、通风空调、消防、电梯等。

3、工程投资：项目投资匡算为768万元，其中建安工程费621万元（深南发改批[2021]454号）。

二、乙方工作内容

本工程全过程造价咨询服务内容包括但不限于：概算编制或审核、招标清单编制、施工图预算编制、招标控制价编制、施工过程中造价管理、工程结算等全过程造价咨询。

具体内容如下（包括但不限于）：1、概算编制或审核；2、施工图预算、招标控制价及工程量清单编制；3、签证变更费用的审核；4、工程结算审核、竣工决算编制；5、全过程投资控制等工作；6、参与项目管理过程的相关会议，配合招投标答疑，审核工程进度款，审核工程变更及合同争议的鉴定与索赔，参与图纸会审并提出合理化建议；7、编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和



评估乙方服务团队主要人员的工作能力和表现，并有权要求乙方及时替换工作表现不佳的人员。乙方应当在接到甲方的书面通知后7个日历天内进行更换，否则甲方有权要求乙方承担每人每次人民币10000元的违约金，不设上限。

九、费用及支付

1、合同价

计费规则：取费参照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》（深价协[2017]14号）计取。按照《南山区建筑工务署小型建设工程招标投标暂行办法（第一次修订版）》（2022年3月）的规定：造价咨询合同额在50万以上上下浮10%，50万以下不下浮，且最低价为3000元。本合同造价咨询服务酬金计算过程如下：

（1）工程概算的编制或审核咨询费：

$(768-500)*1.6/1000+400*1.8/1000+100*2/1000=1.35$ 万元

（2）施工阶段全过程造价控制咨询费：

$(768-500)*10/1000+400*11/1000+100*12/1000=8.28$ 万元

（3）工程竣工决算编制（计费基数以发改批复概算的其他费作为计费基数，如概算暂未批复，暂估2162万元）咨询费：

$(768-500)*1.1/1000+400*1.4/1000+100*2/1000=1.05$ 万元

（1）（2）（3）合计：10.684 万元

本合同暂定价为：10.684 万元。（注意：若超过50万需要下浮10%）

其中，结算绩效收费不能高于基本收费，决算编制计费基数为扣除建安费之外的其他费为决算额计取；最终审核费以合同取费标准和造价站复核为准，最终结算价不得超过99.8万元。

咨询酬金包含乙方为完成本咨询服务所发生的一切费用。

2、支付方式：


（1）概算编制费用支付

概算通过政府主管部门审查批复且乙方向甲方提出书面付款申请后，支付概算咨询费的100%。

（2）施工阶段全过程造价控制费用支付：

标底经政府确定的造价部门审定，完成招标及协助甲方签定合同，乙方向甲方提出书面付款申请后，按全过程咨询费的30%支付；工程竣工验收并出具结算审核成果文件时，支付至全过程咨询费的80%，余款待政府确定的造价部门复核后，根据审定的造价控制费支付尾款。



甲方：  乙方： 
深圳市南山区建筑工务署 (盖章) 深圳市三合和工程项目管
理有限公司 (盖章)
法定 代 表 人 法定 代 表 人
或 或
其授权的代理人：  其授权的代理人： 
(签字) (签字)

开户银行： 中国民生银行
深圳南山支行

银行账号： 1615 80387

签订日期：

2022年12月01日

联系人及联系方
式：

戴光玉
150 1247 2380



建安工程概算造价书

工程名称：田厦社康中心升级社区医院装修改造项目

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

代建单位：华润置地城市运营管理(深圳)有限公司

工程造价：4621712.93元 单位造价：9960.59元/m²

金额大写：肆佰陆拾贰万壹仟柒佰壹拾贰元玖角叁分

编制单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司

编制人：崔芳 资格证号：

复核人：谢怀平 资格证号：

主管：王炎武 资格证号：



日期：二〇二三年十二月二十五日



7、峰景社康中心改造项目全过程造价咨询

合同编号：2022F157001

峰景社康中心改造项目全过程造价咨询服务合同

甲方：深圳市南山区建筑工务署

乙方：深圳市三合和工程项目管理有限公司





甲方：深圳市南山区建筑工务署

乙方：深圳市三合和工程项目管理有限公司

经南山区建筑工务署小型建设工程交易及履约评价管理系统公开招标，确定乙方为峰景社康中心改造项目造价咨询中标单位。按照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程造价咨询工作协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：峰景社康中心改造项目

2、工程概况：峰景社康中心改造项目位于龙珠大道天地峰景园1-3号裙楼113-116号，面积约1230平方米；改造内容为原有社康拆除装饰面层，新建隔墙及装饰面层，电气、给排水、暖通等系统安装。

3、工程投资：项目投资匡算为542万元（深南发改批[2022]182号）。

二、乙方工作内容

本工程全过程造价咨询服务内容包括但不限于：概算编制或审核、招标清单编制、施工图预算编制、招标控制价编制、施工过程中造价管理、工程结算等全过程造价咨询。

具体内容如下（包括但不限于）：1、概算编制或审核；2、施工图预算、招标控制价及工程量清单编制；3、签证变更费用的审核；4、工程结算审核、竣工决算编制；5、全过程投资控制等工作；6、参与项目管理过程的相关会议，配合招投标答疑，审核工程进度款，审核工程变更及合同争议的鉴定与索赔，参与图纸会审并提出合理化建议；7、编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等；8、配合发改、造价、审计部门完成审核工作等；9、本工程需公开招标的标段，如施工等，乙方需对评标报告进行复核，并对清标报告签字确认。

（一）概算编制或审核阶段造价咨询工作内容：

编制或审核概算、协助完成概算评审工作；进行报送概算和批复概算的对比分析，书面提出批复概算中未包含的工程内容，以及下一步造价控制中应注意的事项。



法（第一次修订版）》（2022年3月）的规定：造价咨询合同额在50万以上下浮10%，50万以下不下浮，且最低价为3000元。本合同造价咨询服务酬金计算过程如下：

- (1) 工程概算的编制或审核咨询费：
 $(542-500) \times 1.6/1000 + 400 \times 1.8/1000 + 100 \times 2/1000 = 0.99$ 万元
- (2) 施工阶段全过程造价控制咨询费：
 $(542-500) \times 10/1000 + 400 \times 11/1000 + 100 \times 12/1000 = 6.02$ 万元
- (3) 工程竣工决算编制（计费基数以发改批复概算的其他费作为计费基数，如概算暂未批复，暂估2162万元）咨询费：
 $(542-500) \times 1.1/1000 + 400 \times 1.4/1000 + 100 \times 2/1000 = 0.81$ 万元

(1) (2) (3) 合计：7.813 万元。

本合同暂定价为：7.813 万元。（注意：若超过50万需要下浮10%）

其中，结算绩效收费不能高于基本收费，决算编制计费基数为扣除建安费之外的其他费为决算额计取；最终审核费以合同取费标准和造价站复核为准，最终结算价不得超过99.8万元。

咨询酬金包含乙方为完成本咨询服务所发生的一切费用。

2、支付方式：

(1) 概算编制费用支付

概算通过政府主管部门审查批复且乙方向甲方提出书面付款申请后，支付概算咨询费的100%。

(2) 施工阶段全过程造价控制费用支付：

标底经政府确定的造价部门审定，完成招标及协助甲方签订合同，乙方向甲方提出书面付款申请后，按全过程咨询费的30%支付；工程竣工验收并出具结算审核成果文件时，支付至全过程咨询费的80%，余款待政府确定的造价部门复核后，根据审定的造价控制费支付尾款。

(3) 工程竣工决算编制费用的支付：

决算经政府确定的造价部门复核且乙方向甲方提出书面付款申请后，根据甲方已完成的履约评价支付至审定的造价控制费的100%。

3、结算方式

结算时以发改局、造价管理站或政府确定的造价部门审定的各阶段造价为计费额，根据《深圳市建设工程造价咨询业收费市场价格》的通知（深价协[2017]14号）并按照《南山区建筑工务署小型建设工程招标投标暂行办法（第一次修订版）》



甲方： 深圳市南山区建筑工务署 乙方： 深圳市三合和工程项目管理有限公司
(盖章) (盖章)

法定代表人 法定代表人
或 或
其授权的代理人： 李刘君 其授权的代理人： 戴光玉
(签字) (签字)

开户银行： 中国民生银行
深圳南山支行

银行账号： 1615 80387

签订日期：
2022年12月01日

联系人及联系方式：
戴光玉
150 1247 2380



建安工程 招标控制价

工程名称：峰景社康中心装修改造工程施工

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

代建单位：华润置地城市运营管理(深圳)有限公司

工程造价：5678391.65元 单位造价：4661.99元/m²

金额大写：伍佰陆拾柒万捌仟叁佰玖拾壹元陆角伍分

编制单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司



编制人：崔莎

资格证号：

复核人：颜国强

资格证号：



主管：



日期：二〇二四年一月三十日



8、区医疗集团总部金众麒麟公馆社区健康服务站改造工程全过程造价咨询服务

合同编号：2022F152001

区医疗集团总部金众麒麟公馆社区健康服务站改造工程
全过程造价咨询服务合同



甲方：深圳市南山区建筑工务署

乙方：深圳市三合和工程项目管理有限公司



甲方：深圳市南山区建筑工务署

乙方：深圳市三合和工程项目管理有限公司

经南山区建筑工务署小型建设工程交易及履约评价管理系统公开招标，确定乙方为区医疗集团总部金众麒麟公馆社区健康服务站改造工程造价咨询中标单位。按照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程造价咨询工作协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：区医疗集团总部金众麒麟公馆社区健康服务站改造工程

2、工程概况：区医疗集团总部金众麒麟公馆社区健康服务站位于西丽街道丽湖社区金众麒麟公馆一期5栋配套01层C号房，为政府物业，建筑面积为1022.94平方米，目前为毛坯房，改造内容包括室内外装修、电气、给排水、消防、空调通风、智能化等工程。

南山区健康促进体验馆位于南山区南头红花路与南新路交汇处，红花路153号附近，建筑面积约 600 平方米，现状为毛坯房，在原有基础上进行装修，优化功能布局。主要建设内容包括砌筑、拆除、装饰装修、电气、消防、给排水、通风空调、弱电及智能化安装等工程。

3、工程投资：项目投资匡算 576 万元。其中区医疗集团总部金众麒麟公馆社区健康服务站改造工程投资 368 万元，包括建安工程费 315 万元，工程建议其他费 42 万元，预备费 11 万元。（深南发改批[2022] 105 号）。

二、乙方工作内容

本工程全过程造价咨询服务内容包括但不限于：概算编制或审核、招标清单编制、施工图预算编制、招标控制价编制、施工过程中造价管理、工程结算等全过程造价咨询。

具体内容如下（包括但不限于）：1、概算编制或审核；2、施工图预算、招标控制价及工程量清单编制；3、签证变更费用的审核；4、工程结算审核、竣工决算编制；5、全过程投资控制等工作；6、参与项目管理过程的相关会议，配合招投标答疑，审核工程进度款，审核工程变更及合同争议的鉴定与索赔，参与图纸会审并提出合理化建议；7、编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和



评估乙方服务团队主要人员的工作能力和表现，并有权要求乙方及时替换工作表现不佳的人员。乙方应当在接到甲方的书面通知后 7 个日历天内进行更换，否则甲方有权要求乙方承担每人每次人民币 10000 元的违约金，不设上限。

九、费用及支付

1、合同价

计费规则：取费参照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》（深价协[2017]14号）计取。按照《南山区建筑工务署小型建设工程招投标暂行办法（第一次修订版）》（2022年3月）的规定：造价咨询合同额在50万以上上浮10%，50万以下不下浮，且最低价为3000元。本合同造价咨询服务酬金计算过程如下：

- (1) 工程概算的编制或审核咨询费：
 $(368-100)*1.8/1000+100*2/1000=0.68$ 万元
- (2) 施工阶段全过程造价控制咨询费：
 $(368-100)*11/1000+100*12/1000=4.15$ 万元
- (3) 工程竣工决算编制（计费基数以发改批复概算的其他费作为计费基数，如概算暂未批复，暂估2162万元）咨询费：
 $(368-100)*1.4/1000+100*2/1000=0.58$ 万元

(1) (2) (3) 合计：5.406 万元。

本合同暂定价为：5.406 万元。（注意：若超过50万需要上浮10%）

其中，结算绩效收费不能高于基本收费，决算编制计费基数为扣除建安费之外的其他费为决算额计取；最终审核费以合同取费标准和造价站复核为准，最终结算价不得超过99.8万元。

咨询酬金包含乙方为完成本咨询服务所发生的一切费用。

2、支付方式：

(1) 概算编制费用支付


概算通过政府主管部门审查批复且乙方向甲方提出书面付款申请后，支付概算咨询费的100%。

(2) 施工阶段全过程造价控制费用支付：

标底经政府确定的造价部门审定，完成招标及协助甲方签订合同，乙方向甲方提出书面付款申请后，按全过程咨询费的30%支付；工程竣工验收并出具结算审核成果文件时，支付至全过程咨询费的80%，余款待政府确定的造价部门复核后，根据审定的造价控制费支付尾款。



甲方：  乙方： 
深圳市南山区建筑工务署 深圳市三合和工程项目管
(盖章) 理有限公司
(盖章)

法定代 表 人 法定代 表 人
或 或
其授 权 的 代 理 人 其授 权 的 代 理 人
 
(签字) (签字)

开户银行： 中国民生银行
深圳南山支行

银行账号： 1615 80387

签订日期：
2022年12月01日

联系人及联系方 戴光玉
式： 150 1247 2380



建安工程 招标控制价

工程名称：金众麒麟公馆社区健康服务站装修改造工程施工

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

代建单位：华润置地城市运营管理(深圳)有限公司

工程造价：4468814.10元 单位造价：4368.34元/m²

金额大写：肆佰肆拾陆万捌仟捌佰壹拾肆元壹角整

编制单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司

编制人：崔芳

资格证号：

复核人：颜国强

资格证号

主管：

王炎武



日期：二〇二四年一月三十日



9、220kV 研创变电站两通一平工程全过程造价咨询

中标通知书

工程编号：NSGWS20230526004

工程名称：220kV研创变电站两通一平工程项目全过程造价咨询

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

中标单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司

中标金额：4.90（万元）

备注信息：最终结算价超过50万元需下浮10%，最终结算价不得超过99.8万元。

本工程于 2023年5月26日 09:00 在南山区政府网站进行公开招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 10 日内按照招标公告和招标人签订本项目的发包合同。

招标人（盖章）：

日期：2023年6月2日



合同编号：2023S417002

220kV 研创变电站两通一平工程
全过程造价咨询合同



委托单位：深圳市南山区建筑工务署

咨询单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司



委托单位（甲方）：深圳市南山区建筑工务署

咨询单位（乙方）：深圳市三合和工程项目管理有限公司

经南山区建筑工务署小型建设工程交易及履约评价管理系统公开招标，确定乙方为220kV研剑变电站两通一平工程全过程造价咨询工作中标单位。按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程全过程造价咨询工作协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：220kV 研剑变电站两通一平工程

2. 工程概况：220kV 研剑变电站两通一平工程项目位于深圳市南山区粤海街道，南海大道与北环大道交叉口的东南角。场平设计范围总面积约 7276.46 平方米，用地中建设用地为 962.15 平方米，农用地为 6314.31平方米。工程内容包括土石方开挖(约7000立方)、破除混凝土路面、新建混凝土挡土墙、绿化迁移等。

3. 工程投资：暂无立项及可研文件，新增绿化迁移后预估工程费用 350 万元。

二、乙方工作内容

本工程全过程造价咨询合同工作内容包括但不限于：概算编制或审核、施工阶段全过程造价控制（招标工程量清单编制开始到工程结算审核的造价咨询服务）、竣工决算编制等全过程造价咨询。工作内容包括但不限于如下方面：

（一）概算编制或审核阶段咨询工作内容

1. 编制或审核概算，出具书面工程概算书或工程概算审核报告。
2. 协助甲方完成工程概算评审工作。
3. 进行报送工程概算和批复概算的对比分析并出具书面分析报告，提出批复概算中未包含的工程内容，以及下一步造价控制中应注意的事项。

（二）施工阶段全过程造价控制咨询工作内容



15. 未经甲方书面同意，乙方不得部分转让其应履行的合同义务。任何情况下，乙方不得转包本合同的义务，否则甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。

16. 乙方应安排至少 1 名固定的工作人员负责与甲方对接工作，汇总工作进度及问题，乙方应确保对接人员的稳定，如必要情况下必须更换需提前至少一周书面通知甲方，并做好工作交接。甲方有权观察并评估乙方服务团队主要人员的工作能力和表现，并有权要求乙方及时替换工作表现不佳的人员。

九、合同价、支付方式及结算方式

(一) 合同价

本项目全过程造价咨询服务酬金暂定为人民币：肆万玖仟元整（大写），即 RMB 4.90 万元（含税价）。

全过程造价咨询费用计费规则：取费参照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》（深价协〔2017〕14号）计取。按照《南山区建筑工务署小型建设工程招投标暂行办法（第一次修订版）》（2022年3月）的规定：造价咨询合同额在 50 万以上上浮 10%，在 50 万以下不下浮，且最低价为 3000 元。计算过程如下：

1. 工程概算编制或审核阶段咨询服务酬金 $A1 = 100 \times 2\% + (350 - 100) \times 1.8\% = 0.65$ 万元（暂定）。其中：基本酬金 $B1 = A1 \times 80\%$ ；绩效酬金 $C1 = A1 \times 20\%$ 。

2. 施工阶段全过程造价控制咨询服务酬金 $A2 = 100 \times 12\% + (350 - 100) \times 11\% = 3.95$ 万元（暂定）。其中：基本酬金 $B2 = A2 \times 80\%$ ；绩效酬金 $C2 = A2 \times 20\%$ 。

3. 工程竣工决算编制审核咨询服务酬金 $A3 = (350 - 350 \times 0.85) \times 2\% = 0.105$ 万元（暂定），不足 0.30 万元按 0.30 万元计取。其中：基本酬金 $B3 = A3 \times 80\%$ ；绩效酬金 $C3 = A3 \times 20\%$ 。

4. 全过程造价咨询服务酬金合计暂定 $A = A1 + A2 + A3 = 0.65 + 3.95 + 0.3 = 4.90$ 万元。其中：基本酬金合计暂定 $B = B1 + B2 + B3$ ；绩效酬金合计暂定 $C = C1 + C2 + C3$ 。



文件，均视为有效送达，由未通知方承担由此而引起的相关责任；

6.4 一方按有效地址递送，另一方拒收的、未妥投退回，视为有效送达；

6.5 如因本合同履行产生争议，本合同所示地址同时作为诉讼所有程序（包括一审、二审、再审、执行等程序）中相关法律文书的有效司法送达地址，按该地址送达即视为有效送达；

6.6 本联系方式条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力影响，始终有效。

7. 本合同未尽事宜双方协商解决。

十五、合同份数


本合同一式陆份，含正本贰份，副本肆份。甲乙双方各执贰份（正本壹份，副本贰份），具同等法律效力，乙方须在合同生效后7日内向发包人提交合同正本扫描件。

委托单位：深圳市南山区建筑工务署

咨询单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：


(签字)



(签字)

地址：深圳市南山区前海路爱心大厦
12-14楼

地址：深圳市南山区光彩新天地13楼
B1

统一社会信用代码：12440305634798694R

统一社会信用代码：91440300MA5G3BJ913

开户银行：中国民生银行深圳南山支行

账号：161580387

签订日期：

联系人及

2023年6月9日

联系方式：戴光玉/150 1247 2380



建安工程 预算造价书

工程名称：220kV研创变电站两通一平树木迁移砍伐工程

建设单位：南山区建筑工务署

建筑面积：

结构特征：

工程造价：2416817.82元

单位造价：

金额大写：贰佰肆拾壹万陆仟捌佰壹拾柒元捌角贰分

编制单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司

编制人：栢华健

资格证号：

复核人：汤怀平

资格证号

主管：王炎武



日期：二〇二三年十一月一日



项目负责人近 5 年类似全过程造价咨询服务业绩一览表

序号	项目名称	合同价 (万元)	项目所在地	工程决(结) 算的造价书封 面所载明的日 期
1	创业路科苑南路人行天桥全过程造价咨询	110.78	南山区	2024.4.12
2	桃源中学改扩建工程项目全过程造价咨询	271.30	南山区	进行中
3	中山大学深圳产学研大楼东北侧地块建设羽毛球馆项目-全过程造价咨询	56.8	南山区	进行中
4	麒麟山庄安全隐患整治环境提升项目全过程造价咨询	47.73	南山区	2024.6.11
5	跨后海滨路天桥二期建设项目全过程造价咨询	33.58	南山区	2023.12.7
6	田厦社康中心升级社区医院改造工程全过程造价咨询服务	10.68	南山区	2023.12.25
7	峰景社康中心改造项目全过程造价咨询	7.81	南山区	2024.1.30
8	区医疗集团总部金众麒麟公馆社区健康服务站改造工程全过程造价咨询服务	5.40	南山区	2024.1.30
9	220kV 研创变电站两通一平工程全过程造价咨询	4.9	南山区	2023.11.1



业绩证明:

1、创业路科苑南路人行天桥全过程造价咨询

中标通知书

标段编号: 2201-440305-04-01-907733002001

标段名称: 创业路科苑南路人行天桥全过程造价咨询

建设单位: 深圳市南山区建筑工务署

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市三合和工程项目管理有限公司

中标价: 110.78万元

中标工期: 按招标文件执行

项目经理(总监):

本工程于 2023-07-11 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2023-08-16 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2023-08-17

查验码: 4256293398673329 查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>



正本

合同编号：2023S419005

深圳市南山区建筑工务署建设工程
全过程造价咨询合同
(修订稿)

工程名称：创业路科苑南路人行天桥

工程地点：深圳市南山区

委托单位：深圳市南山区建筑工务署

咨询单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司





委托单位（甲方）：深圳市南山区建筑工务署

咨询单位（乙方）：深圳市三合和工程项目管理有限公司

甲方于2023年08月采用公开招标方式确定乙方为创业路科苑南路人行天桥工程全过程造价咨询工作中标单位。按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程全过程造价咨询工作协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：创业路科苑南路人行天桥

2. 工程概况：项目位于南山区后海中心区，中轴景观桥起于创业路中轴景观绿化带，跨越科苑南路，与深圳湾文化广场中央草坪活动区连接，长约 219 米。中轴景观桥两侧修建腾创、恒大连桥，腾创连桥长约 40 米；恒大连桥长约 20 米。工程内容主要包括桥梁、交通、给排水、通讯、电力、防雷、管线、景观、照明等工程。

3. 工程投资：14383 万元

二、乙方工作内容

本工程全过程造价咨询合同工作内容包括但不限于：概算编制或审核、施工阶段全过程造价控制（招标工程量清单编制开始到工程结算审核的造价咨询服务）、竣工决算编制等全过程造价咨询。工作内容包括但不限于如下方面：

（一）概算编制或审核阶段咨询工作内容

1. 编制或审核概算，出具书面工程概算书或工程概算审核报告。
2. 协助甲方完成工程概算评审工作。
3. 进行报送工程概算和批复概算的对比分析并出具书面分析报告，提出批复概算中未包含的工程内容，以及下一步造价控制中应注意的事项。

（二）施工阶段全过程造价控制咨询工作内容

1. 工程量清单编制、标底编制阶段造价咨询工作内容



应从造价咨询角度对甲方提交的图纸等相关资料进行全面会审复核并在 1~3 天提出书面的复核意见。并根据项目的不同情况，须针对性地组织安排对现场的核实与了解工作。

11. 若甲方连续三次通知分派任务，乙方均未参加，甲方将有权拒绝其参加其他任何项目并要求乙方承担违约责任。

12. 乙方若在工作中出现重大工作失误，甲方将有权收回该项目并委托他人完成。

13. 乙方参与本项目的工作人员若与本项目承包单位的员工有亲属关系或存在其他利害关系的，必须主动提出回避，若被甲方发现，将记入不良履约行为记录并承担违约责任。

14. 乙方应自行准备造价审核的办公场所、用品、设备、软件及国家、部委、省市颁布的有关定额及工程造价规定。

15. 未经甲方书面同意，乙方不得部分转让其应履行的合同义务。任何情况下，乙方不得转包本合同的义务，否则甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。

16. 乙方应安排至少 1 名固定的工作人员负责与甲方对接工作，汇总工作进度及问题，乙方应确保对接人员的稳定，如必要情况下必须更换需提前至少一周书面通知甲方，并做好工作交接。甲方有权观察并评估乙方服务团队主要人员的工作能力和表现，并有权要求乙方及时替换工作表现不佳的人员。

九、 合同价、支付方式及结算方式

(一) 合同价

本项目全过程造价咨询服务酬金暂定为人民币：壹佰壹拾万零柒仟捌佰元整（大写），即 RMB 110.78 万元（含税价）。

全过程造价咨询费用计费规则：取费参照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》（深价协〔2017〕14号）计取，下浮率按 20% 执行。计算过程如下：

1. 工程概算编制或审核阶段咨询服务酬金 $A1 = 14.192$ 万元（暂定）。

其中：基本酬金 $B1 = A1 \times 80\%$ ；绩效酬金 $C1 = A1 \times 20\%$ 。

2. 施工阶段全过程造价控制咨询服务酬金 $A2 = 93.824$ 万元（暂定）。

其中：基本酬金 $B2 = A2 \times 80\%$ ；绩效酬金 $C2 = A2 \times 20\%$ 。



3. 工程竣工决算编制审核咨询服务酬金 $A_3 = 2.76$ 万元(暂定)。其中:
基本酬金 $B_3 = A_3 \times 80\%$; 绩效酬金 $C_3 = A_3 \times 20\%$ 。

4. 全过程造价咨询服务酬金合计暂定 A : $A = A_1 + A_2 + A_3 = 110.78$ 万元。其中:
基本酬金合计暂定 $B = B_1 + B_2 + B_3$; 绩效酬金合计暂定 $C = C_1 + C_2 + C_3$ 。

5. 计算本项目施工阶段全过程造价咨询费用时,若乙方未核对设计变更和现场签证、未复核工程进度款支付等,则应分阶段进行取费,分为预算编制(审核)和结算审核两个阶段进行取费。

6. 结算绩效收费不能高于基本收费,决算编制计费基数为扣除建安费之外的其他费为决算额计取;最终咨询服务费执行合同计费规则及下浮率,以区造价站质量复核结论为准。

7. 咨询酬金包含乙方为完成本咨询服务所发生的一切费用。乙方的人员工资、福利费、工会经费、教育经费、养老保险、住房公积金、办公费、差旅费、通讯费、交通费、加班费、医疗费、现场补贴、公司管理费、各种税费保险、现场必备的检测设备、办公用品和交通工具合理的购置及使用费用和现场的住宿费、电话费、外出考察费、保险费、返工费以及按照甲方要求进行的补充、修改、完善等为完成本咨询服务所需的全部费用均含在此合同价内。

(二) 支付方式

1. 概算编制或审核费用支付



概算通过政府主管部门审查批复,乙方向甲方提出书面付款申请且甲方完成当期节点履约评价后,甲方支付工程概算编制或审核阶段咨询服务酬金的基本酬金 $B_1 \times 100\% +$ 绩效酬金 $C_1 \times$ 当期节点履约评价支付比例 - 当期违约金(赔偿金)。计费基数为批复概算价。

2. 施工阶段全过程造价控制咨询费用支付

(1) 标底、工程量清单编制费用支付

标底经区造价站审定,完成招标及协助甲方完成施工合同签订后,乙方向甲方提出书面付款申请,甲方支付施工阶段全过程造价控制咨询服务酬金的基本酬金 $B_2 \times 30\% +$ 绩效酬金 $C_2 \times 30\% \times$ 当期节点履约评价支付比例 - 当期违约金(赔偿金)。计费基数为批复概算价。



委托单位：深圳市南山区建筑工务署  (公章)	咨询单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  (签字)	法定代表人或其委托代理人：  (签字)
地址：深圳市南山区前海路爱心大厦 12-14 楼	地址：深圳市南山区南头街道大汪山社 区南山大道 2068 号南侨花园住宅楼 G 栋 502
统一社会信用代码：12440305634798694R	统一社会信用代码：91440300MA5G3BJ913
	开户银行：中国民生银行深圳南山支行 账号：161580387
签订日期： 2023 年 8 月 30 日	联系人及 联系方式：戴光玉 15012472380



初步设计概算书

工程名称: 创业路科苑南路人行天桥项目

建设单位: 深圳市南山区建筑工务署

代建单位: 华润置地城市运营管理(深圳)有限公司

设计单位: 林同棧国际工程咨询(中国)有限公司

工程造价: 人民币(大写)壹亿零玖佰肆拾捌万柒仟柒佰贰拾肆元贰角叁分
(¥109487724.23元)

编制单位:



林同棧国际工程咨询
(中国)有限公司
(单位盖章)

复核单位:



深圳市三合和工程项目
管理有限公司
(单位公章/资质专用章)

编制人:

陈松柏
(造价人员签字专用章)

复核人:



王彦彦
B11014400010256
深圳市三合和工程项目管理
有限公司
有效期至:2025年12月31日

编制时间:

复核时间:



深圳市南山区工程造价管理站

(预算、标底)

编号: 标2024105改

2201-440305-04-01-907733

工程造价审定书

工程名称: 创业路科苑南路人行天桥工程施工总承包

建设单位: 深圳市南山区建筑工务署

咨询单位: 深圳市三合和工程项目管理有限公司

代建单位: 华润置地城市运营管理(深圳)有限公司

建设单位报送造价: 67,551,481.99 元

单位造价:

区造价站审定造价: 64,310,517.86 元

单位造价:

核 减 额: 3,240,964.13 元

安全文明施工措施费: 2,145,058.88 元

暂列金额: 5,300,000.00 元

主 审 人: 李仕能 李琪胜

总 审: 刘良荣

复 核 人: 贺小勇

副 站 长: 刘良荣

审核组组长: 贺小勇

站 长: 刘良荣

建设单位报送日期:

区造价站审定日期: 2024年8月2日



2、桃源中学改扩建工程项目全过程造价咨询

中标通知书

标段编号：2212-440305-04-01-830293002001

标段名称：桃源中学改扩建工程项目全过程造价咨询

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司

中标价：271.30万元

中标工期：按招标文件要求执行

项目经理(总监)：

本工程于 2023-08-11 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，于 2023-09-27 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

赵伟强


招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-10-26





合同编号：2022F175006

深圳市南山区建筑工务署建设工程 全过程造价咨询合同

工程名称：桃源中学改扩建工程项目全过程造价咨询

工程地点：深圳市南山区龙珠大道49号

委托单位：深圳市南山区建筑工务署

咨询单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司



合同编号：2022F175006

深圳市南山区建筑工务署建设工程 全过程造价咨询合同

工程名称：桃源中学改扩建工程项目全过程造价咨询

工程地点：深圳市南山区龙珠大道49号

委托单位：深圳市南山区建筑工务署

咨询单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司



委托单位（甲方）：深圳市南山区建筑工务署

咨询单位（乙方）：深圳市三合和工程项目管理有限公司

甲方于 2023 年 9 月采用公开招标方式确定乙方为桃源中学改扩建工程项目全过程造价咨询工程全过程造价咨询工作中标单位。按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程全过程造价咨询工作协商一致，订立本合同。

一、 工程概况

1. 工程名称：桃源中学改扩建工程项目全过程造价咨询

2. 工程概况：项目位于深圳市南山区龙珠大道 49 号。桃源中学建于1999年，现有 24 班，建筑面积 13053 平方米。本项目拟将桃源中学由 24 班扩建至 48 班、2400 个学位的标准中学，总占地面积 19861 平方米，改扩建后总建筑面积 57028 平方米，主要建设内容包括：（一）新建工程：新建建筑面积 43975 平方米，包括教学综合楼、地下车库（面积 9390 平方米）、教职工宿舍（面积 3185 平方米）、体育馆、报告厅、立体运动场等，功能主要设为普通教室、机动教室、专业教室、公共教学用房、办公用房、食堂、教职工宿舍、地下车库、游泳池、篮球场、报告厅、设备用房、架空层、跑道等。（二）改造工程：对原有建筑整体改造，总改造建筑面积 13053 平方米，改造内容包括室内装饰、安装、外立面等，改造后功能设为专业教室、图书馆、行政办公室等。

3. 工程投资：38816 万元

二、 乙方工作内容

本工程全过程造价咨询合同工作内容包括但不限于：概算编制或审核、施工阶段全过程造价控制（招标工程量清单编制开始到工程结算审核的造价咨询服务）、竣工决算编制等全过程造价咨询。工作内容包括但不限于如下方面：

（一） 概算编制或审核阶段咨询工作内容



1. 编制或审核概算，出具书面工程概算书或工程概算审核报告。
2. 协助甲方完成工程概算评审工作。
3. 进行报送工程概算和批复概算的对比分析并出具书面分析报告，提出批复概算中未包含的工程内容，以及下一步造价控制中应注意的事项。

(二) 施工阶段全过程造价控制咨询工作内容

1. 工程量清单编制、标底编制阶段造价咨询工作内容

- (1) 编制工程预算。
- (2) 协助甲方审核招标文件和设计图纸。
- (3) 编制工程量清单及标底，计算标准工期，并提供综合单价分析表、措施费项目分析表、主要材料设备的数量、价格(包括暂定价)清单及定价依据；按甲方要求到现场踏勘。
- (4) 协助甲方完成标底、预算审核工作，进行报送标底、预算和批复概算、审定标底、预算的对比分析，说明报送标底、预算和批复概算、审定标底、预算的差额原因，以及下一步造价控制中应注意的事项。

2. 施工(含施工准备)阶段造价咨询工作内容

- (1) 协助甲方进行招投标答疑。
- (2) 本工程公开招标的标段，如施工招标等，乙方需对评标报告进行复核、对投标文件进行清标，并出具书面签字确认的清标报告。
- (3) 按照项目施工招标文件要求复核和修正中标候选人的商务标，并出具详细的造价分析报告；核对中标人投标文件商务标电子版并打印纸质文件。
- (4) 协助甲方审核、签订各类工程合同。
- (5) 参与图纸会审并提出合理化建议。
- (6) 施工过程中，参与工程量计量及工程进度款支付的复核工作。
- (7) 及时按甲方要求进行工程变更及现场签证的计量、计价审核；根据甲方需要对现场拟进行工程变更及现场签证的工程费用进行预评估，并在甲方要求时间范围内提供书面报告；根据政府规定配合甲方及时报审工程变更。
- (8) 参与工程暂定价定价工作，并根据甲方要求出具书面报告。
- (9) 施工合同及工程相关合同争议的鉴定与索赔等，并根据甲方要求出



该工程全过程造价控制情况；直接与甲方进行工作对接；根据甲方的需要及安排参加项目工程例会，未经甲方同意不得缺席。

10. 工程概算、预算及结算的编制（含暂定价、工程变更等）或审核前，应从造价咨询角度对甲方提交的图纸等相关资料进行全面会审复核并在 1~3 天提出书面的复核意见。并根据项目的不同情况，须针对性地组织安排对现场的核实与了解工作。

11. 若甲方连续三次通知分派任务，乙方均未参加，甲方将有权拒绝其参加其他任何项目并要求乙方承担违约责任。

12. 乙方若在工作中出现重大工作失误，甲方将有权收回该项目并委托他人完成。

13. 乙方参与本项目的工作人员若与本项目承包单位的员工有亲属关系或存在其他利害关系的，必须主动提出回避，若被甲方发现，将记入不良履约行为记录并承担违约责任。

14. 乙方应自行准备造价审核的办公场所、用品、设备、软件及国家、部委、省市颁布的有关定额及工程造价规定。

15. 未经甲方书面同意，乙方不得部分转让其应履行的合同义务。任何情况下，乙方不得转包本合同的义务，否则甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。

16. 乙方应安排至少 1 名固定的工作人员负责与甲方对接工作，汇总工作进度及问题，乙方应确保对接人员的稳定，如必要情况下必须更换需提前至少一周书面通知甲方，并做好工作交接。甲方有权观察并评估乙方服务团队主要人员的工作能力和表现，并有权要求乙方及时替换工作表现不佳的人员。

九、 合同价、支付方式及结算方式

（一）合同价

本项目全过程造价咨询服务酬金暂定为人民币： 贰佰柒拾壹万叁仟元整（大写），即 RMB 271.30 万元（含税价）。

全过程造价咨询费用计费规则：取费参照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》（深价协〔2017〕14 号）计取，下浮率按 20% 执行。计算过程如下：



(1)、工程概算的编制或审核： $100*2\%+400*1.8\%+500*1.6\%+4000*1.3\%+5000*1.2\%+28816*1.1\%=44.62$ （万元）

(2)、施工阶段全过程造价控制： $100*12\%+400*11\%+500*10\%+4000*9\%+5000*8\%+28816*7\%=288.3$ （万元）

(3)、工程竣工决算编制： $100*2\%+400*1.4\%+500*1.1\%+4000*1\%+1000*0.9\%=6.21$ （万元）

合计费用： $44.62+288.3+6.21=339.13$ （万元），下浮 20%后费用为：271.30（万元）

1. 工程概算编制或审核阶段咨询服务酬金 $A1=35.70$ 万元（暂定）。其中：基本酬金 $B1=A1*80\%$ ；绩效酬金 $C1=A1*20\%$ 。

2. 施工阶段全过程造价控制咨询服务酬金 $A2=230.64$ 万元（暂定）。其中：基本酬金 $B2=A2*80\%$ ；绩效酬金 $C2=A2*20\%$ 。

3. 工程竣工决算编制审核咨询服务酬金 $A3=4.97$ 万元（暂定）。其中：基本酬金 $B3=A3*80\%$ ；绩效酬金 $C3=A3*20\%$ 。


4. 全过程造价咨询服务酬金合计暂定 A ： $A=A1+A2+A3=271.30$ 万元。其中：基本酬金合计暂定 $B=B1+B2+B3$ ；绩效酬金合计暂定 $C=C1+C2+C3$ 。

5. 计算本项目施工阶段全过程造价咨询费用时，若乙方未核对设计变更和现场签证、未复核工程进度款支付，则应分阶段进行取费，分为预算编制（审核）和结算审核两个阶段进行取费。

6. 结算绩效收费不能高于基本收费，决算编制计费基数为扣除建安费之外的其他费为决算额计取；最终咨询服务费执行合同计费规则及下浮率，以区造价站质量复核结论为准。

7. 咨询酬金包含乙方为完成本咨询服务所发生的一切费用。乙方的人员工资、福利费、工会经费、教育经费、养老保险、住房公积金、办公费、差旅费、通讯费、交通费、加班费、医疗费、现场补贴、公司管理费、各种税费保险、现场必备的检测设备、办公用品和交通工具合理的购置及使用费用和现场的住宿费、



委托单位：深圳市南山区建筑工务署  (公章)	咨询单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  (签字)	法定代表人或其委托代理人：  (签字)
地址：深圳市南山区前海路爱心大厦 12-14 楼	地址：深圳市南山区南头街道大汪山社区南山大道 2068 号南侨花园住宅楼 G 栋 502
统一社会信用代码：12440305634798694R	统一社会信用代码：91440300MA563BJ913
	开户银行：中国民生银行深圳南山支行 账号：161580387
签订日期： 2023 年 10 月 11 日	联系人及：戴光玉 联系方式：15012472380



3、中山大学深圳产学研大楼东北侧地块建设羽毛球馆项目-全过程造价咨询

中标通知书

工程编号：NSGWS20240909009

工程名称：中山大学深圳产学研大楼东北侧地块建设羽毛球馆项目

招标工程名称：中山大学深圳产学研大楼东北侧地块建设羽毛球馆项目-全过程造价咨询

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

中标单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司

中标金额：56.800000（万元）


备注信息：最终结算价超过50万元需下浮10%，最终结算价不得超过99.8万元。

本工程于 2024年9月9日 09:00 在南山区政府网站进行公开招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 10 日内按照招标公告和招标人签订本项目的发包合同，如为代建项目中标人则需和代建单位签订合同。

招标人（盖章）：

日期：2024年9月24日



合同编号: 2024F238003

深圳市南山区建筑工务署建设工程 全过程造价咨询合同

工程名称: 中山大学深圳产学研大楼东北侧地块建设羽
毛球馆项目

合同名称: 中山大学深圳产学研大楼东北侧地块建设羽
毛球馆项目全过程造价咨询合同

委托单位: 深圳市南山区建筑工务署

咨询单位: 深圳市三合和工程项目管理有限公司





委托单位（甲方）：深圳市南山区建筑工务署

咨询单位（乙方）：深圳市三合和工程项目管理有限公司

经南山区建筑工务署小型建设工程交易及履约评价管理系统公开招标，确定乙方为中山大学深圳产学研大楼东北侧地块建设羽毛球馆项目全过程造价咨询工作中标单位。按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程全过程造价咨询工作协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：中山大学深圳产学研大楼东北侧地块建设羽毛球馆项目

2. 工程概况：项目位于粤兴四道东侧，粤兴四道与粤兴三道交界处的北侧，为临时用地，现状为停车场及临时建筑，用地面积为6098.20 平方米。场地毗邻深圳虚拟大学园院校产业化综合楼、中山大学深圳产学研大楼、湾区创新大厦、华中科技大学深圳产学研基地大楼、南京大学深圳产学研基地。主要建设内容包括：新建一栋地上两层羽毛球综合馆，1 层为停车库，2 层及夹层为羽毛球区；配套建设岗亭、绿化景观、道路广场（地面停车场）、化粪池等设施。

3. 工程投资：项目估算为 6091 万元。其中建安工程费 4828 万元，工程建设其他费 627 万元，预备费 436 万元，开办费 200 万元。（深南发改批〔2024〕324 号）

二、乙方工作内容

本工程全过程造价咨询合同工作内容包括但不限于：概算审核、施工阶段全过程造价控制（招标工程量清单编制开始到工程结算审核的造价咨询服务）、竣工决算编制等全过程造价咨询。工作内容包括但不限于如下方面：

（一）概算审核阶段咨询工作内容



前，应从造价咨询角度对甲方提交的图纸等相关资料进行全面会审复核并在1~3天提出书面的复核意见。并根据项目的不同情况，须针对性地组织安排对现场的核实与了解工作。

11. 若甲方连续三次通知分派任务，乙方均未参加，甲方将有权拒绝其参加其他任何项目并要求乙方承担违约责任。

12. 乙方若在工作中出现重大工作失误，甲方将有权收回该项目并委托他人完成。

13. 乙方参与本项目的工作人员若与本项目承包单位的员工有亲属关系或存在其他利害关系的，必须主动提出回避，若被甲方发现，将记入不良履约行为记录并承担违约责任。

14. 乙方应自行准备造价审核的办公场所、用品、设备、软件及国家、部委、省市颁布的有关定额及工程造价规定。

15. 未经甲方书面同意，乙方不得部分转让其应履行的合同义务。任何情况下，乙方不得转包本合同的义务，否则甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。

16. 乙方应安排至少1名固定的工作人员负责与甲方对接工作，汇总工作进度及问题，乙方应确保对接人员的稳定，如必要情况下必须更换需提前至少一周书面通知甲方，并做好工作交接。甲方有权观察并评估乙方服务团队主要人员的工作能力和表现，并有权要求乙方及时替换工作表现不佳的人员。

九、合同价、支付方式及结算方式

(一) 合同价

本项目全过程造价咨询服务酬金暂定为人民币：伍拾陆万捌仟元整（大写），即RMB 568000.00元（含税价）。按甲方的履约评价管理办法，本酬金由基本酬金与绩效酬金两部分组成，其中基本酬金占90%，绩效酬金占10%。

全过程造价咨询费用计费规则：取费参照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》（深价协（2017）14号）计取。按照《南山区建筑工务署小型建设工程招标投标暂行办法（第一次修订版）》（2022年3月）的规定：造价咨询合同额在50万以上上浮10%（但概算审核阶段需在此基础上再上浮20%），在50万以下不下浮（但概算审核阶段需下浮20%），且最低价为3000元。计算过



程如下:

本项目投资匡算(或估算) 6091 万元, 建安工程费为 4828 万元。

1. 工程概算审核阶段咨询服务酬金

$A1 = (100 \times 0.2\% + (500 - 100) \times 0.18\% + (1000 - 500) \times 0.16\% + (5000 - 1000) \times 0.13\% + (6091 - 5000) \times 0.12\%) \times (1 - 20\%) \times (1 - 10\%) = 5.92$ 万元(暂定)。其中: 基本酬金 $B1 = A1 \times 90\%$; 绩效酬金 $C1 = A1 \times 10\%$ 。

2. 施工阶段全过程造价控制咨询服务酬金

$A2 = 100 \times 1.2\% + (500 - 100) \times 1.1\% + (1000 - 500) \times 1\% + (5000 - 1000) \times 0.9\% + (6091 - 5000) \times 0.8\% \times (1 - 10\%) = 49.79$ 万元(暂定)。其中: 基本酬金 $B2 = A2 \times 90\%$; 绩效酬金 $C2 = A2 \times 10\%$ 。

3. 工程竣工决算编制审核咨询服务酬金

$A3 = (100 \times 0.2\% + (500 - 100) \times 0.14\% + (6091 - 6091 \times 0.85 - 500) \times 0.11\%) \times (1 - 10\%) = 1.09$ 万元(暂定)。其中: 基本酬金 $B3 = A3 \times 90\%$; 绩效酬金 $C3 = A3 \times 10\%$ 。

4. 全过程造价咨询服务酬金合计暂定 A:

$A = A1 + A2 + A3 = 5.92 + 49.79 + 1.09 = 56.80$ 万元。其中: 基本酬金合计暂定 $B = B1 + B2 + B3$; 绩效酬金合计暂定 $C = C1 + C2 + C3$ 。

5. 咨询酬金包含乙方为完成本咨询服务所发生的一切费用。乙方的人工工资、福利费、工会经费、教育经费、养老保险、住房公积金、办公费、差旅费、通讯费、交通费、加班费、医疗费、现场补贴、公司管理费、各种税费保险、现场必备的检测设备、办公用品和交通工具合理的购置及使用费用和现场的住宿费、电话费、外出考察费、保险费、返工费以及按照甲方要求进行的补充、修改、完善等为完成本咨询服务所需的全部费用均含在此合同价内。



(二) 支付方式

1. 概算审核费用支付

概算通过政府主管部门审查批复, 乙方向甲方提出书面付款申请且甲方完成当期节点履约评价后, 甲方支付工程概算审核阶段咨询服务酬金的基本酬金 B1



(本页为《中山大学深圳产学研大楼东北侧地块建设羽毛球馆项目全过程造价咨询合同》的盖章页。)

 委托单位：深圳市南山区建筑工务署 (公章)	 咨询单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司 (公章)
法定代表人或其委托代理人：  (签字)	法定代表人或其委托代理人：  (签字)
地址：深圳市南山区前海路爱心大厦 12-14 楼	地址：深圳市南山区南头街道大汪山社 区南山大道 2068 号南侨花园住宅楼 G 栋 502
统一社会信用代码：12440305634798694R	统一社会信用代码：91440300MA563BJ913
	开户银行：中国民生银行深圳南山支行 账号：161580387
签订日期： 2024 年 10 月 14 日	联系人及 联系方式：戴光玉/15012472380



4、麒麟山庄安全隐患整治环境提升项目全过程造价咨询

正本

合同编号：2024S437002

深圳市南山区建筑工务署建设工程
全过程造价咨询合同

工程名称：麒麟山庄安全隐患整治环境提升项目

合同名称：麒麟山庄安全隐患整治环境提升项目
全过程造价咨询合同

委托单位：深圳市南山区建筑工务署

咨询单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司



委托单位（甲方）：深圳市南山区建筑工程署

咨询单位（乙方）：深圳市三合和工程项目管理有限公司

本项目为应急工程，甲方确定乙方为麒麟山庄安全隐患整治环境提升项目工程全过程造价咨询工作中标单位。按照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程全过程造价咨询工作协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：麒麟山庄安全隐患整治环境提升项目

2. 工程概况：麒麟山庄安全隐患整治环境提升项目位于深圳市南山区沁园路4599号，背靠麒麟山，面向天鹅湖，东南被麒麟山、野生动物园、西丽高尔夫球场和深圳大学城等环抱，占地范围约为77.7万平方米。本次安全隐患整治及环境提升范围包括：麒麟山庄九号楼、二号楼、三号楼、四号楼、五号楼的外立面翻新、室外配套设施设备换新，办公楼及三层楼的结构加固和翻新，山庄机动车道、人行道及室外停车场的翻新及配套设施设备换新，彩麟湖（麒麟苑旁）湖边栈道翻新及延长等。

3. 工程投资：初步匡算总投资为4985.68万元，建安费为4214.99万元（建筑提升约937.79万元，景观类提升约3277.2万元）。

二、乙方工作内容

本工程全过程造价咨询合同工作内容包括但不限于：概算审核、施工阶段全过程造价控制（招标工程量清单编制开始到工程结算审核的造价咨询服务）、竣工决算编制等全过程造价咨询。工作内容包括但不限于如下方面：

（一）概算审核阶段咨询工作内容

1. 审核概算，出具书面工程概算审核报告。
2. 协助甲方完成工程概算评审工作。
3. 进行报送工程概算和批复概算的对比分析并出具书面分析报告，提出批复



13. 乙方参与本项目的工作人员若与本项目承包单位的员工有亲属关系或存在其他利害关系的，必须主动提出回避，若被甲方发现，将记入不良履约行为记录并承担违约责任。

14. 乙方应自行准备造价审核的办公场所、用品、设备、软件及国家、部委、省市颁布的有关定额及工程造价规定。

15. 未经甲方书面同意，乙方不得部分转让其应履行的合同义务。任何情况下，乙方不得转包本合同的义务，否则甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。

16. 乙方应安排至少1名固定的工作人员负责与甲方对接工作，汇总工作进度及问题，乙方应确保对接人员的稳定，如必要情况下必须更换需提前至少一周书面通知甲方，并做好工作交接。甲方有权观察并评估乙方服务团队主要人员的工作能力和表现，并有权要求乙方及时替换工作表现不佳的人员。

九、合同价、支付方式及结算方式

(一) 合同价

本项目全过程造价咨询服务酬金暂定为人民币：肆拾柒万柒仟叁佰捌拾元整（大写），即 RMB 477380.00 元（含税价）。按甲方的履约评价管理办法，本酬金由基本酬金与绩效酬金两部分组成，其中基本酬金占 90%，绩效酬金占 10%。

全过程造价咨询费用计费规则：取费参照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》（深价协〔2017〕14号）计取，上下浮率分阶段设置，在100万以上上下浮20%（但概算审核阶段需在此基础上再下浮30%），在50万以上上下浮10%（但概算审核阶段需在此基础上再下浮20%），在50万以下不下浮（但概算审核阶段需下浮20%）。计算过程如下：

本项目投资匡算（或估算）暂定为 4985.68 万元，建安工程费暂定为 4214.99 万元。

1. 工程概算审核阶段咨询服务酬金 $A1 = (100 \times 2\% + (500 - 100) \times 1.8\% + (1000 - 500) \times 1.6\% + (4985 - 1000) \times 1.3\%) \times (1 - 20\%) = 5.5204$ 万元（暂定），其中：基本酬金 $B1 = A1 \times 90\%$ ；绩效酬金 $C1 = A1 \times 10\%$ 。



2. 施工阶段全过程造价控制咨询服务酬金 $A_2=100 \times 12\% + (500-100) \times 11\% + (1000-500) \times 10\% + (4985-1000) \times 9\% = 46.465$ 万元（暂定）。其中：基本酬金 $B_2=A_2 \times 90\%$ ；绩效酬金 $C_2=A_2 \times 10\%$ 。

3. 工程竣工决算编制审核咨询服务酬金 $A_3=100 \times 2\% + (500-100) \times 1.4\% + (4985-4215-500) \times 1.1\% = 1.057$ 万元（暂定）。其中：基本酬金 $B_3=A_3 \times 90\%$ ；绩效酬金 $C_3=A_3 \times 10\%$ 。

4. 全过程造价咨询服务酬金合计暂定 A： $A=A_1+A_2+A_3=(5.5204+46.465+1.057) \times (1-10\%) = 47.738$ 万元。其中：基本酬金合计暂定 $B=B_1+B_2+B_3$ ；绩效酬金合计暂定 $C=C_1+C_2+C_3$ 。

5. 咨询酬金包含乙方为完成本咨询服务所发生的一切费用。乙方的人员工资、福利费、工会经费、教育经费、养老保险、住房公积金、办公费、差旅费、通讯费、交通费、加班费、医疗费、现场补贴、公司管理费、各种税费保险、现场必备的检测设备、办公用品和交通工具合理的购置及使用费用和现场的住宿费、电话费、外出考察费、保险费、返工费以及按照甲方要求进行的补充、修改、完善等为完成本咨询服务所需的全部费用均含在此合同价内。

（二）支付方式

1. 概算审核费用支付

概算通过政府主管部门审查批复，乙方向甲方提出书面付款申请且甲方完成当期节点履约评价后，甲方支付工程概算审核阶段咨询服务酬金的基本酬金 $B_1 \times 100\% +$ 绩效酬金 $C_1 \times$ 当期节点履约评价支付比例 - 当期违约金（赔偿金）。计费基数为批复概算总投资。


2. 施工阶段全过程造价控制咨询费用支付

（1）标底、工程量清单编制费用支付

标底经区造价站审定，完成招标及协助甲方完成施工合同签订后，乙方向甲方提出书面付款申请，甲方支付施工阶段全过程造价控制咨询服务酬金的基本酬金 $B_2 \times 30\% +$ 绩效酬金 $C_2 \times 30\% \times$ 当期节点履约评价支付比例 - 当期违约金（赔偿金）。计费基数为造价站审定标底。

若项目以单项工程报送标底或预算，则以每次造价站审定的单项工程的标底



委托单位：深圳市南山区建筑工务署  (公章)	咨询单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  (签字)	法定代表人或其委托代理人：  (签字)
地址：深圳市南山区前海路爱心大厦 12-14楼	地址：南山区光彩新天地 13楼 B1
统一社会信用代码：12440305634798694R	统一社会信用代码：91440300MA563BJ913
	开户银行：中国民生银行深圳南山支行
	账号：161580387
签订日期： 2024年4月19日	联系人及 联系方式：戴光玉/15012472380



建安工程概算造价书

工程名称：麒麟山庄安全隐患整治环境提升项目

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

工程造价：48481989.79元 单位造价：

金额大写：肆仟捌佰肆拾捌万壹仟玖佰捌拾玖元柒角玖分

编制单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司

编制人：吴廷廷

资格证号：

复核人：余丽芸

资格证号

主管：王炎武





建安工程 预算造价书

工程名称：麒麟山庄安全隐患整治环境提升项目

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

工程造价：41301277.38元 单位造价：

金额大写：肆仟壹佰叁拾万壹仟贰佰柒拾柒元叁角捌分

编制单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司



编制人：崔梅

资格证号：

复核人：余丽蓉

资格证号：



主管：王炎武



本项为隐蔽项目 本工程造价经审核核算。
林伟 2028.11.6



5、跨后海滨路天桥二期建设项目全过程造价咨询

中标通知书

工程编号：NSGWS20230621002

工程名称：跨后海滨路天桥二期建设项目全过程造价咨询

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

中标单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司

中标金额：33.578000（万元）

备注信息：最终结算价超过50万元需下浮10%，最终结算价不得超过99.8万元。

本工程于 2023年6月21日 09:00 在南山区政府网站进行公开招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 10 日内按照招标公告和招标人签订本项目的发包合同。

招标人（盖章）：

日期：2023年6月28日





合同编号: 2018SS236001

跨后海滨路天桥二期建设项目
全过程造价咨询合同



委托单位: 深圳市南山区建筑工务署

咨询单位: 深圳市三合和工程项目管理有限公司



委托单位（甲方）：深圳市南山区建筑工务署

咨询单位（乙方）：深圳市三合和工程项目管理有限公司

经南山区建筑工务署小型建设工程交易及履约评价管理系统公开招标，确定乙方为跨后海滨路天桥二期建设项目工程全过程造价咨询工作中标单位。按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程全过程造价咨询工作协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：跨后海滨路天桥二期建设项目

2. 工程概况：跨后海滨路天桥位于南山区粤海街道后海滨路与海德二道相交处，全长约70m，宽为12m，主要功能为连接后海滨路西侧的深圳湾大街及东侧的深圳湾大街东延段。

3. 工程投资：总投资 2997 万元（估）（深南发改〔2019〕6 号）

二、乙方工作内容

本工程全过程造价咨询合同工作内容包括但不限于：概算编制或审核、施工阶段全过程造价控制（招标工程量清单编制开始到工程结算审核的造价咨询服务）、竣工决算编制等全过程造价咨询。工作内容包括但不限于如下方面：

（一）概算编制或审核阶段咨询工作内容

1. 编制或审核概算，出具书面工程概算书或工程概算审核报告。
2. 协助甲方完成工程概算评审工作。
3. 进行报送工程概算和批复概算的对比分析并出具书面分析报告，提出批复概算中未包含的工程内容，以及下一步造价控制中应注意的事项。

（二）施工阶段全过程造价控制咨询工作内容

1. 工程量清单编制、标底编制阶段造价咨询工作内容

（1）编制工程预算。



(一) 合同价

本项目全过程造价咨询服务酬金暂定为人民币：叁拾叁万伍仟柒佰捌拾元整（大写），即 RMB 335780.00 元（含税价）。

全过程造价咨询费用计费规则：取费参照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》（深价协（2017）14号）计取。按照《南山区建筑工务署小型建设工程招标投标暂行办法（第一次修订版）》（2022年3月）的规定：造价咨询合同额在50万以上上浮10%，在50万以下不下浮，且最低价为3000元。计算过程如下：

1. 工程概算编制或审核阶段咨询服务酬金 A1

$=1000000*2/1000+4000000*1.8/1000+5000000*1.6/1000+(29970000-10000000)*1.3/1000 = 43161.00$ 元（暂定）。其中：基本酬金 $B1=A1*80%$ ；绩效酬金 $C1=A1*20%$ 。

2. 施工阶段全过程造价控制咨询服务酬金 A2

$=1000000*12/1000+4000000*11/1000+5000000*10/1000+(29970000-10000000)*9/1000 = 285730.00$ 元（暂定）。其中：基本酬金 $B2=A2*80%$ ；绩效酬金 $C2=A2*20%$ 。


3. 工程竣工决算编制审核咨询服务酬金 A3

$=[(29970000-29970000*0.85)-1000000]*1.4/1000+1000000*2/1000=6893.70$ 元（暂定）。其中：基本酬金 $B3=A3*80%$ ；绩效酬金 $C3=A3*20%$ 。

4. 全过程造价咨询服务酬金合计暂定 A： $A=A1+A2+A3= 335784.70$ 元 ≈ 335780.00 元。其中：基本酬金合计暂定 $B=B1+B2+B3$ ；绩效酬金合计暂定 $C=C1+C2+C3$ 。

5. 计算本项目施工阶段全过程造价咨询费用时，若乙方未核对设计变更和现场签证、未复核工程进度款支付等，则应分阶段进行取费，分为预算编制（审核）和结算审核两个阶段进行取费。



委托单位：深圳市南山区建筑工务署  (公章)	咨询单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  (签字)	法定代表人或其委托代理人：  (签字)
地址：深圳市南山区前海路爱心大厦 12-14楼	地址：深圳市南山区南头街道大汪山社区 南山大道2068号南侨花园住宅楼G栋 502
统一社会信用代码：12440305634798694R	统一社会信用代码：91440300MA5G3BI913
	开户银行：中国民生银行深圳南山支行
	账号：161580387
签订日期： 2023年6月30日	联系人及 联系方式：戴光玉 15012472380



市政工程 招标控制价

工程名称：跨后海滨路天桥（二期）项目地铁安全影响评估

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

工程造价：184200.00元

金额大写：壹拾捌万肆仟贰佰元整

编制单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司



编制人：林廷弘

资格证号：

复核人：汤怀平

资格证号：

主管：王炎武



日期：二〇二三年八月二十一日



工程预算书

工程名称：跨前海滨路天桥（二期）工程施工总承包

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

工程造价：25615697.10(元)

工程造价（大写）：贰仟伍佰陆拾壹万伍仟陆佰玖拾柒元壹角

编制单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司

编制人：栢华集 资格证号：

复核人：汤小祥 资格证号：

主管：王炎武



日期：2023年12月07日



深圳市南山区工程造价管理站

(预算、标底)

编号: 标2024005

2014-440305-78-01-701653

工程造价审定书

工程名称: 跨前海滨路天桥(二期)施工总承包工程

建设单位: 深圳市南山区建筑工务署

咨询单位: 深圳市三合和工程项目管理有限公司

代建单位: 华润(深圳)有限公司

建设单位报送造价: 25,615,697.10 元

单位造价:

区造价站审定造价: 24,385,272.90 元

单位造价:

核 减 额 : 1,230,424.20 元

安全文明施工费: 577,347.97 元

暂列金额: 1,380,000.00 元

主 审 人: 张明远 何建胜

总 审: 刘良京

复 核 人: 1

副 站 长: 刘良京

审核组组长: 贺小勤

站 长: 刘良京

建设单位报送日期:

区造价站审定日期: 2024年1月26日



6、田厦社康中心升级社区医院改造工程全过程造价咨询服务

合同编号：2022F153001

**田厦社康中心升级社区医院改造工程
全过程造价咨询服务合同**

甲方：深圳市南山区建筑工务署

乙方：深圳市三合和工程项目管理有限公司





甲方：深圳市南山区建筑工务署

乙方：深圳市三合和工程项目管理有限公司

经南山区建筑工务署小型建设工程交易及履约评价管理系统公开招标，确定乙方为田厦社康中心升级社区医院改造工程造价咨询中标单位。按照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程造价咨询工作协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：田厦社康中心升级社区医院改造工程

2、工程概况：项目位于深圳市南山区南新路2030-19号（福祥阁沿街商业-2F），拟对田厦社康中心进行升级改造为社区医院，总改造面积约859平方米。建设内容包括对首层社康中心旧址进行拆除，改造为社区医院发热门诊和住院区，增加病床30床，重新规划平面布局，改造面积为478.55平方米；对二层局部用房进行装修改造，以满足社区医院的功能要求，改造面积为380.83平方米；对建筑物一、二层外立面统一翻新；对一、二层整体智能化系统设备设施进行升级改造等。

主要改造内容包括：拆除、装饰、外立面、给排水、智能化、电气、通风空调、消防、电梯等。

3、工程投资：项目投资匡算为768万元，其中建安工程费621万元（深南发改批[2021]454号）。

二、乙方工作内容

本工程全过程造价咨询服务内容包括但不限于：概算编制或审核、招标清单编制、施工图预算编制、招标控制价编制、施工过程中造价管理、工程结算等全过程造价咨询。

具体内容如下（包括但不限于）：1、概算编制或审核；2、施工图预算、招标控制价及工程量清单编制；3、签证变更费用的审核；4、工程结算审核、竣工决算编制；5、全过程投资控制等工作；6、参与项目管理过程的相关会议，配合招投标答疑，审核工程进度款，审核工程变更及合同争议的鉴定与索赔，参与图纸会审并提出合理化建议；7、编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和



评估乙方服务团队主要人员的工作能力和表现，并有权要求乙方及时替换工作表现不佳的人员。乙方应当在接到甲方的书面通知后7个日历天内进行更换，否则甲方有权要求乙方承担每人每次人民币10000元的违约金，不设上限。

九、费用及支付

1、合同价

计费规则：取费参照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》（深价协[2017]14号）计取。按照《南山区建筑工务署小型建设工程招标投标暂行办法（第一次修订版）》（2022年3月）的规定：造价咨询合同额在50万以上下浮10%，50万以下不下浮，且最低价为3000元。本合同造价咨询服务酬金计算过程如下：

（1）工程概算的编制或审核咨询费：

$(768-500) \times 1.6/1000 + 400 \times 1.8/1000 + 100 \times 2/1000 = 1.35$ 万元

（2）施工阶段全过程造价控制咨询费：

$(768-500) \times 10/1000 + 400 \times 11/1000 + 100 \times 12/1000 = 8.28$ 万元

（3）工程竣工决算编制（计费基数以发改批复概算的其他费作为计费基数，如概算暂未批复，暂估2162万元）咨询费：

$(768-500) \times 1.1/1000 + 400 \times 1.4/1000 + 100 \times 2/1000 = 1.05$ 万元

（1）（2）（3）合计：10.684万元

本合同暂定价为：10.684万元。（注意：若超过50万需要下浮10%）

其中，结算绩效收费不能高于基本收费，决算编制计费基数为扣除建安费之外的其他费为决算额计取；最终审核费以合同取费标准和造价站复核为准，最终结算价不得超过99.8万元。

咨询酬金包含乙方为完成本咨询服务所发生的一切费用。

2、支付方式：

（1）概算编制费用支付

概算通过政府主管部门审查批复且乙方向甲方提出书面付款申请后，支付概算咨询费的100%。


（2）施工阶段全过程造价控制费用支付：

标底经政府确定的造价部门审定，完成招标及协助甲方签定合同，乙方向甲方提出书面付款申请后，按全过程咨询费的30%支付；工程竣工验收并出具结算审核成果文件时，支付至全过程咨询费的80%，余款待政府确定的造价部门复核后，根据审定的造价控制费支付尾款。



甲方：  深圳市南山区建筑工务署 (盖章)

乙方：  深圳市三合和工程项目管理有限公司 (盖章)

法定代表人 或 其授权的代理人：  (签字)

法定代表人 或 其授权的代理人：  (签字)

开户银行： 中国民生银行
深圳南山支行

银行账号： 1615 80387

签订日期：

2022年12月01日

联系人及联系方式：

戴光玉
150 1247 2380



建安工程概算造价书

工程名称：田厦社康中心升级社区医院装修改造项目

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

代建单位：华润置地城市运营管理(深圳)有限公司

工程造价：4621712.93元 单位造价：9960.59元/m²

金额大写：肆佰陆拾贰万壹仟柒佰壹拾贰元玖角叁分

编制单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司

编制人：崔芳

资格证号：

复核人：谢怀平

资格证号：

主管：王炎武



日期：二〇二三年十二月二十五日



7、峰景社康中心改造项目全过程造价咨询

合同编号：2022F157001

峰景社康中心改造项目全过程造价咨询服务合同

甲方：深圳市南山区建筑工务署

乙方：深圳市三合和工程项目管理有限公司





甲方：深圳市南山区建筑工务署

乙方：深圳市三合和工程项目管理有限公司

经南山区建筑工务署小型建设工程交易及履约评价管理系统公开招标，确定乙方为峰景社康中心改造项目造价咨询中标单位。按照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程造价咨询工作协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：峰景社康中心改造项目

2、工程概况：峰景社康中心改造项目位于龙珠大道天地峰景园1-3号裙楼113-116号，面积约1230平方米；改造内容为原有社康拆除装饰面层，新建隔墙及装饰面层，电气、给排水、暖通等系统安装。

3、工程投资：项目投资匡算为542万元（深南发改批[2022]182号）。

二、乙方工作内容

本工程全过程造价咨询服务内容包括但不限于：概算编制或审核、招标清单编制、施工图预算编制、招标控制价编制、施工过程中造价管理、工程结算等全过程造价咨询。

具体内容如下（包括但不限于）：1、概算编制或审核；2、施工图预算、招标控制价及工程量清单编制；3、签证变更费用的审核；4、工程结算审核、竣工决算编制；5、全过程投资控制等工作；6、参与项目管理过程的相关会议，配合招投标答疑，审核工程进度款，审核工程变更及合同争议的鉴定与索赔，参与图纸会审并提出合理化建议；7、编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等；8、配合发改、造价、审计部门完成审核工作等；9、本工程需公开招标的标段，如施工等，乙方需对评标报告进行复核，并对清标报告签字确认。

（一）概算编制或审核阶段造价咨询工作内容：

编制或审核概算、协助完成概算评审工作；进行报送概算和批复概算的对比分析，书面提出批复概算中未包含的工程内容，以及下一步造价控制中应注意的事项。



法（第一次修订版）》（2022年3月）的规定：造价咨询合同额在50万以上下浮10%，50万以下不下浮，且最低价为3000元。本合同造价咨询服务酬金计算过程如下：

- (1) 工程概算的编制或审核咨询费：
 $(542-500) \times 1.6/1000 + 400 \times 1.8/1000 + 100 \times 2/1000 = 0.99$ 万元
 - (2) 施工阶段全过程造价控制咨询费：
 $(542-500) \times 10/1000 + 400 \times 11/1000 + 100 \times 12/1000 = 6.02$ 万元
 - (3) 工程竣工决算编制（计费基数以发改批复概算的其他费作为计费基数，如概算暂未批复，暂估2162万元）咨询费：
 $(542-500) \times 1.1/1000 + 400 \times 1.4/1000 + 100 \times 2/1000 = 0.81$ 万元
- (1) (2) (3) 合计：7.813 万元。

本合同暂定价为：7.813 万元。（注意：若超过50万需要下浮10%）

其中，结算绩效收费不能高于基本收费，决算编制计费基数为扣除建安费之外的其他费为决算额计取；最终审核费以合同取费标准和造价站复核为准，最终结算价不得超过99.8万元。

咨询酬金包含乙方为完成本咨询服务所发生的一切费用。

2、支付方式：

(1) 概算编制费用支付

概算通过政府主管部门审查批复且乙方向甲方提出书面付款申请后，支付概算咨询费的100%。

(2) 施工阶段全过程造价控制费用支付：

标底经政府确定的造价部门审定，完成招标及协助甲方签订合同，乙方向甲方提出书面付款申请后，按全过程咨询费的30%支付；工程竣工验收并出具结算审核成果文件时，支付至全过程咨询费的80%，余款待政府确定的造价部门复核后，根据审定的造价控制费支付尾款。

(3) 工程竣工决算编制费用的支付：

决算经政府确定的造价部门复核且乙方向甲方提出书面付款申请后，根据甲方已完成的履约评价支付至审定的造价控制费的100%。

3、结算方式

结算时以发改局、造价管理站或政府确定的造价部门审定的各阶段造价为计费额，根据《深圳市建设工程造价咨询业收费市场价格》的通知（深价协[2017]14号）并按照《南山区建筑工务署小型建设工程招标投标暂行办法（第一次修订版）》



甲方： 深圳市南山区建筑工务署 乙方： 深圳市三合和工程项目管理有限公司
(盖章) (盖章)

法定代表人 法定代表人
或 或
其授权的代理人： 李刘君 其授权的代理人： 戴光玉
(签字) (签字)

开户银行： 中国民生银行
深圳南山支行

银行账号： 1615 80387

签订日期：
2022年12月01日

联系人及联系方式：
戴光玉
150 1247 2380



建安工程 招标控制价

工程名称：峰景社康中心装修改造工程施工

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

代建单位：华润置地城市运营管理(深圳)有限公司

工程造价：5678391.65元 单位造价：4661.99元/m²

金额大写：伍佰陆拾柒万捌仟叁佰玖拾壹元陆角伍分

编制单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司

编制人：

资格证号：

复核人：

资格证号：

主管：



日期：二〇二四年一月三十日





8、区医疗集团总部金众麒麟公馆社区健康服务站改造工程全过程造价咨询服务

合同编号：2022F152001

区医疗集团总部金众麒麟公馆社区健康服务站改造工程
全过程造价咨询服务合同



甲方：深圳市南山区建筑工务署

乙方：深圳市三合和工程项目管理有限公司



甲方：深圳市南山区建筑工务署

乙方：深圳市三合和工程项目管理有限公司

经南山区建筑工务署小型建设工程交易及履约评价管理系统公开招标，确定乙方为区医疗集团总部金众麒麟公馆社区健康服务站改造工程造价咨询中标单位。按照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程造价咨询工作协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：区医疗集团总部金众麒麟公馆社区健康服务站改造工程

2、工程概况：区医疗集团总部金众麒麟公馆社区健康服务站位于西丽街道丽湖社区金众麒麟公馆一期5栋配套01层C号房，为政府物业，建筑面积为1022.94平方米，目前为毛坯房，改造内容包括室内外装修、电气、给排水、消防、空调通风、智能化等工程。

南山区健康促进体验馆位于南山区南头红花路与南新路交汇处，红花路153号附近，建筑面积约 600 平方米，现状为毛坯房，在原有基础上进行装修，优化功能布局。主要建设内容包括砌筑、拆除、装饰装修、电气、消防、给排水、通风空调、弱电及智能化安装等工程。

3、工程投资：项目投资匡算 576 万元。其中区医疗集团总部金众麒麟公馆社区健康服务站改造工程造价 368 万元，包括建安工程费 315 万元，工程建议其他费 42 万元，预备费 11 万元。（深南发改批[2022] 105 号）。

二、乙方工作内容

本工程全过程造价咨询服务内容包括但不限于：概算编制或审核、招标清单编制、施工图预算编制、招标控制价编制、施工过程中造价管理、工程结算等全过程造价咨询。

具体内容如下（包括但不限于）：1、概算编制或审核；2、施工图预算、招标控制价及工程量清单编制；3、签证变更费用的审核；4、工程结算审核、竣工决算编制；5、全过程投资控制等工作；6、参与项目管理过程的相关会议，配合招投标答疑，审核工程进度款，审核工程变更及合同争议的鉴定与索赔，参与图纸会审并提出合理化建议；7、编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和



评估乙方服务团队主要人员的工作能力和表现，并有权要求乙方及时替换工作表现不佳的人员。乙方应当在接到甲方的书面通知后 7 个日历天内进行更换，否则甲方有权要求乙方承担每人每次人民币 10000 元的违约金，不设上限。

九、费用及支付

1、合同价

计费规则：取费参照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》（深价协[2017]14号）计取。按照《南山区建筑工务署小型建设工程招标投标暂行办法（第一次修订版）》（2022年3月）的规定：造价咨询合同额在50万以上上浮10%，50万以下不下浮，且最低价为3000元。本合同造价咨询服务酬金计算过程如下：

- (1) 工程概算的编制或审核咨询费：
 $(368-100)*1.8/1000+100*2/1000=0.68$ 万元
- (2) 施工阶段全过程造价控制咨询费：
 $(368-100)*11/1000+100*12/1000=4.15$ 万元
- (3) 工程竣工决算编制（计费基数以发改批复概算的其他费作为计费基数，如概算暂未批复，暂估2162万元）咨询费：
 $(368-100)*1.4/1000+100*2/1000=0.58$ 万元

(1) (2) (3) 合计：5.406 万元。

本合同暂定价为：5.406 万元。（注意：若超过50万需要上浮10%）

其中，结算绩效收费不能高于基本收费，决算编制计费基数为扣除建安费之外的其他费为决算额计取；最终审核费以合同取费标准和造价站复核为准，最终结算价不得超过99.8万元。

咨询酬金包含乙方为完成本咨询服务所发生的一切费用。

2、支付方式：

(1) 概算编制费用支付

概算通过政府主管部门审查批复且乙方向甲方提出书面付款申请后，支付概算咨询费的100%。

(2) 施工阶段全过程造价控制费用支付：

标底经政府确定的造价部门审定，完成招标及协助甲方签订合同，乙方向甲方提出书面付款申请后，按全过程咨询费的30%支付；工程竣工验收并出具结算审核成果文件时，支付至全过程咨询费的80%，余款待政府确定的造价部门复核后，根据审定的造价控制费支付尾款。



甲方：

深圳市南山区建筑工务署

乙方：

深圳市三合和工程项目管理有限公司

法定代表人

或

其授权的代理人：



李刘君

(签字)

法定代表人

或

其授权的代理人：



戴光玉

(签字)

开户银行：

中国民生银行

深圳南山支行

银行账号：1615 80387

签订日期：

2022年12月01日

联系人及联系方式：

戴光玉

150 1247 2380



建安工程 招标控制价

工程名称：金众麒麟公馆社区健康服务站装修改造工程施工

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

代建单位：华润置地城市运营管理(深圳)有限公司

工程造价：4468814.10元 单位造价：4368.34元/m²

金额大写：肆佰肆拾陆万捌仟捌佰壹拾肆元壹角整

编制单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司

编制人：崔芳

资格证号：

复核人：颜国强

资格证号

主管：

王炎武



日期：二〇二四年一月三十日



9、220kV 研创变电站两通一平工程全过程造价咨询

中标通知书

工程编号：NSGWS20230526004

工程名称：220kV研创变电站两通一平工程项目全过程造价咨询

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

中标单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司

中标金额：4.90（万元）

备注信息：最终结算价超过50万元需下浮10%，最终结算价不得超过99.8万元。

本工程于 2023年5月26日 09:00 在南山区政府网站进行公开招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 10 日内按照招标公告和招标人签订本项目的发包合同。

招标人（盖章）：

日期：2023年6月2日



合同编号：2023S417002

220kV 研创变电站两通一平工程
全过程造价咨询合同



委托单位：深圳市南山区建筑工务署

咨询单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司



委托单位（甲方）：深圳市南山区建筑工务署

咨询单位（乙方）：深圳市三合和工程项目管理有限公司

经南山区建筑工务署小型建设工程交易及履约评价管理系统公开招标，确定乙方为220kV研剑变电站两通一平工程全过程造价咨询工作中标单位。按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程全过程造价咨询工作协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：220kV 研剑变电站两通一平工程

2. 工程概况：220kV 研剑变电站两通一平工程项目位于深圳市南山区粤海街道，南海大道与北环大道交叉口的东南角。场平设计范围总面积约 7276.46 平方米，用地中建设用地为 962.15 平方米，农用地为 6314.31平方米。工程内容包括土石方开挖(约7000立方)、破除混凝土路面、新建混凝土挡土墙、绿化迁移等。

3. 工程投资：暂无立项及可研文件，新增绿化迁移后预估工程费用 350 万元。

二、乙方工作内容

本工程全过程造价咨询合同工作内容包括但不限于：概算编制或审核、施工阶段全过程造价控制（招标工程量清单编制开始到工程结算审核的造价咨询服务）、竣工决算编制等全过程造价咨询。工作内容包括但不限于如下方面：

（一）概算编制或审核阶段咨询工作内容

1. 编制或审核概算，出具书面工程概算书或工程概算审核报告。
2. 协助甲方完成工程概算评审工作。
3. 进行报送工程概算和批复概算的对比分析并出具书面分析报告，提出批复概算中未包含的工程内容，以及下一步造价控制中应注意的事项。

（二）施工阶段全过程造价控制咨询工作内容



15. 未经甲方书面同意，乙方不得部分转让其应履行的合同义务。任何情况下，乙方不得转包本合同的义务，否则甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。

16. 乙方应安排至少 1 名固定的工作人员负责与甲方对接工作，汇总工作进度及问题，乙方应确保对接人员的稳定，如必要情况下必须更换需提前至少一周书面通知甲方，并做好工作交接。甲方有权观察并评估乙方服务团队主要人员的工作能力和表现，并有权要求乙方及时替换工作表现不佳的人员。

九、合同价、支付方式及结算方式

(一) 合同价

本项目全过程造价咨询服务酬金暂定为人民币：肆万玖仟元整（大写），即 RMB 4.90 万元（含税价）。

全过程造价咨询费用计费规则：取费参照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》（深价协〔2017〕14号）计取。按照《南山区建筑工务署小型建设工程招投标暂行办法（第一次修订版）》（2022年3月）的规定：造价咨询合同额在50万以上上浮10%，在50万以下不下浮，且最低价为3000元。计算过程如下：

1. 工程概算编制或审核阶段咨询服务酬金 $A1 = 100 \times 2\% + (350 - 100) \times 1.8\% = 0.65$ 万元（暂定）。其中：基本酬金 $B1 = A1 \times 80\%$ ；绩效酬金 $C1 = A1 \times 20\%$ 。

2. 施工阶段全过程造价控制咨询服务酬金 $A2 = 100 \times 12\% + (350 - 100) \times 11\% = 3.95$ 万元（暂定）。其中：基本酬金 $B2 = A2 \times 80\%$ ；绩效酬金 $C2 = A2 \times 20\%$ 。

3. 工程竣工决算编制审核咨询服务酬金 $A3 = (350 - 350 \times 0.85) \times 2\% = 0.105$ 万元（暂定），不足 0.30 万元按 0.30 万元计取。其中：基本酬金 $B3 = A3 \times 80\%$ ；绩效酬金 $C3 = A3 \times 20\%$ 。

4. 全过程造价咨询服务酬金合计暂定 $A = A1 + A2 + A3 = 0.65 + 3.95 + 0.3 = 4.90$ 万元。其中：基本酬金合计暂定 $B = B1 + B2 + B3$ ；绩效酬金合计暂定 $C = C1 + C2 + C3$ 。



文件，均视为有效送达，由未通知方承担由此而引起的相关责任；

6.4 一方按有效地址递送，另一方拒收的、未妥投退回，视为有效送达；

6.5 如因本合同履行产生争议，本合同所示地址同时作为诉讼所有程序（包括一审、二审、再审、执行等程序）中相关法律文书的有效司法送达地址，按该地址送达即视为有效送达；

6.6 本联系方式条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力影响，始终有效。

7. 本合同未尽事宜双方协商解决。

十五、合同份数


本合同一式陆份，含正本贰份，副本肆份。甲乙双方各执贰份（正本壹份，副本贰份），具同等法律效力，乙方须在合同生效后7日内向发包人提交合同正本扫描件。

委托单位：深圳市南山区建筑工务署

咨询单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

 (签字)

 (签字)

地址：深圳市南山区前海路爱心大厦
12-14楼

地址：深圳市南山区光彩新天地13楼
B1

统一社会信用代码：12440305634798694R

统一社会信用代码：91440300MA5G3BJ913

开户银行：中国民生银行深圳南山支行

账号：161580387

签订日期：

联系人及

2023年6月9日

联系方式：戴光玉/150 1247 2380



建安工程 预算造价书

工程名称：220kV研创变电站两通一平树木迁移砍伐工程

建设单位：南山区建筑工务署

建筑面积：

结构特征：

工程造价：2416817.82元

单位造价：

金额大写：贰佰肆拾壹万陆仟捌佰壹拾柒元捌角贰分

编制单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司

编制人：栢华健

资格证号：

复核人：汤怀平

资格证号

主管：王炎武



日期：二〇二三年十一月一日



履约评价情况表

序号	项目名称	合同价 (万元)	项目所在地	备注
1	益安数码科技产业园全过程造价咨询服务	42.78	惠州市	
2	顺逸东方酒店旗舰店全过程造价咨询服务	37.64	惠州市	
3	好美佳智能科技产业园全过程造价咨询服务	24.00	惠州市	
4	粤海街道后海村“瓶改管”项目	6.85	南山区	
5	粤海街道“瓶改管”查漏补缺项目	1.75	南山区	



履约评价证明:

1、益安数码科技产业园全过程造价咨询服务

履约评价报告书

造价咨询单位名称: 深圳市三合和工程项目管理有限公司

序号	考核项目	评分细则	标准分值	实际得分	扣分原因
一	基本要求 (20分)	人员配备是否符合投标承诺(2分), 人员更换是否提前书面告之(1分), 项目经理是否更换(5分), 专业负责人是否更换(3分)。(全部满足10分, 并按上述分值进行评分, 最多扣10分)	10	10	
		考核期内, 编审台账是否登记齐全(2分), 存档资料是否齐全(2分), 收发文是否登记齐全(1分)。(全部满足5分, 不齐全1个扣1分, 并按上述分值进行评分, 最多扣5分)	5	4	
		造价咨询单位书面汇报情况评分。(书面汇报应包括本考核期工作总结, 工作中存在的问题及对今后工作的建议)	5	5	
二	工作效率 (25分)	依照造价咨询任务单的计划完成时间, 考核造价咨询单位是否在规定时间内完成造价成果文件, 概算阶段: 在规定时间内完成得25分, 非业主原因延迟完成时间, 延迟时间在3天以内的扣4分, 延迟时间在4-10天的扣6分, 10天以上的扣25分, 预算、结算阶段: (含工程变更审核) 扣分标准: 每个任务单延迟时间在3天以内的扣1分, 延迟时间在4-10天的扣2分, 10天以上的扣3分, 最多扣25分。	25	24	
三	工作质量 (40分)	建立完整有效的质量保证体系, 质量保证体系中必须有复核及审核程序。(完整有效得3分, 一般得1分, 不完整有效0分)	3	3	
		每一项子目工程量误差超过±3%(包含3%), 扣1分; 以只、个出现的计量单位, 工程量错一项扣1分; 漏项一项扣2分, 最多扣22分。	22	21	
		定额或费用应用错误一项扣1分; 重大单价错误, 一项扣2分; 最多扣15分。	15	14	
四	履约配合 (15分)	考核期内存在问题是否及时与业主沟通(2分), 业主组织会议是否按时参加(1分), 是否及时配合政府相关部门审计(2分)。(全部满足得5分, 并按上述分值进行评分每缺席1次扣1分, 最多扣5分)	5	5	
		是否有串通施工、监理等单位弄虚作假的现象; 在没有得到相应许可的情况下, 是否对外公开涉及任何机密的资料(全部满足得10分, 违规一次扣10分)。	10	10	
合计得分				96	
考核组(签名): 宁晓青 检查时间: 2022.12.30					



2、顺逸东方酒店旗舰店全过程造价咨询服务

履约评价报告书

造价咨询单位名称：深圳市三合和工程项目管理有限公司

序号	考核项目	评分细则	标准分值	实际得分	扣分原因
一	基本要求 (20分)	人员配备是否符合投标承诺(2分)，人员更换是否提前书面告之(1分)，项目经理是否更换(5分)，专业负责人是否更换(3分)。(全部满足10分，并按上述分值进行评分，最多扣10分)	10	10	
		考核期内，编审台账是否登记齐全(2分)，存档资料是否齐全(2分)，收发文是否登记齐全(1分)。(全部满足5分，不齐全1个扣1分，并按上述分值进行评分，最多扣5分)	5	4	
		造价咨询单位书面汇报情况评分。(书面汇报应包括本考核期工作总结，工作中存在的问题及对今后工作的建议)	5	5	
二	工作效率 (25分)	依照造价咨询任务单的计划完成时间，考核造价咨询单位是否在规定时间内完成造价成果文件，概算阶段：在规定时间内完成得25分，非业主原因延迟完成时间，延迟时间在3天以内的扣4分，延迟时间在4-10天的扣6分，10天以上的扣25分，预算、结算阶段：(含工程变更审核)扣分标准：每个任务单延迟时间在3天以内的扣1分，延迟时间在4-10天的扣2分，10天以上的扣3分，最多扣25分。	25	23	
三	工作质量 (40分)	建立完善有效的质量保证体系，质量保证体系中必须有复核审核程序。(完整有效得3分，一般得1分，不完整有效0分)	3	3	
		每一项目工程量误差超过±3%(包含3%)，扣1分；以只、个出现的计量单位，工程量错一项扣1分；漏项一项扣2分，最多扣22分。	22	21	
		定额或费用应用错误一项扣1分；重大单价错误，一项扣2分；最多扣15分。	15	14	
四	履约配合 (15分)	考核期内存在问题是否及时与业主沟通(2分)，业主组织会议是否按时参加(1分)，是否及时配合政府相关部门审计(2分)。(全部满足得5分，并按上述分值进行评分每缺席1次扣1分，最多扣5分)	5	5	
		是否有串通施工、监理等单位弄虚作假的现象；在没有得到相应许可的情况下，是否对外公开涉及任何机密的资料(全部满足得10分，违规一次扣10分)。	10	10	
合计得分				95	
考核组(签名)				检查时间：2023.2.7	



3、好美佳智能科技产业园全过程造价咨询服务

履约评价报告书

造价咨询单位名称：深圳市三合和工程项目管理有限公司

序号	考核项目	评分细则	标准分值	实际得分	扣分原因
一	基本要求 (20分)	人员配备是否符合投标承诺(2分)，人员更换是否提前书面告之(1分)，项目经理是否更换(5分)，专业负责人是否更换(3分)。(全部满足10分，并按上述分值进行评分，最多扣10分)	10	10	
		考核期内，编审台账是否登记齐全(2分)，存档资料是否齐全(2分)，收发文是否登记齐全(1分)。(全部满足5分，不齐全1个扣1分，并按上述分值进行评分，最多扣5分)	5	4	
		造价咨询单位书面汇报情况评分。(书面汇报应包括本考核期工作总结，工作中存在的问题及对今后工作的建议)	5	5	
二	工作效率 (25分)	依照造价咨询任务单的计划完成时间，考核造价咨询单位是否在规定时间内完成造价成果文件，概算阶段：在规定时间内完成得25分，非业主原因延迟完成时间，延迟时间在3天以内的扣4分，延迟时间在4-10天的扣6分，10天以上的扣25分，预算、结算阶段：(含工程变更审核)扣分标准：每个任务单延迟时间在3天以内的扣1分，延迟时间在4-10天的扣2分，10天以上的扣3分，最多扣25分。	25	23	
三	工作质量 (40分)	建立完善有效的质量保证体系，质量保证体系中必须有复核及审核程序。(完整有效得3分，一般得1分，不完整有效0分)	3	3	
		每一项目工程量误差超过±3%(包含3%)，扣1分；以只、个出现的计量单位，工程量错一项扣1分；漏项一项扣2分，最多扣22分。 定额或费用应用错误一项扣1分；重大单价错误，一项扣2分，最多扣15分。	22	21	
四	履约配合 (15分)	考核期内存在问题是否及时与业主沟通(2分)，业主组织会议是否按时参加(1分)，是否及时配合政府相关部门审计(2分)。(全部满足得5分，并按上述分值进行评分，每缺席1次扣1分，最多扣5分)	5	4	
		是否有串通施工、监理等单位弄虚作假的现象，在没有得到相应许可的情况下，是否对外公开涉及任何机密的资料(全部满足得10分，违规一次扣10分)。	10	10	
合计得分				94	
考核组(签名)：  检查时间：2022.11.26					



4、粤海街道后海村“瓶改管”项目

工程项目企业履约评价表 (适合造价咨询单位)

工程项目：粤海街道后海村“瓶改管”项目

履约单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司评价日期：2023年8月20日

序号	分项内容	满分	得分	分项评价表				说明
一	人员配备	10						
1	项目负责人要求	5	5	<input checked="" type="radio"/> 优秀	<input type="radio"/> 良好	<input type="radio"/> 合格	<input type="radio"/> 不合格	
2	专业人员配置要求	5	4	<input type="radio"/> 优秀	<input checked="" type="radio"/> 良好	<input type="radio"/> 合格	<input type="radio"/> 不合格	
二	履约质量	50						
3	工程量计算准确率	10	10	<input checked="" type="radio"/> 优秀		<input type="radio"/> 合格	<input type="radio"/> 不合格	
4	工程量清单漏项情况	10	8	<input checked="" type="radio"/> 优秀	<input checked="" type="radio"/> 良好	<input type="radio"/> 合格	<input type="radio"/> 不合格	
5	工程造价与审核价误差控制	10	8	<input checked="" type="radio"/> 优秀	<input checked="" type="radio"/> 良好	<input type="radio"/> 合格	<input type="radio"/> 不合格	
6	材料设备价格定价	10	10	<input checked="" type="radio"/> 优秀		<input type="radio"/> 合格	<input type="radio"/> 不合格	
7	对可能影响造价的事项，提出合理化的建议	3	3			<input checked="" type="radio"/> 合格	<input type="radio"/> 不合格	
8	变更签证计量计价	5	5			<input checked="" type="radio"/> 合格	<input type="radio"/> 不合格	
9	提交造价成果文件的完备情况	2	2			<input checked="" type="radio"/> 合格	<input type="radio"/> 不合格	
三	履约时间	20						
10	进度	20	20	<input checked="" type="radio"/> 优秀	<input type="radio"/> 良好	<input type="radio"/> 合格	<input type="radio"/> 不合格	
四	履约配合	20						
11	全过程配合情况	7	7	<input checked="" type="radio"/> 优秀	<input type="radio"/> 良好	<input type="radio"/> 合格	<input type="radio"/> 不合格	
12	会议出席情况	5	5			<input checked="" type="radio"/> 合格	<input type="radio"/> 不合格	
13	保密工作	3	5			<input checked="" type="radio"/> 合格	<input type="radio"/> 不合格	
14	不良行为	5	5			<input checked="" type="radio"/> 合格	<input type="radio"/> 不合格	
五	小计	100	95					
六	本次履约情况							
	项目所处阶段							
	得分	95分						
七	建设单位综合评定等级及建设单位(盖章)	优秀						





5、粤海街道“瓶改管”查漏补缺项目

工程项目企业履约评价表 (适合造价咨询单位)

工程项目：粤海街道“瓶改管”查漏补缺项目

履约单位：深圳市三合和工程项目管理有限公司评价日期：2023年8月30日

序号	分项内容	满分	得分	分项评价表				说明
一	人员配备	10						
1	项目负责人要求	5	5	<input checked="" type="radio"/> 优秀	<input type="radio"/> 良好	<input type="radio"/> 合格	<input type="radio"/> 不合格	
2	专业人员配置要求	5	4	<input type="radio"/> 优秀	<input checked="" type="radio"/> 良好	<input type="radio"/> 合格	<input type="radio"/> 不合格	
二	履约质量	50						
3	工程量计算准确率	10	10	<input checked="" type="radio"/> 优秀		<input type="radio"/> 合格	<input type="radio"/> 不合格	
4	工程量清单漏项情况	10	8	<input checked="" type="radio"/> 优秀	<input checked="" type="radio"/> 良好	<input type="radio"/> 合格	<input type="radio"/> 不合格	
5	工程造价与审核价误差控制	10	8	<input checked="" type="radio"/> 优秀	<input checked="" type="radio"/> 良好	<input type="radio"/> 合格	<input type="radio"/> 不合格	
6	材料设备价格定价	10	10	<input checked="" type="radio"/> 优秀		<input type="radio"/> 合格	<input type="radio"/> 不合格	
7	对可能影响造价的事项，提出合理化的建议	3	3			<input checked="" type="radio"/> 合格	<input type="radio"/> 不合格	
8	变更签证计量计价	5	5			<input checked="" type="radio"/> 合格	<input type="radio"/> 不合格	
9	提交造价成果文件的完备情况	2	2			<input checked="" type="radio"/> 合格	<input type="radio"/> 不合格	
三	履约时间	20						
10	进度	20	20	<input checked="" type="radio"/> 优秀	<input type="radio"/> 良好	<input type="radio"/> 合格	<input type="radio"/> 不合格	
四	履约配合	20						
11	全过程配合情况	7	7	<input checked="" type="radio"/> 优秀	<input type="radio"/> 良好	<input type="radio"/> 合格	<input type="radio"/> 不合格	
12	会议出席情况	5	5			<input checked="" type="radio"/> 合格	<input type="radio"/> 不合格	
13	保密工作	3	5			<input checked="" type="radio"/> 合格	<input type="radio"/> 不合格	
14	不良行为	5	5			<input checked="" type="radio"/> 合格	<input type="radio"/> 不合格	
五	小计	100	95					
六	本次履约情况							
	项目所处阶段	预算编制						
	得分	95分						
七	建设单位综合评定等级及建设单位(盖章)	优秀						





承诺书

致招标人：深圳市南山区建筑工务署

我单位参加蛇口影剧院升级改造工程项目全过程造价咨询的招投标活动，我方郑重作以下承诺：我方承诺本公司企业性质为其他（填写：民营企业或国有企业或其他）。且承诺本公司所提供的投标人业绩和项目负责人业绩及证明材料一律属实。

特此承诺！

承诺人（盖章）：深圳市三合和工程项目管理有限公司

法定代表人（签字）：何易

日期：2024 年 12 月 04 日

