标段编号： 2411-440305-04-01-804053001001

深圳市建设工程监理招标投标文件

标段名称： 妈湾电厂-松湖变电站220千伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 英泰克工程顾问(上海)有限公司

日期： 2025年11月17日

投标人基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="2">英泰克工程顾问（上海）有限公司</td><td>企业性质</td><td>□民营　　□国有
☑其他：有限责任公司
(外商投资、非独资)</td></tr>
<tr><td>投标人简介</td><td colspan="4">英泰克工程顾问(上海)有限公司(英文简称Intertek-lEs)，为英国Intertek Group Pic集团子公司。公司创建于1992年，是一家综合型的工程咨询企业。公司具备工程监理综合资质、国家设备监理甲级、国家工程咨询甲级等资质。可在房屋建筑工程、市政公用工程、化工石油工程、机电安装工程、电力工程、水利水电工程、通信工程、港口与航道工程、铁路工程、公路工程、冶炼工程矿山工程、农林工程、航天航空工程等领域从事全过程工程咨询、工程项目管理、建设监理、设备监理、工程咨询、招投标代理服务。
本着立足上海、面向全国、走向世界的经营理念：依托集团公司和遍及全国各地分公司的资源优势，恪守“敬业、勤业、专业”的企业精神开展经营活动，公司先后通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康管理体系认证。
现有员工1300余人，期中注册监理工程师182名，注册造价工程师16名，一级注册造价师34名，一级注册结构工程师1名，其他监理工程师监理员700余名。面对中国经济的蓬勃发展和经济全球化的格局，坚持“顾客满意为目标、优质服务为根本、高效管理为手段、持续改进创品牌”的经营指导思想，不断推进管理的规范化、标准化、科学化，以诚实信用的企业品格和科学创新的专业知识为客户提供优质服务，为打造国内一流、国际领先的工程咨询公司而努力。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">联系方式</td><td>法定代表人：邓卫</td><td>身份证号码：
310110196510256291</td><td colspan="2">电话：13901651527</td></tr>
<tr><td>项目总监：傅海政</td><td>身份证号码：
510702196811099015</td><td colspan="2">电话：18550279505</td></tr>
<tr><td>投标员：朱胤</td><td>身份证号码：
321281198311041872</td><td colspan="2">电话：18626208007</td></tr>
<tr><td colspan="2">电子邮箱：3387957659@qq.com</td><td colspan="2">邮编：200072</td></tr>
</table>

注：

1．投标人须对填写内容的真实性负责。

2．投标人认为有需要的可自行增加表格内容。

3．若为联合体投标的，联合体各成员应分别填写此表。

营业执照

统一社会信用代码
91310000631191544Q
证照编号：060000022024101800O4

营业执照

扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　英泰克工程顾问（上海）有限公司
类　　型　有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人　邓卫
经营范围　许可项目：工程造价咨询业务；建设工程设计；建设工程监理；检验检测服务；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；工程管理服务（核电站、城市供排水管网的建设除外）；招投标代理服务；政府采购代理服务；信息技术咨询服务；安全咨询服务；工业工程设计服务；环保咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　人民币1000.0000万
成立日期　1998年07月2日
住　　所　上海市静安区江场路1401弄14号301-6室

登记机关　上海市市场监督管理局
2024 年 10 月 18 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制

资质证书

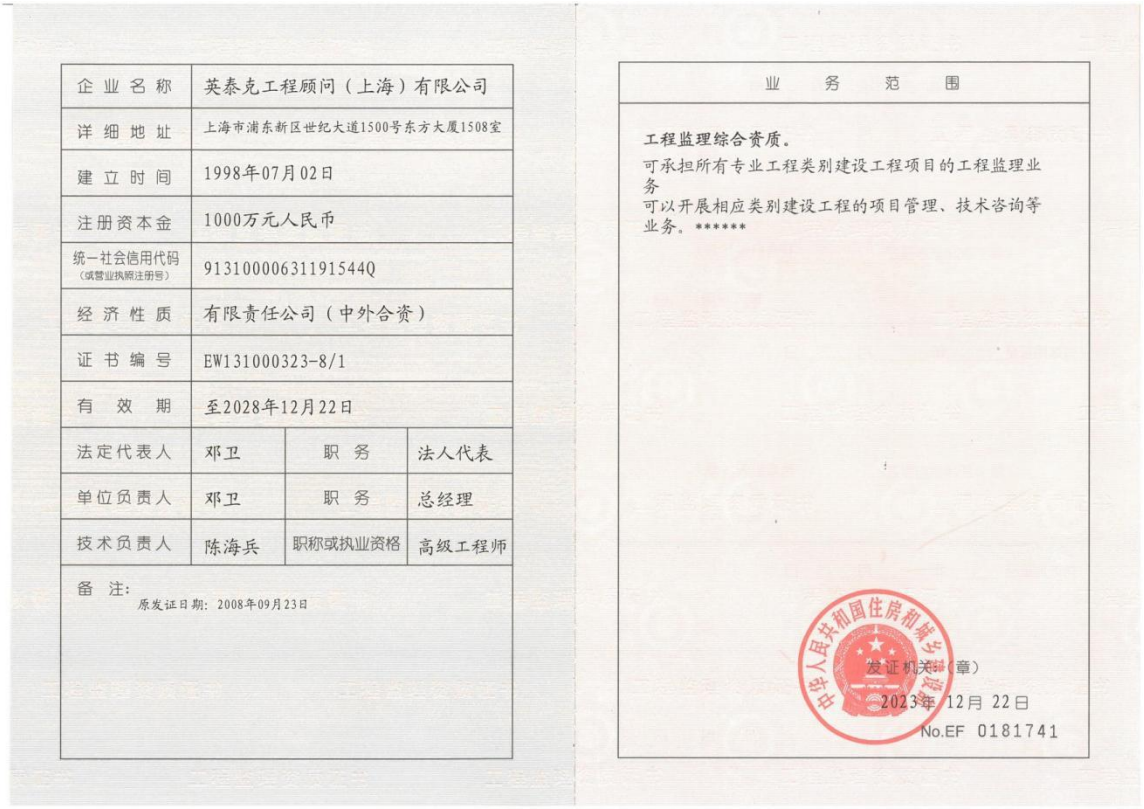

企业名称	英泰克工程顾问（上海）有限公司		
详细地址	上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦1508室		
建立时间	1998年07月02日		
注册资本金	1000万元人民币		
统一社会信用代码（或营业执照注册号）	91310000631191544Q		
经济性质	有限责任公司（中外合资）		
证书编号	EW131000323-8/1		
有效期	至2028年12月22日		
法定代表人	邓卫	职务	法人代表
单位负责人	邓卫	职务	总经理
技术负责人	陈海兵	职称或执业资格	高级工程师
备注：原发证日期：2008年09月23日			

业务范围

工程监理综合资质。
可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务
可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。******

中华人民共和国住房和城乡建设部

发证机关（章）
2023年 12月 22日
No.EF 0181741

ISO 管理体系认证证书

北京中建协认证中心有限公司

质量管理体系认证证书

注册号：02323Q21422R6M

兹　证　明

英泰克工程顾问（上海）有限公司

(统一社会信用代码：91310000631191544Q)
注册地址：上海市静安区江场路 1401 弄 14 号 301-6 室；
生产经营地址：上海浦东世纪大道 1500 号 1508 室；
质量管理体系符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求
特发此证，并予注册。
本证书覆盖范围：资质范围内的建设工程监理、设备监理

发证日期：2023 年 10 月 17 日
有 效 期：2023 年 10 月 17 日至 2026 年 10 月 17 日
在适用的法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等有效期内，接受例行年度监督审核并持有《监督审核保持认证注册资格通知书》的情况下本证书方可保持有效。本证书有效性信息可扫描下方二维码、登陆我公司网站 www.jccchina.com，或国家认证认可监督管理委员会网站 www.cnca.gov.cn 查询。

北京中建协认证中心有限公司
(地址：北京市朝阳区南湖东园 122 号博奇国际大厦 A 座 20 层)

董事长

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C023-M

NO.A01018016

北京中建协认证中心有限公司

环境管理体系认证证书

注册号： 02323E21315R5M-B

兹　证　明

英泰克工程顾问（上海）有限公司

（统一社会信用代码：91310000631191544Q）

注册地址：上海市静安区江场路 1401 弄 14 号 301-6 室；

生产经营地址：上海浦东世纪大道 1500 号 1508 室；

环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求

特发此证，并予注册。

本证书覆盖范围：资质范围内的建设工程监理、设备监理及相关的环境管理活动

发证日期：2023 年 10 月 17 日

有 效 期：2023 年 10 月 17 日至 2026 年 10 月 17 日

在适用的法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等有效期内，接受例行年度监督审核并持有《监督审核保持认证注册资格通知书》的情况下本证书方可保持有效。本证书有效性信息可扫描下方二维码、登陆我公司网站 www.jccchina.com，或国家认证认可监督管理委员会网站 www.cnca.gov.cn 查询。

北京中建协认证中心有限公司

（地址：北京市朝阳区南湖东园 122 号泰国际大厦 A 座 20 层）

董事长

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C023-M

NO.B01026526

北京中建协认证中心有限公司

职业健康安全管理体系认证证书

注册号：02323S21309R5M-B

兹　证　明

英泰克工程顾问（上海）有限公司

（统一社会信用代码：91310000631191544Q）

注册地址：上海市静安区江场路 1401 弄 14 号 301-6 室；

生产经营地址：上海浦东世纪大道 1500 号 1508 室；

职业健康安全管理体系符合 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求

特发此证，并予注册。

本证书覆盖范围：资质范围内的建设工程监理、设备监理及相关的职业健康安全管理活动

发证日期：2023 年 10 月 17 日

有 效 期：2023 年 10 月 17 日至 2026 年 10 月 17 日

在适用的法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等有效期内，接受例行年度监督审核并持有《监督审核保持认证注册资格通知书》的情况下本证书方可保持有效。本证书有效性信息可扫描下方二维码、登陆我公司网站 www.jccchina.com，或国家认证认可监督管理委员会网站 www.cnca.gov.cn 查询。

北京中建协认证中心有限公司

（地址：北京市朝阳区南湖东园 122 号博泰国际大厦 A 座 20 层）

董事长

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C023-M

NO.C01016026

投标人业绩情况一览表

投标人名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司

序号	建设单位	项目名称	合同金额（万元）	合同范围及内容	合同签订日期	履约评价情况	证明文件页码
1	深圳市龙华区建筑工务署	观盛二路一大和路下穿隧道及连接工程(全过程工程咨询)	1118.074 监理部分：843.594262 万元	合同范围含施工准备阶段、施工阶段、保修阶段监理。观盛二路一大和路下穿隧道及连接工程位于观湖街道，西起大和路东至观盛二路，规划为双向四车道城市次干道，道路红线宽 30 米，全长约 1.18 公里。	2022.05.27	2023 年第一季度：良好 2023 年第二季度：优秀 2023 年第三季度：良好 2023 年第四季度：优秀 2023 年年度：良好 2024 年第一季度：良好 2024 年第二季度：良好 2024 年第三季度：良好 2024 年第四季度：良好 2024 年年度：良好 2025 年第一季度：良好 2025 年第二季度：中等	8
2	济南轨道交通集团建设投资有限公司	济南轨道交通 4 号线一期工程土建工程（六标段）监理	2079	合同范围含施工准备阶段、施工阶段、保修阶段监理。四站五区间，盾构隧道区间	2021 年 02 月 10 日	2021 年第四季度：95.6 分 2021 年年度：96.1 分 2022 年第一季度：97.7 分 2022 年第二季度：96.6 分 2022 年第三季度：96.4 2022 年第四季度：96.6 分 2022 年年度：96.8 分 2023 年第一季度：91.8 分	44

序号	建设单位	项目名称	合同金额（万元）	合同范围及内容	合同签订日期	履约评价情况	证明文件页码
						2023 年第二季度：93.3 分 2023 年第三季度：91.2 分 2023 年第四季度：95.2 分 2023 年年度：92.9 分 2024 年第一季度：93.7 分 2024 年第二季度：93.8 分 2024 年第三季度：93.1 分 2024 年第四季度：95.29 分 2024 年年度：94.4 分 2024 年度：优秀参建单位表彰 2025 年第一季度防尘治理：较好及奖励 2025 年 1 月：94.2 分 2025 年 2 月：89.1 分	
3	深圳高速公路股份有限公司	沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场段改扩建工程施工监理	1021	合同范围含施工阶段、保修阶段监理。盾构法隧道，长度约为 6673 米	2021 年 06 月 18 日	2025 年第二季度：符合要求	125

注：后附业绩证明材料。

1、观盛二路一大和路下穿隧道及连接工程(全过程工程咨询)

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44031020220021001001

标段名称：观盛二路一大和路下穿隧道及连接工程（全过程工程咨询）

建设单位：深圳市龙华区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：英泰克工程顾问（上海）有限公司//北京城建设计发展集团股份有限公司

中标价：1118.074010万元

中标工期：按招标文件要求执行

项目经理(总监)：

本工程于 2022-03-29 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-05-13 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-05-16

查验码：7645689230882545

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

XS-QC-220804

正 本

合同编号：深龙华建工合[2022]工程咨询-6

工程编号：SZ202207

深圳市龙华区建筑工务署

全过程工程咨询服务合同

（范本）

项目名称：观盛二路—大和路下穿隧道及连接工程

合同名称：观盛二路—大和路下穿隧道及连接工程（全过程工程咨询）合同

甲　　方：深圳市龙华区建筑工务署

乙　　方：英泰克工程顾问（上海）有限公司//北京城建设计发展集团股份有限公司

日　　期：

XS-QC-220802

第一部分 合同协议书

委 托 人（甲方）：深圳市龙华区建筑工务署

工程咨询人（乙方）：英泰克工程顾问（上海）有限公司//北京城建设计发展集团股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、规章，并结合广东省、深圳市及龙华区的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托工程咨询与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：观盛二路—大和路下穿隧道及连接工程（全过程工程咨询）

2.工程地点：深圳市龙华区

3.工程规模：观盛二路—大和路下穿隧道及连接工程位于观湖街道，西起大和路，东至观盛二路，规划为双向四车道城市次干道，道路红线宽 30 米，全长约 1.18 公里。项目主要设计范围包括:道路、给排水、隧道、交通及交通疏解、电气、绿化、水土保持、管线迁改等工程。

4.建设内容：具体以施工图纸、工程量清单为准。

5.工程投资额：项目总投资暂估约 **60422.92** 万元，最终以发改部门批复为准。

6.其他：

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

三、服务阶段与服务内容

（一）本项目全过程工程咨询服务阶段包括：

☑项目策划阶段

☑可行性研究阶段

☑工程规划阶段

☑勘察与设计阶段

☑招标与采购阶段

☑施工及保修监理阶段

☑运营管理阶段

☑其他：与全过程工程咨询服务的有关阶段

（二）本项目全过程工程咨询服务内容包括：包括但不限于全过程工程项目管理、工程监理、专业咨询服务（如有），不含造价咨询，详见以下勾选项 。

1.全过程工程项目管理（以下简称："项目管理"）：

☑项目计划统筹及总体管理

☑报批报建管理

☑设计管理

☑招标采购及合同管理

☑进度管理

☑投资管理

☑工程技术管理

☑工程结算管理

☑档案与信息管理

☑BIM管理

☑专业或专项工程工艺咨询管理

☑现场施工管理

☑竣工验收及移交管理

☑运营或维护期管理

☑其他：项目策划管理、勘察管理、设计管理、质量管理、安全生产管理、项目组织协调管理、风险管理、后评价工作及与项目建设管理相关的其他工作，提出创新技术应用、智慧工地建设等策划方案，并监督相关单位实施。

2.工程监理：施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修监理及后续服务管理以及与工程监理相关的其他工作（不含电力管线迁改工程）。

□3.专业咨询服务：

□项目建议书编制

□可行性研究报告编制

□规划咨询

□设计任务书编制

□环境影响评估

□节能评估

□交通评估

□其他工作：____/____。

4.其他服务：（1）专项工程技术咨询：以招标人实际需求为准。（2）全过程工程咨询单位依法承担与项目管理工作、工程监理工作相应的法律责任。

四、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.专用合同条款及其附件；

2.通用合同条款；

3.中标通知书；

4.招标文件及补遗；

5.投标文件及附件（含工程咨询人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经委托人同意地对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

6.标准、规范及有关技术文件；

7.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

五、项目主要负责人

项目总负责人姓名：李广军，身份证号码：320831196901060052，注册证书号：31000877，联系电话：13151300888，电子邮箱：929951769@qq.com，通讯地址：上海市浦东新区世纪大道1500号1508室。

设计管理负责人姓名：孙静，身份证号码：21010419770923312X，联系电话：18610937034，电子邮箱：54996254@qq.com，通讯地址：北京市西城区阜成门北大街五号；

造价合约管理负责人姓名：莫恩清，身份证号码：110108196611242359，联系电话：13651965806，电子邮箱：/，通讯地址：上海市浦东新区世纪大道1500号1508室；

总监理工程师姓名：傅海政，身份证号码：510702196811099015，注册证书号：31008290，联系电话：18550279505，电子邮箱：864178549@qq.com，通讯地址：上海市浦东新区世纪大道1500号1508室。

其他主要负责人员：（如实填写）_____。

六、合同费用

合同价为人民币（大写）：壹仟壹佰壹拾捌万零柒佰肆拾元壹角整

（¥：11180740.10元）。包括：

☑项目管理服务费：2544797.48元，中标下浮率：8.08%；

☑工程监理服务费：8435942.62元，中标下浮率：8.08%；

□专业咨询服务费：_____/_____元，中标下浮率：_/__%；

☑暂列金：200000.00 元， 其中奖金：____/___元

□其他：_____。

合同最终结算价以甲方委托第三方机构审定并经发包人确认的结果为准，项目按规定须提交龙华区财政投资评审中心评审的，则最终结算价以龙华区财政投资评审中心评审结论为准（若项目按规定须提交政府审计部门审计的，则最终结算价以政府审计部门审计结果为准）。

七、服务期限

全过程工程咨询服务期为自签订合同之日起至完成全部合同约定内容为止，其中：

1. 项目管理服务期：自签订合同之日起至工程竣工验收及结决算完成。

2. 工程监理服务期：自工程开工之日起至工程竣工验收及结决算完成。保修阶段监理服务期按国家有关规定执行。

3. 专业咨询服务期：_____。

八、双方承诺

1. 工程咨询人向委托人承诺，按照本合同约定提供工程咨询与相关服务。工程咨询人承诺，工程咨询人不存在可能使其在履行合同义务时引起利益冲突的事项，包括与项目的工程总承包、施工、材料设备供应单位之间不存在利害关系。

2. 委托人向工程咨询人承诺，按照本合同约定提供资料、设备，支付费用。

九、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，正本 贰 份，委托人 壹 份，工程咨询人 壹 份；副本 拾 份，委托人 陆 份，工程咨询人 肆 份。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

十、合同生效

1.合同订立时间：2022年 5月 27日

2.合同订立地点：深圳市龙华区梅龙大道国鸿工业区 3 栋 4 楼

3.本合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖公章后生效。

4.与本合同有关的通知可用邮寄方式送达，邮寄地址以本合同中约定的住所为准，寄出三日后即视为送达，任何一方变更住所的，应书面方式通知对方。

委托人：（公章）

深圳市龙华区建筑工务署

住　　所：

深圳市龙华区梅龙大道 2283 号

行政服务中心 3 栋 4 楼

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

开户银行：

帐　　号：

邮政编码：

工程咨询人（联合体主体单位）：

英泰克工程顾问(上海)有限公司（公章）

住　　所：

上海市静安区江场路 1401 弄 14 号 301-6 室

法定代表人：邓卫

委托代理人：

法定代表人手机：13901651527

（务必填写用以发送履约评价结果）

电　　话：021-68407646

传　　真：021-68407904

开户银行：中国银行上海漕河泾支行

帐　　号：457259250753

邮政编码：200122

工程咨询人（联合体成员单位）：

北京城建设计发展集团股份有限公司（公章）

住　　所：北京市西城区阜成门北大街五号

法定代表人：裴宏伟

委托代理人：

法定代表人手机：13552091993

（务必填写用以发送履约评价结果）

电　　话：010-88336231

传　　真：010-68300793

开户银行：中国建设银行北京北环支行

帐　　号：11001028700056034719

邮政编码：100037

联合体协议书

观盛二路－大和路下穿隧道及连接工程（全过程工程咨询）

联合体协议

甲方：深圳市龙华区建筑工务署

联合体主体单位：英泰克工程顾问（上海）有限公司

联合体成员单位：北京城建设计发展集团股份有限公司

2022 年 04 月 15 日，英泰克工程顾问（上海）有限公司、北京城建设计发展集团股份有限公司共同组成联合体中标观盛二路－大和路下穿隧道及连接工程（全过程工程咨询）（招标项目名称），中标价：1118.07401 万元。

现就联合体事宜订立如下协议。

（一）、英泰克工程顾问（上海）有限公司为本联合体的主体单位。

（二）、联合体成员单位在本协议中的责任

1、联合体各方将共同协商决策，严格按照国家法律法规，履行合同并获得由此而得到的收益，对各自负责的工作承担相应责任。

2、联合体的一方没有履行自己的义务时，应承担联合体其他成员由此而造成的直接损失。

3、因联合体的一方或双方没有履行自己的义务，造成联合体在履行与业主的合同时违约或联合体与业主的合同无法继续履行时，直接责任方应承担相关责任。

（三）、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

1、联合体主体单位英泰克工程顾问（上海）有限公司承担（1）项目管理:项目计划统筹及总体管理、项目策划管理、勘察管理、技术管理、进度管理、投资管理、质量管理、安全生产管理、项目组织协调管理、招标采购管理、合同管理、档案管理、报批报建管理、信息管理（含 BIM 咨询及信息化应用管理）、竣工验收收尾及移交管理、工程结（决）算管理、风险管理、后评价工作及与项目建设管理相关的其他工作。提出创新技术应用、智慧工地建设等策划方案，并监督相关单位实施。（2）工程监理：施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修监理及后续服务管理以及与工程监理相关的其他工作（不含电力管线迁改工程）。（3）专项工程技术咨询：以招标人实际需求为准。

1

HZ-NB-2208028

2、联合体成员单位北京城建设计发展集团股份有限公司负责设计管理工作。

（四）、联合体费用分配

1、联合体各方根据实际工作分工所对应咨询费如下：

观盛二路－大和路下穿隧道及连接工程（全过程工程咨询）合同额1118.07401万元，经过联合体成员各方共同协商后联合体各方的咨询费暂定为：联合体主体单位英泰克工程顾问（上海）有限公司为：1060.27401万元；联合体成员单位北京城建设计发展集团股份有限公司为：57.8万元。各方最终服务费以全过程工程咨询合同规定的结算方式为准。

2、联合体各方针对本项目在合同履约阶段各自支出的相关费用由各自承担。

3.如增加工作内容需单独计费并签订补充协议。

五、联合体成员单位费用支付

联合体主体单位负责向甲方申请咨询费，再由联合体主体单位根据工作节点支付给联合体成员单位。费用支付节点如下：

付费次序	占总设计费%	付费额（万元）	付费时间（由交付设计文件所决定）
第一次付费	20	11.56	方案设计完成后15天内，且甲方已支付咨询费。
第二次付费	30	17.34	初步设计完成后15天内，且甲方已支付咨询费。
第三次付费	40	23.12	施工图设计完成后15天内，且甲方已支付咨询费至20%时。
第四次付费	10	结清所有款项	甲方出具项目最终履约评价后15天内。

六、在项目实施过程中，本协议未尽事宜，由双方协商解决。

七、因履行本协议所引起的一切争议，各方应在诚信原则基础上协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，各方当事人同意由项目所在地仲裁委员会仲裁。

八、本协议经各方签字盖章后生效，履行完协议约定的全部义务、结算各项费用或者该项目未能履行，则本协议自动终止。

九、本协议一式贰拾份，联合体主体单位及联合体成员单位方各执壹拾份。

工程咨询人（1）（联合体主体单位）

（公章）：英泰克工程顾问（上海）有限公司

住所： 上海市静安区江场路 1401 弄 14 号 301-6 室

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

电话：021-68407646

传真：021-68407646

开户银行： 中国银行上海漕河泾支行

账户：457259250753

邮政编码：200122

工程咨询人（2）（联合体成员单位）

（公章）：北京城建设计发展集团股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门北大街五号

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

电话：010-88336231

传真：010-68300793

开户银行：中国建设银行北京北环支行

账户：11001028700056034719

邮政编码：100037 日期：2022 年 6 月 日

履约评价：

2023 年第一季度：

查询网址：

https://www.szlhq.gov.cn/bmxxgk/jzgws/qt/lypj/content/post_10637132.html

2023年第一季度履约评价结果分类统计表

合同类别	合同份数	优秀	良好	中等	合格	不合格
施工	83	1	19	37	19	7
设计	71	1	33	28	9	0
全过程造价咨询	74	1	36	33	4	0
勘察	29	2	20	4	3	0
监理	35	1	10	13	9	2
工程咨询	62	3	21	28	10	0
代建	11	1	4	2	4	0
EPC	11	1	6	2	2	0
合计	**376**	**11**	**149**	**147**	**60**	**9**

2023年第一季度合同履约评价结果汇总表

序号	合同类型	项目名称	履约单位	评价科室	评价得分	评价等级
1	设计	龙华文化艺术中心升级改造	深圳市建筑设计研究总院有限公司	工程管理二部	82	良好
2	工程咨询	龙华文化艺术中心升级改造	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程管理二部	80	良好
3	设计	松平公园	深圳市朗石园林设计工程有限公司	工程管理三部	85	良好
4	全过程造价咨询	福花路（观兴西路-观兴东路）	深圳市华夏工程顾问有限公司	工程管理五部	75	中等
5	设计	长顺路空中连廊（CS-02与CS-03）工程	上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司	工程管理五部	84	良好
6	设计	深圳北站商务中心区跨铁路廊桥	林同棪国际工程咨询（中国）有限公司、长沙铁路勘察设计有限公司、海南水文地质工程地质勘察院	工程管理五部	85	良好
7	设计	规划二路（永乐路东延段）又名：永乐路（下岭排路-观状水泰路）工程	深圳市市政设计研究院有限公司	工程管理四部	78	中等
8	勘察	规划二路（永乐路东延段）又名：永乐路（下岭排路-观状水泰路）工程	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	工程管理四部	80	良好
9	设计	规划一路（浪水路-永乐路）又名：下岭排路（浪水路-永乐路）工程	深圳市市政设计研究院有限公司	工程管理四部	78	中等
10	勘察	规划一路（浪水路-永乐路）又名：下岭排路（浪水路-永乐路）工程	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	工程管理四部	80	良好
11	全过程造价咨询	福悦路（龙澜大道-合和科技园）工程	深圳市广诚工程顾问有限公司	工程管理五部	80	良好
12	施工	福悦路（龙澜大道-合和科技园）工程	深圳市市政工程总公司	工程管理五部	72.82	中等
13	工程咨询	福悦路（龙澜大道-合和科技园）工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	68.07	合格
14	设计	深圳市第二十七高级中学配套道路工程	中天设计咨询有限公司	工程管理二部	78	中等
15	勘察	福花路（观兴东路-圆黎南路）工程	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	工程管理五部	60	合格
16	监理	福花路（观兴东路-圆黎南路）工程	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	工程管理五部	76.8	中等
17	施工	福润路（福悦路-龙澜大道）工程	深圳市市政工程总公司	工程管理五部	78.9	中等
18	工程咨询	福润路（福悦路-龙澜大道）工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	71.62	中等
19	勘察	龙华学校配套道路工程	深圳华粤城市建设工程设计有限公司	工程管理一部	82	良好

356	监理	民新派出所	深圳市建控地盘监理有限公司	工程管理三部	80	良好
357	施工	民新派出所	中建三局第二建设工程有限公司	工程管理三部	80.49	良好
358	代建	民新派出所	深圳市龙华人才安居有限公司	工程管理三部	80	良好
359	设计	上塘派出所	深圳市清华苑建筑与规划设计研究有限公司	工程管理三部	65	合格
360	勘察	上塘派出所	深圳市长勘勘察设计有限公司	工程管理三部	80	良好
361	全过程造价咨询	上塘派出所	云基智慧工程股份有限公司	工程管理三部	82	良好
362	施工	上塘派出所	中国建筑第六工程局有限公司	工程管理三部	61.72	合格
363	工程咨询	上塘派出所	广东华禹工程咨询有限公司//国机中兴工程咨询有限公司	工程管理三部	65.82	合格
364	设计	区档案馆建设项目	浙江西城工程设计有限公司	工程管理三部	78	中等
365	勘察	区档案馆建设项目	深圳地质建设工程公司	工程管理三部	85	良好
366	全过程造价咨询	区档案馆建设项目	深圳市栋森工程项目管理有限公司	工程管理三部	84	良好
367	监理	区档案馆建设项目	中海监理有限公司	工程管理三部	81.61	良好
368	施工	区档案馆建设项目	中建二局第三建筑工程有限公司	工程管理三部	70.44	中等
369	设计	观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程	天津城建设计院有限公司	工程管理五部	86	良好
370	全过程造价咨询	观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程	四川同创建设工程管理有限公司	工程管理五部	85	良好
371	施工	观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程	深圳市市政工程总公司	工程管理五部	85.605	良好
372	工程咨询	观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程	英泰克工程顾问（上海）有限公司//北京城建设计发展集团股份有限公司	工程管理五部	87.7075	良好
373	施工	片区路网综合整治工程第二批-龙华水斗南片区	湖南望新建设集团股份有限公司	工程管理五部	56.6	不合格
374	施工	大浪浪口-泥头咀片区路网整治工程	天津市市政工程设计研究院（设计）/天津市市政工程设计研究院（勘察）/中恒建设集团有限公司	工程管理五部	30	不合格
375	施工	油联路（工业路-油松路）改造工程	深圳市蛇口建筑安装工程有限公司	工程管理四部	6	不合格
376	设计	油松派出所	深圳市建筑设计研究总院有限公司	工程管理三部	83	良好

2023 年第二季度：

查询网址：

https://www.szlhq.gov.cn/bmxxgk/jzgws/qt/lypj/content/post_10832333.html

2023年第二季度履约评价结果分类统计表

合同类别	合同份数	优秀	良好	中等	合格	不合格
EPC	12	0	5	7	0	0
代建	16	0	8	5	3	0
工程咨询	65	4	29	21	11	0
监理	36	1	8	17	9	1
勘察	24	2	15	6	0	1
全过程造价咨询	84	2	46	32	3	1
设计	80	4	36	30	10	0
施工	77	2	18	27	27	3
合计	**394**	**15**	**165**	**145**	**63**	**6**

2023年第二季度合同履约评价结果汇总表

序号	合同类型	项目名称	履约单位	评价科室	评价得分	评价等级
1	施工	第六立面提升	深圳市联博建筑工程技术有限公司	工程管理四部	84	良好
2	施工	清泉外国语学校初中部配套道路工程	深圳市鹏润达控股集团有限公司	工程管理一部	75	中等
3	施工	龙华学校配套道路工程	中建三局集团（深圳）有限公司	工程管理一部	75.2	中等
4	施工	观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程	深圳市市政工程总公司	工程管理五部	85.15	良好
5	施工	宝君路（环观南路-君新路）市政工程	中铁五局集团深圳工程有限责任公司	工程管理五部	74.5	中等
6	施工	景悦路南北连接工程	深圳市市政工程总公司	工程管理五部	78.34	中等
7	施工	上塘医院（01-13）地块场平工程	深圳市鹏润达控股集团有限公司	工程管理四部	70.19	中等
8	施工	桂荣路（桂月路-黎光新工业区）工程	深圳市兴远工程有限公司	工程管理四部	60.43	合格
9	施工	浪景路工程	深圳市市政工程总公司	工程管理五部	78	中等
10	施工	龙峰小学配套道路项目	深圳市路安达工程有限公司	工程管理一部	81.73	良好
11	施工	福民学校	中建海峡建设发展有限公司	工程管理一部	70.51	中等
12	施工	油松路（布龙路至东环二路）改造工程	中冶建工集团有限公司	工程管理五部	78	中等
13	施工	富荣路（狮径路-悦兴路）工程	广州市第二市政工程有限公司	工程管理四部	56.91	不合格
14	施工	横坑水库西侧产业园区场平工程	中冶建工集团有限公司	工程管理四部	61.37	合格
15	施工	观平路改造工程	中国建筑第七工程局有限公司	工程管理五部	64.56	合格
16	施工	大浪北路市政工程	中建八局第二建设有限公司	工程管理五部	77	中等
17	施工	景祥路（平安路-金园路）工程	深圳格亨实业集团有限公司	工程管理五部	62	合格
18	施工	樟桂路（龙观快速路-桂祥路）市政工程	武汉市市政建设集团有限公司	工程管理五部	58.07	不合格
19	施工	龙华区云璞幼儿园（艺术幼儿园）	深圳市景鹏建设工程有限公司	工程管理一部	72	中等

293	监理	龙华新区人民医院新外科大楼工程	深圳市京圳工程咨询有限公司	工程管理三部	68.32	合格
294	监理	东和花园三期（好日子保障性住房）	深圳市邦迪工程顾问有限公司	工程管理一部	74.64	中等
295	监理	东和花园三期（好日子保障性住房）	深圳市燃气工程监理有限公司	工程管理一部	71	中等
296	监理	新田停车场综合体	深圳市启光建设监理有限公司	工程管理二部	72	中等
297	监理	龙华区中心医院扩建工程	深圳市首嘉工程顾问有限公司	工程管理三部	68.17	合格
298	监理	龙华区综合医院	深圳市特发工程建设监理有限公司	工程管理三部	76.17	中等
299	监理	白松公园地下停车场项目	深圳市深龙港建设监理有限公司	工程管理二部	65	合格
300	监理	区档案馆建设项目	中海监理有限公司	工程管理三部	81.54	良好
301	监理	75615部队（竹村部队）西侧挡墙治理工程	广州市广州工程建设监理有限公司	工程管理五部	72.81	中等
302	工程咨询	龙华文化艺术中心升级改造	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程管理二部	80	良好
303	工程咨询	章阁工业园区配套道路工程	江西中昌工程咨询监理有限公司//天津市政工程设计研究总院有限公司	工程管理四部	74.65	中等
304	工程咨询	福悦路（龙澜大道-合和科技园）工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	69.75	合格
305	工程咨询	龙华学校配套道路工程	深圳市众鑫工程造价咨询有限公司	工程管理一部	85	良好
306	工程咨询	观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程	英泰克工程顾问（上海）有限公司//北京城建设计发展集团股份有限公司	工程管理五部	90.7	优秀
307	工程咨询	景悦路南北连接工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	69.7	合格
308	工程咨询	地下原水隧洞（禹坑-鹅颈）新建工程	深圳市水务规划设计院股份有限公司//北京燕波工程管理有限公司	工程管理五部	85.2	良好
309	工程咨询	浪景路工程	福州市规划设计研究院集团有限公司/深圳地铁工程咨询有限公司	工程管理五部	84	良好
310	工程咨询	横坑水库西侧产业园区场平工程	浙江江南工程管理股份有限公司	工程管理四部	80.57	良好
311	工程咨询	栢恒保障房配套学校	上海同济工程咨询有限公司//深圳机械院建筑设计有限公司	工程管理一部	78.67	中等
312	工程咨询	龙华文化广场地下停车场	深圳科宇工程顾问有限公司//中国五洲工程设计集团有限公司	工程管理二部	80	良好
313	工程咨询	樟坑径片区法定图则06-23地块规划学校	广东海外建设咨询有限公司//中国建筑西南设 计研究院有限公司	工程管理二部	77	中等

2023 年第三季度：

查询网址：

https://www.szlhq.gov.cn/bmxxgk/jzgws/qt/lypj/content/post_11013647.html

2023年第三季度履约评价结果分类统计表

合同类别	合同份数	优秀	良好	中等	合格	不合格
施工	83	4	29	29	17	4
设计	88	3	42	24	16	3
全过程造价咨询	94	5	49	35	4	1
勘察	30	1	18	7	4	0
监理	43	3	14	19	6	1
工程咨询	71	2	29	32	8	0
代建	17	1	4	8	4	0
EPC	13	0	8	5	0	0
合计	**439**	**19**	**193**	**159**	**59**	**9**

2023年第三季度合同履约评价结果汇总表

序号	合同类型	项目名称	履约单位	评价科室	评价得分	评价等级
1	施工	第六立面提升	深圳市联博建筑工程技术有限公司	工程管理四部	85.88	良好
2	施工	第六立面提升	深圳市联博建筑工程技术有限公司	工程管理四部	85.88	良好
3	施工	北站壹号公共服务层建设工程	启迪数字科技（深圳）有限公司	工程管理三部	73.01	中等
4	施工	北站壹号公共服务层建设工程	宏伟建设工程股份有限公司	工程管理三部	74.55	中等
5	施工	清泉外国语学校初中部配套道路工程	深圳市鹏润达控股集团有限公司	工程管理一部	72	中等
6	施工	松平公园	中建五局第三建设（深圳）有限公司//中建五局第三建设有限公司	工程管理三部	82.67	良好
7	施工	观澜高新园近期整治提升工程（二期）	深圳榕亨实业集团有限公司	工程管理五部	63.06	合格
8	施工	长顺路空中连廊（CS-02与CS-03）工程	深圳市典汉豫建筑工程有限公司	工程管理五部	61	合格
9	施工	龙华二线拓展区白松路（新区大道-民塘路）新通路（白松一路-白松路）工程	深圳市市政工程总公司	工程管理五部	93	优秀
10	施工	求知东路(梅观高速东辅道-横滨西二路)工程	深圳市鹏润达控股集团有限公司	工程管理五部	84.2	良好
11	施工	福悦路（龙澜大道-合和科技园）工程	深圳市市政工程总公司	工程管理五部	71.27	中等
12	施工	澜盛二路新建工程	中建三局第一建设工程有限责任公司	工程管理三部	76.39	中等
13	施工	福润路（福悦路-龙澜大道）工程	深圳市市政工程总公司	工程管理五部	79.45	中等
14	施工	龙华学校配套道路工程	中建三局集团（深圳）有限公司	工程管理一部	72.13	中等
15	施工	观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程	深圳市市政工程总公司	工程管理五部	85.36	良好
16	施工	福花路（龙澜大道-九龙山2号变电站）工程	深圳市市政工程总公司	工程管理五部	78.21	中等
17	施工	宝君路（环观南路-君新路）市政工程	中铁五局集团深圳工程有限责任公司	工程管理五部	85.5	良好
18	施工	景悦路南北连接工程	深圳市市政工程总公司	工程管理五部	70.25	中等
19	施工	上塘医院（01-13）地块场平工程	深圳市鹏润达控股集团有限公司	工程管理四部	60.8	合格

序号	合同类型	项目名称	履约单位	评价科室	评价得分	评价等级
339	工程咨询	龙华文化艺术中心升级改造	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程管理二部	79	中等
340	工程咨询	章阁工业园区配套道路工程	江西中昌工程咨询监理有限公司//天津市政工程设计研究总院有限公司	工程管理四部	80.96	良好
341	工程咨询	福悦路（龙澜大道-合和科技园）工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	79.42	中等
342	工程咨询	福润路（福悦路-龙澜大道）工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	79.28	中等
343	工程咨询	观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程	美泰克工程顾问（上海）有限公司//北京城建设计发展集团股份有限公司	工程管理五部	85.26	良好
344	工程咨询	福花路（龙澜大道-九龙山2号变电站）工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	78.42	中等
345	工程咨询	华达路改扩建工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	86	良好
346	工程咨询	观盛五路-清祥路通道工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	76	中等
347	工程咨询	景悦路南北连接工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	68.3	合格
348	工程咨询	观兴东路道路工程	江苏建科工程咨询有限公司	工程管理五部	74.5	中等
349	工程咨询	地下原水隧洞（禹坑-鹅颈）新建工程	深圳市水务规划设计院股份有限公司//北京燕波工程管理有限公司	工程管理五部	78	中等
350	工程咨询	浪景路工程	福州市规划设计研究院集团有限公司/深圳地铁工程咨询有限公司	工程管理五部	78	中等
351	工程咨询	横坑水库西侧产业园区场平工程	浙江江南工程管理股份有限公司	工程管理四部	80.8	良好
352	工程咨询	栢恒保障房配套学校	上海同济工程咨询有限公司//深圳机械院建筑设计有限公司	工程管理一部	81	良好
353	工程咨询	龙华文化广场地下停车场	深圳科宇工程顾问有限公司//中国五洲工程设计集团有限公司	工程管理二部	80	良好
354	工程咨询	樟坑径片区法定图则06-23地块规划学校	广东海外建设咨询有限公司//中国建筑西南设 计研究院有限公司	工程管理二部	70.74	中等
355	工程咨询	白石龙文化中心	深圳市东部工程咨询有限公司//深圳市建筑设计研究总院有限公司	工程管理四部	65.14	合格
356	工程咨询	龙华交警大队观澜中队（含龙华车管分所）营房建设项目	深圳市东部工程咨询有限公司//深圳市建筑设计研究总院有限公司	工程管理三部	80.64	良好
357	工程咨询	深圳市第三十四高级中学	深圳市邦迪工程顾问有限公司//深圳查创国际设计股份有限公司	工程管理一部	76	中等

2023 年第四季度：

查询网址：

https://www.szlhq.gov.cn/bmxxgk/jzgws/qt/lypj/content/post_11201642.html

2023年第四季度履约评价结果分类统计表

合同类别	合同份数	优秀	良好	中等	合格	不合格
施工	79	11	30	17	16	5
设计	83	1	46	23	13	0
全过程造价咨询	81	0	47	31	3	0
勘察	36	3	21	11	1	0
监理	35	2	16	9	8	0
工程咨询	57	3	31	20	3	0
代建	18	2	5	6	5	0
EPC	12	0	5	6	1	0
合计	**401**	**22**	**201**	**123**	**50**	**5**

2023年第四季度合同履约评价结果汇总表

序号	合同类型	项目名称	履约单位	评价科室	评价得分	评价等级
1	施工	北站查号公共服务层建设工程	启迪数字科技（深圳）有限公司	工程管理三部	80.87	良好
2	施工	北站查号公共服务层建设工程	宏伟建设工程股份有限公司	工程管理三部	86.93	良好
3	施工	深莞先进制造走廊攀光片区配套道路工程	深圳市市政工程总公司	工程管理四部	80.11	良好
4	施工	清泉外国语学校初中部配套道路工程	深圳市鹏阔达控股集团有限公司	工程管理一部	74.00	中等
5	施工	松平公园	中建五局第三建设（深圳）有限公司//中建五局第三建设有限公司	工程管理三部	91.88	优秀
6	施工	观澜高新园近期整治提升工程（二期）	深圳榕亨实业集团有限公司	工程管理五部	62.56	合格
7	施工	龙华二线拓展区白松路（新区大道-民塘路）新通路（白松一路-白松路）工程	深圳市市政工程总公司	工程管理五部	94.00	优秀
8	施工	求知东路(梅观高速东辅道-横浒西二路)工程	深圳市鹏阔达控股集团有限公司	工程管理五部	90.27	优秀
9	施工	福悦路（龙澜大道-合和科技园）工程	深圳市市政工程总公司	工程管理五部	82.02	良好
10	施工	澜盛二路新建工程	中建三局第一建设工程有限责任公司	工程管理三部	82.39	良好
11	施工	福润路（福悦路-龙澜大道）工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	81.24	良好
12	施工	龙华学校配套道路工程	中建三局集团（深圳）有限公司	工程管理一部	65.33	合格
13	施工	观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	90.18	优秀
14	施工	福花路（龙澜大道-九龙山2号变电站）工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	82.23	良好
15	施工	宝君路（环观南路-君新路）市政工程	中铁五局集团深圳工程有限责任公司	工程管理五部	87.49	良好
16	施工	景悦路南北连接工程	深圳市市政工程总公司	工程管理五部	85.36	良好
17	施工	桂荣路（桂月路-黎光新工业区）工程	深圳市兴远工程有限公司	工程管理四部	69.52	合格
18	施工	观兴东路道路工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	80.28	良好
19	施工	浪景路工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	80.00	良好

308	监理	新石社区党群服务中心项目	深圳市甘泉建设监理有限公司	工程管理三部	68.23	合格
309	监理	龙华新区人民医院新外科大楼工程	深圳市京圳工程咨询有限公司	工程管理三部	68.34	合格
310	监理	新田停车场综合体	深圳市启光建设监理有限公司	工程管理二部	85.00	良好
311	监理	龙华区中心医院扩建工程	深圳市首嘉工程顾问有限公司	工程管理三部	81.00	良好
312	监理	区档案馆建设项目	中海监理有限公司	工程管理三部	83.50	良好
313	监理	75615部队（竹村部队）西侧挡墙治理工程	广州市广州工程建设监理有限公司	工程管理五部	80.50	良好
314	工程咨询	龙华文化艺术中心升级改造	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程管理二部	80.00	良好
315	工程咨询	深莞先进制造走廊攀光片区配套道路工程	云基智慧工程股份有限公司	工程管理四部	71.40	中等
316	工程咨询	章阁工业园区配套道路工程	江西中昌工程咨询监理有限公司//天津市政工程设计研究总院有限公司	工程管理四部	76.00	中等
317	工程咨询	福悦路（龙澜大道-合和科技园）工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	80.32	良好
318	工程咨询	福润路（福悦路-龙澜大道）工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	81.08	良好
319	工程咨询	观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程	英泰克工程顾问（上海）有限公司//北京城建设计发展集团股份有限公司	工程管理五部	90.30	优秀
320	工程咨询	福花路（龙澜大道-九龙山2号变电站）工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	79.33	中等
321	工程咨询	华达路改扩建工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理四部	80.00	良好
322	工程咨询	观盛五路-清祥路通道工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	87.00	良好
323	工程咨询	景悦路南北连接工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	80.28	良好
324	工程咨询	观兴东路道路工程	江苏建科工程咨询有限公司	工程管理五部	86.16	良好
325	工程咨询	地下原水隧洞（禹坑-鹅颈）新建工程	深圳市水务规划设计院股份有限公司//北京燕波工程管理有限公司	工程管理五部	87.60	良好
326	工程咨询	浪景路工程	福州市规划设计研究院集团有限公司/深圳地铁工程咨询有限公司	工程管理五部	80.00	良好
327	工程咨询	横坑水库西侧产业园区场平工程	浙江江南工程管理股份有限公司	工程管理四部	86.00	良好
328	工程咨询	龙华区实验学校至喜校区新建工程	广东海外建设咨询有限公司//中国建筑西南设计研究院有限公司	工程管理一部	79.00	中等
329	工程咨询	柏恒保障房配套学校	上海同济工程咨询有限公司//深圳机械院建筑设计有限公司	工程管理一部	82.00	良好
330	工程咨询	深圳市龙华区观朗实验学校（原名：樟坑径片区法定图则06-23地块规划学校）	广东海外建设咨询有限公司//中国建筑西南设 计研究院有限公司	工程管理二部	75.32	中等
331	工程咨询	白石龙文化中心	深圳市东部工程咨询有限公司//深圳市建筑设计研究总院有限公司	工程管理四部	63.00	合格

2023 年年度：

查询网址：

https://www.szlhq.gov.cn/bmxxgk/jzgws/qt/lypj/content/post_11201642.html

2023年度履约评价结果分类统计表

合同类别	合同份数	优秀	良好	中等	合格	不合格
施工	97	4	27	39	24	3
设计	111	1	52	46	11	1
全过程造价咨询	103	2	52	46	3	0
勘察	53	5	26	19	3	0
监理	49	1	17	23	7	1
工程咨询	71	0	28	35	8	0
代建	23	1	7	13	2	0
EPC	14	0	4	10	0	0
合计	**521**	**14**	**213**	**231**	**58**	**5**

2023年度合同履约评价结果汇总表

序号	合同类型	项目名称	履约单位	评价科室	评价得分	评价等级
1	施工	北站查号公共服务层建设工程	启迪数字科技（深圳）有限公司	工程管理三部	76.94	中等
2	施工	北站查号公共服务层建设工程	宏伟建设工程股份有限公司	工程管理三部	80.74	良好
3	施工	深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程	深圳市市政工程总公司	工程管理四部	80.11	良好
4	施工	清泉外国语学校初中部配套道路工程	深圳市腾辉达控股集团有限公司	工程管理一部	73.67	中等
5	施工	松平公园	中建五局第三建设（深圳）有限公司/中建五局第三建设有限公司	工程管理三部	87.28	良好
6	施工	观澜高新园近期整治提升工程（二期）	深圳恒享实业集团有限公司	工程管理五部	62.81	合格
7	施工	长顺路空中连廊（CS-02与CS-03）工程	深圳市典仪德建筑工程有限公司	工程管理五部	61.00	合格
8	施工	龙华二线拓展区白松路（新区大道-民塘路）新建路（白松一路-白松路）工程	深圳市市政工程总公司	工程管理五部	93.50	优秀
9	施工	求知东路(梅观高速东辅道-横坪西二路)工程	深圳市腾辉达控股集团有限公司	工程管理五部	87.24	良好
10	施工	福悦路（龙澜大道-合和科技园）工程	深圳市市政工程总公司	工程管理五部	75.37	中等
11	施工	澜盛二路新建工程	中建三局第一建设工程有限责任公司	工程管理三部	79.39	中等
12	施工	福润路（福悦路-龙澜大道）工程	深圳市欧集团有限公司	工程管理五部	81.24	良好
13	施工	龙华学校配套道路工程	中建三局集团（深圳）有限公司	工程管理一部	71.93	中等
14	施工	观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程	深圳市欧集团有限公司	工程管理五部	90.18	优秀
15	施工	福花路（龙澜大道-九龙山2号变电站）工程	深圳市欧集团有限公司	工程管理五部	82.23	良好
16	施工	宝昌路（环观南路-昌新路）市政工程	中铁五局集团深圳工程有限责任公司	工程管理五部	82.50	良好
17	施工	英泰工业中心城市更新单元规划学校配套道路	深圳市市政工程总公司/中建科工集团有限公司	工程管理一部	74.88	中等
18	施工	景悦路南北连接工程	深圳市市政工程总公司	工程管理五部	78.41	中等
19	施工	上塘医院（01-13）地块场平工程	深圳市腾辉达控股集团有限公司	工程管理四部	65.50	合格
20	施工	桂荣路（桂月路-黎光新工业区）工程	深圳市兴远工程有限公司	工程管理四部	63.86	合格
21	施工	观盛四路（澜汇路-科盛路）工程	深圳市路安达工程有限公司	工程管理五部	92.30	优秀
22	施工	观兴东路道路工程	深圳市欧集团有限公司	工程管理五部	80.28	良好
23	施工	浪景路工程	深圳市欧集团有限公司	工程管理五部	80.00	良好
24	施工	龙峰小学配套道路项目	深圳市路安达工程有限公司	工程管理一部	77.60	中等
25	施工	清声路、新业路、规划路新建工程项目（原名称：龙华街道清湖富多肯城市更新单元配套道路项目）	深圳市腾辉达控股集团有限公司	工程管理四部	66.42	合格
26	施工	福民学校	中建鸿峻建设发展有限公司	工程管理一部	71.93	中等
27	施工	油松路（布龙路至东环二路）改造工程	中冶建工集团有限公司	工程管理五部	77.75	中等
28	施工	富荣路（梅径路-悦兴路）工程	广州市第二市政工程有限公司	工程管理四部	58.14	不合格
29	施工	长湖东路（朗松路-武馆路）工程	重庆建工集团股份有限公司	工程管理二部	78.00	中等
402	监理	大浪文化艺术中心	深圳市盲嘉工程顾问有限公司	工程管理四部	85.20	良好
403	监理	大浪体育中心	深圳华西建设工程管理有限公司	工程管理四部	87.82	良好
404	监理	华联社区党群服务中心项目	深圳市斌骏建设工程顾问有限公司	工程管理三部	71.45	中等
405	监理	新石社区党群服务中心项目	深圳市甘泉建设监理有限公司	工程管理三部	69.68	合格
406	监理	龙华区人民武装部新营区工程	深圳市恒信建工程项目管理有限公司	工程管理四部	87.00	良好
407	监理	民丰学校	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程管理二部	66.43	合格
408	监理	龙华新区人民医院新外科大楼工程	深圳市京圳工程咨询有限公司	工程管理三部	69.80	合格
409	监理	新田停车场综合体	深圳市启光建设监理有限公司	工程管理二部	81.33	良好
410	监理	龙华区中心医院扩建工程	深圳市盲嘉工程顾问有限公司	工程管理三部	71.52	中等
411	监理	白松公园地下停车场项目	深圳市深龙港建设监理有限公司	工程管理二部	75.67	中等
412	监理	区档案馆建设项目	中海监理有限公司	工程管理三部	81.88	良好
413	监理	75615部队（竹村部队）西侧挡墙治理工程	广州市广州工程建设监理有限公司	工程管理五部	75.40	中等
414	工程咨询	龙华文化艺术中心升级改造	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程管理二部	79.50	中等
415	工程咨询	深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程	云基智慧工程股份有限公司	工程管理四部	71.40	中等
416	工程咨询	章阁工业园区配套道路工程	江西中昌工程咨询监理有限公司/天津市政工程设计研究总院有限公司	工程管理四部	77.20	中等
417	工程咨询	福悦路（龙澜大道-合和科技园）工程	浙江天成项目管理有限公司/中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	74.39	中等
418	工程咨询	福润路（福悦路-龙澜大道）工程	浙江天成项目管理有限公司/中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	77.33	中等
419	工程咨询	观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程	基泰克工程顾问（上海）有限公司/北京城建设计发展集团股份有限公司	工程管理五部	88.49	良好
420	工程咨询	福花路（龙澜大道-九龙山2号变电站）工程	浙江天成项目管理有限公司/中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	78.87	中等
421	工程咨询	华达路改扩建工程	浙江天成项目管理有限公司/中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理四部	83.00	良好
422	工程咨询	观盛五路-清祥路通道工程	浙江天成项目管理有限公司/中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	74.33	中等
423	工程咨询	景悦路南北连接工程	浙江天成项目管理有限公司/中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	71.62	中等
424	工程咨询	观兴东路道路工程	江苏建科工程咨询有限公司	工程管理五部	80.33	良好
425	工程咨询	地下原水隧洞（雷坑-鹅颈）新建工程	深圳市水务规划设计院股份有限公司/北京燕院工程管理有限公司	工程管理五部	85.42	良好
426	工程咨询	浪景路工程	福州市规划设计研究院集团有限公司/深圳地铁工程咨询有限公司	工程管理五部	79.75	中等
427	工程咨询	横坑水库西侧产业园区场平工程	浙江江南工程管理股份有限公司	工程管理四部	82.16	良好
428	工程咨询	龙华区实验学校至番校区新建工程	广东海外建设咨询有限公司/中国建筑西南设计研究院有限公司	工程管理一部	79.00	中等
429	工程咨询	相馆保障房配套学校	上海同济工程咨询有限公司/深圳机械院建筑设计有限公司	工程管理一部	80.56	良好
430	工程咨询	龙华文化广场地下停车场	深圳科宇工程顾问有限公司/中国五洲工程设计集团有限公司	工程管理二部	78.33	中等
431	工程咨询	深圳市龙华区观湖实验学校（原名：樟坑径片区统定图则6-23地块规划学校）	广东海外建设咨询有限公司/中国建筑西南设计研究院有限公司	工程管理二部	75.77	中等
432	工程咨询	白石龙文化中心	深圳市东部工程咨询有限公司/深圳市建筑设计研究总院有限公司	工程管理四部	64.38	合格

2024 年第一季度：

查询网址：

https://www.szlhq.gov.cn/bmxxgk/jzgws/qt/lypj/content/post_11366776.html

2024年第一季度履约评价结果分类统计表

合同类别	合同份数	优秀	良好	中等	合格	不合格
施工	72	8	29	20	10	5
设计	74	1	36	29	8	0
全过程造价咨询	75	1	45	26	3	0
勘察	33	1	20	11	1	0
监理	30	1	14	9	6	0
工程咨询	54	1	34	16	2	1
代建	19	2	7	6	4	0
EPC	11	4	7	0	0	0
合计	**368**	**19**	**192**	**117**	**34**	**6**

2024年第一季度合同履约评价结果汇总表

序号	合同类型	项目名称	履约单位	评价科室	评价得分	评价等级
1	施工	深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程	深圳市市政工程总公司	工程管理四部	76.79	中等
2	施工	观澜高新园近期整治提升工程（二期）	深圳棕亨实业集团有限公司	工程管理五部	51.80	不合格
3	施工	长顺路空中连廊（CS-02与CS-03）工程	深圳市典汉濠建筑工程有限公司	工程管理五部	70.00	中等
4	施工	龙华二线拓展区白松路（新区大道-民塘路）新通路（白松一路-白松路）工程	深圳市市政工程总公司	工程管理五部	91.00	优秀
5	施工	福悦路（龙澜大道-合和科技园）工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	77.41	中等
6	施工	澜盛三路新建工程	中建三局第一建设工程有限责任公司	工程管理三部	85.39	良好
7	施工	澜盛二路新建工程	中建三局第一建设工程有限责任公司	工程管理三部	90.00	优秀
8	施工	福润路（福悦路-龙澜大道）工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	83.09	良好
9	施工	龙华学校配套道路工程	中建三局集团（深圳）有限公司	工程管理一部	79.54	中等
10	施工	观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	88.52	良好
11	施工	福花路（龙澜大道-九龙山2号变电站）工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	80.15	良好
12	施工	华达路改扩建工程	深圳市景鹏建设工程有限公司// 济南城建集团有限公司	工程管理四部	71.70	中等
13	施工	宝荷路（环观南路-君新路）市政工程	中铁五局集团深圳工程有限责任公司	工程管理五部	82.86	良好
14	施工	英泰工业中心城市更新单元规划学校配套道路	深圳市市政工程总公司//中建科工集团有限公司	工程管理一部	80.00	良好
15	施工	景悦路南北连接工程	深圳市市政工程总公司	工程管理五部	82.35	良好
16	施工	桂荣路（桂月路-黎光新工业区）工程	深圳市兴远工程有限公司	工程管理四部	62.15	合格
17	施工	观兴东路道路工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	82.45	良好
18	施工	浪景路工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	86.00	良好
19	施工	清奔路、新业路、规划路新建工程项目（原名称：龙华街道清湖富多肯城市更新单元配套道路项目）	深圳市鹏润达控股集团有限公司	工程管理四部	80.00	良好

272	监理	樟桂路（龙观快速路-桂祥路）市政工程	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	工程管理五部	72.54	中等
273	监理	地铁4号线红山站至深圳北站区段声屏障增设工程	深圳市大众工程管理有限公司	工程管理五部	81.00	良好
274	监理	深圳北站超核绿芯项目	中咨工程管理咨询有限公司	工程管理四部	82.00	良好
275	监理	新围学校	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	工程管理一部	85.20	良好
276	监理	龙华区高级中学初中部（南校区）	浙江天成项目管理有限公司	工程管理一部	75.01	中等
277	监理	福龙学校	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	工程管理一部	83.51	良好
278	监理	大浪文化艺术中心	深圳市首嘉工程顾问有限公司	工程管理四部	86.23	良好
279	监理	大浪体育中心	深圳华西建设工程管理有限公司	工程管理四部	90.37	优秀
280	监理	新石社区党群服务中心项目	深圳市甘泉建设监理有限公司	工程管理三部	69.50	合格
281	监理	龙华新区人民医院新外科大楼工程	深圳市京圳工程咨询有限公司	工程管理三部	62.40	合格
282	监理	新田停车场综合体	深圳市启光建设监理有限公司	工程管理二部	64.00	合格
283	监理	龙华区中心医院扩建工程	深圳市首嘉工程顾问有限公司	工程管理三部	65.00	合格
284	监理	区档案馆建设项目	中海监理有限公司	工程管理三部	82.86	良好
285	工程咨询	观湖音乐厅声学及设备工程	深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司	工程管理四部	78.00	中等
286	工程咨询	龙华文化艺术中心升级改造	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程管理二部	80.00	良好
287	工程咨询	深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程	云基智慧工程股份有限公司	工程管理四部	81.23	良好
288	工程咨询	章阁工业园区配套道路工程	江西中昌工程咨询监理有限公司//天津市政工程设计研究总院有限公司	工程管理四部	80.47	良好
289	工程咨询	深高北扩建校区配套道路新建工程	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司//湖南省建筑设计院集团股份有限公司	工程管理二部	84.64	良好
290	工程咨询	福悦路（龙澜大道-合和科技园）工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	73.80	中等
291	工程咨询	福润路（福悦路-龙澜大道）工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	80.62	良好
292	工程咨询	观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程	英泰克工程顾问（上海）有限公司//北京城建设计发展集团股份有限公司	工程管理五部	89.79	良好

2024 年第二季度：

查询网址：

https://www.szlhq.gov.cn/bmxxgk/jzgws/qt/lypj/content/post_11581840.html

2024年第二季度履约评价结果分类统计表

合同类别	合同份数	优秀	良好	中等	合格	不合格
施工	77	8	38	16	11	4
设计	76	0	48	22	5	1
全过程造价咨询	82	0	56	22	4	0
勘察	26	1	19	5	1	0
监理	34	0	15	15	3	1
工程咨询	52	4	24	18	6	0
代建	18	0	10	4	4	0
EPC	9	1	6	2	0	0
合计	**374**	**14**	**216**	**104**	**34**	**6**

2024年第二季度合同履约评价结果汇总表

序号	合同类型	项目名称	履约单位	评价科室	评价得分	评价等级
1	施工	华南物流园隐患点整治工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	92.00	优秀
2	施工	深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程	深圳市市政工程总公司	工程管理四部	77.44	中等
3	施工	桂平路 新环路及海存路新建工程	深圳市政集团有限公司	工程管理四部	80.26	良好
4	施工	观澜高新园近期整治提升工程（二期）	深圳榕亨实业集团有限公司	工程管理五部	54.90	不合格
5	施工	长顺路空中连廊（CS-02与CS-03）工程	深圳市典汉濠建筑工程有限公司	工程管理五部	55.00	不合格
6	施工	观澜北（企坪）地区03-02-01、03-02-02地块配套道路工程	深圳市典汉濠建筑工程有限公司	工程管理四部	78.67	中等
7	施工	龙华二线拓展区白松路（新区大道-民塘路）新通路（白松—路-白松路）工程	深圳市市政工程总公司	工程管理五部	88.00	良好
8	施工	福悦路（龙澜大道-合和科技园）工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	81.24	良好
9	施工	澜盛三路新建工程	中建三局第一建设工程有限责任公司	工程管理三部	85.00	良好
10	施工	澜盛二路新建工程	中建三局第一建设工程有限责任公司	工程管理三部	90.00	优秀
11	施工	福润路（福悦路-龙澜大道）工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	85.35	良好
12	施工	龙华学校配套道路工程	中建三局集团（深圳）有限公司	工程管理一部	82.26	良好
13	施工	观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	85.56	良好
14	施工	福花路（龙澜大道-九龙山2号变电站）工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	80.15	良好
15	施工	华达路改扩建工程	深圳市景鹏建设工程有限公司//济南城建集团有限公司	工程管理四部	67.40	合格
16	施工	宝君路（环观南路-君新路）市政工程	中铁五局集团深圳工程有限责任公司	工程管理五部	81.27	良好
17	施工	英泰工业中心城市更新单元规划学校配套道路	深圳市市政工程总公司/中建科工集团有限公司	工程管理一部	85.83	良好
18	施工	景悦路南北连接工程	深圳市市政工程总公司	工程管理五部	86.18	良好
19	施工	桂荣路（桂月路-黎光新工业区）工程	深圳市兴远工程有限公司	工程管理四部	78.43	中等

293	监理	新田停车场综合体	深圳市启光建设监理有限公司	工程管理二部	65.00	合格
294	监理	龙华区中心医院扩建工程	深圳市首嘉工程顾问有限公司	工程管理三部	76.00	中等
295	监理	区档案馆建设项目	中海监理有限公司	工程管理三部	82.16	良好
296	工程咨询	龙华文化艺术中心升级改造	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程管理二部	80.00	良好
297	工程咨询	观澜大水坑地区15-01地块场平工程	深圳科宇工程顾问有限公司/北京城建设计发展集团股份有限公司//北京城建勘测设计研究院有限责任公司	工程管理四部	79.00	中等
298	工程咨询	深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程	云基智慧工程股份有限公司	工程管理四部	77.79	中等
299	工程咨询	福花路（酒黎南路-规划梅创路）新建工程	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程管理五部	82.40	良好
300	工程咨询	桂平路 新环路及海存路新建工程	江西中昌工程咨询监理有限公司//天津市政工程设计研究总院有限公司	工程管理四部	77.19	中等
301	工程咨询	深高北扩建校区配套道路新建工程	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司//湖南省建筑设计院集团股份有限公司	工程管理二部	77.44	中等
302	工程咨询	福悦路（龙澜大道-合和科技园）工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	78.37	中等
303	工程咨询	福润路（福悦路-龙澜大道）工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	78.62	中等
304	工程咨询	观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程	英泰克工程顾问（上海）有限公司/北京城建设计发展集团股份有限公司	工程管理五部	82.61	良好
305	工程咨询	福花路（龙澜大道-九龙山2号变电站）工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	79.33	中等
306	工程咨询	华达路改扩建工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理四部	70.20	中等
307	工程咨询	观盛五路-清祥路通道工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	80.00	良好
308	工程咨询	景悦路南北连接工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	79.32	中等
309	工程咨询	观兴东路道路工程	江苏建科工程咨询有限公司	工程管理五部	83.27	良好
310	工程咨询	地下原水隧洞（茜坑-鹅颈）新建工程	深圳市水务规划设计院股份有限公司/北京燕波工程管理有限公司	工程管理五部	90.40	优秀
311	工程咨询	浪景路工程	福州市规划设计研究院集团有限公司/深圳地铁工程咨询有限公司	工程管理五部	81.00	良好
312	工程咨询	栢恒保障房配套学校	上海同济工程咨询有限公司//深圳机械院建筑设计有限公司	工程管理一部	83.20	良好
313	工程咨询	深圳市龙华区观湖实验学校（原名：樟坑径片区法定图则06-23地块规划学校）	广东海外建设咨询有限公司//中国建筑西南设 计研究院有限公司	工程管理二部	81.01	良好

2024 年第三季度：

查询网址：

https://www.szlhq.gov.cn/bmxxgk/jzgws/qt/lypj/content/post_11918452.html

2024年第三季度履约评价结果分类统计表

合同类别	合同份数	优秀	良好	中等	合格	不合格
施工	79	6	49	10	9	5
设计	91	3	60	23	3	2
全过程造价咨询	94	2	73	17	2	0
勘察	39	1	31	7	0	0
监理	39	1	25	8	5	0
工程咨询	58	3	39	13	3	0
代建	19	1	13	3	2	0
EPC	9	1	7	1	0	0
合计	**428**	**18**	**297**	**82**	**24**	**7**

2024年第三季度合同履约评价结果汇总表

序号	合同类型	项目名称	履约单位	评价科室	评价得分	评价等级
1	施工	华达路改扩建工程（一期）	深圳市景鹏建设工程有限公司 // 济南城建集团有限公司	工程管理四部	65	合格
2	施工	红山中学配套道路新建工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	84	良好
3	施工	梅观高速新增声屏障工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	84	良好
4	施工	坂澜大道西侧华章新筑声屏障工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	84	良好
5	施工	观澜大水坑地区15-01地块场平工程	中建三局集团（深圳）有限公司	工程管理六部	80.5	良好
6	施工	星火创新器械产业园区场平工程	深圳市路安达工程有限公司	工程管理六部	75.52	中等
7	施工	建盛路、建环路和建优路新建道路工程（原名：黎光工业地块(13-(6M1)配套道路工程）	深圳市兴班建筑工程有限公司	工程管理六部	74.15	中等
8	施工	深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程	深圳市市政工程总公司	工程管理六部	75.27	中等
9	施工	福花路（泗黎南路-规划梅创路）新建工程	深圳市政集团有限公司	工程管理六部	80.55	良好
10	施工	观澜高新园近期整治提升工程（二期）	深圳裕亨实业集团有限公司	工程管理五部	5	不合格
11	施工	长顺路空中连廊（CS-02与CS-03）工程	深圳市典汉廉建筑工程有限公司	工程管理五部	68	合格
12	施工	观澜北（企坪）地区03-02-01、03-02-02地块配套道路工程	深圳市典汉廉建筑工程有限公司	工程管理六部	80	良好
13	施工	澜盛三路新建工程	中建三局第一建设工程有限责任公司	工程管理三部	80	良好
14	施工	澜盛二路新建工程	中建三局第一建设工程有限责任公司	工程管理三部	85	良好
15	施工	龙华学校配套道路工程	中建三局集团（深圳）有限公司	工程管理一部	80.35	良好
16	施工	观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	82.32	良好
17	施工	宝君路（环观南路-君新路）市政工程	中铁五局集团深圳工程有限责任公司	工程管理五部	80.68	良好
18	施工	英泰工业中心城市更新单元规划学校配套道路	深圳市市政工程总公司//中建科工集团有限公司	工程管理一部	80.79	良好
19	施工	人民路学校配套道路工程	中建二局深圳南方建设投资有限公司 // 中国建筑第二工程局有限公司	工程管理一部	83	良好

330	监理	110千伏云昌I、II线下地工程	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	工程管理五部	78.8	中等
331	监理	龙华新城核心地区20-02-02地块规划学校	深圳市邦迪工程顾问有限公司	工程管理二部	85	良好
332	监理	深圳北站超核绿芯项目	中咨工程管理咨询有限公司	工程管理四部	84	良好
333	监理	新围学校	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	工程管理一部	84.21	良好
334	监理	龙华区高级中学初中部（南校区）	浙江天成项目管理有限公司	工程管理一部	76.01	中等
335	监理	福龙学校	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	工程管理一部	81.27	良好
336	监理	大浪文化艺术中心	深圳市首嘉工程顾问有限公司	工程管理四部	90	优秀
337	监理	大浪体育中心	深圳华西建设工程管理有限公司	工程管理四部	87.96	良好
338	监理	华联社区党群服务中心项目	深圳市棋骏建设工程顾问有限公司	工程管理三部	61.51	合格
339	监理	新石社区党群服务中心项目	深圳市甘泉建设监理有限公司	工程管理三部	72.18	中等
340	监理	新田停车场综合体	深圳市启光建设监理有限公司	工程管理四部	79	中等
341	监理	龙华区中心医院扩建工程	深圳市首嘉工程顾问有限公司	工程管理三部	80	良好
342	监理	区档案馆建设项目	中海监理有限公司	工程管理三部	75.39	中等
343	工程咨询	龙华文化艺术中心升级改造	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程管理四部	84	良好
344	工程咨询	华达路改扩建工程（一期）	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理四部	69	合格
345	工程咨询	观澜大水坑地区15-01地块场平工程	深圳科宇工程顾问有限公司//北京城建设计发展集团股份有限公司//北京城建勘测设计研究院有限责任公司	工程管理六部	83.31	良好
346	工程咨询	深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程	云基智慧工程股份有限公司	工程管理六部	71.67	中等
347	工程咨询	福花路（泗黎南路-规划梅创路）新建工程	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程管理六部	80.32	良好
348	工程咨询	深高北扩建校区配套道路新建工程	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司//湖南省建筑设计院集团股份有限公司	工程管理二部	80	良好
349	工程咨询	观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程	英泰克工程顾问（上海）有限公司//北京城建设计发展集团股份有限公司	工程管理五部	83.18	良好
350	工程咨询	观盛五路-清祥路通道工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	91	优秀
351	工程咨询	景悦路南北连接工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理六部	71.22	中等
352	工程咨询	观兴东路道路工程	江苏建科工程咨询有限公司	工程管理五部	80.99	良好
353	工程咨询	地下原水隧洞（茜坑-鹅颈）新建工程	深圳市水务规划设计院股份有限公司//北京燕波工程管理有限公司	工程管理五部	83.51	良好

2024 年第四季度：

查询网址：

https://www.szlhq.gov.cn/bmxxgk/jzgws/qt/lypj/content/post_12099061.html

2024年第四季度履约评价结果分类统计表

合同类别	合同份数	优秀	良好	中等	合格	不合格
施工	80	7	40	22	8	3
设计	83	0	48	31	4	0
全过程造价咨询	87	0	39	46	2	0
勘察	29	1	14	13	1	0
监理	38	0	16	15	7	0
工程咨询	58	4	27	25	2	0
代建	17	0	8	8	1	0
EPC	6	1	3	2	0	0
合计	**398**	**13**	**195**	**162**	**25**	**3**

2024年第四季度合同履约评价结果汇总表

序号	合同类型	项目名称	履约单位	评价科室	评价得分	评价等级
1	施工	龙华文化艺术中心升级改造	中建海峡（深圳）建设发展有限公司//中建海峡建设发展有限公司	工程管理四部	86	良好
2	施工	华达路改扩建工程（一期）	深圳市景鹏建设工程有限公司// 济南城建集团有限公司	工程管理四部	68	合格
3	施工	红山中学配套道路新建工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	82	良好
4	施工	梅观高速新增声屏障工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	82	良好
5	施工	坂澜大道西侧华章新筑声屏障工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	88	良好
6	施工	观澜大水坑地区15-01地块场平工程	中建三局集团（深圳）有限公司	工程管理六部	79.38	中等
7	施工	黎光工业地块（13-08M1）边坡治理工程	铁科院（深圳）特种工程有限公司	工程管理六部	80.97	良好
8	施工	建盛路、建环路和建优路新建道路工程（原名：黎光工业地块(13-08M1)配套道路工程）	深圳市兴班建筑工程有限公司	工程管理六部	72.91	中等
9	施工	深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程	深圳市市政工程总公司	工程管理六部	79.48	中等
10	施工	龙华区轨道站点（周边1公里）接驳慢行系统建设工程	深圳市鹏润达控股集团有限公司	工程管理五部	84	良好
11	施工	福花路（泗黎南路-规划梅创路）新建工程	深圳市政集团有限公司	工程管理六部	82.3	良好
12	施工	观澜高新园近期整治提升工程（二期）	深圳榕亨实业集团有限公司	工程管理五部	5	不合格
13	施工	长源路空中连廊（CS-02与CS-03）工程	深圳市典汉濠建筑工程有限公司	工程管理五部	70	中等
14	施工	观澜北（企坪）地区03-02-01、03-02-02地块配套道路工程	深圳市典汉濠建筑工程有限公司	工程管理六部	80.56	良好
15	施工	沙吓南路南北段工程（深圳市第二十七高级中学配套道路工程）	中建五局第三建设（深圳）有限公司（联合体主体单位）//中建五局第三建设有限公司（联合体成员单位）	工程管理二部	75.33	中等
16	施工	澜盛三路新建工程	中建三局第一建设工程有限责任公司	工程管理三部	83.86	良好
17	施工	澜盛二路新建工程	中建三局第一建设工程有限责任公司	工程管理三部	90.75	优秀
18	施工	澜盛一路(鹭湖大道-澜盛三路)新建工程	中建三局第一建设工程有限责任公司	工程管理三部	88	良好
19	施工	龙华学校配套道路工程	中建三局集团（深圳）有限公司	工程管理一部	83.08	良好
20	施工	观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	84.3	良好
21	施工	宝君路（环观南路-君新路）市政工程	中铁五局集团深圳工程有限责任公司	工程管理五部	82.72	良好
22	施工	景悦路南北连接工程	深圳市政集团有限公司	工程管理六部	72.13	中等

310	监理	龙华新城核心地区20-02-02地块规划学校	深圳市邦迪工程顾问有限公司	工程管理二部	79.23	中等
311	监理	深圳北站超铁绿芯项目	中咨工程管理咨询有限公司	工程管理四部	84	良好
312	监理	大浪文化艺术中心	深圳市首嘉工程顾问有限公司	工程管理四部	81	良好
313	监理	大浪体育中心	深圳华西建设工程管理有限公司	工程管理四部	83.6	良好
314	监理	华联社区党群服务中心项目	深圳市祺骏建设工程顾问有限公司	工程管理三部	68.1	合格
315	监理	新石社区党群服务中心项目	深圳市甘泉建设监理有限公司	工程管理三部	61	合格
316	监理	新田停车场综合体	深圳市启光建设监理有限公司	工程管理四部	78	中等
317	监理	区档案馆建设项目	中海监理有限公司	工程管理三部	70.59	中等
318	工程咨询	龙华文化艺术中心升级改造	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程管理四部	86	良好
319	工程咨询	华达路改扩建工程（一期）	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理四部	75	中等
320	工程咨询	观澜大水坑地区15-01地块场平工程	深圳科宇工程顾问有限公司//北京城建设计发展集团股份有限公司//北京城建勘测设计研究院有限责任公司	工程管理六部	80.51	良好
321	工程咨询	深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程	云基智慧工程股份有限公司	工程管理六部	73.32	中等
322	工程咨询	福花路（泗黎南路-规划梅创路）新建工程	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程管理六部	85.17	良好
323	工程咨询	深高北扩建校区配套道路新建工程	深圳市恒盾建工程项目管理有限公司//湖南省建筑设计院集团股份有限公司	工程管理二部	77.2	中等
324	工程咨询	福悦路（龙澜大道-合和科技园）工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理六部	78.82	中等
325	工程咨询	福润路（福悦路-龙澜大道）工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理六部	78	中等
326	工程咨询	观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程	英泰克工程顾问（上海）有限公司//北京城建设计发展集团股份有限公司	工程管理五部	85.14	良好
327	工程咨询	福花路（龙澜大道-九龙山2号变电站）工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理六部	75	中等
328	工程咨询	观盛五路-清祥路通道工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	85	良好
329	工程咨询	景悦路南北连接工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理六部	82.82	良好
330	工程咨询	观兴东路道路工程	江苏建科工程咨询有限公司	工程管理五部	80	良好
331	工程咨询	地下原水隧洞（雨坑-鹅颈）新建工程	深圳市水务规划设计院股份有限公司//北京燕波工程管理有限公司	工程管理五部	84.86	良好
332	工程咨询	浪景路工程	福州市规划设计研究院集团有限公司//深圳地铁工程咨询有限公司	工程管理五部	80	良好
333	工程咨询	深圳外环高速黎光互通立交改造工程（深圳外环高速黎光互通新增匝道工程）	中交第一公路勘察设计研究院有限公司（联合体牵头单位）//西安方舟工程咨询有限责任公司（联合体成员）	工程管理六部	73.22	中等

2024 年年度：

查询网址：

https://www.szlhq.gov.cn/bmxxgk/jzgws/qt/lypj/content/post_12099061.html

2024年度履约评价结果分类统计表

合同类别	合同份数	优秀	良好	中等	合格	不合格
施工	91	3	51	21	14	2
设计	104	0	58	42	4	0
全过程造价咨询	100	0	54	45	1	0
勘察	57	0	35	20	2	0
监理	44	0	20	18	6	0
工程咨询	59	0	31	24	4	0
代建	20	0	9	8	3	0
EPC	7	1	5	1	0	0
合计	**482**	**4**	**263**	**179**	**34**	**2**

2024年度合同履约评价结果汇总表

序号	合同类型	项目名称	履约单位	评价科室	评价得分	评价等级
1	施工	龙华文化艺术中心升级改造	中建海峡（深圳）建设发展有限公司/中建海峡建设发展有限公司	工程管理四部	86.00	良好
2	施工	黎泰路下穿梅观段新建道路工程（黎泰路下穿梅观段节点工程）	深圳市兹集团有限公司	工程管理六部	80.00	良好
3	施工	华达路改扩建工程（一期）	深圳市景鹏建设工程有限公司//济南城建集团有限公司	工程管理四部	66.50	合格
4	施工	红山中学配套道路新建工程	深圳市兹集团有限公司	工程管理五部	83.00	良好
5	施工	梅观高速新增声屏障工程	深圳市兹集团有限公司	工程管理五部	83.00	良好
6	施工	坂澜大道西侧华泰新筑声屏障工程	深圳市兹集团有限公司	工程管理五部	86.00	良好
7	施工	观澜大水坑地区15-01地块场平工程	中建三局集团（深圳）有限公司	工程管理六部	79.94	中等
8	施工	星火创新器械产业园区场平工程	深圳市路安达工程有限公司	工程管理六部	75.52	中等
9	施工	黎光工业地块（13-08M1）边坡治理工程	铁科院（深圳）特种工程有限公司	工程管理六部	80.97	良好
10	施工	建盛路、建环路和建优路新建道路工程（原名：黎光工业地块13-08M1配套道路工程）	深圳市兴班建筑工程有限公司	工程管理六部	73.53	中等
11	施工	深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程	深圳市市政工程总公司	工程管理六部	77.25	中等
12	施工	龙华区轨道站点（周边1公里）接驳慢行系统建设工程	深圳市鹏润达控股集团有限公司	工程管理五部	84.00	良好
13	施工	清泉外国语学校初中部配套道路工程（永淳路、华康路）	深圳市鹏润达控股集团有限公司	工程管理一部	81.00	良好
14	施工	福花路（润黎南路-规划梅创路）新建工程	深圳市兹集团有限公司	工程管理六部	81.43	良好
15	施工	桂平路新环路及海存路新建工程	深圳市兹集团有限公司	工程管理六部	80.26	良好
16	施工	观澜高新园近期整治提升工程（二期）	深圳榕亨实业集团有限公司	工程管理五部	29.18	不合格
17	施工	长顺路空中连廊（CS-02与CS-03）	深圳市典汉濠建筑工程有限公司	工程管理五部	65.75	合格
18	施工	观澜北（企坪）地区03-02-01、03-02-02地块配套道路工程	深圳市典汉濠建筑工程有限公司	工程管理六部	79.74	中等
19	施工	沙吓南路南北段工程（深圳市第二十七高级中学配套道路工程）	中建五局第三建设（深圳）有限公司（联合体主体单位）//中建五局第三建设有限公司（联合体成员单位）	工程管理二部	75.33	中等
20	施工	澜盛三路新建工程	中建三局第一建设工程有限责任公司	工程管理三部	83.56	良好
21	施工	澜盛二路新建工程	中建三局第一建设工程有限责任公司	工程管理三部	88.94	良好
22	施工	澜盛一路(鹭湖大道-澜盛三路)新建工程	中建三局第一建设工程有限责任公司	工程管理三部	88.00	良好
23	施工	龙华学校配套道路工程	中建三局集团（深圳）有限公司	工程管理一部	81.31	良好

399	工程咨询	深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程	云基智慧工程股份有限公司	工程管理六部	76.00	中等
400	工程咨询	观澜大水坑地区15-01地块场平工程	深圳科宇工程顾问有限公司//北京城建设计发展集团股份有限公司/北京城建勘测设计研究院有限责任公司	工程管理六部	80.94	良好
401	工程咨询	桂平路新环路及海存路新建工程	江西中昌工程咨询监理有限公司/天津市兹工程设计研究总院有限公司	工程管理六部	79.67	中等
402	工程咨询	深高北扩建校区配套道路新建工程	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司/湖南省建筑设计院集团股份有限公司	工程管理二部	79.82	中等
403	工程咨询	福花路（润黎南路-规划梅创路）新建工程	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程管理六部	82.63	良好
404	工程咨询	华达路改扩建工程（现状华荫路）	浙江天成项目管理有限公司/中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	71.60	中等
405	工程咨询	观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程	英泰克工程顾问（上海）有限公司//北京城建设计发展集团股份有限公司	工程管理五部	85.18	良好
406	工程咨询	观盛五路-清祥路通道工程	浙江天成项目管理有限公司/中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	84.25	良好
407	工程咨询	景悦路南北连接工程	浙江天成项目管理有限公司/中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理六部	78.92	中等
408	工程咨询	源高路-园兴路通道工程	浙江天成项目管理有限公司/中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	81.00	良好
409	工程咨询	观兴东路道路工程	江苏建科工程咨询有限公司	工程管理五部	81.91	良好
410	工程咨询	地下原水隧洞（禹坑-略源）新建工程	深圳市水务规划设计院股份有限公司/北京燕波工程管理有限公司	工程管理五部	86.75	良好
411	工程咨询	深圳外环高速黎光互通立交改造工程（深圳外环高速黎光互通新增匝道工程）	中交第一公路勘察设计研究院有限公司（联合体牵头单位）/西安方舟工程咨询有限责任公司（联合体成员）	工程管理六部	73.22	中等
412	工程咨询	浪景路工程	福州市规划设计研究院集团有限公司/深圳地铁工程咨询有限公司	工程管理五部	83.00	良好
413	工程咨询	九龙山产业园区涉及法定图则未覆盖区域规划学校	深圳市联合创艺建筑设计有限公司//广州珠江监理咨询集团有限公司	工程管理一部	77.00	中等
414	工程咨询	观城第一期城市更新单元规划学校	五洲工程顾问集团有限公司/深圳市东大国际工程设计有限公司	工程管理一部	79.50	中等
415	工程咨询	福城社新土地整备利益统筹项目土地整备项目规划学校	金地（集团）股份有限公司//华南理工大学建筑设计研究院有限公司/深圳科宇工程顾问有限公司	工程管理一部	81.00	良好
416	工程咨询	深圳市第三十五高级中学	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司/深圳市东部工程咨询有限公司	工程管理一部	80.00	良好
417	工程咨询	深圳市第三十七高级中学	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司/深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	工程管理二部	75.49	中等
418	工程咨询	福城冠都电器厂城市更新单元规划学校	友谊国际工程咨询股份有限公司/华南理工大学建筑设计研究院有限公司	工程管理一部	81.00	良好
419	工程咨询	新华中学新教学楼建设工程项目	广州珠江监理咨询集团有限公司/深圳市联合 艺建筑设计有限公司	工程管理二部	82.98	良好
420	工程咨询	龙华区实验学校至善校区新建工程	广东海外建设咨询有限公司//中国建筑西南设计研究院有限公司	工程管理一部	80.00	良好
421	工程咨询	福悦路北侧地下停车场建设工程	江苏建科工程咨询有限公司（主体单位）奥意建筑工程设计有限公司（成员单位）	工程管理四部	81.20	良好
422	工程咨询	柘恒保障房配套学校	上海同济工程咨询有限公司//深圳机械院建筑设计有限公司	工程管理一部	81.60	良好
423	工程咨询	华龙幼儿园	友谊国际工程咨询股份有限公司	工程管理一部	74.11	中等

2025 年第一季度：

查询网址：

https://www.szlhq.gov.cn/bmxxgk/jzgws/qt/lypj/content/post_12231439.html

2025年第一季度履约评价结果分类统计表

合同类别	合同份数	优秀	良好	中等	合格	不合格
施工	76	4	40	19	7	6
设计	82	0	42	38	3	0
全过程造价咨询	69	0	39	27	3	0
勘察	25	0	15	10	0	0
监理	31	0	17	11	2	1
工程咨询	65	4	34	21	6	0
代建	14	1	9	3	0	0
EPC	6	0	2	4	0	0
合计	**368**	**9**	**198**	**133**	**21**	**7**

2025年第一季度合同履约评价结果汇总表

序号	合同类型	项目名称	履约单位	评价科室	评价得分	评价等级
1	施工	龙华文化艺术中心升级改造	中建海峡（深圳）建设发展有限公司//中建海峡建设发展有限公司	工程管理四部	75	中等
2	施工	华达路改扩建工程（一期）	深圳市景鹏建设工程有限公司// 济南城建集团有限公司	工程管理四部	63.38	合格
3	施工	红山中学配套道路新建工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	85	良好
4	施工	新华医院配套道路（新区大道-长顺路）新建工程	中城交建（深圳）建设有限公司	工程管理五部	64	合格
5	施工	海神路、新腾路、新怡街新建工程	深圳市政集团有限公司	工程管理六部	80.67	良好
6	施工	观澜大水坑地区15-01地块场平工程	中建三局集团（深圳）有限公司	工程管理六部	73.49	中等
7	施工	黎光工业地块（13-08M1）边坡治理工程	铁科院（深圳）特种工程有限公司	工程管理六部	80.13	良好
8	施工	建盛路、建环路和建优路新建道路工程（原名：黎光工业地块(13-08M1)配套道路工程）	深圳市兴新建筑工程有限公司	工程管理六部	77.1	中等
9	施工	深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程	深圳市市政工程总公司	工程管理六部	75.16	中等
10	施工	龙华区轨道站点（周边1公里）接驳慢行系统建设工程	深圳市鹏润达控股集团有限公司	工程管理五部	82	良好
11	施工	观澜北（企坪）地区03-02-01、03-02-02地块配套道路工程	深圳市典汉濠建筑工程有限公司	工程管理六部	80.14	良好
12	施工	沙吓南路南北段工程（深圳市第二十七高级中学配套道路工程）	中建五局第三建设（深圳）有限公司（联合体主体单位）//中建五局第三建设有限公司（联合体成员单位）	工程管理二部	75.93	中等
13	施工	澜盛三路新建工程	中建三局第一建设工程有限责任公司	工程管理三部	88	良好
14	施工	澜盛二路新建工程	中建三局第一建设工程有限责任公司	工程管理三部	85	良好
15	施工	澜盛一路(鹭湖大道-澜盛三路)新建工程	中建三局第一建设工程有限责任公司	工程管理三部	80	良好
16	施工	观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	83	良好
17	施工	深圳北站商务中心区留仙大道中段跨街连廊LX-02工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	84	良好
18	施工	宝君路（环观南路-君新路）市政工程	中铁五局集团深圳工程有限责任公司	工程管理五部	78	中等
19	施工	观光路观澜体育公园段人行天桥工程	深圳市建宏达建设实业有限公司	工程管理六部	70.27	中等
20	施工	景悦路南北连接工程	深圳市政集团有限公司	工程管理六部	86.6	良好
294	工程咨询	下横朗十路（华旺路-华新西二路）	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	工程管理四部	81.87	良好
295	工程咨询	观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程	英泰克工程顾问（上海）有限公司//北京城建设计发展集团股份有限公司	工程管理五部	82	良好
296	工程咨询	观盛五路-清祥路通道工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	80	良好
297	工程咨询	景悦路南北连接工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理六部	84.4	良好
298	工程咨询	富澜路（安元大道-大布西路）工程	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司//湖南省建筑设计院集团股份有限公司	工程管理六部	80.53	良好
299	工程咨询	观兴东路道路工程	江苏建科工程咨询有限公司	工程管理五部	65	合格
300	工程咨询	地下原水隧洞（茜坑-鹅颈）新建工程	深圳市水务规划设计院股份有限公司//北京燕波工程管理有限公司	工程管理五部	85	良好
301	工程咨询	能源路工程（原：浪景路工程）	福州市规划设计研究院集团有限公司/深圳地铁工程咨询有限公司	工程管理五部	85	良好
302	工程咨询	深圳外环高速黎光互通立交改造工程（深圳外环高速黎光互通新增匝道工程）	中交第一公路勘察设计研究院有限公司（联合体牵头单位）/西安方舟工程咨询有限责任公司（联合体成员）	工程管理六部	85	良好
303	工程咨询	赤岭头一片区城市更新单元规划学校	北京国金管理咨询有限公司//华南理工大学建筑设计研究院有限公司	工程管理二部	78.56	中等
304	工程咨询	福城桔新土地整备利益统筹项目土地整备项目规划学校	金地（集团）股份有限公司//华南理工大学建筑设计研究院有限公司//深圳科宇工程顾问有限公司	工程管理一部	79	中等
305	工程咨询	九龙山产业园区涉及法定图则未覆盖区城规划学校	深圳市联合创艺建筑设计有限公司//广州珠江监理咨询集团有限公司	工程管理一部	80	良好
306	工程咨询	观城第一期城市更新单元规划学校	五洲工程顾问集团有限公司//深圳市东大国际工程设计有限公司	工程管理一部	66.8	合格
307	工程咨询	深圳市第三十五高级中学	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司\深圳市东部工程咨询有限公司	工程管理一部	80.5	良好
308	工程咨询	华南物流园土地整备利益统筹学校新建工程	深圳科宇工程顾问有限公司//华南理工大学建筑设计研究院有限公司	工程管理二部	80.13	良好
309	工程咨询	观湖北产业片区土地整备利益统筹项目规划学校	北京国金管理咨询有限公司	工程管理二部	78.67	中等
310	工程咨询	观湖街道松元厦大布头片区更新单元规划学校	深圳科宇工程顾问有限公司//中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	工程管理一部	80.3	良好
311	工程咨询	龙华区实验学校至善校区新建工程	广东海外建设咨询有限公司//中国建筑西南设计研究院有限公司	工程管理一部	73.53	中等
312	工程咨询	福悦路北侧地下停车场建设工程	江苏建科工程咨询有限公司（主体单位） 奥意建筑工程设计有限公司（成员单位）	工程管理四部	84.6	良好
313	工程咨询	柏恒保障房配套学校	上海同济工程咨询有限公司//深圳机械院建筑设计有限公司	工程管理一部	81.86	良好
314	工程咨询	深圳市龙华区观湖实验学校（原名：樟坑径片区法定图则[06-23]地块规划学校）	广东海外建设咨询有限公司//中国建筑西南设 计研究院有限公司	工程管理二部	77.33	中等

2025 年第二季度：

查询网址：

https://www.szlhq.gov.cn/bmxxgk/jzgws/qt/lypj/content/post_12231439.html

2025年第二季度履约评价结果分类统计表

合同类别	合同份数	优秀	良好	中等	合格	不合格
施工	78	7	32	26	9	4
设计	80	0	39	35	6	0
全过程造价咨询	71	1	45	23	1	1
勘察	26	0	15	9	2	0
监理	33	0	17	10	6	0
工程咨询	67	1	39	22	5	0
代建	14	0	7	7	0	0
EPC	6	1	3	2	0	0
合计	**375**	**10**	**197**	**134**	**29**	**5**

2025年第二季度合同履约评价结果汇总表

序号	合同类型	项目名称	履约单位	评价科室	评价得分	评价等级
1	施工	观湖音乐厅声学及设备工程	北京北特圣迪科技发展有限公司	工程管理四部	71	中等
2	施工	龙华文化艺术中心升级改造	中建海峡（深圳）建设发展有限公司//中建海峡建设发展有限公司	工程管理四部	68	合格
3	施工	华达路改扩建工程（一期）	深圳市景鹏建设工程有限公司// 济南城建集团有限公司	工程管理四部	63.05	合格
4	施工	新华医院配套道路（新区大道-长顺路）新建工程	中城交建（深圳）建设有限公司	工程管理五部	60.61	合格
5	施工	观澜大水坑地区15-01地块场平工程	中建三局集团（深圳）有限公司	工程管理六部	77.32	中等
6	施工	黎光工业地块（13-08M1）边坡治理工程	铁科院（深圳）特种工程有限公司	工程管理六部	79.86	中等
7	施工	建盛路、建环路和建优路新建道路工程（原名：黎光工业地块(13-08M1)配套道路工程）	深圳市兴旅建筑工程有限公司	工程管理六部	78.13	中等
8	施工	深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程	深圳市市政工程总公司	工程管理六部	80.62	良好
9	施工	福花路（润黎南路-规划梅创路）新建工程	深圳市政集团有限公司	工程管理六部	73.7	中等
10	施工	观澜北（企坪）地区03-02-01、03-02-02地块配套道路工程	深圳市典汉廉建筑工程有限公司	工程管理六部	75.02	中等
11	施工	下横朗十路（华旺路-华新西二路）	中建三局集团（深圳）有限公司	工程管理四部	81	良好
12	施工	沙坏南路南北段工程（深圳市第二十七高级中学配套道路工程）	中建五局第三建设（深圳）有限公司（联合体主体单位）//中建五局第三建设有限公司（联合体成员单位）	工程管理二部	65.29	合格
13	施工	澜盛三路新建工程	中建三局第一建设工程有限责任公司	工程管理三部	90	优秀
14	施工	澜盛二路新建工程	中建三局第一建设工程有限责任公司	工程管理三部	83	良好
15	施工	澜盛一路(鹭湖大道-澜盛三路)新建工程	中建三局第一建设工程有限责任公司	工程管理三部	90	优秀
16	施工	观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	79	中等
17	施工	深圳北站商务中心区前仙大道中段跨街连廊 LX-02工程	深圳市政集团有限公司	工程管理五部	83	良好
18	施工	宝君路（环观南路-君新路）市政工程	中铁五局集团深圳工程有限责任公司	工程管理五部	84	良好
19	施工	观光路观澜体育公园段人行天桥工程	深圳市建宏达建设实业有限公司	工程管理六部	77.17	中等
20	施工	景悦路南北连接工程	深圳市政集团有限公司	工程管理六部	85.6	良好
21	施工	人民路学校配套道路工程	中建二局深圳南方建设投资有限公司 // 中国建筑第二工程局有限公司	工程管理一部	79.42	中等
22	施工	桂荣路（桂月路-黎光新工业区）工程	深圳市兴远工程有限公司	工程管理六部	79.66	中等

284	监理	龙华新城核心地区20-02-02地块规划学校	深圳市邦迪工程顾问有限公司	工程管理二部	80.27	良好
285	监理	大浪文化艺术中心	深圳市首嘉工程顾问有限公司	工程管理四部	78.92	中等
286	监理	大浪体育中心	深圳华西建设工程管理有限公司	工程管理四部	82	良好
287	监理	华联社区党群服务中心项目	深圳市祺骏建设工程顾问有限公司	工程管理三部	60	合格
288	监理	新石社区党群服务中心项目	深圳市甘泉建设监理有限公司	工程管理三部	65.1	合格
289	工程咨询	龙华文化艺术中心升级改造	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程管理四部	70	中等
290	工程咨询	跨百通街连廊与跨玉龙路连廊新建工程	华润置地城市运营管理（深圳）有限公司//深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司	工程管理四部	69	合格
291	工程咨询	黎泰路下穿梅观段新建道路工程（黎泰路下穿梅观段节点工程）	浙江天成项目管理有限公司（主体单位）// 中交第二公路勘察设计研究院有限公司（成员单位）	工程管理六部	85	良好
292	工程咨询	油松片区地下通道新建工程	深圳市中安项目管理有限公司	工程管理五部	83	良好
293	工程咨询	华达路改扩建工程（一期）	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理四部	78	中等
294	工程咨询	观澜大水坑地区15-01地块场平工程	深圳科宇工程顾问有限公司//北京城建设计发展集团股份有限公司//北京城建勘测设计研究院有限责任公司	工程管理六部	80.51	良好
295	工程咨询	深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程	云基智慧工程股份有限公司	工程管理六部	77.93	中等
296	工程咨询	福花路（润黎南路-规划梅创路）新建工程	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程管理六部	73.32	中等
297	工程咨询	深高北扩建校区配套道路新建工程	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司//朗南省建筑设计院集团股份有限公司	工程管理二部	79	中等
298	工程咨询	福悦路（龙澜大道-合和科技园）工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理六部	83	良好
299	工程咨询	下横朗十路（华旺路-华新西二路）	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	工程管理四部	80	良好
300	工程咨询	观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程	英泰克工程顾问（上海）有限公司//北京城建设计发展集团股份有限公司	工程管理五部	79	中等
301	工程咨询	观盛五路-清祥路通道工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	82	良好
302	工程咨询	源高路-同兴路通道工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理五部	80	良好
303	工程咨询	景悦路南北连接工程	浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司	工程管理六部	84.3	良好
304	工程咨询	下横朗八路（下横朗十路-布龙路）工程	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	工程管理四部	80	良好
305	工程咨询	富澜路（安元大道-大布西路）工程	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司//朗南省建筑设计院集团股份有限公司	工程管理六部	81.17	良好
306	工程咨询	观兴东路道路工程	江苏建科工程咨询有限公司	工程管理五部	80	良好
307	工程咨询	地下原水隧洞（茜坑-鹅颈）新建工程	深圳市水务规划设计院股份有限公司//北京燕波工程管理有限公司	工程管理五部	80	良好

项目获奖情况

荣誉证书

英泰克工程顾问（上海）有限公司：

你公司监理的 观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程 工程，荣获二〇二三年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

证书编号：SZAQWM-2023A-032

协会网址：http://www.szjzy.org.cn

深圳建筑业协会

二〇二三年四月

荣誉证书

观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程项目：

在龙华区建筑工务署2023年第四季度安全文明施工评比中获得市政类项目

第二名

特发此证，以示表彰

项目施工单位：深圳市市政工程总公司

项目监理单位：英泰克工程顾问（上海）有限公司

深圳市龙华区建筑工务署

2024年03月

2、济南轨道交通 4 号线一期工程土建工程（六标段）监理

中标通知书

20200217143242103306 5

济南公共资源交易项目

中 标 通 知 书

（工程建设类）

为实现资源优化配置，保护国家、社会公共利益和当事人的合法权益。依据国家相关法律规定程序，该项目在济南公共资源交易中心进行交易。中标公示期满，经招标人确定，同意该项目中标结果，特发此证。

项目名称	济南轨道交通4号线一期工程 土建工程监理		
标段名称	6标段	交易登记号	2020DLJL01Z5042001
招标代理机构名称	山东德勤招标评估造价咨询有限公司		

英泰克工程顾问（上海）有限公司：

济南轨道交通4号线一期工程 土建工程监理，于2020-12-30在济南公共资源交易中心进行开标评标活动，经评标委员会评审，招标人确认，你单位为中标人。

中标项目地点：济南市

中标项目概况(规模)： 6.5km 结构类型：其他

招标范围：济南轨道交通4号线一期工程土建工程施工期及保修阶段的全过程监理服务，工作内容包含但不限于土建工程、市政设施迁改、施工期间市政设施养护及维修、交通疏解、协调配合、降水回灌等，具体详见招标文件。

中标价(费率)：0.011

中标工期：计划服务期限：1956日历天，自2021年01月10日至2026年05月20日

质量要求：合格

项目负责人(项目总监)：王景之

其他内容：

招标人：济南轨道交通集团建设投资有限公司

待法定前置要件齐全后，此中标通知书生效。

招标人单位(盖章) 招标人法定代表人(负责人)(签章)

说明	此件无招标人单位盖章和招标人法定代表人(负责人)无效，请据此办理相关手续。

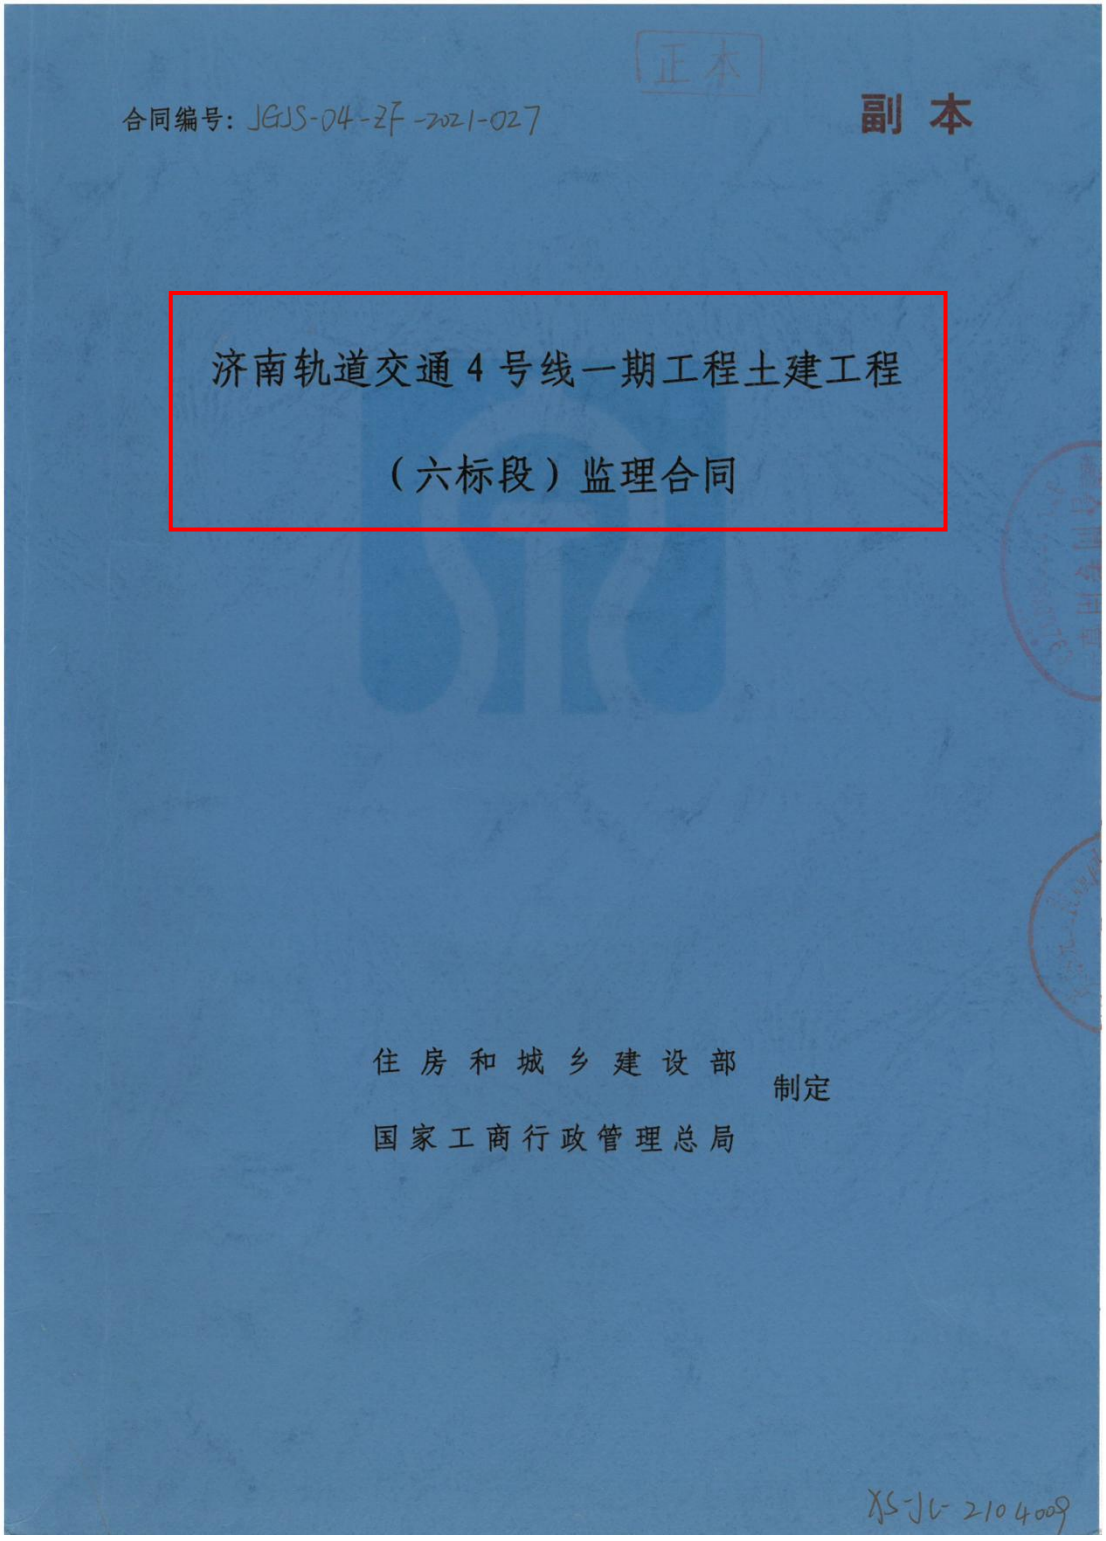
正本
合同编号：JGJS-04-ZF-2021-027
副 本
济南轨道交通4号线一期工程土建工程
（六标段）监理合同
住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
制定
XS-JL-2104009

第一部分　合同协议书

委托人（全称）： 济南轨道交通集团建设投资有限公司

监理人（全称）： 英泰克工程顾问（上海）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：济南轨道交通 4 号线一期工程土建工程监理；

2. 工程地点：济南市；

3. 工程规模：6.5 公里，奥体中心站～奥体中心东站、奥体中心东站、奥体中心东站～舜华路站、舜华路站、舜华路站～凤凰路站区间、凤凰路站、凤凰路站～林家庄站、林家庄站、林家庄站～雪山路站（四站五区间）的土建工程监理；

4. 建筑安装工程费：189000 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：王景之，身份证号码：211102196307241550，注册号：31002894。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：贰仟零柒拾玖万元整（¥ 20,790,000.00 元）。

包括：

1. 监理酬金：已包含在本合同酬金内。

2. 相关服务酬金：已包含在本合同酬金内。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：_____/_____。

（2）设计阶段服务酬金：_____/_____。

（3）保修阶段服务酬金：已包含在本合同酬金内。

（4）其他相关服务酬金：_____/_____。

六、期限

1. 监理期限：

自 2021 年 02 月 01 日始，至 2026 年 06 月 11 日止，实际开始时间以委托人通知为准。计划服务期限 1956 天 。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（2）设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（3）保修阶段服务期限自 2026 年 06 月 12 日始，至工程竣工验收合格满二十四个月止。

（4）其他相关服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2021 年 2 月 10 日。

2. 订立地点：山东省济南市。

3. 本合同一式十二份，正本二份，委托人和监理人各执一份，副本十份，委托人执六份，监理人执四份。正本与副本具有同等法律效力。

(此页为签字盖章页)

委托人：济南轨道交通集团建设投资有限公司

（盖章）

法定代表人：

或授权委托人：

住所：济南市历下区解放东路5号济南轨道交通大厦

邮政编码：250014

监理人：英泰克工程顾问（上海）有限公司

（盖章）

法定代表人：

或授权委托人：

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路1287号1幢三楼308A室

邮政编码：200122

开户银行：中国银行上海市漕河泾支行

账号：457259250753

电话：021-68407645

传真：021-68407904

住房和城乡建设行政主管机关备案意见

经办人：　　主管机关（公章）

年　月　日

工商行政管理机关鉴证意见

经办人：　　鉴证机关（公章）

年　月　日

竣 工 验 收 证 书

工程名称：济南轨道交通4号线一期工程土建工程监理六标

监理单位：英泰克工程顾问（上海）有限公司

施工单位：中铁十五局集团有限公司

中铁二十三局集团有限公司

施工许可证号：奥体中心东站370100202408191101(2024093)

林家庄站370100202404171101(2024032)

工程质量自评结论			
济南轨道交通4号线一期工程土建工程监理六标单位工程已经全部验收合格，工程验收前检查所发现的、需要整改的项目均已及时整改完毕。 整个工程质量保证资料齐全，工程的安全及使用功能检测结果符合设计及验收规范的要求，满足工程验收条件。 工程质量自评合格！			
参加竣工验收单位意见			
建设单位	项目负责人：（盖章）	设计单位	项目负责人：（盖章）
勘察单位	项目负责人：（盖章）	监理单位	总监理工程师：（盖章）
施工单位	项目经理：（盖章）		
竣工验收时间	2024 年 11月 4日		

工程名称	济南轨道交通4号线一期工程土建工程监理六标	工程地点	山东省济南市
工程造价（万元）	191968.86	施工决算（万元）	/
开工日期	2021.3.6	完工日期	
合同工期	1956日历天	竣工日期	
验收范围及主要工程量			
项目名称			主要工程数量
奥奥盾构区间	起始里程	左线：DK25+365.175 右线：DK25+365.175	2座联络通道兼泵房
	终点里程	左线：DK26+458.899 右线：DK26+458.897	
奥体中心东站	起始里程	左线：DK26+458.899 右线：DK26+458.897	地下三层车站，总建筑面积18781㎡，5个出入口（含3个暗挖通道，C2出入口暗挖101㎡。）
	终点里程	左线：DK26+678.899 右线：DK26+678.899	
奥舜盾构区间	起始里程	左线：DK26+678.899 右线：DK26+678.899	2座联络通道
	终点里程	左线：DK28+012.672 右线：DK28+012.672	
舜华路站	起始里程	左线：DK28+012.672 右线：DK28+012.672	地下两层车站（局部三层），车站总建筑面积29044.6㎡，2组风亭，3个出入口（含1个暗挖通道）
	终点里程	左线：DK28+349.172 右线：DK28+349.172	
舜凤盾构区间	起始里程	左线：DK28+349.172 右线：DK28+349.172	区间214m
	终点里程	左线：DK28+563.748 右线：DK28+563.748	
凤凰路站	起始里程	左线：DK28+563.748 右线：DK28+563.748	地下两层车站，总建筑面积15792㎡，3个出入口（含2个暗挖通道，其中B口暗挖101㎡。）
	终点里程	左线：DK28+852.498 右线：DK28+852.498	
凤林盾构区间	起始里程	左线：DK28+852.498 右线：DK28+852.498	2座联络通道
	终点里程	左线：DK30+122.150 右线：DK30+122.150	
林家庄站	起始里程	左线：DK30+122.150 右线：DK30+122.150	地下两层车站，车站总建筑面积13287㎡，2组风亭，4个出入口（含1个暗挖通道，其中C暗挖85.5m）
	终点里程	左线：DK30+391.429 右线：DK30+391.429	
林雪盾构区间	起始里程	左线：DK30+391.429	8285环管片监造，1座

			右线：DK30+391.429联络通道。
		终点里程	左线：DK31+449.809
			右线：DK31+449.809
存在问题及处理意见			
无			

2021年第四季度履约评价：

济南轨道交通集团有限公司土建工程考评办公室

关于2021年12月份暨第四季度考评结果的通报

集团各部门、各直属中心、各子公司，各参建单位：

根据《济南轨道交通集团建设项目参建单位考评办法（修订）》和《城市轨道交通工程质量安全检查指南》，考评办公室对集团在建工程的各施工、监理、第三方监测和检测单位进行了考评，现将结果通报如下：

一、日常检查情况

2021年12月2-21日，集团安全质量部组织开展了12月份日常检查，共下发《施工现场隐患整改通知单》61份，发现施工单位存在问题640条，其中安全问题285条、质量问题277条、文明施工问题78条，监理单位存在问题92条。截至目前，问题均已整改并回复。

上级主管部门、子公司、监理单位在本月日常检查时发现问题175条，其中施工单位存在问题128条，监理单位存在问题47条。

二、月度集中检查情况

2021年12月22-31日，土建考评办公室组织集团纪委、安全质量部、工程管理部、总工办等相关部门，子公司，参建各方代表组成3个检查组，对在建工程进行了12月份月度集中检查，主要情况如下：

（一）对施工单位检查情况

根据《城市轨道交通工程质量安全检查指南》和《2021年12

月份考评检查方案》，针对各施工现场的不同特点，分别从安全、质量和文明施工三个方面进行了检查，共下发《施工现场隐患整改通知单》55份，发现问题751条，其中安全问题284条、质量问题391条、文明施工问题76条。截至目前，问题均已整改并回复。

1.安全方面

组织开展安全生产“一月一主题”专项治理行动，本月主题为“消防安全”，对该类问题加重检查和扣分。同时，对临时用电、安全防护、起重吊装、高处坠落、脚手架及高支模、机械设备报验及规范使用、基坑开挖及支撑架设、连续梁浇筑、隧道监控量测、风险管控、初期支护、施工现场安全隐患排查及治理、应急物资、应急演练、人员教育培训等方面进行检查，存在的主要问题：

一是各施工单位普遍对消防安全重视程度不足，存在较多安全隐患。如：现场消防柜中消防桶、消防斧、消防锹等消防器材缺失，现场灭火器失效或压力表损坏，易燃物品堆放区消防器材配备不足等。二是个别施工单位安全责任意识不强。如：基坑开挖临边防护不严密，基坑支护滞后，起重吊装作业无专职司索工，脚手架操作平台搭设缺少剪刀撑、步距及立杆间距偏大等。

2.质量方面

重点对混凝土施工、钢筋加工与安装、钢格栅加工与安装、防水施工、原材料见证取样及检测、结构尺寸控制、拌合站、试验室等进行了检查，存在的主要问题：

一是各施工单位普遍存在混凝土冬期施工保温养护措施不到位，混凝土表面局部裂缝、渗漏，混凝土结构接茬处凿毛不到位等

问题，在混凝土施工质量控制方面仍需进一步加强管理。二是个别施工单位还存在钢筋焊接烧伤主筋、防水卷材搭接处粘贴不严密、屋面门口泛水高度不足等问题。

3.文明施工方面

重点对扬尘治理“四个一律”、“六个百分之百”、“八项扬尘防治措施”落实情况、垃圾及污水排放、材料堆码、围挡及周边道路维护、食堂卫生、职工及农民工宿舍管理等进行了检查，发现个别单位仍存在土方作业洒水降尘措施不到位，扬尘在线监控设备未开启，现场材料、机具堆放混乱等问题。

4.进度方面

根据工程管理部统计情况，38家施工单位完成施工进度计划，9家施工单位基本完成进度计划。

（二）对监理单位检查情况

重点对监理责任落实、监理规划和实施细则、监理日志、旁站记录、监理通知单等进行了检查，共发现问题57条。截至目前，问题均已整改并回复。存在的主要问题：

一是针对施工单位存在的安全、质量和文明施工问题，监理单位未及时采取监理措施或监理措施不到位。二是个别监理单位存在冬期施工细则编制无针对性、监理通知单整改回复和问题不符、检验批监理单位验收结论未填写等问题。

三、月度考评结果

月度考评结束后，对各子公司所辖建设项目进行排名，排名第一且成绩优良的单位，颁发流动红旗；排名落后的单位，由子公司

约谈项目负责人或其上级单位领导。各项目月度排名第一的参建单位见表1，各项目月度排名落后的参建单位见表2。

表1 各项目月度排名第一的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线 十二工区	中铁十四局集团有限公司
	监理	4号线 监理三标	北京铁城建设监理有限责任公司
6号线项目	施工	十二工区	中铁北京局集团有限公司
	监理	监理十一标	济南建设监理有限公司
市政工程项目	施工	管辋大街、龙脊河东西路一标	中建八局第一建设有限公司
	监理	东进场南路二期工程监理	山东易方达建设项目管理有限公司
房建工程项目	施工	总部基地B地块	济南长兴建设集团有限公司
	监理	总部基地 B地块监理	山东易方达建设项目管理有限公司
济莱高铁站前项目	施工	土建六标	中铁十四局集团有限公司
	监理	监理一标	北京铁城建设监理有限责任公司
济莱高铁站房项目	施工	站房三标	中国建筑第八工程局有限公司
	监理	监理二标	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司

表 2 各项目月度排名落后的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线腊山站换乘项目	中铁五局集团有限公司
	监理	4号线腊山站换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司
6号线项目	施工	八工区	中铁四局集团有限公司
	监理	监理七标	山东贝特建筑项目监理咨询有限公司
市政工程项目	施工	进出场道路一标	济南城建集团有限公司
	监理	进出场道路一标监理	山东建院工程监理咨询有限公司
房建工程项目	施工	彭家庄站地块	中铁十四局集团有限公司
	监理	彭家庄租赁住房监理	山东省工程监理咨询有限公司
济莱高铁站前项目	施工	土建三标	中铁十七局集团有限公司
	监理	监理三标	山东济铁工程建设监理有限责任公司
济莱高铁站房项目	施工	站房二标	中铁十七局集团有限公司
	监理	监理三标	上海天佑工程咨询有限公司

四、第四季度考评结果

根据《济南轨道交通集团建设项目参建单位考评办法(修订)》文件要求，结合工作实际，汇总10、11、12月份考评成绩平均值为本季度考评成绩。对各子公司所辖参建项目进行排名，排名第一的参建项目部树立为榜样，并组织向排名第一的先进项目部学习。排名落后的，由轨道集团约谈其合同签订单位分管领导，并可以要求其更换项目负责人。季度排名第一的参建单位见表3，季度被约谈的参建单位见表4。

表 3 季度排名第一的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线十二工区	中铁十四局集团有限公司
	监理	4号线奥体中心换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司
6号线项目	施工	一工区	中铁十局集团有限公司
市政工程项目	施工	管辖大街、龙脊河东西路一标	中建八局第一建设有限公司
	监理	管辖大街、龙脊河东西路二标监理	济南城建监理有限责任公司
房建工程项目	施工	总部基地B地块	济南长兴建设集团有限公司
	监理	总部基地B地块监理	山东易方达建设项目管理有限公司
济莱高铁站前项目	施工	土建一标	中铁十局集团有限公司
	监理	监理一标	北京铁城建设监理有限责任公司

表 4 被约谈的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线腊山站换乘项目	中铁五局集团有限公司

	监理	4号线腊山站换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司
6号线项目	施工	十二工区	中铁北京局集团有限公司
市政工程项目	施工	东客站东进场南路二期工程	中恒建设集团有限公司
	监理	安置三区二期市政道路监理	山东敬业监理项目管理有限公司
房建工程项目	施工	彭家庄站地块	中铁十四局集团有限公司
	监理	彭家庄租赁住房监理	山东省工程监理咨询有限公司
济莱高铁站前项目	施工	土建五标	中铁二十二局集团有限公司
	监理	监理三标	山东济铁工程建设监理有限责任公司

五、工作要求

（一）根据集团《关于转发<关于开展全市在建工程安全生产专项整治活动的通知>的通知》文件要求，各子公司、各参建单位要深入开展拉网式排查整治自查活动，全面深入分析研判所辖工程安全生产现状，压紧压实安全生产责任，突出重点强化风险管控，防范各类生产安全事故发生。

（二）根据集团转发市安全生产委员会办公室《关于深入学习宣传和贯彻落实<山东省安全生产条例>的通知》文件要求，各子公司、各参建单位要提高站位，充分认识《条例》实施的重大意义，切实加强组织领导，精心谋划实施，切实把各项宣传工作抓细抓实抓出成效，从而全面增强学法用法能力，不断提升安全生产管理能力水平。

（三）为全力抓好岁末年初安全生产各项工作，从严防范各类生产安全事故发生，根据集团《关于转发市安委办<关于开展岁末年初安全生产专项整治行动的通知>的通知》文件要求，各子公司、各参建单位要聚力重要时段和关键环节，扎实开展岁末年初安全生产专项整治行动，全力做好安全生产各项工作，严防安全事故发生，确保集团安全生产形势稳定。

附件：

1.4号线及3号线二期项目月度考评评分汇总表—施工单位

2.6号线项目月度考评评分汇总表—施工单位

3.市政工程项目月度考评评分汇总表—施工单位

4.房建项目月度考评评分汇总表—施工单位

5.济莱高铁站前项目月度考评评分汇总表—施工单位

6. 济莱高铁站房项目月度考评评分汇总表—施工单位

7.其他项目月度考评评分汇总表—施工单位

8.月度考评评分汇总表—监理单位

9.2021年第四季度考评评分汇总表—施工单位

10.2021年第四季度考评评分汇总表—监理单位

济南轨道交通集团有限公司土建工程考评办公室

2022年1月10日

附件 10

济南轨道交通集团有限公司

2021 年第四季度考评评分汇总表—监理单位

统计日期：2022 年 1 月 5 日

序号	标段	监理单位名称	10 月份得分	11 月份得分	12 月份得分	合计得分	名次
轨道交通 4 号线及 3 号线二期 项目							
1	4 号线监理一标	北京致远工程建设监理有限责任公司	95.0	94.3	97.4	95.6	5
2	4 号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司	96.4	95.1	97.8	96.4	2
3	4 号线监理三标	北京铁城建设监理有限责任公司	--	92.5	98.2	95.4	8
4	4 号线监理四标	河南长城铁路工程建设咨询有限公司	--	94.1	97.0	95.6	5
5	4 号线监理五标	中铁二院监理（成都）咨询监理有限公司	97.4	93.9	97.1	96.1	3
6	4 号线监理六标	英泰克工程顾问（上海）有限公司	93.6	95.3	97.9	95.6	5
7	4 号线监理七标	上海同济监理咨询有限公司	93.8	94.6	97.0	95.1	10
8	4 号线监理八标	山东省工程监理咨询有限公司	95.2	95.0	94.8	95.0	12
9	4 号线腊山站换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司	95.6	94.4	87.5	92.5	13
10	4 号线历下广场同期监理	北京铁城建设监理有限责任公司	95.2	92.8	97.6	95.2	9
11	4 号线奥体中心换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司	96.9	95.8	97.0	96.6	1
12	3 号线二期监理一标	山东众成建设项目管理有限公司	94.2	93.5	97.7	95.1	10
13	3 号线二期监理二标	山东济铁工程建设监理有限责任公司	95.2	94.3	97.7	95.7	4
市政工程 项目							
14	东客站进出场道路一标监理	山东建院工程监理咨询有限公司	96.9	96.6	95.3	96.3	5
15	东客站东进场南路二期工程监理	山东易方达建设项目管理有限公司	97.5	95.2	98.7	97.1	2
16	管齐大街、龙脊河东西路一标监理	天宇工程咨询有限公司	97.0	96.9	96.0	96.6	3
17	管齐大街、龙脊河东西路二标监理	济南城建监理有限责任公司	97.2	96.7	98.6	97.5	1

2021 年年度履约评价：

济南轨道交通集团有限公司土建工程考评办公室

关于 2021 年度考评结果的通报

集团各部门、直属中心、各子公司，各参建单位：

根据轨道集团《济南轨道交通集团建设项目参建单位考评办法（修订）》，汇总 2021 年第一、二、三、四季度考评成绩平均值为本年度考评成绩，并作为年度评优依据。按工程类别总评，对排名落后的单位由轨道集团约谈合同签订单位的主要领导。年度排名第一的参建单位见表 1，年度被约谈的参建单位见表 2。

表 1 年度排名第一的参建单位

项目	类型	标段	单位
轨道交通 2 号线项目	施工	土建六标	中铁四局集团有限公司
	监理	监理六标	中铁济南工程建设监理有限公司
轨道交通 4 号线及 3 号线二期项目	施工	3 号线二期一工区	济南城建集团有限公司
	监理	3 号线二期监理二标	山东济铁工程建设监理有限责任公司
市政工程项目	施工	管鲍大街、龙脊河东西路一标	中建八局第一建设有限公司
	监理	东客站东进场南路二期工程监理	山东易方达建设项目管理有限公司
房建工程项目	施工	总部基地 B 地块	济南长兴建设集团有限公司
	监理	总部基地 B 地块监理	山东易方达建设项目管理有限公司

济莱高铁项目	施工	土建一标	中铁十局集团有限公司
	监理	监理一标	北京铁城建设监理有限责任公司

表 2 被约谈的参建单位

项目	类型	标段	单位
轨道交通 2 号线项目	施工	土建二标	中铁五局集团有限公司
	监理	监理五标	山东泰山工程项目管理有限公司/沈阳市振东建设工程监理股份有限公司
轨道交通 4 号线及 3 号线二期项目	施工	4 号线一工区	中铁十二局集团有限公司
	监理	4 号线监理八标	山东省工程监理咨询有限公司
市政工程项目	施工	安置三区二期市政道路	中国电建市政建设集团有限公司
	监理	安置三区二期市政道路监理	山东敬业监理项目管理有限公司
房建工程项目	施工	彭家庄站地块	中铁十四局集团有限公司
	监理	新东站安置四区监理二标	山东众成建设项目管理有限公司
济莱高铁项目	施工	土建五标	中铁二十二局集团有限公司
	监理	监理三标	山东济铁工程建设监理有限责任公司

希望排名靠前的单位要发扬成绩，再接再厉，继续发挥好表率和标杆作用；排名靠后的单位要知耻而后勇，自我加压，奋起直追，明确责任，狠抓工作落实，迎头赶上。下一年度，各参建单位要继续埋头苦干，攻坚克难，为推动新时代现代化强省会建设开好局、起好步做出积极贡献。

附件：1.2021 年度考评评分汇总表—施工单位
2.2021 年度考评评分汇总表—监理单位

济南轨道交通集团有限公司土建工程考评办公室
2022 年 1 月 10 日

附件 2

济南轨道交通集团有限公司

2021 年度考评评分汇总表—监理单位

统计日期：2022 年 1 月 6 日

序号	标段	监理单位名称	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	合计得分	名次
轨道交通 2 号线 项目								
1	监理二标	上海新光工程咨询有限公司/山东高新工程设计有限公司	--	97.5	95.3	94.5	95.8	3
2	监理三标	北京致远工程建设监理有限责任公司/山东省华一建设项目管理有限公司	--	97.2	97.1	--	97.2	2
3	监理五标	山东泰山工程项目管理有限公司/沈阳市振东建设工程监理股份有限公司	--	96.3	94.9	--	95.6	4
4	监理六标	中铁济南工程建设监理有限公司	--	96.9	97.7	--	97.3	1
轨道交通 4 号线及 3 号线二期 项目								
5	4 号线监理一标	北京致远工程建设监理有限责任公司	96.5	96.8	92.6	95.6	95.4	7
6	4 号线监理六标	英泰克工程顾问（上海）有限公司	96.6	--	--	95.6	96.1	4
7	4 号线监理八标	山东省工程监理咨询有限公司	95.1	96.4	94.2	95.0	95.2	8
8	4 号线腊山站换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司	97.8	97.5	96.5	92.5	96.1	4
9	4 号线历下广场同期监理	北京铁城建设监理有限责任公司	97.6	97.3	94.7	95.2	96.2	2
10	4 号线奥体中心换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司	95.5	97.9	94.8	96.6	96.2	2
11	3 号线二期监理一标	山东众成建设项目管理有限公司	95.8	97.4	95.5	95.1	96.0	6
12	3 号线二期监理二标	山东济铁工程建设监理有限责任公司	97.5	97.4	96.5	95.7	96.8	1
市政工程 项目								
13	东客站进出场道路一标监理	山东建院工程监理咨询有限公司	96.9	--	95.8	96.3	96.3	5
14	东客站东进场南路二期工程监理	山东易方达建设项目管理有限公司	98.3	97.3	96.1	97.1	97.2	1
15	管鲍大街、龙脊河东西路一标监理	天宇工程咨询有限公司	--	97.6	97.0	96.6	97.1	2
16	管鲍大街、龙脊河东西路二标监理	济南城建监理有限责任公司	--	96.4	96.4	97.5	96.8	3
17	华山北市政一标监理	青岛建设监理研究有限公司	--	96.8	--	96.6	96.7	4
18	安置三区二期市政道路监理	山东敬业监理项目管理有限公司	--	--	92.9	95.8	94.4	6

2022年第一季度履约评价：

济南轨道交通集团有限公司土建工程考评办公室

关于2022年3月份暨第一季度考评结果的通报

集团各部门、各直属中心、各子公司，各参建单位：

根据《济南轨道交通集团建设项目参建单位考评办法（修订）》和《城市轨道交通工程质量安全检查指南》，考评办公室对集团在建工程的各施工、监理、第三方监测和检测单位进行了考评，现将结果通报如下：

一、日常检查情况

2022年3月2~21日，集团安全质量部组织开展了3月份日常检查，共下发《施工现场隐患整改通知单》68份，发现施工单位存在问题754条，其中安全问题324条、质量问题346条、文明施工问题84条，监理单位存在问题98条。截至目前，问题均已整改并回复。

二、月度集中检查情况

2022年3月22日~31日，土建考评办公室组织集团纪委、安全质量部、工程管理部、总工办等相关部门，子公司，参建各方代表组成3个检查组，对在建工程进行了3月份月度集中检查，主要情况如下：

（一）对施工单位检查情况

根据《城市轨道交通工程质量安全检查指南》和《2022年3月份月度考评检查方案》，针对各施工现场的不同特点，分别从安全、质量和文明施工三个方面进行了检查，共下发《施工现场隐患

整改通知单》47份，发现施工单位存在问题568条，其中安全问题247条、质量问题267条、文明施工问题54条。截至目前，问题均已整改并回复。

1.安全方面

组织开展安全生产“一月一主题”专项治理行动，本月主题为“临时用电”，对该类问题加重检查和扣分。同时，对起重吊装、安全防护、高处坠落、脚手架及高支模、机械设备报验及规范使用、基坑开挖及支撑架设、连续梁浇筑、隧道监控量测、风险管控、初期支护、施工现场安全隐患排查及治理、应急物资、应急演练、人员教育培训等方面进行检查，存在的主要问题：

一是各施工单位普遍对临时用电重视程度不足，存在较多安全隐患。如：二级配电箱无防雨防尘棚，三级配电箱距用电设备超30米，线缆拖地、固定部位无绝缘保护措施，用电设备金属外壳未接地等。二是个别施工单位安全责任意识不强。如：现场工人未佩戴安全帽、高空作业未佩戴安全带，脚手架无上下安全通道、脚手板未满铺固定，基坑开挖局部喷锚滞后等。

2.质量方面

重点对混凝土施工、钢筋加工与安装、钢格栅加工与安装、防水施工、原材料见证取样及检测、结构尺寸控制、拌合站、试验室等进行了检查，存在的主要问题：

一是各施工单位普遍存在拉钩钢筋弯制角度不足135°、弯钩长度不足，桩头钢筋随意热熔切割，钢筋焊接电流过大、烧伤主筋，钢筋直螺纹套筒连接外露丝超2P等问题，在钢筋加工与安装质量

控制方面仍需进一步加强管理。二是个别施工单位还存在钢边橡胶止水带连接不规范，混凝土框架柱涨模、烂根、磕碰掉角，标养室混凝土试块台账记录不全等问题。

3.文明施工方面

重点对扬尘治理“四个一律”、“六个百分之百”、“八项扬尘防治措施”落实情况、垃圾及污水排放、材料堆码、围挡及周边道路维护、食堂卫生、职工及农民工宿舍管理等进行了检查，发现个别单位仍存在钢筋原材无下垫上盖措施、基坑土方开挖处无降尘措施、施工围挡破损、固定不牢等问题。

4.进度方面

根据工程管理部统计情况，本月57家单位参与考评，其中，31家施工单位完成施工进度计划，26家施工单位基本完成进度计划。

（二）对监理单位检查情况

重点对监理责任落实、监理规划和实施细则、监理日志、旁站记录、监理通知单等进行了检查，共发现问题56条。截至目前，问题均已整改并回复。存在的主要问题：

一是针对施工单位存在的安全、质量和文明施工问题，监理单位未及时采取监理措施或监理措施不到位。二是个别监理单位存在监理旁站记录填写不规范、记录内容不全面，监理会议纪要未体现对施工单位的安全、质量检查情况，针对施工单位虚假整改监理单位复核不到位等问题。

三、月度考评结果

月度考评结束后，对各子公司所辖建设项目进行排名，排名第一且成绩优良的单位，颁发流动红旗；排名落后的单位，由子公司约谈项目负责人或其上级单位领导。各项目月度排名第一的参建单位见表1，各项目月度排名落后的参建单位见表2。

表1 各项目月度排名第一的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线四工区	中铁十一局集团有限公司
	监理	4号线监理三标	北京铁城建设监理有限责任公司
6号线和2号线项目	施工	6号线一工区	中铁十局集团有限公司
	监理	6号线监理三标	中铁济南工程建设监理有限公司
市政工程项目	施工	管辖大街、龙脊河东西路一标	中建八局第一建设有限公司
	监理	管辖大街、龙脊河东西路一标监理	天宇工程咨询有限公司
房建工程项目	施工	总部基地A地块	中国建筑第八工程局有限公司
	监理	总部基地B地块监理	山东易方达建设项目管理有限公司
济莱高铁站前项目	施工	土建三标	中铁十七局集团有限公司
	监理	监理一标	北京铁城建设监理有限责任公司
济莱高铁站房项目	施工	站房一标	中铁十局集团有限公司
	监理	监理一标	北京铁城建设监理有限责任公司

表 2 各项目月度排名落后的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线七工区	中铁十八局集团有限公司
	监理	4号线监理五标	中铁二院监理（成都）咨询监理有限公司
6号线和2号线项目	施工	6号线八工区	中铁四局集团有限公司
	监理	6号线监理九标	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司
市政工程项目	施工	东客站东进场南路二期工程	中恒建设集团有限公司
	监理	华山北道路一标监理	青岛建设监理研究有限公司
房建工程项目	施工	王府水屯安置房	中建三局集团有限公司
	监理	王府水屯安置房监理	中天昊建设管理集团股份有限公司
济莱高铁站前项目	施工	土建四标	中铁三局集团有限公司
	监理	监理三标	山东济铁工程建设监理有限责任公司
济莱高铁站房项目	施工	站房四标	中铁二十二局集团有限公司
	监理	监理三标	上海天佑工程咨询有限公司

四、第一季度考评结果

根据《济南轨道交通集团建设项目参建单位考评办法（修订）》文件要求，结合工作实际，汇总1、2、3月份考评成绩平均值为本季度考评成绩。对各子公司所辖参建项目进行排名，排名第一的参建项目部树立为榜样，并组织向排名第一的先进项目部学习。排名

落后的，由轨道集团约谈其合同签订单位分管领导，并可以要求其更换项目负责人。季度排名第一的参建单位见表3，季度被约谈的参建单位见表4。

表 3 季度排名第一的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线十二工区	中铁十四局集团有限公司
	监理	4号线监理三标	北京铁城建设监理有限责任公司
6号线项目	施工	十一工区	济南城建集团有限公司
	监理	监理三标	中铁济南工程建设监理有限公司
市政工程项目	施工	管辖大街、龙脊河东西路一标	中建八局第一建设有限公司
	监理	管辖大街、龙脊河东西路二标监理	济南城建监理有限责任公司
房建工程项目	施工	总部基地B地块	济南长兴建设集团有限公司
	监理	总部基地B地块监理	山东易方达建设项目管理有限公司
济莱高铁站前项目	施工	土建一标	中铁十局集团有限公司
	监理	监理一标	北京铁城建设监理有限责任公司
济莱高铁站房项目	施工	站房一标	中铁十局集团有限公司
	监理	站房监理一标	北京铁城建设监理有限责任公司

表 4 被约谈的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线七工区	中铁十八局集团有限公司
	监理	3号线二期监理一标	山东众成建设项目管理有限公司
6号线项目	施工	八工区	中铁四局集团有限公司
	监理	监理五标	上海三维工程建设咨询有限公司
市政工程项目	施工	东客站东进场南路二期工程	中恒建设集团有限公司
	监理	东客站进出场道路一标监理	山东建院工程监理咨询有限公司
房建工程项目	施工	王府水屯安置房	中建三局集团有限公司
	监理	王府水屯安置房监理	中天昊建设管理集团股份有限公司
济莱高铁站前项目	施工	土建四标	中铁三局集团有限公司
	监理	监理三标	山东济铁工程建设监理有限责任公司
济莱高铁站房项目	施工	站房三标	中国建筑第八工程局有限公司
	监理	站房监理二标	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司

五、工作要求

（一）各子公司、各参建单位要深入贯彻落实省市安全生产各项决策部署，进一步压实安全生产主体责任，深刻认识到开展“晨会”的重要性，把“晨会”制度作为落实安全生产主体责任的一项重要内容，纳入本单位安全生产会议制度体系和全年安全生产重点工作内容，并将“晨会”制度落实情况纳入部门和员工考核之中。

（二）各子公司、各参建单位要充分认识防汛工作的重要性，深刻汲取郑州“7·20”特大暴雨灾害教训，举一反三，全面对照，深入排查风险隐患，补齐漏洞短板，对防汛工作进行统筹部署，落细落实各项准备措施，全力确保安全度汛。

（三）各子公司、各参建单位要认真贯彻落实省委主要领导同志指示精神及各级文件要求，严格落实安全生产主体责任，全面提升安全生产管理水平，深入开展重点领域安全整治提升，进一步做好当前安全生产各项工作，切实守牢守住安全底线，为迎接党的二十大胜利召开营造安全稳定环境。

附件：

1.4号线及3号线二期项目月度考评评分汇总表—施工单位
2.6号线和2号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
3.市政工程项目月度考评评分汇总表—施工单位
4.房建项目月度考评评分汇总表—施工单位
5.济莱高铁站前项目月度考评评分汇总表—施工单位
6.济莱高铁站房项目月度考评评分汇总表—施工单位
7.其他项目月度考评评分汇总表—施工单位
8.月度考评评分汇总表—监理单位
9.2022年第一季度考评评分汇总表—施工单位
10.2022年第一季度考评评分汇总表—监理单位

济南轨道交通集团有限公司土建工程考评办公室

2022年4月7日

附件 10

济南轨道交通集团有限公司

2022 年第一季度考评评分汇总表—监理单位

统计日期：2022 年 4 月 3 日

序号	标段	监理单位名称	1 月份得分	2 月份得分	3 月份得分	合计得分	名次
轨道交通 4 号线及 3 号线二期 项目							
1	4 号线监理一标	北京致远工程建设监理有限责任公司	96.8	97.6	97.3	97.2	5
2	4 号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司	98.5	96.9	97	97.5	4
3	4 号线监理三标	北京铁城建设监理有限责任公司	97.9	98.53	97.6	98.0	1
4	4 号线监理四标	河南长城铁路工程建设咨询有限公司	97.6	97.7	96.2	97.2	5
5	4 号线监理五标	中铁二院监理（成都）咨询监理有限公司	97.7	97.1	94.6	96.5	12
6	4 号线监理六标	英泰克工程顾问（上海）有限公司	97.9	98.54	96.8	97.7	3
7	4 号线监理七标	上海同济监理咨询有限公司	97.2	97.1	96.5	96.9	10
8	4 号线监理八标	山东省工程监理咨询有限公司	97.7	97.5	95.9	97.0	9
9	4 号线腊山站换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司	96.9	98.2	96.5	97.2	5
10	4 号线历下广场同期监理	北京铁城建设监理有限责任公司	98.4	98.1	97.1	97.9	2
11	4 号线奥体中心换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司	97.0	97.6	96.7	97.1	8
12	3 号线二期监理一标	山东众成建设项目管理有限公司	96.7	95.8	96.2	96.2	13
13	3 号线二期监理二标	山东济铁工程建设监理有限责任公司	97.1	96.1	96.5	96.6	11
轨道交通 6 号线项目							
14	监理一标	北京致远工程建设监理有限责任公司	--	96.1	94.6	95.4	5
15	监理三标	中铁济南工程建设监理有限公司	96.9	98.1	96.2	97.1	1
16	监理五标	上海三维工程建设咨询有限公司	--	95.7	93.3	94.5	6
17	监理七标	山东贝特建筑项目管理有限责任公司	--	96.7	94.7	95.7	4
18	监理十标	青岛建设研究监理有限公司	96.6	97.8	95.7	96.7	3
19	监理十一标	济南建设监理有限公司	97.2	97.3	96.1	96.9	2

2022年第二季度履约评价：

济南轨道交通集团有限公司土建工程考评办公室

关于2022年6月份暨第二季度考评结果的通报

集团各部门、各直属中心、各子公司，各参建单位：

根据《济南轨道交通集团建设项目参建单位考评办法（修订）》和《城市轨道交通工程质量安全检查指南》，考评办公室对集团在建工程的各施工、监理、第三方监测和检测单位进行了考评，现将结果通报如下：

一、日常检查情况

2022年6月3~19日，集团安全质量部组织开展了6月份日常检查，共下发《施工现场隐患整改通知单》74份，发现施工单位存在问题725条，其中安全问题294条、质量问题350条、文明施工问题81条，监理单位存在问题74条。截至目前，问题均已整改并回复。

二、月度集中检查情况

2022年6月20日~7月1日，土建考评办公室组织集团纪委、安全质量部、工程管理部、总工办等相关部门，子公司，参建各方代表组成3个检查组，对在建工程进行了6月份月度集中检查，主要情况如下：

（一）对施工单位检查情况

根据《城市轨道交通工程质量安全检查指南》和《2022年6月份月度考评检查方案》，针对各施工现场的不同特点，分别从安全、质量和文明施工三个方面进行了检查，共下发《施工现场隐患

整改通知单》75份，发现施工单位存在问题826条，其中安全问题358条、质量问题382条、文明施工问题86条。截至目前，问题均已整改并回复。

1.安全方面

组织开展安全生产“一月一主题”专项治理行动，本月主题为“高处作业”，对该类问题加重检查和扣分。同时，对起重吊装、安全防护、脚手架及高支模、机械设备报验及规范使用、基坑开挖及支撑架设、连续梁浇筑、隧道监控量测、风险管控、初期支护、施工现场安全隐患排查及治理、应急物资、应急演练、人员教育培训等方面进行检查，存在的主要问题：

一是各施工单位普遍对高处作业和安全防护重视程度不足，存在较多安全隐患。如：高空作业人员未佩戴安全带；基坑、预留洞口无临边防护措施或临边防护措施不到位；工人未正确佩戴安全帽等。二是个别施工单位安全责任意识不强。如：基坑周边未按方案设置挡水台；基坑开挖钢支撑架设滞后；圆盘锯无防护罩等。

2.质量方面

重点对混凝土施工、钢筋加工与安装、钢格栅加工与安装、防水施工、原材料见证取样及检测、结构尺寸控制、拌合站、试验室等进行了检查，存在的主要问题：

一是各施工单位普遍存在防水层基面不平整、侧墙防水板搭接不到位、止水钢板局部漏焊等问题，在防水施工质量控制方面仍需要进一步加强管理。二是个别施工单位还存在混凝土修补色差

明显、外观质量差，钢筋焊缝不饱满、焊渣未清理，外墙保温板碎拼等问题。

3.文明施工方面

重点对扬尘治理“四个一律”、“六个百分之百”、“八项扬尘防治措施”落实情况、垃圾及污水排放、材料堆码、围挡及周边道路维护、食堂卫生、职工及农民工宿舍管理等进行了检查，发现个别单位仍存在围挡不连续、未作业区域裸土未完全覆盖、危险作业区域无安全警示标识等问题。

4.进度方面

根据工程管理部统计情况，本月72家单位参与进度考评，其中，37家施工单位完成施工进度计划，35家施工单位基本完成进度计划。

（二）对监理单位检查情况

重点对监理责任落实、监理规划和实施细则、监理日志、旁站记录、监理通知单等进行了检查，共发现问题95条。截至目前，问题均已整改并回复。存在的主要问题：

一是针对施工单位存在的安全、质量和文明施工问题，监理单位未及时采取监理措施或监理措施不到位。二是个别监理单位存在安全监理细则无报审表、监理细则交底记录不全面、监理日志缺少人材机记录情况等问题

三、月度考评结果

月度考评结束后，对各子公司所辖建设项目进行排名，排名第

一且成绩优良的单位，颁发流动红旗；排名落后的单位，由子公司约谈项目负责人或其上级单位领导。各项目月度排名第一的参建单位见表1，各项目月度排名落后的参建单位见表2。

表1 各项目月度排名第一的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线四工区	中铁十一局集团有限公司
	监理	4号线历下广场同期监理	北京铁城建设监理有限责任公司
6号线和2号线项目	施工	6号线一工区	中铁十局集团有限公司
	监理	6号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司
市政工程项目	施工	管辖大街、龙脊河东西路二标	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	东客站进出场道路一标监理	山东建院工程监理咨询有限公司
房建工程项目	施工	总部基地B地块	济南长兴建设集团有限公司
	监理	总部基地B地块监理	山东易方达建设项目管理有限公司
济莱高铁站房项目	施工	站房二标	中铁十七局集团有限公司
	监理	监理一标	北京铁城建设监理有限责任公司

表 2 各项目月度排名落后的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线十一工区	山东省路桥集团有限公司
	监理	3号线二期监理二标	山东济铁工程建设监理有限责任公司
6号线和2号线项目	施工	6号线五工区	中铁隧道局集团有限公司
	监理	6号线监理四标	北京城建建设监理有限责任公司
市政工程项目	施工	张马片区市政道路三标	中恒建设集团有限公司
	监理	张马片区市政道路三标监理	中铁隧道洛阳监理有限公司
房建工程项目	施工	张马屯AX地块小学	济南一建集团有限公司
	监理	彭家庄程贤住房监理	山东省工程监理咨询有限公司
济莱高铁站房项目	施工	站房四标	中铁二十二局集团有限公司
	监理	监理二标	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司

四、第二季度考评结果

根据《济南轨道交通集团建设项目参建单位考评办法（修订）》文件要求，结合工作实际，汇总5、6月份考评成绩平均值为本季度考评成绩（4月份因疫情防控要求，未组织月度考评）。对各子公司所辖参建项目进行排名，排名第一的参建项目部树立为榜样，并组织向排名第一的先进项目部学习。排名落后的，由轨道集团约谈其合同签订单位分管领导，并可以要求其更换项目负责人。季度

排名第一的参建单位见表3，季度被约谈的参建单位见表4。

表 3 各项目季度排名第一的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线三工区	中铁二十四局集团有限公司
	监理	4号线历下广场同期监理	北京铁城建设监理有限责任公司
6号线和2号线项目	施工	6号线一工区	中铁十局集团有限公司
	监理	6号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司
市政工程项目	施工	东客站进出场道路一标	济南城建集团有限公司
	监理	管鲍大街、龙脊河东西路一标监理	天宇工程咨询有限公司
房建工程项目	施工	总部基地B地块	济南长兴建设集团有限公司
	监理	总部基地B地块监理	山东易方达建设项目管理有限公司
济莱高铁站房项目	施工	站房一标	中铁十局集团有限公司
	监理	监理一标	北京铁城建设监理有限责任公司

表 4 各项目季度排名落后的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线七工区	中铁十八局集团有限公司
	监理	3号线二期监理二标	山东济铁工程建设监理有限责任公司

6号线和2号线项目	施工	6号线十工区	中铁十局集团有限公司
	监理	6号线监理四标	北京城建建设监理有限责任公司
市政工程项目	施工	张马片区市政道路三标	中恒建设集团有限公司
	监理	张马片区市政道路三标监理	中铁隧道洛阳监理有限公司
房建工程项目	施工	张马屯AX地块小学	济南一建集团有限公司
	监理	华山北安置二区监理一标	济南中建建筑设计院有限公司
济莱高铁站房项目	施工	站房三标	中国建筑第八工程局有限公司
	监理	监理三标	上海天佑工程咨询有限公司

五、工作要求

（一）目前我市已进入汛期，据气象部门预测，今年我市降水较常年偏多，局部可能出现强降雨和暴雨洪涝灾害。根据省、市、集团各级文件要求，各子公司、各参建单位要加强组织领导，认真落实各级防汛工作要求，深刻吸取往年事故教训，全力做好今年防汛工作，确保安全度汛。

（二）各子公司、各参建单位要集合安全生产大检查活动、“大学习、大培训、大考试”专项行动，认真落实安全生产“十五项硬措施”“八抓二十项”举措，认真查找工作落实中的差距和不足，对安全生产工作进行再部署、再检查、再督促、再落实，务必宣传贯彻到每名员工，打通工作落实最后一公里。

（三）夏季高温时段堪称“危险期”，容易发生中暑、高处坠

落、电器火灾等事故。各子公司、各参建单位要高度重视，合理安排夏季高温时段作业时间，落实各项防暑降温措施，加强现场监督检查，防止高温中暑以及火灾等事故的发生。

附件：

1.4号线及3号线二期项目月度考评评分汇总表—施工单位
2.6号线和2号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
3.市政工程项目月度考评评分汇总表—施工单位
4.房建项目月度考评评分汇总表—施工单位
5.济莱高铁站房项目月度考评评分汇总表—施工单位
6.其他项目月度考评评分汇总表—施工单位
7.月度考评评分汇总表—监理单位
8. 2022年第二季度考评评分汇总表—施工单位
9. 2022年第二季度考评评分汇总表—监理单位

济南轨道交通集团有限公司土建工程考评办公室

2022年7月8日

附件 9

济南轨道交通集团有限公司

2022 年第二季度考评评分汇总表—监理单位

统计日期： 7 月 6 日

序号	标段	监理单位名称	5 月份得分	6 月份得分	合计得分	名次
轨道交通 4 号线及 3 号线二期 项目						
1	4 号线监理一标	北京致远工程建设监理有限责任公司	96.5	96.0	96.3	11
2	4 号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司	97.4	97.7	97.6	2
3	4 号线监理三标	北京铁城建设监理有限责任公司	97.4	97.8	97.6	2
4	4 号线监理四标	河南长城铁路工程建设咨询有限公司	95.5	96.8	96.2	12
5	4 号线监理五标	中铁二院监理（成都）咨询监理有限公司	95.4	97.3	96.4	10
6	4 号线监理六标	英泰克工程顾问（上海）有限公司	96.9	96.3	96.6	8
7	4 号线监理七标	上海同济监理咨询有限公司	96.8	96.6	96.7	7
8	4 号线监理八标	山东省工程监理咨询有限公司	97.2	96.5	96.9	5
9	4 号线腊山站换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司	96.8	96.7	96.8	6
10	4 号线历下广场同期监理	北京铁城建设监理有限责任公司	97.7	97.9	97.8	1
11	4 号线奥体中心换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司	95.5	97.6	96.6	8
12	3 号线二期监理一标	山东众成建设项目管理有限公司	97.5	97.2	97.4	4
13	3 号线二期监理二标	山东济铁工程建设监理有限责任公司	97.6	94.5	96.1	13
轨道交通 6 号线和 2 号线 项目						
14	6 号线监理一标	北京致远工程建设监理有限责任公司	97.0	97.0	97.0	2
15	6 号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司	--	97.2	97.2	1
16	6 号线监理三标	中铁济南工程建设监理有限公司	95.1	94.5	94.8	7
17	6 号线监理四标	北京城建建设监理有限责任公司	93.6	90.6	92.1	11

2022年第三季度履约评价：

济南轨道交通集团有限公司土建工程考评办公室

关于2022年9月份暨第三季度考评结果的通报

集团各部门、各直属中心、各子公司，各参建单位：

根据《济南轨道交通集团建设项目参建单位考评办法（修订）》和《城市轨道交通工程质量安全检查指南》，考评办公室对集团在建工程的各施工、监理、第三方监测和检测单位进行了考评，现将结果通报如下：

一、日常检查情况

2022年9月5~15日，集团安全质量部组织开展了9月份日常检查，共下发《施工现场隐患整改通知单》67份，发现施工单位存在问题789条，其中安全问题297条、质量问题453条、文明施工问题39条，监理单位存在问题136条。截至目前，问题均已整改并回复。

二、月度集中检查情况

2022年9月16~28日，土建考评办公室组织集团纪委、安全质量部、工程管理部、总工办等相关部门，子公司，参建各方代表组成3个检查组，对在建工程进行了9月份月度集中检查，主要情况如下：

（一）对施工单位检查情况

根据《城市轨道交通工程质量安全检查指南》和《2022年9月份月度考评检查方案》，针对各施工现场的不同特点，分别从安全、质量和文明施工三个方面进行了检查，共下发《施工现场隐患

整改通知单》64份，发现施工单位存在问题764条，其中安全问题266条、质量问题430条、文明施工问题68条。截至目前，问题均已整改并回复。

1.安全方面

组织开展安全生产“一月一主题”专项治理行动，本月主题为“安全防护”，对该类问题重点检查和加重扣分。同时，对起重吊装、脚手架及高支模、机械设备报验及规范使用、基坑开挖及支撑架设、隧道监控量测、风险管控、初期支护、施工现场安全隐患排查及治理、应急物资、应急演练、人员教育培训等方面进行检查，存在的主要问题：

一是各施工单位普遍对安全防护隐患重视程度不足，存在较多安全隐患。如：基坑、预留洞口、作业平台等未设置临边防护或临边防护不连续；高空作业工人未佩戴安全带；个别员工未正确佩戴安全帽等。二是个别施工单位安全责任意识不强。如：基坑开挖钢支撑架设滞后；脚手架搭设不规范，剪刀撑搭接长度不足1m且扣件不足3个；施工现场未公示重大风险源等。

2.质量方面

重点对混凝土施工、钢筋加工与安装、钢格栅加工与安装、防水施工、原材料见证取样及检测、结构尺寸控制、拌合站、试验室等进行了检查，存在的主要问题：

一是各施工单位普遍存在带水房间防水未外翻，防水板铺贴不严密、局部破损，侧墙施工缝处钢边止水带与钢板止水带搭接不

符合要求等问题，在防水施工质量控制方面仍需要进一步加强管理。二是个别施工单位还存在现场钢筋、混凝土、外墙保温等成品保护不到位，砌体墙根部未设置挡水台，钢筋笼主筋焊接焊缝不饱满等问题。

3.文明施工方面

重点对扬尘治理“四个一律”、“六个百分之百”、“八项扬尘防治措施”落实情况、垃圾及污水排放、材料堆码、围挡及周边道路维护、食堂卫生、职工及农民工宿舍管理等进行了检查，发现个别单位仍存在施工现场围挡不连续、钢筋原材未下垫上盖、扬尘治理措施落实不到位等问题。

4.进度方面

根据工程管理部统计情况，本月63家单位参与进度考评，其中，40家施工单位完成施工进度计划，23家施工单位基本完成进度计划。

（二）对监理单位检查情况

重点对监理责任落实、监理规划和实施细则、监理日志、旁站记录、监理通知单等进行了检查，共发现问题95条。截至目前，问题均已整改并回复。存在的主要问题：

一是针对施工单位存在的安全、质量和文明施工问题，监理单位未及时采取监理措施或监理措施不到位。二是个别监理单位存在旁站记录内容不全面、监理通知单问题与整改问题照片不符、监理日志中部分内容总监未签字等问题。

三、月度考评结果

月度考评结束后，对各子公司所辖建设项目进行排名，排名第一且成绩优良的单位，颁发流动红旗；排名落后的单位，由子公司约谈项目负责人或其上级单位领导。各项目月度排名第一的参建单位见表1，各项目月度排名落后的参建单位见表2。

表1 各项目月度排名第一的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	3号线二期二工区	中铁十局集团有限公司
	监理	4号线历下广场同期监理	北京铁城建设监理有限责任公司
6号线和2号线项目	施工	6号线二工区	中铁发展投资有限公司
	监理	6号线监理九标	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司
市政工程项目	施工	新东站安置三区二期市政道路	中国电建市政建设集团有限公司
	监理	东客站进出场道路二标监理	青岛建设监理研究有限公司
房建工程项目	施工	总部基地B地块	济南长兴建设集团有限公司
	监理	总部基地B地块监理	山东易方达建设项目管理有限公司
济莱高铁站房项目	施工	站房三标	中国建筑第八工程局有限公司
	监理	监理一标	北京铁城建设监理有限责任公司

表 2 各项目月度排名落后的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线七工区	中铁十八局集团有限公司
	监理	4号线监理七标	上海同济监理咨询有限公司
6号线和2号线项目	施工	6号线六工区	中铁一局集团有限公司
	监理	6号线监理十标	青岛建设研究监理有限公司
市政工程项目	施工	东客站进出场道路二标	中铁四局集团有限公司
	监理	张马片区市政道路三标监理	中铁隧道洛阳监理有限公司
房建工程项目	施工	张马屯AX地块小学	济南一建集团有限公司
	监理	华山北租赁住房C-1地块监理	济南大成建设项目管理有限公司
济莱高铁站房项目	施工	站房四标	中铁二十二局集团有限公司
	监理	监理二标	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司

四、第三季度考评结果

根据《济南轨道交通集团建设项目参建单位考评办法（修订）》文件要求，结合工作实际，汇总7、8、9月份考评成绩平均值为本季度考评成绩。对各子公司所辖参建项目进行排名，排名第一的参建项目部树立为榜样，并组织向排名第一的先进项目部学习。排名落后的，由轨道集团约谈其合同签订单位分管领导，并可以要求其更换项目负责人。季度排名第一的参建单位见表3，季度被约谈的参建单位见表4。

表 3 各项目季度排名第一的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线三工区	中铁二十四局集团有限公司
	监理	4号线监理三标	北京铁城建设监理有限责任公司
6号线和2号线项目	施工	6号线二工区	中铁发展投资有限公司
	监理	6号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司
市政工程项目	施工	新东站安置三区二期市政道路	中国电建市政建设集团有限公司
	监理	东客站进出场道路二标监理	青岛建设监理研究有限公司
房建工程项目	施工	总部基地B地块	济南长兴建设集团有限公司
	监理	总部基地B地块监理	山东易方达建设项目管理有限公司
济莱高铁站房项目	施工	站房一标	中铁十局集团有限公司
	监理	监理一标	北京铁城建设监理有限责任公司

表 4 各项目季度排名落后的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线七工区	中铁十八局集团有限公司
	监理	4号线监理七标	上海同济监理咨询有限公司

6号线和2号线项目	施工	6号线六工区	中铁一局集团有限公司
	监理	6号线监理十标	青岛建设研究监理有限公司
市政工程项目	施工	东客站东进场南路二期工程	中恒建设集团有限公司
	监理	张马片区市政道路三标监理	中铁隧道洛阳监理有限公司
房建工程项目	施工	华山北租赁住房C-1地块	中国建筑第八工程局有限公司
	监理	王府水屯小学监理	山东三强建设咨询有限公司
济莱高铁站房项目	施工	站房三标	中国建筑第八工程局有限公司
	监理	监理三标	上海天佑工程咨询有限公司

五、工作要求

（一）各子公司、各参建单位要深入开展安全生产提升年、“大学习、大培训、大考试”专项行动、燃气运输安全排查整治百日行动、房屋市政工程施工预防高处坠落专项整治百日行动、重要电力用户用电安全隐患集中排查治理专项行动等，绷紧防范安全风险这根弦，强化风险意识和忧患意识，坚决防范遏制各类生产安全事故发生，为党的“二十大”胜利召开营造安全稳定社会环境。

（二）各子公司、各参建单位要进一步认清形势、提高站位，全面抓好安全生产责任落实、各项整治工作统筹推进、重大事故隐患排查整治、安全生产检查、事故信息报送统计、极端天气应对防范等工作，切实推动“十五条硬措施”和“八抓20条”创新措施落实见效，确保集团安全生产形势持续稳定。

（三）9月27日起到年底，市安委会组织在全市深入开展安全生产大检查集中攻坚行动，各子公司、各参建单位要高度重视、周密部署，结合前期开展的安全生产大检查工作，迅即开展自查自纠，从制度措施落实、重大隐患排查整改、重大安全风险防范、三年行动巩固提升、重点工作任务落实等六个方面开展集中攻坚，进一步统筹各方力量，强化工作措施，及时研究解决安全生产大检查发现的问题，以最高标准、最严要求深入推进各项工作落实落细，严防各类生产安全事故发生。

附件：

1.4号线及3号线二期项目月度考评评分汇总表—施工单位
2.6号线和2号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
3.市政工程项目月度考评评分汇总表—施工单位
4.房建项目月度考评评分汇总表—施工单位
5.济莱高铁站房项目月度考评评分汇总表—施工单位
6.其他项目月度考评评分汇总表—施工单位
7.月度考评评分汇总表—监理单位
8.2022年第三季度考评评分汇总表—施工单位
9.2022年第三季度考评评分汇总表—监理单位

济南轨道交通集团有限公司建设工程考评办公室

2022年10月8日

附件 9

济南轨道交通集团有限公司

2022 年第三季度考评评分汇总表—监理单位

统计日期： 10 月 3 日

序号	标段	监理单位名称	7 月份得分	8 月份得分	9 月份得分	合计得分	名次
轨道交通 4 号线及 3 号线二期 项目							
1	4 号线监理一标	北京致远工程建设监理有限责任公司	96.5	97.1	96.4	96.7	7
2	4 号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司	97.7	97.4	97.8	97.6	2
3	4 号线监理三标	北京铁城建设监理有限责任公司	97.6	97.3	98.1	97.7	1
4	4 号线监理四标	河南长城铁路工程建设咨询有限公司	96.6	97.2	95.9	96.6	8
5	4 号线监理五标	中铁二院监理（成都）咨询监理有限公司	95.9	94.9	96.4	95.7	12
6	4 号线监理六标	英泰克工程顾问（上海）有限公司	96.1	96.3	96.8	96.4	10
7	4 号线监理七标	上海同济监理咨询有限公司	96.9	96.8	87.4	93.7	13
8	4 号线监理八标	山东省工程监理咨询有限公司	95.3	96.7	96.1	96.0	11
9	4 号线腊山站换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司	96.3	97.5	96.6	96.8	6
10	4 号线历下广场同期监理	北京铁城建设监理有限责任公司	96.5	97.0	98.2	97.2	3
11	4 号线奥体中心换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司	96.4	97.5	96.9	96.9	5
12	3 号线二期监理一标	山东众成建设项目管理有限公司	95.6	96.6	97.7	96.6	8
13	3 号线二期监理二标	山东济铁工程建设监理有限责任公司	95.8	97.8	97.3	97.0	4
轨道交通 6 号线和 2 号线 项目							
14	6 号线监理一标	北京致远工程建设监理有限责任公司	94.3	93.6	90.4	92.8	10
15	6 号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司	97.7	97.0	94.8	96.5	1
16	6 号线监理三标	中铁济南工程建设监理有限公司	97.2	96.1	94.0	95.8	2
17	6 号线监理四标	北京城建建设监理有限责任公司	97.2	95.2	94.2	95.5	3
18	6 号线监理五标	上海三维工程建设咨询有限公司	94.6	96.4	94.6	95.2	5

2022年第四季度履约评价：

济南轨道交通集团有限公司土建工程考评办公室

关于2022年11月份暨第四季度考评结果的通报

集团各部门、各直属中心、各子公司，各参建单位：

根据《济南轨道交通集团建设项目参建单位考评办法（修订）》和《城市轨道交通工程质量安全检查指南》，考评办公室对集团在建工程的各施工、监理、第三方监测和检测单位进行了考评，现将结果通报如下：

一、日常检查情况

2022年11月1~17日，集团安全质量部组织开展了11月份日常检查，共下发《施工现场隐患整改通知单》65份，发现施工单位存在问题683条，其中安全问题263条、质量问题356条、文明施工问题64条，监理单位存在问题111条。截至目前，问题均已整改并回复。

二、月度集中检查情况

根据集团疫情防控要求，本月月度集中检查取消，月度考评成绩为日常检查和进度考评加权平均所得。

进度方面，根据工程管理部统计情况，本月64家单位参与进度考评，其中，44家施工单位完成施工进度计划，20家施工单位基本完成进度计划。

三、月度考评结果

月度考评结束后，对各子公司所辖建设项目进行排名，排名第一且成绩优良的单位，颁发流动红旗；排名落后的单位，由子公司

约谈项目负责人或其上级单位领导。各项目月度排名第一的参建单位见表1，各项目月度排名落后的参建单位见表2。

表1 各项目月度排名第一的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线历下广场同期项目	中铁十八局集团有限公司
	监理	4号线历下广场同期监理	北京铁城建设监理有限责任公司
6号线项目	施工	6号线十二工区	中铁北京局集团有限公司
	监理	6号线监理十一标	济南建设监理有限公司
场段项目	施工	梁王车辆段三工区	中铁建工集团有限公司
	监理	6号线场段监理四标	北京铁城建设监理有限责任公司
市政工程项目	施工	管鲍大街、龙脊河东西路一标	中建八局第一建设有限公司
	监理	管鲍大街、龙脊河东西路一标监理	天宇工程咨询有限公司
房建工程项目	施工	总部基地B地块	济南长兴建设集团有限公司
	监理	总部基地B地块监理	山东易方达建设项目管理有限公司

表2 各项目月度排名落后的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线六工区	中铁十四局集团有限公司
	监理	4号线监理八标	山东省工程监理咨询有限公司

6号线项目	施工	6号线九工区	中铁三局集团有限公司
	监理	6号线监理三标	中铁济南工程建设监理有限公司
场段项目	施工	梁王车辆段二工区	中铁四局集团有限公司
	监理	6号线场段监理三标	众成工程管理集团有限公司
市政工程项目	施工	王府片区市政道路一期一批二标	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	济南东站片区王舍人街市政道路监理	山东泰山工程项目管理有限公司
房建工程项目	施工	张马屯AX-4地块初中	青岛中建联合集团有限公司
	监理	张马屯AX-2地块幼儿园监理	众成工程管理集团有限公司

四、第四季度考评结果

根据《济南轨道交通集团建设项目参建单位考评办法（修订）》文件要求，结合工作实际，汇总10、11月份考评成绩平均值为本季度考评成绩（12月份因疫情防控要求，未组织考评）。对各子公司所辖参建项目进行排名，排名第一的参建项目部树立为榜样，并组织向排名第一的先进项目部学习。排名落后的，由轨道集团约谈其合同签订单位分管领导，并可以要求其更换项目负责人。季度排名第一的参建单位见表3，季度被约谈的参建单位见表4。

表3 各项目季度排名第一的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	3号线二期一工区	济南城建集团有限公司
	监理	4号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司
6号线项目	施工	6号线十二工区	中铁北京局集团有限公司
	监理	6号线监理十一标	济南建设监理有限公司
场段项目	施工	4号线16工区	中铁二十二局集团有限公司
	监理	6号线场段监理四标	北京铁城建设监理有限责任公司
市政工程项目	施工	管鲍大街、龙脊河东西路一标	中建八局第一建设有限公司
	监理	管鲍大街、龙脊河东西路一标监理	天宇工程咨询有限公司
房建工程项目	施工	总部基地B地块	济南长兴建设集团有限公司
	监理	华山北租赁租房B-1地块监理	济南城建监理有限责任公司
济莱高铁站房项目	施工	站房一标	中铁十局集团有限公司
	监理	监理二标	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司

表2 各项目季度排名落后的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线六工区	中铁十四局集团有限公司
	监理	4号线监理八标	山东省工程监理咨询有限公司

6号线项目	施工	6号线九工区	中铁三局集团有限公司
	监理	6号线监理八标	山东省建设监理咨询有限公司
场段项目	施工	梁王车辆段二工区	中铁四局集团有限公司
	监理	6号线场段监理三标	众成工程管理集团有限公司
市政工程项目	施工	张马片区市政道路三标	中恒建设集团有限公司
	监理	新东站安置市三区市政道路监理	山东敬业监理项目管理有限公司
房建工程项目	施工	张马屯AX-4地块初中	青岛中建联合集团有限公司
	监理	张马屯AX-2地块幼儿园监理	众成工程管理集团有限公司
济莱高铁站房项目	施工	站房四标	中铁二十二局集团有限公司
	监理	监理三标	上海天佑工程咨询有限公司

四、工作要求

（一）进入秋冬季，我市空气污染形势严峻，各子公司、各参建单位要严格落实省、市有关安排部署，加强施工过程中的扬尘污染管控，积极采取有效措施应对重污染天气，深入打好污染防治攻坚战。

（二）各子公司、各参建单位要深入贯彻省、市关于生产安全事故信息报告工作的决策部署，结合工作实际，就提高信息质量、规范报告流程、拓宽信息渠道等方面认真落实工作要求，进一步规范生产安全事故信息报告工作。

（三）各子公司、各参建单位要进一步强化重点部位、关键环

节安全生产管控，持续深入排查各类安全、火灾隐患，切实加强疫情防控和值班值守，认真做好全员安全教育培训，特别是要将河南安阳“11·21”火灾事故警示传达到每名从业人员，切实增强员工安全意识，全力保障工程建设安全。

附件:

1.4 号线及 3 号线二期项目月度考评评分汇总表—施工单位

2. 6 号线项目月度考评评分汇总表—施工单位

3. 场段项目月度考评评分汇总表—施工单位

4.市政工程项目月度考评评分汇总表—施工单位

5.房建项目月度考评评分汇总表—施工单位

6.其他项目月度考评评分汇总表—施工单位

7.月度考评评分汇总表—监理单位

8.2022 年第四季度考评评分汇总表—施工单位

9.2022 年第四季度考评评分汇总表—监理单位

济南轨道交通集团有限公司土建工程考评办公室

2022 年 12 月 22 日

附件 9

济南轨道交通集团有限公司

2022 年第四季度考评评分汇总表—监理单位

序号	标段	被考核单位名称	10 月份得分	11 月份得分	合计得分	名次
轨道交通 4 号线及 3 号线二期 项目						
1	4 号线监理一标	北京致远工程建设监理有限责任公司	95.0	98.1	96.6	8
2	4 号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司	97.2	98.2	97.7	1
3	4 号线监理三标	北京铁城建设监理有限责任公司	96.5	98.2	97.4	5
4	4 号线监理四标	河南长城铁路工程建设咨询有限公司	95.3	97.6	96.5	12
5	4 号线监理五标	中铁二院监理（成都）咨询监理有限公司	95.3	97.9	96.6	8
6	4 号线监理六标	英泰克工程顾问（上海）有限公司	95.5	97.6	96.6	8
7	4 号线监理七标	上海同济监理咨询有限公司	95.5	97.7	96.6	8
8	4 号线监理八标	山东省工程监理咨询有限公司	95.2	97.0	96.1	13
9	4 号线腊山站换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司	95.6	98.2	96.9	7
10	4 号线历下广场同期监理	北京铁城建设监理有限责任公司	96.6	98.4	97.5	2
11	4 号线奥体中心换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司	96.7	98.2	97.5	2
12	3 号线二期监理一标	山东众成建设项目管理有限公司	96.3	98.2	97.3	6
13	3 号线二期监理二标	山东济铁工程建设监理有限责任公司	96.8	98.2	97.5	2
轨道交通 6 号线 项目						
14	6 号线监理一标	北京致远工程建设监理有限责任公司	94.4	89.4	91.9	9
15	6 号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司	97.0	93.6	95.3	2
16	6 号线监理三标	中铁济南工程建设监理有限公司	96.7	87.5	92.1	8
17	6 号线监理四标	北京城建建设监理有限责任公司	95.3	89.8	92.6	6
18	6 号线监理六标	济南城建监理有限公司	--	92.6	92.6	6

2022 年年度履约评价：

济南轨道交通集团有限公司土建工程考评办公室

关于 2022 年度考评结果的通报

集团各部门、直属中心、各子公司，各参建单位：

根据轨道集团《济南轨道交通集团建设项目参建单位考评办法（修订）》，汇总 2022 年第一、二、三、四季度考评成绩平均值为本年度考评成绩，并作为年度评优依据。按工程类别总评，对排名落后的单位由轨道集团约谈合同签订单位的主要领导。年度排名第一的参建单位见表 1，年度被约谈的参建单位见表 2。

表 1 年度排名第一的参建单位

项目	类型	标段	单位
轨道交通 4 号线及 3 号线二期项目	施工	4 号线四工区	中铁十一局集团有限公司
	监理	4 号线监理三标	北京铁城建设监理有限责任公司
轨道交通 6 号线项目	施工	6 号线二工区	中铁发展投资有限公司
	监理	6 号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司
市政工程项目	施工	管辖大街、龙脊河东西路一标	中建八局第一建设有限公司
	监理	管辖大街、龙脊河东西路一标监理	天宇工程咨询有限公司
房建工程项目	施工	总部基地 B 地块	济南长兴建设集团有限公司
	监理	总部基地 B 地块监理	山东易方达建设项目管理有限公司
济莱高铁站房项目	施工	站房一标	中铁十局集团有限公司
	监理	监理一标	北京铁城建设监理有限责任公司

表 2 被约谈的参建单位

项目	类型	标段	单位
轨道交通 4 号线及 3 号线二期项目	施工	4 号线七工区	中铁十八局集团有限公司
	监理	4 号线监理七标	上海同济监理咨询有限公司
轨道交通 6 号线项目	施工	6 号线五工区	中铁隧道局集团有限公司
	监理	6 号线监理四标	北京铁城建设监理有限责任公司
市政工程项目	施工	东客站进出场道路二标	中铁四局集团有限公司
	监理	新东站安置三区二期市政道路监理	山东敬业监理项目管理有限公司
房建工程项目	施工	苑村车辆基地一标	山东铁信建设集团有限公司
	监理	王府水屯小学监理	山东三强建设咨询有限公司
济莱高铁站房项目	施工	站房三标	中国建筑第八工程局有限公司
	监理	监理三标	上海天佑工程咨询有限公司

希望排名靠前的单位要再接再厉，戒骄戒躁，发扬成绩，不断进取，继续发挥好引领和标杆作用；排名靠后的单位要知耻而后勇，化压力为动力，突出抓重点、补短板、强弱项，自我加压，奋起直追，迎头赶上。2023 年度，各参建单位要继续强化项目管理，埋头苦干，攻坚克难，为维护集团高质量发展形势、助力开创新时代社会主义现代化强省会建设新局面作出新的更大贡献。

附件：1. 2022 年度考评评分汇总表—施工单位
2. 2022 年度考评评分汇总表—监理单位

济南轨道交通集团有限公司土建工程考评办公室
2023 年 1 月 30 日

附件 2

济南轨道交通集团有限公司

2022 年年度考评评分汇总表—监理单位

序号	标段	被考核单位名称	一季度得分	二季度得分	三季度得分	四季度得分	合计得分	名次
轨道交通 4 号线及 3 号线二期 项目								
1	4 号线监理一标	北京致远工程建设监理有限责任公司	97.2	96.3	96.7	96.6	96.7	9
2	4 号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司	97.5	97.6	97.6	97.7	97.6	2
3	4 号线监理三标	北京铁城建设监理有限责任公司	98.0	97.6	97.7	97.4	97.7	1
4	4 号线监理四标	河南长城铁路工程建设咨询有限公司	97.2	96.2	96.6	96.5	96.6	10
5	4 号线监理五标	中铁二院监理（成都）咨询监理有限公司	96.5	96.4	95.7	96.6	96.3	12
6	4 号线监理六标	英泰克工程顾问（上海）有限公司	97.7	96.6	96.4	96.6	96.8	7
7	4 号线监理七标	上海同济监理咨询有限公司	96.9	96.7	93.7	96.6	96.0	13
8	4 号线监理八标	山东省工程监理咨询有限公司	97.0	96.9	96.0	96.1	96.5	11
9	4 号线腊山站换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司	97.2	96.8	96.8	96.9	96.9	5
10	4 号线历下广场同期监理	北京铁城建设监理有限责任公司	97.9	97.8	97.2	97.5	97.6	2
11	4 号线奥体中心换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司	97.1	96.6	96.9	97.5	97.0	4
12	3 号线二期监理一标	山东众成建设项目管理有限公司	96.2	97.4	96.6	97.3	96.9	5
13	3 号线二期监理二标	山东济铁工程建设监理有限责任公司	96.6	96.1	97.0	97.5	96.8	7
轨道交通 6 号线 项目								
14	6 号线监理一标	北京致远工程建设监理有限责任公司	95.4	97.0	92.8	91.9	94.3	7
15	6 号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司	--	97.2	96.5	95.3	96.3	1

2023年第一季度履约评价：

济南轨道交通集团有限公司土建工程考评办公室

关于2023年3月份暨第一季度考评结果的通报

集团各部门、直属中心、各子公司，各参建单位：

根据《济南轨道交通集团建设项目参建单位考评办法（修订）》和《城市轨道交通工程质量安全检查指南》，考评办公室对集团在建工程的各施工、监理、第三方监测和检测单位进行了考评，现将结果通报如下：

一、日常检查情况

2023年3月5~20日，集团安全质量部组织开展了3月份日常检查，共下发《施工现场隐患整改通知单》58份，发现施工单位存在问题682条，其中安全问题308条、质量问题323条、文明施工问题51条，监理单位存在问题160条。截至目前，问题均已整改并回复。

二、月度集中检查情况

2023年3月20~31日，土建考评办公室组织集团纪委、安全质量部、工程管理部、总工办等相关部门，子公司，参建各方代表组成3个检查组，对在建工程进行了3月份月度集中检查，主要情况如下：

（一）对施工单位检查情况

根据《城市轨道交通工程质量安全检查指南》和《2023年3月份月度考评检查方案》，针对各施工现场的不同特点，分别从安全、质量和文明施工三个方面进行了检查，共下发《施工现场

隐患整改通知单》64份，发现施工单位存在问题848条，其中安全问题403条、质量问题386条、文明施工问题59条。截至目前，问题均已整改并回复。

1.安全方面

组织开展安全生产“一月一主题”专项治理行动，本月主题为“监理内业隐患”，对该类问题重点检查和加重扣分。同时，对起重吊装、安全防护、脚手架及高支模、机械设备报验及规范使用、基坑开挖及支撑架设、隧道监控量测、风险管控、初期支护、施工现场安全隐患排查及治理、应急物资、应急演练、人员教育培训等方面进行检查，存在的主要问题：

一是各施工单位普遍对基坑支护隐患重视程度不足，存在较多安全隐患。如：钢支撑防坠落装置与图纸不符；个别钢斜撑抗滑移装置缺失；个别钢支撑高强度螺栓连接副外露丝不足2-3丝；钢支撑架设不及时；基坑侧壁喷锚支护滞后等。二是个别施工单位安全责任意识不强。如：承插型盘扣式钢管支架搭设不规范，架体立杆间距、水平杆步距超过方案或规范要求，立杆底部未按要求设置可调底座，未按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑；安全防护不到位，深度超过2m的基坑临边防护不严密；高处作业人员未正确系挂安全带。

2.质量方面

重点对混凝土施工、钢筋加工与安装、钢格栅加工与安装、防水施工、原材料见证取样及检测、结构尺寸控制、拌合站、试

验室等进行了检查，存在的主要问题：

一是各施工单位普遍存在主体结构混凝土蜂窝、麻面、孔洞、疏松、夹渣、错台、露筋、烂根、裂缝等外观质量缺陷，混凝土施工缝凿毛不到位，混凝土浇筑前杂物清理不彻底，在混凝土施工质量控制方面仍需要进一步加强管理。二是个别施工单位还存在部分管片拼装后错台超标、漏水、崩块、缺棱掉角及裂缝问题，钢筋间距、排距、保护层厚度偏差超允许值；防水板粘接不牢等问题。

3.文明施工方面

重点对扬尘治理“四个一律”、“六个百分之百”、“八项扬尘防治措施”落实情况、垃圾及污水排放、材料堆码、围挡及周边道路维护、食堂卫生、职工及农民工宿舍管理等进行了检查，发现个别单位仍存在施工场地内无排水设施或排水不畅，施工现场土方作业、裸露场地等未采取扬尘防治措施，局部易燃材料存放区灭火器材配备数量不足等问题。

4.进度方面

根据工程管理部统计情况，本月62家单位参与进度考评，其中，34家施工单位完成施工进度计划，28家施工单位基本完成进度计划。

（二）对监理单位检查情况

重点对监理责任落实、监理规划和实施细则、监理日志、旁站记录、监理通知单等进行了检查，共发现问题174条。截至目

前，问题均已整改并回复。存在的主要问题：

一是针对施工单位存在的安全、质量和文明施工问题，监理单位未及时采取监理措施或监理措施不到位。二是个别监理单位存在旁站监理记录不真实，日常巡视、检查监理日志记录不全面，未对个别危大工程进行巡视记录等问题。

三、月度考评结果

月度考评结束后，对各子公司所辖建设项目进行排名，排名第一且成绩优良的单位，颁发流动红旗；排名落后的单位，由子公司约谈项目负责人或其上级单位领导。各项目月度排名第一的参建单位见表1，各项目月度排名落后的参建单位见表2。

表1 各项目月度排名第一的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线历下广场同期项目	中铁十八局集团有限公司
	监理	3号线二期监理二标	山东济铁工程建设监理有限责任公司
6号线项目	施工	6号线十二工区	中铁北京局集团有限公司
	监理	6号线监理十一标	济南建设监理有限公司
轨道交通场段项目	施工	位里车辆段二工区	中铁上海局集团有限公司
	监理	6号线场段监理四标	北京铁城建设监理有限责任公司

市政工程	施工	济南东站三期、疏导工程	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	济南东站三期、疏导工程监理三标	济南城建监理有限责任公司
房建工程项目	施工	张马屯 AX-3 地块幼儿园	国舜绿建科技有限公司
	监理	郭店租赁住房监理一标	山东诚信建设项目管理有限公司

表 2 各项目月度排名落后的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线八工区	中铁十五局集团有限公司
	监理	4号线监理六标	英泰克工程顾问（上海）有限公司
6号线项目	施工	6号线三工区	中铁上海局集团有限公司
	监理	6号线监理四标	北京铁城建设监理有限责任公司
轨道交通场段项目	施工	4号线16工区	中铁二十二局集团有限公司
	监理	6号线场段监理二标	北京中铁诚业工程建设监理有限公司
市政工程	施工	进出场道路二标	中铁四局集团有限公司
	监理	华山北片区二期市政道路监理	山东诚信建设项目管理有限公司
房建工程项目	施工	张马屯 AX-2 地块幼儿园	济南铸城建筑工程集团有限公司
	监理	彭家庄租赁住房监理	山东省工程监理咨询有限公司

四、第三季度考评结果

根据《济南轨道交通集团建设项目参建单位考评办法（修订）》文件要求，结合工作实际，汇总1、2、3月份考评成绩平均值为本季度考评成绩。对各子公司所辖参建项目进行排名，排名第一的参建项目部树立为榜样，并组织向排名第一的先进项目部学习。排名落后的，由轨道集团约谈其合同签订单位分管领导，并可以要求其更换项目负责人。季度排名第一的参建单位见表3，季度被约谈的参建单位见表4。

表 3 各项目季度排名第一的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线历下广场同期项目	中铁十八局集团有限公司
	监理	3号线二期监理一标	众成工程管理集团有限公司
6号线项目	施工	6号线六工区	中铁一局集团有限公司
	监理	6号线监理十一标	济南建设监理有限公司
轨道交通场段项目	施工	梁王车辆段二工区	中铁四局集团有限公司
	监理	6号线场段监理四标	北京铁城建设监理有限责任公司
房建工程项目	施工	郭店租赁住房一标	山东平安建设集团有限公司
	监理	华山北安置二区监理二标	济南城建监理有限责任公司

表 4 各项目季度排名落后的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线八工区	中铁十五局集团有限公司
	监理	4号线监理六标	英泰克工程顾问（上海）有限公司
6号线项目	施工	6号线三工区	中铁上海局集团有限公司
	监理	6号线监理三标	中铁济南工程建设监理有限公司
轨道交通场段项目	施工	位里车辆段四工区	中铁十局集团有限公司
	监理	6号线场段监理二标	北京中铁诚业工程建设监理有限公司
房建工程项目	施工	张马屯 AX-2 地块幼儿园	济南铸城建筑工程集团有限公司
	监理	张马屯 AX-2 地块幼儿园监理	众成工程管理集团有限公司

五、工作要求

（一）各子公司、各参建单位要高度重视开展“规范安全管控平台使用”工作，落实各项工作要求，加强人员打卡实名制管理，安排专人负责相关工作，及时完成各项资料上传任务，对资料真实性、准确性、完整性负责，定期自查资料完整度，发现问题及时整改，并做好记录，确保规范使用安全管控平台工作落到实处，充分发挥安全管控平台的重要作用。

（二）各子公司、各参建单位要认真组织宣贯《全市交通运

输系统常态化开展安全生产“审计式”监督检查工作实施方案》相关内容，对照“安全生产‘审计式’监督检查标准化任务清单”每月开展不少于1次的自查自纠，确保每项指标对标完成、落实落细；同时，按要求上传至“泉城安全”综合监管平台，并形成问题清单和整改报告，留档备查。各单位要以此为契机，切实推动安全生产主体责任有效落实，全面提升安全生产管理水平，争创安全生产“审计式”监督检查标准化企业。

（三）各子公司、各参建单位要根据集团《安全生产提升年专项整治行动实施方案》，做好周密部署、措施细化，按照时间阶段按时开展各项行动，针对方案要求的整治重点，进行全面自查自纠及监督检查工作，并举一反三，不折不扣落实安全生产提升相关行动，各子公司、各参建单位要全面落实安全生产分级分类监督管理，强化主体责任落实，有效防范化解安全风险，确保集团“双零”安全目标的实现。

附件：

1. 4号线及3号线二期项目月度考评评分汇总表—施工单位
2. 6号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
3. 轨道交通场段项目月度考评评分汇总表—施工单位
4. 市政工程项目月度考评评分汇总表—施工单位
5. 房建项目月度考评评分汇总表—施工单位
6. 其他项目月度考评评分汇总表—施工单位
7. 月度考评评分汇总表—监理单位

8. 2023 年第一季度考评评分汇总表—施工单位

9. 2023 年第一季度考评评分汇总表—监理单位

济南轨道交通集团有限公司土建工程考评办公室

2023 年 4 月 6 日

附件 9

济南轨道交通集团有限公司

2023 年第一季度考评评分汇总表—监理单位

统计日期：4 月 5 日

序号	标段	监理单位名称	1 月份得分	2 月份得分	3 月份得分	合计得分	名次
轨道交通 4 号线及 3 号线二期 项目							
1	4 号线监理一标	北京致远工程建设监理有限责任公司	98.0	93.6	92.5	94.7	9
2	4 号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司	97.1	95.2	92.9	95.1	7
3	4 号线监理三标	北京铁城建设监理有限责任公司	98.1	96.9	93.8	96.3	3
4	4 号线监理四标	河南长城铁路工程建设咨询有限公司	97.9	92.1	91.1	93.7	11
5	4 号线监理五标	中铁二院监理（成都）咨询监理有限公司	96.9	92.7	91.0	93.5	12
6	4 号线监理六标	英泰克工程顾问（上海）有限公司	96.5	92.2	86.6	91.8	13
7	4 号线监理七标	上海同济监理咨询有限公司	97.0	94.1	90.8	94.0	10
8	4 号线监理八标	山东省工程监理咨询有限公司	98.1	96.8	92.5	95.8	5
9	4 号线腊山站换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司	98.2	94.9	92.9	95.3	6
10	4 号线历下广场同期监理	北京铁城建设监理有限责任公司	98.0	97.3	94.6	96.6	2
11	4 号线奥体中心换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司	98.0	94.6	91.8	94.8	8
12	3 号线二期监理一标	众成工程管理集团有限公司	99.2	96.2	94.6	96.7	1
13	3 号线二期监理二标	山东济铁工程建设监理有限责任公司	98.1	94.2	95.7	96.0	4
轨道交通 6 号线 项目							
14	6 号线监理一标	北京致远工程建设监理有限责任公司	93.2	93.1	93.1	93.1	8
15	6 号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司	92.7	95.9	94.7	94.4	6
16	6 号线监理三标	中铁济南工程建设监理有限公司	90.1	93.5	90.5	91.4	11
17	6 号线监理四标	北京铁城建设监理有限责任公司	94.5	95.1	85.6	91.7	10
18	6 号线监理五标	上海三维工程建设咨询有限公司	--	94.6	96.6	95.6	2
19	6 号线监理六标	济南城建监理有限公司	94.1	95.1	94.1	94.4	6

2023年第二季度履约评价：

关于2023年6月份暨第二季度考评结果的通报

集团各部门、各直属中心、各子公司，各参建单位：

根据《济南轨道交通集团有限公司建设工程参建单位考评办法》和《城市轨道交通工程质量安全检查指南》，考评办公室对集团在建工程的各施工、监理、第三方监测和检测单位进行了考评，现将结果通报如下：

一、日常检查情况

2023年6月7-22日，集团安全监察部组织开展了6月份日常检查，共下发《施工现场隐患整改通知单》79份，发现施工单位存在问题755条，其中安全问题286条、质量问题395条、文明施工问题74条，监理单位存在问题142条。截至目前，问题均已整改并回复。

二、月度集中检查情况

2023年6月23日~7月6日，土建考评办公室组织集团纪委、安全监察部、工程管理部、总工办等相关部门，子公司，参建各方代表组成3个检查组，对在建工程进行了6月份月度集中检查，主要情况如下：

（一）对施工单位检查情况

根据《城市轨道交通工程质量安全检查指南》和《2023年6月份月度考评检查方案》，针对各施工现场的不同特点，分别从安全、质量和文明施工三个方面进行了检查，共下发《施工现场隐患整改

通知单》77份，发现施工单位存在问题877条，其中安全问题393条、质量问题410条、文明施工问题74条。截至目前，问题均已整改并回复。

1.安全方面

组织开展安全生产“一月一主题”专项治理行动，本月主题为“有限空间作业与燃气使用安全”，对该类问题重点检查和加重扣分。同时，对起重吊装、安全防护、脚手架及高支模、机械设备报验及规范使用、基坑开挖及支撑架设、隧道监控量测、风险管控、初期支护、施工现场安全隐患排查及治理、应急物资、应急演练、人员教育培训等方面进行检查，存在的主要问题：

一是各施工单位普遍对模板支架体系隐患重视程度不足，存在较多安全隐患。如：支架体系竖向斜杆安装滞后；主/次龙骨安装间距大于方案值；侧墙模板对拉螺栓间距偏大；混凝土达到方案要求的强度前拆除模板支撑；主龙骨采用材质与方案不符；模板支架体系拆除未遵循“先支后拆、后支先拆”原则；二是个别施工单位安全责任意识不强。如：未严格落实“红马甲”制度，个别项目未根据《济南市安全生产委员会办公室关于推广外来作业人员“红马甲”管理制度的通知》进行工作部署，未定制外来作业人员专用马甲，未落实进出场登记；个别项目未严格落实“先审批，再作业”、“先通风，再检测，后作业”的有限空间作业要求，存在审批手续不全，通风检测设备检测项目不全、检测频率过低，通风及检测记录填写滞后等问题；安全防护不到位，深度超过2m的基坑、楼板、

预留孔洞等的临边防护不严密。

2.质量方面

重点对混凝土施工、钢筋加工与安装、钢格栅加工与安装、防水施工、原材料见证取样及检测、结构尺寸控制、拌合站、试验室等进行了检查，存在的主要问题：

一是各施工单位普遍存在钢筋加工及安装质量控制不到位，钢筋搭接长度不足，钢筋间距、排距、保护层厚度偏差超过允许值，钢筋保护层垫块、架立筋设置间距偏大，主筋弯锚平直段长度不足等问题。二是个别施工单位还存在防水卷材粘接不牢、搭接长度不足；盾构管片存在破损、缺棱掉角；混凝土存在蜂窝麻面等问题。

3.文明施工方面

重点对扬尘治理“四个一律”、“六个百分之百”、“八项扬尘防治措施”落实情况、垃圾及污水排放、材料堆码、围挡及周边道路维护、食堂卫生、职工及农民工宿舍管理等进行了检查，发现个别单位仍存在施工场地内文明施工差，建筑垃圾清运不及时，现场原材、半成品保护不到位，易燃材料存放区灭火器材配备数量不足等问题。

4.进度方面

根据工程管理部统计情况，本月75家单位参与进度考评，其中，37家施工单位完成施工进度计划，38家施工单位基本完成进度计划。

（二）对监理单位检查情况

重点对监理责任落实、监理规划和实施细则、监理日志、旁站记录、监理通知单等进行了检查，共发现问题173条。截至目前，问题均已整改并回复。存在的主要问题：

一是针对施工单位存在的安全、质量和文明施工问题，监理单位未及时采取监理措施或监理措施不到位。二是个别监理单位监理例会召开不及时，监理日志内容填写不全面，对监理整改通知单回复单审核把关不严等问题。

三、月度考评结果

月度考评结束后，对各子公司所辖建设项目进行排名，排名第一且成绩优良的单位，颁发流动红旗；排名落后的单位，由子公司约谈项目负责人或其上级单位领导。各项目月度排名第一的参建单位见表1，各项目月度排名落后的参建单位见表2。

表1 各项目月度排名第一的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	3号线二期二工区	中铁十局集团有限公司
	监理	3号线二期监理二标	山东济铁工程建设监理有限责任公司
6号线项目	施工	6号线三工区	中铁上海局集团有限公司
	监理	6号线监理十一标	济南市建设监理有限公司
8号线项目	施工	8号线二工区	中交路桥建设有限公司

	监理	8号线监理二标	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司
9号线项目	施工	9号线一工区	济南城建集团有限公司
	监理	9号线土建监理2标	上海三维工程建设咨询有限公司
轨道交通场段项目	施工	位里车辆段三工区	中铁二局集团有限公司
	监理	6号线场段监理四标	北京铁城建设监理有限责任公司
市政工程	施工	华山北片区二期市政道路建设工程	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	华山北片区二期市政道路监理	山东诚信建设项目管理有限公司
房建工程项目	施工	彭家庄站地块租赁住房项目	中铁十四局集团有限公司
	监理	新东站安置四区三标段剩余工程监理	山东高新工程设计有限公司

表2 各项目月度排名落后的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线七-1工区	中铁十八局集团有限公司
	监理	4号线腊山站换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司
6号线项目	施工	6号线九工区	中铁三局集团有限公司
	监理	6号线监理三标	中铁济南工程建设监理有限公司

8号线项目	施工	8号线五工区	中交第三公路工程局有限公司
	监理	8号线监理一标	北京铁城建设监理有限责任公司
9号线项目	施工	9号线六工区	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	9号线土建监理1标	中铁济南工程建设监理有限公司
轨道交通场段项目	施工	4号线16工区	中铁二十二局集团有限公司
	监理	6号线场段监理三标	众成工程管理集团有限公司
市政工程	施工	济南东站三期、疏导工程	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	济南东站王舍人街市政道路监理	山东泰山工程项目管理有限公司
房建工程项目	施工	山东财经大学一标	中铁十四局集团有限公司
	监理	山东财经大学（原）明水校区改造建设工程监理	管特国际工程咨询集团有限公司

四、第二季度考评结果

根据《济南轨道交通集团有限公司建设工程参建单位考评办法》文件要求，结合工作实际，汇总4、5、6月份考评成绩平均值为本季度考评成绩。对各子公司所辖参建项目进行排名，排名第一的参建项目部树立为榜样，并组织向排名第一的先进项目部学习。排名落后的，由轨道集团约谈其合同签订单位分管领导，并可以要求其更换项目负责人。季度排名第一的参建单位见表3，季度被约谈的参建单位见表4。

表3 各项目季度排名第一的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	3号线二期二工区	中铁十局集团有限公司
	监理	3号线二期监理一标	众成工程管理集团有限公司
6号线项目	施工	6号线十一工区	济南城建集团有限公司
	监理	6号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司
9号线项目	施工	9号线一工区	济南城建集团有限公司
	监理	9号线监理二标	上海三维工程建设咨询有限公司
轨道交通场段项目	施工	位里车辆段三工区	中铁二局集团有限公司
	监理	6号线场段监理四标	北京铁城建设监理有限责任公司
市政工程	施工	济南东站三期、疏导工程	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	济南东站三期、疏导工程监理三标	济南城建监理有限责任公司
房建工程项目	施工	华山北租赁住房B-1地块	山东长兴建设集团有限公司
	监理	新东站安置三区二期配套小学监理	济南海河建设项目管理有限公司

表4 各项目季度排名落后的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线七-1工区	中铁十八局集团有限公司
	监理	4号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司
6号线项目	施工	6号线九工区	中铁三局集团有限公司
	监理	6号线监理九标	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司
9号线项目	施工	9号线六工区	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	9号线监理七标	北京铁城建设监理有限责任公司
轨道交通场段项目	施工	4号线16工区	中铁二十二局集团有限公司
	监理	4号线一期唐冶北车辆段监理	山东建院工程监理咨询有限公司
市政工程	施工	华山北片区二期市政道路建设工程	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	济南东站王舍人街市政道路监理	山东泰山工程项目管理有限公司
房建工程项目	施工	安置四区三标段剩余工程	中国建筑第五工程局有限公司
	监理	华山北租赁住房C-1地块监理	济南大成建设项目管理有限公司

五、工作要求

（一）各子公司、各参建单位要高度重视主汛期防汛备汛工作，要全面调查现有防汛应急物资及人员配备情况，保证应急物资充足、防汛组织机构健全、应急救援人员专业可靠，及时根据《济南

市防汛抗旱应急预案》修订本单位、本项目相关应急预案，做好预案衔接，并根据应急预案及时组织开展应急演练，充分检验应急预案可操作性、实用性，达到锻炼队伍、磨合机制、普及应急管理知识的目的。

（二）各子公司、各参建单位要积极确保施工安全日志在项目建设中得到充分运用，施工单位要严格按照安全日志格式和要求规范填写，有效发挥安全日志作用，及时消除安全隐患；监理单位要加强对施工安全日志的日常检查，对安全日志中记录的安全隐患问题，及时督促整改到位。各建设子公司要有效督促所辖工程项目做好每日安全检查，严格落实重大事故隐患判定标准，强化安全隐患排查整改，确保闭环管理。各级安全管理部门要把工程项目安全日志制度落实情况作为日常监督检查和各类督导检查的重点内容和必查事项，引导施工单位建立安全日志奖惩机制。

（三）各子公司、各参建单位要同时做好燃气使用安全和有限空间作业安全，切实吸取近期类似事故教训，加强隐患排查，杜绝使用不合格气瓶、灶具、连接软管和减压阀，严禁将气瓶间设置在地下室或半地下室；各单位要做好培训教育，强化有限空间作业人员安全意识，提高自救互救能力，要配齐劳动防护用品，严格执行有限空间作业审批制度，做到“先通风、再检测、后作业”，确保燃气使用安全和有限空间作业安全。

附件：

1.4号线及3号线二期项目月度考评评分汇总表—施工单位

2.6号线项目月度考评评分汇总表—施工单位

3.7号线项目月度考评评分汇总表—施工单位

4.8号线项目月度考评评分汇总表—施工单位

5.9号线项目月度考评评分汇总表—施工单位

6.轨道交通场段项目月度考评评分汇总表—施工单位

7.市政工程项目月度考评评分汇总表—施工单位

8.房建项目月度考评评分汇总表—施工单位

9.其他项目月度考评评分汇总表—施工单位

10.月度考评评分汇总表—监理单位

11.2023年第二季度考评评分汇总表—施工单位

12.2023年第二季度考评评分汇总表—监理单位

济南轨道交通集团有限公司土建工程考评办公室

2023年7月11日

附件 12

济南轨道交通集团有限公司

2023 年第二季度考评评分汇总表—监理单位

统计日期：7 月 11 日

序号	标段	监理单位名称	4 月份得分	5 月份得分	6 月份得分	合计得分	名次
轨道交通 4 号线及 3 号线二期 项目							
1	4 号线监理一标	北京致远工程建设监理有限责任公司	95.4	96.0	92.7	94.7	6
2	4 号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司	95.9	92.1	91.2	93.1	13
3	4 号线监理三标	北京铁城建设监理有限责任公司	94.3	93.9	93.8	94.0	10
4	4 号线监理四标	河南长城铁路工程建设咨询有限公司	95.5	95.2	92.7	94.5	7
5	4 号线监理五标	中铁二院监理（成都）咨询监理有限公司	96.9	97.3	90.2	94.8	5
6	4 号线监理六标	英泰克工程顾问（上海）有限公司	91.8	94.1	94.0	93.3	12
7	4 号线监理七标	上海同济监理咨询有限公司	94.8	95.5	92.4	94.2	9
8	4 号线监理八标	山东省工程监理咨询有限公司	92.6	94.8	95.5	94.3	8
9	4 号线腊山站换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司	96.6	96.7	87.7	93.7	11
10	4 号线历下广场同期监理	北京铁城建设监理有限责任公司	96.5	97.1	93.9	95.8	3
11	4 号线奥体中心换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司	96.1	96.6	94.4	95.7	4
12	3 号线二期监理一标	众成工程管理集团有限公司	96.8	96.5	--	96.7	1
13	3 号线二期监理二标	山东济铁工程建设监理有限责任公司	95.8	95.6	96.6	96.0	2
轨道交通 6 号线 项目							
14	6 号线监理一标	北京致远工程建设监理有限责任公司	93.8	91.2	89.1	91.4	9
15	6 号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司	97.0	96.6	94.4	96.0	1
16	6 号线监理三标	中铁济南工程建设监理有限公司	91.2	91.8	88.9	90.6	10
17	6 号线监理四标	北京铁城建设监理有限责任公司	91.7	93.0	--	92.4	8
18	6 号线监理五标	上海三维工程建设咨询有限公司	94.0	94.3	91.7	93.3	5
19	6 号线监理六标	济南城建监理有限公司	95.3	94.4	91.6	93.8	4

2023年第三季度履约评价：

济南轨道交通集团有限公司土建工程考评办公室

济轨土建考评办〔2023〕6号

关于2023年9月份暨第三季度考评结果的通报

集团各部门、各直属中心、各子公司，各参建单位：

根据《济南轨道交通集团有限公司建设工程参建单位考评办法》和《城市轨道交通工程质量安全检查指南》，通过参建单位自查考评、子公司检查考评、集团督查考评对集团在建工程的各施工、监理单位进行了考评，现将结果通报如下：

一、参建单位自评情况

（一）施工单位自评

2023年9月1~20日，集团建设工程参建施工单位开展了9月份自评检查，共72家施工单位开展自评检查工作，发现存在问题1086条，其中安全问题627条、质量问题144条、文明施工问题315条。截至目前，问题均已整改闭环。

（二）监理单位自评

2023年9月1~20日，集团建设工程参建监理单位开展了9月份自评检查，共59家监理单位开展自评检查工作，发现存在问题226条。截至目前，问题均已整改闭环。

二、子公司检查情况

（一）对施工单位检查情况

2023年9月1~21日，集团各建设子公司开展了9月份月度检查，发现施工单位存在问题794条，其中安全问题433条、质量问题222条、文明施工问题139条。截至目前，问题均已整改闭环。

（二）对监理单位检查情况

2023年9月1~21日，集团各建设子公司开展了9月份月度检查，发现监理单位存在问题290条。截至目前，问题均已整改闭环。

三、集团督查考评情况

（一）对施工单位检查情况

2023年9月5~21日，集团安全监察部、工程管理部根据《城市轨道交通工程质量安全检查指南》，针对各施工现场的不同特点，对集团范围内建设工程参建单位开展了9月份督查考评，分别从安全、质量和文明施工三个方面进行了检查，其中安全监察部共下发《施工现场隐患整改通知单》65份，发现存在问题417条，其中安全问题323条、文明施工问题94条；工程管理部下发《施工现场隐患整改通知单》10份，发现存在质量问题73条。截至目前，问题均已整改闭环。

（二）对监理单位检查情况

重点对监理责任落实、监理规划和实施细则、监理日志、旁站记录、监理通知单等进行了检查，共发现问题198条。截至目前，问题均已整改并回复。

四、检查发现的主要问题

（一）施工单位存在问题

1. 安全方面

对起重吊装、安全防护、脚手架及高支模、机械设备报验及规范使用、基坑开挖及支撑架设、隧道监控量测、风险管控、初期支护、施工现场安全隐患排查及治理、应急物资、应急演练、人员教育培训等方面进行检查，存在的主要问题：

一是各施工单位普遍对安全防护隐患重视程度不足，存在较多安全隐患，如：个别施工人员未正确佩戴安全帽；个别施工人员未正确使用安全带；脚手架作业平台未设置安全防护栏杆；外架未设置水平防护网或设置不全；通道口未设置防护棚；防护栏杆安装不牢固。二是个别施工单位安全责任意识不强，如：基坑支护斜撑位置钢围檩背后未设置抗剪蹬；模板支撑体系立杆底部悬空；现场未设置危险源公示牌；单人操作双机吊篮；外电防护措施设置不齐全；燃气罐存放间未设置气体检测装置；土方开挖纵向坡度过陡等问题。

2. 质量方面

重点对混凝土施工、钢筋加工与安装、钢格栅加工与安装、盾构施工、防水施工、原材料见证取样及检测、结构尺寸控制、拌合站、试验室等进行了检查，存在的主要问题：

一是各施工单位普遍存在钢筋加工、安装质量控制不到位，如：局部钩筋弯钩平直段长度不足10d；钢筋机械连接外露丝超2P；

柱顶板弯锚钢筋随意切割；冠梁上排筋局部间距不均匀；部分钢筋直螺纹丝头凹陷、不平整；墙垛、构造柱违规植筋无植筋胶等。二是个别施工单位还存在墩柱混凝土表面裂缝；墙面抹灰不平整，阴阳角不顺直；管道两侧素土回填且含有建筑垃圾，也未分层夯实，管道破损；混凝土表面修补质量差，色差明显等问题。

3. 文明施工方面

重点对扬尘治理"四个一律"、"六个百分之百"、"八项扬尘防治措施"落实情况、垃圾及污水排放、材料堆码、围挡及周边道路维护、食堂卫生、职工及农民工宿舍管理等进行了检查，发现个别单位仍存在外架垃圾未及时清理；现场材料无标识牌；裸土或裸露场地无抑尘措施；围挡歪斜、不稳固等问题。

（二）监理单位存在问题

一是针对施工单位存在的安全、质量和文明施工问题，监理单位未及时采取监理措施或监理措施不到位。二是个别监理单位监理通知单无整改时限要求；监理规划内容不全面；安全监理日志内容填写不全；监理未有效督促施工单位上报资料；监理无年度安全教育培训资料等问题。

五、月度考评结果

月度考评结束后，对各子公司所辖建设项目进行排名，对各项目排名前20%的参建单位只扣分，不处罚；对排名末位的参建单位，由各建设子公司约谈其后方单位相关领导。各项目月度排名第一的参建单位见表1，各项目月度排名落后的参建单位见表2。

表 1 各项目月度排名第一的参建单位

项目	类型	标段	单位
4 号线和 3 号线二期项目	施工	4 号线八工区	中铁十五局集团有限公司
	监理	4 号线历下广场同期监理	北京铁城建设监理有限责任公司
6 号线项目	施工	6 号线七工区	中铁二局集团有限公司
	监理	6 号线监理九标	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司
7 号线项目	施工	7 号线三工区	中国建筑第八工程局有限公司
	监理	7 号线土建监理 2 标	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司/济南海河建设项目管理有限公司
8 号线项目	施工	8 号线五工区	中交第三公路工程局有限公司
	监理	8 号线监理二标	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司
9 号线项目	施工	9 号线六工区	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	9 号线监理 7 标	北京铁城建设监理有限责任公司
轨道交通场段项目	施工	位里庄车辆段三工区	中铁二局集团有限公司
	监理	6 号线场段监理四标	北京铁城建设监理有限责任公司
市政工程	施工	华山北片区二期市政道路建设工程	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	济南东站三期、疏导工程监理三标	济南城建监理有限责任公司

房建工程项目	施工	华山北租赁住房 B-1 地块项目	山东长兴建设集团有限公司
	监理	华山北租赁租房 B-1 地块项目监理	济南城建监理有限责任公司

表 2 各项目月度排名落后的参建单位

项目	类型	标段	单位
4 号线和 3 号线二期项目	施工	4 号线十三工区	中铁十七局集团有限公司
	监理	4 号线监理八标	山东省工程监理咨询有限公司
6 号线项目	施工	6 号线三工区	中铁上海工程局集团有限公司
	监理	6 号线监理四标	北京铁城建设监理有限责任公司
7 号线项目	施工	7 号线二工区	中国建筑股份有限公司
	监理	7 号线土建监理 1 标	山东贝特建筑项目管理咨询有限公司
8 号线项目	施工	8 号线一工区	中交第二公路工程局有限公司
	监理	8 号线监理一标	北京铁城建设监理有限责任公司
9 号线项目	施工	9 号线五工区	中国水利水电第四工程局有限公司
	监理	9 号线监理 6 标	众成工程管理集团有限公司/上海市市政工程管理咨询有限公司
轨道交通场段项目	施工	4 号线十六工区	中铁二十二局集团有限公司
	监理	4 号线一期唐冶北车辆段监理	山东建院工程监理咨询有限公司

市政工程	施工	济南东站二期市政道路建设工程冷水路工程	中铁建工集团有限公司
	监理	济南新东站二期市政道路建设工程冷水路监理	众成工程管理集团有限公司
房建工程项目	施工	郭店租赁住房一标	山东平安建设集团有限公司
	监理	彭家庄租赁住房项目监理	山东省工程监理咨询有限公司

六、第三季度考评结果

根据《济南轨道交通集团有限公司建设工程参建单位考评办法》文件要求，结合工作实际，汇总 7、8、9 月份考评成绩平均值为本季度考评成绩。对各子公司所辖参建项目进行排名，排名第一的参建项目部树立为榜样，并组织向排名第一的先进项目部学习。对各项目排名末位的参建单位，由各建设子公司约谈其后方单位相关领导，可要求更换项目负责人；情节严重的，可报请集团分管领导约谈。季度排名第一的参建单位见表 3，季度被约谈的参建单位见表 4。

表 3 季度排名第一的参建单位

项目	类型	标段	单位
4 号线和 3 号线二期项目	施工	4 号线五工区	中铁二十局集团有限公司
	监理	4 号线历下广场同期监理	北京铁城建设监理有限责任公司
6 号线项目	施工	6 号线七工区	中铁二局集团有限公司
	监理	6 号线监理九标	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司

7 号线项目	施工	7 号线三工区	中国建筑第八工程局有限公司
	监理	7 号线土建监理 2 标	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司/济南海河建设项目管理有限公司
8 号线项目	施工	8 号线二工区	中交路桥建设有限公司
	监理	8 号线监理三标	中咨工程管理咨询有限公司
9 号线项目	施工	9 号线二工区	中铁十四局集团有限公司
	监理	9 号线土建监理 3 标	江苏盛华工程监理咨询有限公司
轨道交通场段项目	施工	位里庄车辆段三工区	中铁二局集团有限公司
	监理	6 号线场段监理四标	北京铁城建设监理有限责任公司
市政工程	施工	华山北片区二期市政道路建设工程	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	济南东站三期、疏导工程监理三标	济南城建监理有限责任公司
房建工程项目	施工	华山北租赁住房 B-1 地块	山东长兴建设集团有限公司
	监理	华山北租赁租房 B-1 地块项目监理	济南城建监理有限责任公司

表 4 季度被约谈的参建单位

项目	类型	标段	单位
4 号线和 3 号线二期项目	施工	4 号线七-2 工区	中铁十八局集团有限公司
	监理	4 号线监理六标	英泰克工程顾问（上海）有限公司

6号线项目	施工	6号线三工区	中铁上海工程局集团有限公司
	监理	6号线监理四标	北京铁城建设监理有限责任公司
7号线项目	施工	7号线二工区	中国建筑股份有限公司
	监理	7号线土建监理8标	山东易方达建设项目管理有限公司/山东诚信建设项目管理有限公司
8号线项目	施工	8号线六工区	中交第三公路工程局有限公司
	监理	8号线监理二标	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司
9号线项目	施工	9号线五工区	中国水利水电第四工程局有限公司
	监理	9号线土建监理7标	北京铁城建设监理有限责任公司
轨道交通场段项目	施工	4号线十六工区	中铁二十二局集团有限公司
	监理	4号线一期唐冶北车辆段监理	山东建院工程监理咨询有限公司
市政工程	施工	济南东站二期市政道路建设工程冷水路工程	中铁建工集团有限公司
	监理	济南新东站二期市政道路建设工程冷水路监理	众成工程管理集团有限公司
房建工程项目	施工	张马屯AX-4地块初中项目	青岛中建联合集团有限公司
	监理	郭店租赁住房监理一标	山东诚信建设项目管理有限公司

七、工作要求

（一）各子公司、各参建单位要高度重视大气污染防治工作，随着各行业全面恢复生产经营，加之今年以来气温偏高、降水偏少等不利气象条件，我市大气污染防治工作压力不断增大，各单位要积极领会近期我市大气污染防治相关文件精神，做好工作落实，请各单位用好《建设工程大气污染防治责任明白纸》和《建设工程大气污染常见问题防范清单》等资料，全面落实大气污染防治“八项措施”、车辆尿素添加使用、OBD故障预警、非道路移动源管控等各项大气污染防治措施，严格落实各项大气污染防治责任，特别要做好重点区域建设工程大气污染防治工作。

（二）各子公司、各参建单位要充分汲取9月5日、6日，槐荫区、市中区两起事故教训，要切实加强用电安全管理，对用电设施进行日常检查和维护，强化作业人员安全技术交底，对临时用电等特殊作业活动进行隐患排查，确保各项安全防范措施落实到位，严防触电事故发生。各子公司、各参建单位要认真开展安全生产“审计式”监督检查自查自纠，并以此为有力抓手，进一步增强安全意识，落实主体责任，全面排查隐患，提高工作质效，坚决防范遏制各类生产安全事故发生。

（三）各子公司、各参建单位要高度重视秋冬季消防安全管理工作，各施工单位要根据自身情况，完善消防安全管理制度，做好消防安全教育培训，对动火作业和用电等重点环节、库房和宿舍等重点部位加强日常巡查，对存在的隐患积极落实整改，监理单位要加强监督检查，积极组织施工单位进行消防安全隐患排查，做到排

查覆盖全面，杜绝死角盲区，做到排查工作深入，杜绝“蜻蜓点水”式检查，并监督整改，确保消防安全管理工作做实做细。

附件：

1.4号线及3号线二期项目月度考评评分汇总表—施工单位
2.6号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
3.7号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
4.8号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
5.9号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
6.轨道交通场段项目月度考评评分汇总表—施工单位
7.市政工程项目月度考评评分汇总表—施工单位
8.房建项目月度考评评分汇总表—施工单位
9.其他项目月度考评评分汇总表—施工单位
10.月度考评评分汇总表—监理单位
11.季度考评评分汇总表—施工单位
12.季度考评评分汇总表—监理单位

济南轨道交通集团有限公司土建工程考评办公室

2023年9月23日

附表 12　　济南轨道交通集团有限公司

季度考评评分汇总表—监理单位（ 2023 年 第三 季度）

统计日期：9 月 23 日

序号	项目名称	被考评施工单位名称	7 月份得分	8 月份得分	9 月份得分	合计得分	名次
轨道交通 4 号线及三号线二期 项目							
1	4 号线监理一标	北京致远工程建设监理有限责任公司	95.0	95.7	95.4	95.4	2
2	4 号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司	95.7	93.3	94.8	94.6	4
3	4 号线监理三标	北京铁城建设监理有限责任公司	96.2	94.2	92.9	94.4	5
4	4 号线监理四标	河南长城铁路工程建设咨询有限公司	88.8	93.2	95.7	92.6	10
5	4 号线监理五标	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	94.0	91.6	93.5	93.0	9
6	4 号线监理六标	英泰克工程顾问（上海）有限公司	89.7	91.5	92.5	91.2	12
7	4 号线监理七标	上海同济监理咨询有限公司	91.5	96.3	94.7	94.2	6
8	4 号线监理八标	山东省工程监理咨询有限公司	94.5	94.3	91.2	93.3	8
9	4 号线腊山站换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司	93.6	93.9	95.0	94.2	6
10	4 号线历下广场同期监理	北京铁城建设监理有限责任公司	94.9	96.5	96.2	95.9	1
11	4 号线奥体中心换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司	91.7	90.1	93.5	91.8	11
12	3 号线二期监理二标	山东济铁工程建设监理有限责任公司	95.6	95.1	94.2	95.0	3
轨道交通 6 号线 项目							
13	6 号线监理一标	北京致远工程建设监理有限责任公司	93.5	91.0	89.5	91.3	6
14	6 号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司	92.5	94.3	94.0	93.6	3
15	6 号线监理三标	中铁济南工程建设监理有限公司	89.1	92.3	89.6	90.3	7

2023年第四季度履约评价：

济南轨道交通集团有限公司土建工程考评办公室

济轨土建考评办〔2024〕3号

关于2023年12月份暨第四季度考评结果的通报

集团各部门、各直属中心、各子公司，各参建单位：

根据《济南轨道交通集团有限公司建设工程参建单位考评办法》和《城市轨道交通工程质量安全检查指南》，通过参建单位自查考评、子公司检查考评、集团督查考评对集团在建工程的各施工、监理单位进行了考评，现将结果通报如下：

一、参建单位自评情况

（一）施工单位自评

2023年12月1~15日，集团建设工程参建施工单位开展了12月份自评检查，共82家施工单位开展自评检查工作，发现问题915条，其中安全问题466条、质量问题274条、文明施工问题175条。截至目前，问题均已整改闭环。

（二）监理单位自评

2023年12月1~15日，集团建设工程参建监理单位开展了12月份自评检查，共70家监理单位开展自评检查工作，发现问题244条。截至目前，问题均已整改闭环。

二、子公司检查情况

（一）对施工单位检查情况

2023年12月1~15日，集团各建设子公司开展了12月份月度检查，发现施工单位存在问题836条，其中安全问题414条、质量问题249条、文明施工问题173条。截至目前，问题均已整改闭环。

（二）对监理单位检查情况

2023年12月1~15日，集团各建设子公司开展了12月份月度检查，发现监理单位存在问题301条。截至目前，问题均已整改闭环。

三、集团督查考评情况

（一）对施工单位检查情况

2023年12月5~15日，集团安全监察部、工程管理部根据《城市轨道交通工程质量安全检查指南》，针对各施工现场的不同特点，对集团范围内建设工程参建单位开展了12月份督查考评，分别从安全、质量和文明施工三个方面进行了检查，其中安全监察部共下发《施工现场隐患整改通知单》23份，发现存在问题197条，其中安全问题160条、文明施工问题37条；工程管理部下发《施工现场隐患整改通知单》17份，发现存在质量问题129条。截至目前，问题均已整改闭环。

（二）对监理单位检查情况

重点对监理责任落实、监理规划和实施细则、监理日志、旁站记录、监理通知单等进行了检查，共发现问题105条。截至目前，问题均已整改并回复。

四、检查发现的主要问题

（一）施工单位存在问题

1. 安全方面

对起重吊装、安全防护、脚手架及高支模、机械设备报验及规范使用、基坑开挖及支撑架设、隧道监控量测、风险管控、初期支护、施工现场安全隐患排查及治理、应急物资、应急演练、人员教育培训等方面进行检查，存在的主要问题：

一是各施工单位普遍对基坑开挖支护重视程度不足，存在较多安全隐患，如：钢支撑架设滞后；格构柱剪刀撑未按设计设置；基坑侧壁喷锚不及时；基坑降排水不到位、基底存在积水；钢支撑安拆过程中施工人员未正确系挂安全带；基坑开挖分层厚度过大；基坑内未及时设置逃生通道等。二是个别施工单位安全责任意识不强，如：钻孔灌注桩孔洞、预留洞口等防护不严密；支撑架斜杆安装滞后；支撑架立杆底部悬空；暗挖施工临时竖壁一次性拆除过长；暗挖初支连接筋长度不足，下台阶未及时封闭；起重吊装作业违规单点起吊；违规使用民用插排等问题。

2. 质量方面

重点对混凝土施工、钢筋加工与安装、钢格栅加工与安装、盾构施工、防水施工、原材料见证取样及检测、结构尺寸控制、拌合站、试验室等进行了检查，存在的主要问题：

一是各施工单位普遍存在混凝土施工质量控制不到位，如：冬期施工保温措施不足，温差控制不到位；局部混凝土存在裂缝；混

凝土施工缝凿毛处理不规范；混凝土存在错台；局部混凝土浇筑、振捣不到位，存在露筋；主侧墙砼局部拆模过早表面粘结；车站结构梁柱接头核心区域砼浇筑未按设计施工等。二是个别施工单位还存在防水板搭接长度不足，成品保护不到位；屋面砖、室内墙地砖存在空鼓；钢筋锚固长度不足；墙面干挂铝板、石材等局部错缝拔台等问题。

3. 文明施工方面

重点对扬尘治理“四个一律”、“六个百分之百”、“八项扬尘防治措施”落实情况、垃圾及污水排放、材料堆码、围挡及周边道路维护、食堂卫生、职工及农民工宿舍管理等进行了检查，发现个别单位仍存在宿舍、易燃材料存放等区域灭火器配备数量不足；施工现场未设置吸烟处、施工人员在场内吸烟；视频监控室无人值守；场内积雪、积泥清理不及时；裸土覆盖不到位；土方作业区域降尘措施不足等问题。

（二）监理单位存在问题

一是针对施工单位存在的安全、质量和文明施工问题，监理单位未及时采取监理措施或监理措施不到位。二是个别监理单位年度培训计划未落实到位；个别监理通知单未附问题照片，监理通知回复单中影像资料不齐全；安全监理实施细则中风险源清单未编制监理管控措施；监理监测细则中控制值不明确；个别监理单位对施工方案审核把关不严，存在明显错误；个别监理资料签字、盖章不及时；监理安全日志未体现特种设备验收情况等问题。

五、月度考评结果

月度考评结束后，对各子公司所辖建设项目进行排名，对各项目排名前20%的参建单位只扣分，不处罚；对排名末位的参建单位，由各建设子公司约谈其后方单位相关领导。各项目月度排名第一的参建单位见表1，各项目月度排名落后的参建单位见表2。

表1 各项目月度排名第一的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	3号线二期二工区	中铁十局集团有限公司
	监理	4号线监理四标	河南长城铁路工程建设咨询有限公司
6号线项目	施工	6号线九工区	中铁三局集团有限公司
	监理	6号线监理十标	青岛建设研究监理有限公司
7号线项目	施工	7号线七工区	中国建筑第八工程局有限公司
	监理	7号线土建监理6标	上海三维工程建设咨询有限公司
8号线项目	施工	8号线五工区	中交第三公路工程局有限公司
	监理	8号线监理二标	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司
9号线项目	施工	9号线六工区	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	9号线土建监理7标	北京铁城建设监理有限责任公司

轨道交通场段项目	施工	位里庄车辆段一工区	中铁一局集团有限公司
	监理	6号线场段监理三标	众成工程管理集团有限公司
济阳有轨电车	施工	有轨电车工程黄河大道段土建施工标	黄河路桥建设集团有限公司
	监理	有轨电车工程监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司
市政工程	施工	济南东站三期、疏导工程	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	济南东站三期、疏导工程监理三标	济南城建监理有限责任公司
房建工程项目	施工	华山北租赁住房B-1地块	山东长兴建设集团有限公司
	监理	华山北租赁租房B-1地块项目监理	济南城建监理有限责任公司
4号线机电、装修、铺轨项目	施工	4号线28工区	中铁十五局集团有限公司
	监理	4号线一期工程机电安装及装饰装修工程监理二标	英泰克工程顾问（上海）有限公司

表2 各项目月度排名落后的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线十一工区	山东省路桥集团有限公司
	监理	4号线监理一标	北京致远工程建设监理有限责任公司
6号线项目	施工	6号线二工区	中铁发展投资有限公司

	监理	6号线监理一标	北京致远工程建设监理有限责任公司
7号线项目	施工	7号线三工区	中国建筑第八工程局有限公司
	监理	7号线土建监理2标	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司/济南海河建设项目管理有限公司
8号线项目	施工	8号线二工区	中交路桥建设有限公司
	监理	8号线监理三标	中咨工程管理咨询有限公司
9号线项目	施工	9号线三工区	中铁十局集团有限公司
	监理	9号线土建监理8标	山东易方达建设项目管理有限公司
轨道交通场段项目	施工	位里庄车辆段四工区	中铁十局集团有限公司
	监理	6号线场段监理四标	北京铁城建设监理有限责任公司
济阳有轨电车	施工	有轨电车工程施工一标	中国建筑第八工程局有限公司
	监理	新建至济阳区（起步区）有轨电车工程监理五标	北京中铁诚业工程建设监理有限公司
市政工程	施工	济南东站二期市政道路建设工程冷水路工程	中铁建工集团有限公司
	监理	济南新东站二期市政道路建设工程冷水路监理	众成工程管理集团有限公司
房建工程项目	施工	郭店租赁住房三标	济南二建集团工程有限公司

	监理	R2线腊山站上盖开发项目监理	山东诚信建设项目管理有限公司
4号线机电、装修、铺轨项目	施工	4号线19工区	中铁十四局集团有限公司
	监理	4号线一期工程机电安装及装饰装修工程监理一标	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司

六、第四季度考评结果

根据《济南轨道交通集团有限公司建设工程参建单位考评办法》文件要求，结合工作实际，汇总10、11、12月份考评成绩平均值为本季度考评成绩。对各子公司所辖参建项目进行排名，排名第一的参建项目部树立为榜样，并组织向排名第一的先进项目部学习。对各项目排名末位的参建单位，由各建设子公司约谈其后方单位相关领导，可要求更换项目负责人；情节严重的，可报请集团分管领导约谈。季度排名第一的参建单位见表3，季度被约谈的参建单位见表4。

表3 季度排名第一的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线六工区	中铁十四局集团有限公司
	监理	4号线监理四标	河南长城铁路工程建设咨询有限公司
6号线项目	施工	6号线九工区	中铁三局集团有限公司
	监理	6号线监理七标	山东贝特建筑项目管理有限责任公司
7号线项目	施工	7号线七工区	中国建筑第八工程局有限公司

	监理	7号线土建监理6标	上海三维工程建设咨询有限公司
8号线项目	施工	8号线五工区	中交第三公路工程局有限公司
	监理	8号线监理二标	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司
9号线项目	施工	9号线六工区	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	9号线土建监理7标	北京铁城建设监理有限责任公司
轨道交通场段项目	施工	位里庄车辆段一工区	中铁一局集团有限公司
	监理	6号线场段监理四标	北京铁城建设监理有限责任公司
济阳有轨电车	施工	有轨电车工程黄河大道段土建施工标	黄河路桥建设集团有限公司
	监理	有轨电车工程监理一标	济南海河建设项目管理有限公司
市政工程	施工	济南东站三期、疏导工程	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	济南东站三期、疏导工程监理三标	济南城建监理有限责任公司
房建工程项目	施工	华山北租赁住房B-1地块	山东长兴建设集团有限公司
	监理	新东站安置三区二期配套小学项目监理	济南海河建设项目管理有限公司
4号线机电、装修、铺轨项目	施工	4号线28工区	中铁十五局集团有限公司
	监理	4号线一期工程机电安装及装饰装修工程监理二标	英泰克工程顾问（上海）有限公司

表4　季度被约谈的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线三工区	中铁二十四局集团有限公司
	监理	4号线监理三标	北京铁城建设监理有限责任公司
6号线项目	施工	6号线一工区	中铁十局集团有限公司
	监理	6号线监理一标	北京致远工程建设监理有限责任公司
7号线项目	施工	7号线三工区	中国建筑第八工程局有限公司
	监理	7号线土建监理9标	北京致远工程建设监理有限责任公司/山东建院工程监理咨询有限公司
8号线项目	施工	8号线二工区	中交路桥建设有限公司
	监理	8号线监理一标	北京铁城建设监理有限责任公司
9号线项目	施工	9号线三工区	中铁十局集团有限公司
	监理	9号线土建监理4标	青岛建设监理研究有限公司
轨道交通场段项目	施工	位里庄车辆段三工区	中铁二局集团有限公司
	监理	6号线场段监理二标	北京中铁诚业工程建设监理有限公司
济阳有轨电车	施工	有轨电车工程施工一标	中国建筑第八工程局有限公司

	监理	新建至济阳区（起步区）有轨电车工程监理五标	北京中铁诚业工程建设监理有限公司
市政工程	施工	济南市张马片区二期、东站四期市政道路工程	济南蓝海建设工程有限公司
	监理	济南东站王舍人街市政道路监理	山东泰山工程项目管理有限公司
房建工程项目	施工	范村车辆基地一标	山东铁信建设集团有限公司
	监理	R2线腊山站上盖开发项目监理	山东诚信建设项目管理有限公司
4号线机电、装修、铺轨项目	施工	4号线19工区	中铁十四局集团有限公司
	监理	4号线一期工程机电安装及装饰装修工程监理一标	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司

七、工作要求

（一）各子公司、各参建单位要深刻吸取近期各类事故教训，充分认识岁末年初安全生产工作的极端重要性。一是要认清当前安全生产形势的严峻复杂，对近期事故进行警示教育，结合当前安全生产工作重点进行再部署、再检查、再落实，层层传导压力、层层压实安全生产责任，全面彻底排查整治安全隐患，切实堵塞安全管理漏洞。二是要结合当前施工工序和天气特点，强化施工现场安全管理和安全检查，重点做好高处作业、基坑开挖支护、施工区临时设施等环节的安全风险管控和事故隐患处置，加强对特种设备、有限空间等部位的监督检查，加密对建筑工地、民工宿舍、车站等

重点场所的突击检查、夜间巡查频次等，采取充分措施防范各类风险，确保集团安全生产形势平稳有序。

（二）各子公司、各参建单位要严格落实领导带班、24小时值班、监控室值班和事故信息报告制度，尤其要加强夜间施工安全管理工作，监理单位、施工单位要根据现场施工工序特点，在全面做好安全巡视工作的基础上，密切关注高风险点位，做到全过程盯控，领导带班、监控室值班过程中，要对现场夜间施工作业面安全隐患进行仔细排查，及时整改消除隐患，避免值班走形式、检查走过场，各子公司要对参建单位相关工作落实情况进行监督检查，对制度落实不到位的单位严厉追责问责，确保各项制度落实落细。

（三）各子公司、各参建单位要及时宣贯《集团安全文明施工标准化图册》，依法、规范、安全、科学、高效的落实好图册相关要求。要加强安全生产党建引领，树牢安全发展理念；要严格结合集团视觉识别系统规范手册内容，规范使用集团LOGO等内容；要积极创新安全管理举措，做细做实安全卫士、积分超市等创新举措的制度搭建、工作落实；要积极使用新设备、新技术、新材料、新工艺，不断优化安全管理、降尘、降噪措施；各子公司、各参建单位要高度重视标准化图册落实工作，严格监督考核，不断提升集团安全文明施工标准化水平。

附件：

1.4号线及3号线二期项目月度考评评分汇总表—施工单位

2.6号线项目月度考评评分汇总表—施工单位

3.7号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
4.8号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
5.9号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
6.轨道交通场段项目月度考评评分汇总表—施工单位
7. 济阳有轨电车项目月度考评评分汇总表—施工单位
8.市政工程项目月度考评评分汇总表—施工单位
9.房建项目月度考评评分汇总表—施工单位
10.其他项目月度考评评分汇总表—施工单位
11.月度考评评分汇总表—监理单位
12.季度考评评分汇总表—施工单位
13.季度考评评分汇总表—监理单位

济南轨道交通集团有限公司土建工程考评办公室

2024年1月17日

附表 13　　济南轨道交通集团有限公司

季度考评评分汇总表—监理单位（2023 年 第四 季度）

统计日期：12 月 17 日

序号	项目名称	被考评施工单位名称	10 月份得分	11 月份得分	12 月份得分	合计得分	名次
轨道交通 4 号线及三号线二期 项目							
1	4 号线监理一标	北京致远工程建设监理有限责任公司	96.2	95.8	87.2	93.1	10
2	4 号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司	96.31	88.6	94.8	93.2	9
3	4 号线监理三标	北京铁城建设监理有限责任公司	92.6	86.1	96.5	91.7	11
4	4 号线监理四标	河南长城铁路工程建设咨询有限公司	96.27	96.1	97.2	96.5	1
5	4 号线监理五标	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	95.0	96.6	96.7	96.1	3
6	4 号线监理六标	英泰克工程顾问（上海）有限公司	94.7	95.6	95.4	95.2	5
7	4 号线监理七标	上海同济监理咨询有限公司	95.8	96.8	96.1	96.2	2
8	4 号线监理八标	山东省工程监理咨询有限公司	93.2	95.4	91.6	93.4	8
9	4 号线腊山站换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司	91.95	95.3	93.8	93.7	7
10	4 号线奥体中心换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司	91.97	96.0	95.7	94.6	6
11	3 号线二期监理二标	山东济铁工程建设监理有限责任公司	95.2	95.7	96.5	95.8	4
轨道交通 6 号线 项目							
12	6 号线监理一标	北京致远工程建设监理有限责任公司	79.3	87.9	74.9	80.7	11
13	6 号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司	91.7	92.8	80.7	88.4	8
14	6 号线监理三标	中铁济南工程建设监理有限公司	83.4	82.9	86.1	84.1	10
15	6 号线监理四标	北京铁城建设监理有限责任公司	85.5	91.0	84.1	86.9	9
16	6 号线监理五标	上海三维工程建设咨询有限公司	90.8	89.5	86.0	88.8	7

2023 年年度履约评价：

济南轨道交通集团有限公司土建工程考评办公室

济轨土建考评办〔2024〕11 号

关于 2023 年度考评结果的通报

集团各部门、直属中心、各子公司，各参建单位：

根据轨道集团《济南轨道交通集团建设项目参建单位考评办法》，汇总 2023 年 1-12 月月度考评成绩平均值为本年度考评成绩，并作为年度评优依据。按工程类别总评，对排名落后的单位由轨道集团约谈合同签订单位的主要领导。年度排名第一的参建单位见表 1，年度被约谈的参建单位见表 2。

表 1 年度排名第一的参建单位

项目	类型	标段	单位
轨道交通 4 号线项目	施工	4 号线 二工区	中铁二十一局集团有限公司
	监理	4 号线 监理七标	上海同济监理咨询有限公司
轨道交通 6 号线项目	施工	6 号线 八工区	中铁四局集团有限公司
	监理	6 号线 监理七标	山东贝特建筑项目管理有限责任公司
轨道交通 7 号线项目	施工	7 号线 八工区	中国建筑第八工程局有限公司
	监理	7 号线土建 监理 7 标	中咨工程管理咨询有限公司

轨道交通 8 号线项目	施工	8 号线 二工区	中交路桥建设有限公司
	监理	8 号线监理二标	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司
轨道交通 9 号线项目	施工	9 号线 六工区	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	9 号线土建 监理 1 标	中铁济南工程建设监理有限公司
轨道交通 场段项目	施工	位里庄车辆段 一工区	中铁一局集团有限公司
	监理	6 号线场段 监理四标	北京铁城建设监理有限责任公司
市政工程 项目	施工	济南东站三期、疏导工程	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	济南东站三期、疏导工程监理三标	济南城建监理有限责任公司
房建工程 项目	施工	华山北片区一期租赁住房 B1	山东长兴建设集团有限公司
	监理	路家洼、裴家村城中村改造项目配套 24 班小学项目监理	济南海河建设项目管理有限公司

表 2 被约谈的参建单位

项目	类型	标段	单位
轨道交通 4 号线项目	施工	4 号线 七-2 工区	中铁十八局集团有限公司
	监理	4 号线 监理六标	英泰克工程顾问（上海）有限公司

轨道交通 6 号线项目	施工	6 号线 三工区	中铁上海工程局集团有限公司
	监理	6 号线 监理四标	北京铁城建设监理有限责任公司
轨道交通 7 号线项目	施工	7 号线 九工区	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	7 号线土建 监理 9 标	北京致远工程建设监理有限责任公司/山东建院工程监理咨询有限公司
轨道交通 8 号线项目	施工	8 号线 六工区	中交第三公路工程局有限公司
	监理	8 号线 监理一标	北京铁城建设监理有限责任公司
轨道交通 9 号线项目	施工	9 号线 四工区	中国水利水电第十一工程局有限公司
	监理	9 号线土建 监理 4 标	青岛建设监理研究有限公司
轨道交通 场段项目	施工	位里庄车辆段 四工区	中铁十局集团有限公司
	监理	6 号线场段 监理二标	北京中铁诚业工程建设监理有限公司
市政工程 项目	施工	济南东站二期市政道路建设工程冷水路工程	中铁建工集团有限公司
	监理	济南东站王舍人街市政道路监理	山东泰山工程项目管理有限公司
房建工程 项目	施工	张马屯片区 AX-4 地块初中	青岛中建联合集团有限公司
	监理	张马屯 AX-2 地块幼儿园监理	众成工程管理集团有限公司

希望排名靠前的单位要保持奋勇争先的劲头，珍惜荣誉，发扬成绩，再接再厉，不断续写济南地铁建设新篇章；排名靠后的单位要知耻而后勇，深刻反思，认真剖析，奋力补短板、强弱项、扬优势，化压力为动力，奋起直追，迎头赶上。2024 年度，各参建单位要主动作为，担当善为，奋发有为，继续强化项目安全、质量、文明施工管理，踔厉奋发，笃行不怠，为不断提升集团本质安全水平、维护集团高质量发展形势、助力全市开创新时代社会主义现代化强省会建设新局面作出新的更大贡献。

附件：1. 2023 年度考评评分汇总表—施工单位

2. 2023 年度考评评分汇总表—监理单位

济南轨道交通集团有限公司土建工程考评办公室

2024 年 5 月 13 日

附件 2

济南轨道交通集团有限公司
年度综合考评评分汇总表—监理单位（ 2023 年）

统计日期： 2023 年 12 月 20 日

序号	项目名称	单位名称	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合计得分	名次
轨道交通 4 号线 项目																
1	4 号线监理一标	北京致远工程建设监理有限责任公司	98	93.6	92.5	95.4	96	92.7	95.0	95.7	95.4	96.2	95.8	87.2	94.5	2
2	4 号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司	97.1	95.2	92.9	95.9	92.1	91.2	95.7	93.3	94.8	96.3	88.6	94.8	94.0	9
3	4 号线监理三标	北京铁城建设监理有限责任公司	98.1	96.9	93.8	94.3	93.9	93.8	96.2	94.2	92.9	92.6	86.1	96.5	94.1	8
4	4 号线监理四标	河南长城铁路工程建设咨询有限公司	97.9	92.1	91.1	95.5	95.2	92.7	88.8	93.2	95.7	96.3	96.1	97.2	94.3	4
5	4 号线监理五标	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	96.9	92.7	91	96.9	97.3	90.2	94.0	91.6	93.5	95.0	96.6	96.7	94.4	3
6	4 号线监理六标	英泰克工程顾问（上海）有限公司	96.5	92.2	86.6	91.8	94.1	94.0	89.7	91.5	92.5	94.7	95.6	95.4	92.9	10
7	4 号线监理七标	上海同济监理咨询有限公司	97.0	94.1	90.8	94.8	95.5	92.4	91.5	96.3	94.7	95.8	96.8	96.1	94.7	1
8	4 号线监理八标	山东省工程监理咨询有限公司	98.1	96.8	92.5	92.6	94.8	95.5	94.5	94.3	91.2	93.2	95.4	91.6	94.2	5
9	4 号线腊山站换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司	98.2	94.9	92.9	96.6	96.7	87.7	93.6	93.9	95.0	91.95	95.3	93.8	94.2	5

2024年第一季度履约评价：

济南轨道交通集团有限公司质量考核领导小组办公室

济轨质量考核〔2024〕3号

关于2024年3月份暨第一季度质量考核结果的通报

集团各部门、各直属中心、各子公司，各参建单位：

根据《济南轨道交通集团有限公司建设工程质量管理考核办法（试行）》和《城市轨道交通工程质量安全检查指南》，通过参建单位自查考核、子公司检查考核、集团督查考核对集团在建工程的各施工、监理单位进行了质量考核，现将结果通报如下：

一、参建单位自评情况

（一）施工单位自评

2024年3月1-25日，集团建设工程参建施工单位开展了3月份自评检查，共98家施工单位开展自评检查工作，发现质量问题311条。截至目前，问题均已整改闭环。

（二）监理单位自评

2024年3月1-25日，集团建设工程参建监理单位开展了3月份自评检查，共84家监理单位开展自评检查工作，发现问题166条。截至目前，问题均已整改闭环。

二、子公司检查情况

（一）对施工单位检查情况

2024年3月1-25日，集团各建设子公司开展了3月份月度检查，

发现施工单位存在质量问题335条。截至目前，问题均已整改闭环。

（二）对监理单位检查情况

2024年3月1-25日，集团各建设子公司开展了3月份月度检查，发现监理单位存在质量问题183条。截至目前，问题均已整改闭环。

三、集团督查考核情况

（一）对施工单位检查情况

2024年3月1-31日，集团工程管理部根据《城市轨道交通工程质量安全检查指南》，针对各施工现场的不同特点，对集团范围内建设工程参建单位开展了3月份督查考评，从质量方面进行了检查，工程管理部下发《施工现场隐患整改通知单》71份，发现存在质量问题196条。截至目前，问题均已整改闭环。

（二）对监理单位检查情况

重点对监理责任落实、监理规划和实施细则、监理日志、旁站记录、监理通知单等进行了检查，共发现问题41条。截至目前，问题均已整改并回复。

四、检查发现的主要问题

（一）施工单位存在问题

1.质量方面

重点对混凝土施工、钢筋加工与安装、隧道内钢格栅加工与安装、盾构施工、防水施工、原材料见证取样及检测、结构尺寸控制、基坑回填压实、装饰装修、机电安装等进行了检查，存在的主要问题：

一是个别施工单位存在混凝土施工质量控制不到位现象，如：混凝土局部存在裂缝；混凝土施工缝凿毛处理不规范；局部侧墙、个别顶板处渗漏。**二是**防水施工不符合设计要求，如镀锌钢板止水带与钢边橡胶止水带铆接未设置丁基橡胶腻子垫片存在缝隙。**三是**个别盾构

区间还存在管片渗漏水、混凝土破损等现象。**四是**个别市政工程进场材料未经取样检验合格，擅自使用。**五是**工程成品、半成品保护措施不到位，如连续梁钢绞线未下垫苫盖，地铁站后内墙装饰面板污染、局部风管变形损坏。

（二）监理单位存在问题

一是监理日志、旁站记录、监理通知单等未做到内容相互对应。**二是**个别施工标段夜间施工过程中，发现监理单位人员未旁站、巡视。**三是**验收盖梁钢筋未发现弯折角度不符合设计要求，履职不到位。

五、月度考核结果

月度考核结束后，对各子公司所辖建设项目进行排名，对各项目排名前30%的参建单位只扣分，不处罚；对排名末位的参建单位，由各建设子公司约谈其后方单位相关领导。各项目月度排名第一的参建单位见表1，各项目月度排名落后的参建单位见表2。

表1 各项目月度排名第一的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线 八工区	中铁十五局集团有限公司
	监理	4号线 奥体中心换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司
6号线项目	施工	6号线 七工区	中铁二局集团有限公司
	监理	6号线 监理三标	中铁济南工程建设监理有限公司
7号线项目	施工	7号线 三工区	中国建筑第八工程局有限公司
	监理	7号线 监理二标	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司/济南海河建设项目管理有限公司

8号线项目	施工	8号线 六工区	中交第三公路工程局有限公司
	监理	8号线 监理二标	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司
9号线项目	施工	9号线 三工区	中铁十局集团有限公司
	监理	9号线 监理三标	江苏盛华工程监理咨询有限公司
轨道交通场段项目	施工	4号线 十五工区	济南四建（集团）有限责任公司
	监理	6号线场段 监理二标	北京中铁诚业二程建设监理有限公司
市政工程项目	施工	济南东站三期、疏导工程及梁王新城南侧配套市政道路	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	济南东站三期疏导工程及梁王新城南侧配套市政道路建设工程监理二标	山东省华一建设项目管理有限公司
房建工程项目	施工	济南轨道交通产业园（一期）施工总承包（1标段）一工区	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	华山北片区一期B-1地块租赁住房项目监理	济南城建监理有限责任公司
4号线机电、装修、铺轨项目	施工	4号线二十七工区（机电三标）	中铁城建集团有限公司
	监理	4号线一期工程机电安装及装饰装修工程监理二标	英泰克工程顾问（上海）有限公司
6号线机电、装修、铺轨项目	施工	6号线 轨道1工区（位里）	中铁上海工程局集团有限公司
	监理	6号线 机电装修监理三标	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司/济南海河建设项目管理有限公司

表 2 各项目月度排名落后的参建单位

项目	类型	标段	单位
4 号线和 3 号线二期项目	施工	4 号线 九工区	中铁二十三局集团有限公司
	监理	4 号线 监理六标	英泰克工程顾问（上海）有限公司
6 号线项目	施工	6 号线 五工区	中铁隧道局集团有限公司
	监理	6 号线 监理四标	北京铁城工程咨询有限公司
7 号线项目	施工	7 号线 四-2 工区	中国建筑第八工程局有限公司
	监理	7 号线 监理三标	济南市建设监理有限公司
8 号线项目	施工	8 号线 二工区	中交路桥建设有限公司
	监理	8 号线 监理一标	北京铁城工程咨询有限公司
9 号线项目	施工	9 号线 四工区	中国水利水电第十一工程局有限公司
	监理	9 号线 监理二标	上海三维工程建设咨询有限公司
轨道交通场段项目	施工	4 号线 十六工区	中铁二十二局集团有限公司
	监理	4 号线一期唐冶北车辆段场段监理	山东建院工程监理咨询有限公司
市政工程项目	施工	济南东站四期、张马片区二期市政道路建设工程（第二批）施工项目	中建八局第二建设有限公司
	监理	济南东站四期、张马片区二期市政道路建设工程（第一批）监理	济南市建设监理有限公司

房建工程项目	施工	站前商务 A-1、A-12 居住项目	中建八局第二建设有限公司
	监理	华山北片区 A-2、A-4、A-5 居住项目监理	济南海河建设项目管理有限公司
4 号线机电、装修、铺轨 项目	施工	4 号线二十工区（供电一标）	中国铁建电气化局集团有限公司
	监理	4 号线一期工程轨道及疏散平台安装工程监理一标	中铁华铁工程设计集团有限公司
6 号线机电、装修、铺轨 项目	施工	6 号线 机电装修五工区	中铁四局集团有限公司
	监理	6 号线 轨道监理四标	中铁济南工程建设监理有限公司

六、第一季度考核结果

根据《济南轨道交通集团有限公司建设工程质量管理考核办法（试行）》文件要求，结合工作实际，汇总 1、2、3 月份考评成绩平均值为本季度考评成绩。对各子公司所辖参建项目进行排名，排名第一的参建项目部树立为榜样，并组织向排名第一的先进项目部学习。对各项目排名末位的参建单位，由各建设子公司约谈其后方单位相关领导，可要求更换项目负责人；情节严重的，可报请集团分管领导约谈。季度排名第一的参建单位见表 3，季度被约谈的参建单位见表 4。

表 3 季度排名第一的参建单位

项目	类型	标段	单位
4 号线和 3 号线二期项目	施工	4 号线 二工区	中铁二十一局集团有限公司
	监理	4 号线 监理五标	中铁二院监理（成都）咨询监理有限公司
6 号线项目	施工	6 号线 十二工区	中铁北京局集团有限公司
	监理	6 号线 监理十一标	济南建设监理有限公司

7 号线项目	施工	7 号线 八工区	中国建筑第八工程局有限公司
	监理	7 号线 监理七标	中咨工程管理咨询有限公司
8 号线项目	施工	8 号线 五工区	中交第三公路工程局有限公司
	监理	8 号线 监理二标	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司
9 号线项目	施工	9 号线 三工区	中铁十局集团有限公司
	监理	9 号线 监理六标	众成工程管理集团有限公司/上海市市政工程管理咨询有限公司
轨道交通场段项目	施工	6 号线 位里车辆段一工区	中铁一局集团有限公司
	监理	6 号线 场段监理三标	众成工程管理集团有限公司
市政工程项目	施工	济南东站三期、疏导工程及梁王新城南侧配套市政道路	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	济南东站三期疏导工程及梁王新城南侧配套市政道路建设工程监理二标	山东省华一建设项目管理有限公司
房建工程项目	施工	济南轨道交通产业园（一期）施工总承包（1 标段）一工区	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	王府车辆段商业项目监理	济南海河建设项目管理有限公司
4 号线机电、装修、铺轨 项目	施工	4 号线二十七工区（机电三标）	中铁城建集团有限公司
	监理	4 号线一期工程机电安装及装饰装修工程监理二标	英泰克工程顾问（上海）有限公司

表 4 季度被约谈的参建单位

项目	类型	标段	单位
4 号线和 3 号线二期项目	施工	4 号线 腊山站换乘项目	中铁五局集团有限公司
	监理	4 号线 监理三标	北京铁城工程咨询有限公司
6 号线项目	施工	6 号线 五工区	中铁隧道局集团有限公司
	监理	6 号线 监理四标	北京铁城工程咨询有限公司
7 号线项目	施工	7 号线 五工区	中国建筑股份有限公司
	监理	7 号线 监理四标	山东省工程监理咨询有限公司
8 号线项目	施工	8 号线 一工区	中交第二公路工程局有限公司
	监理	8 号线 监理一标	北京铁城工程咨询有限公司
9 号线项目	施工	9 号线 四工区	中国水利水电第十一工程局有限公司
	监理	9 号线 监理八标	山东易方达建设项目管理有限公司
轨道交通场段项目	施工	6 号线 位里车辆段四工区	中铁十局集团有限公司
	监理	4 号线一期唐冶北车辆段场段监理	山东建院工程监理咨询有限公司
市政工程	施工	济南东站四期、张马片区二期市政道路建设工程（第一批）施工项目	济南蓝海建设工程有限公司
	监理	济南东站四期、张马片区二期市政道路建设工程（第一	济南市建设监理有限公司

		批）监理	
房建工程项目	施工	范村车辆基地租赁住房项目施工总承包（一标段）项目	山东铁信建设集团有限公司
	监理	冷水沟村等四村城中村改造项目（新东站安置二区）配套24班小学项目监理	济南市建设监理有限公司
4号线机电、装修、铺轨 项目	施工	4号线二十八工区（机电四标）	中铁十五局集团有限公司
	监理	4号线一期工程轨道及疏散平台安装工程监理一标	中铁华铁工程设计集团有限公司

七、工作要求

（一）各子公司、各参建单位要加强混凝土施工管理，避免出现裂缝、渗漏等质量问题。重视施工缝混凝土凿毛处理，加强新旧混凝土结合；镀锌钢板止水带与钢边橡胶止水带铆接要符合设计要求，减少施工缝处的渗漏。

（二）各子公司、各参建单位要提高成品、半成品保护意识。采取有效的措施进行防护，才能全面控制工程进度，在节约成本的情况下，提高工程质量及经济效益。

（三）各子公司要加大对监理单位的履职管理。项目监理机构配备的监理人员应当与投标文件、合同约定及监理规划人员名单一致。现场施工、材料检验监理人员未到位，对工程质量缺乏有效监管。各子公司要严格规范项目监理人员行为，督促监理人员履职尽责，确保工程质量。

附件：

1. 4号线及3号线二期项目月度考评评分汇总表—施工单位
2. 6号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
3. 7号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
4. 8号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
5. 9号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
6. 轨道交通场段项目月度考评评分汇总表—施工单位
7. 市政工程项目月度考评评分汇总表—施工单位
8. 房建项目月度考评评分汇总表—施工单位
9. 其他项目月度考评评分汇总表—施工单位
10. 月度考评评分汇总表—监理单位
11. 季度考评评分汇总表—施工单位
12. 季度考评评分汇总表—监理单位

济南轨道交通集团有限公司

工程管理部

2024年4月7日

附表 12　　济南轨道交通集团有限公司

季度质量考核评分汇总表—监理单位（2024 年 第一 季度）

统计日期：4 月 7 日

序号	项目名称	被考评施工单位名称	1月份得分	2月份得分	3月份得分	合计得分	名次
轨道交通 4 号线及 3 号线二期 项目							
1	4 号线监理五标	中铁二院监理（成都）咨询监理有限公司	97.0	96.5	94.6	96.05	1
2	4 号线奥体中心换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司	96.2	95.8	96.1	96.02	2
3	4 号线监理七标	上海同济监理咨询有限公司	95.9	97.0	93.5	95.5	3
4	4 号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司	95.4	96.8	94.0	95.4	4
5	4 号线监理八标	山东省工程监理咨询有限公司	96.3	95.7	93.3	95.1	5
6	4 号线腊山站换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司	93.7	94.2	—	94.0	6
7	4 号线监理六标	英泰克工程顾问（上海）有限公司	94.7	94.1	92.3	93.7	7
8	4 号线监理四标	河南长城铁路工程建设咨询有限公司	93.2	94.2	93.5	93.62	8
9	4 号线监理三标	北京铁城工程咨询有限公司	93.4	95.0	92.3	93.57	9
10	3 号线二期监理二标	山东济铁工程建设监理有限责任公司	98.5	97.0	97.0	97.5	—
轨道交通 6 号线 项目							
11	6 号线监理十一标	济南建设监理有限公司	96.4	92.4	—	94.4	1
12	6 号线监理六标	济南城建监理有限公司	92.3	96.3	92.6	93.77	2
13	6 号线监理十标	青岛建设研究监理有限公司	93.9	93.6	—	93.75	3
14	6 号线监理七标	山东贝特建筑项目管理咨询有限公司	97.1	84.3	91.5	91.0	4
15	6 号线监理五标	上海三维工程建设咨询有限公司	85.9	97.1	89.1	90.7	5
16	6 号线监理三标	中铁济南工程建设监理有限公司	84.8	86.4	96.8	89.3	6

2024年第二季度履约评价：

济南轨道交通集团有限公司质量考核领导小组办公室

济轨质量考核〔2024〕6号

关于2024年6月份暨第二季度质量考核结果的通报

集团各部门、各直属中心、各子公司，各参建单位:

根据《济南轨道交通集团有限公司建设工程质量管理考核办法（试行）和《城市轨道交通工程质量安全检查指南》，通过参建单位自查考核、子公司检查考核、集团督查考核对集团在建工程的各施工、监理单位进行了质量考核，现将结果通报如下:

一、参建单位自评情况

（一）施工单位自评

2024年6月1-25日，集团建设工程参建施工单位开展了6月份自评检查，共98家施工单位开展自评检查工作，发现质量问题439条。截至目前，问题均已整改闭环。

（二）监理单位自评

2024年6月1-25日，集团建设工程参建监理单位开展了6月份自评检查，共76家监理单位开展自评检查工作，发现问题

210条。截至目前，问题均已整改闭环。

二、子公司检查情况

（一）对施工单位检查情况

2024年6月1-25日，集团各建设子公司开展了6月份月度检查，发现施工单位存在质量问题450条。截至目前，问题均已整改闭环。

（二）对监理单位检查情况

2024年6月1-25日，集团各建设子公司开展了6月份月度检查，发现监理单位存在质量问题184条。截至目前，问题均已整改闭环。

三、集团督查考核情况

（一）对施工单位督查情况

2024年6月1-31日，集团工程管理部根据《城市轨道交通工程质量安全检查指南》，针对各施工现场的不同特点，对集团范围内建设工程参建单位开展了6月份督查考评，从质量方面进行了检查，工程管理部下发《施工现场隐患整改通知单》93份，发现存在质量问题307条。截至目前，问题均已整改闭环。

（二）对监理单位督查情况

重点对监理责任落实、监理规划和实施细则、监理日志、旁站记录、监理通知单等进行了检查，共发现问题67条。截至目前，问题均已整改并回复。

四、月度考核结果

月度考核结束后，对各子公司所辖建设项目进行排名，对各项目排名前30%的参建单位只扣分，不处罚；对排名末位的参建单位，由各建设子公司分管领导约谈施工单位子公司分管领导，并将约谈会议纪要报工程管理部备案。各项目月度排名第一的参建单位见表1，各项目月度排名落后的参建单位见表2。

表1 各项目月度排名第一的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线项目	施工	4号线 九工区	中铁二十三局集团有限公司
	监理	4号线 监理五标	中铁二院监理（成都）咨询监理有限公司
6号线项目	施工	6号线 四工区	中铁十局集团有限公司
	监理	6号线 监理五标	上海三维工程建设咨询有限公司
7号线项目	施工	7号线 九工区	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	7号线 监理一标	山东贝特建筑项目管理咨询有限公司
8号线项目	施工	8号线 一工区	中交第二公路工程局有限公司
	监理	8号线 监理一标	北京铁城工程咨询有限公司
9号线项目	施工	9号线 六工区	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	9号线 监理七标	北京铁城工程咨询有限公司

轨道交通场段项目	施工	6号线位里庄车辆段五工区	济南四建（集团）有限责任公司
	监理	4号线一期唐冶北车辆段场段监理	山东建院工程监理咨询有限公司
低运量轨道交通高新东区环线项目	施工	低运量轨道交通高新东区环线施工四标	济南城建集团有限公司
	监理	低运量轨道交通高新东区环线监理三标	北京铁城建设监理有限责任公司
房建工程项目	施工	R2线腊山站上盖开发项目	山东三箭建设工程股份有限公司
	监理	R2线腊山站上盖开发项目监理	山东诚信建设项目管理有限公司
4号线机电、装修、铺轨项目	施工	4号线十七工区（铺轨一标）	中铁十二局集团有限公司
	监理	4号线一期工程轨道及疏散平台安装工程监理一标	中铁华铁工程设计集团有限公司
6号线机电、装修、铺轨项目	施工	6号线 轨道3工区	中铁四局集团有限公司
	监理	6号线 供电监理标	北京铁城工程咨询有限责任公司

表2 各项目月度排名落后的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线项目	施工	4号线奥体中心换乘项目	中铁十四局集团有限公司
	监理	4号线 监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司
6号线项目	施工	6号线 七工区	中铁二局集团有限公司

	监理	6号线 监理六标	济南城建监理有限公司
7号线项目	施工	7号线 一工区	中国建筑第六工程局有限公司
	监理	7号线 监理六标	上海三维工程建设咨询有限公司
8号线项目	施工	8号线 七工区	中交（青岛）城市建设有限公司
	监理	8号线 监理二标	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司
9号线项目	施工	9号线 四工区	中国水利水电第十一工程局有限公司
	监理	9号线 监理五标	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司/济南海河建设项目管理有限公司
轨道交通场段项目	施工	4号线 十六工区	中铁二十二局集团有限公司
	监理	6号线场段监理二标	北京中铁诚业工程建设监理有限公司
低运量轨道交通高新东区环线项目	施工	低运量轨道交通高新东区环线施工三标	中国建筑第八工程局有限公司
	监理	低运量轨道交通高新东区环线监理二标	济南海河建设项目管理有限公司
房建工程项目	施工	冷水沟村等四村城中村改造项目（新东站安置二区）配套24班小学项目	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	济南轨道交通产业园（一期）监理合同（1标段）	众成工程管理集团有限公司
4号线机电、装修、铺轨 项目	施工	4号线二十五工区（机电一标）	中铁建设集团有限公司

	监理	4号线一期工程机电安装及装饰装修工程监理一标	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司
6号线机电、装修、铺轨 项目	施工	6号线 机电装修二工区	中铁一局集团有限公司
	监理	6号线 轨道监理四标	中铁济南工程建设监理有限公司

五、第二季度考核结果

根据《济南轨道交通集团有限公司建设工程质量管理考核办法（试行）》文件要求，结合工作实际，汇总4、5、6月份考评成绩平均值为本季度考评成绩。对各子公司所辖参建项目进行排名，排名第一的参建项目部树立为榜样，并组织向排名第一的先进项目部学习。对各项目排名末位的参建单位，由各建设子公司主要领导约谈参建单位上级公司分管领导，集团工程管理部参加约谈会；情节严重的，可报请集团分管领导约谈。季度排名第一的参建单位见表3，季度被约谈的参建单位见表4。

表3 季度排名第一的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线 十工区	中铁十六局集团有限公司
	监理	3号线二期 监理二标	山东济铁工程建设监理有限责任公司
6号线项目	施工	6号线 六工区	中铁一局集团有限公司
	监理	6号线 监理五标	上海三维工程建设咨询有限公司

7号线项目	施工	7号线 九工区	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	7号线 监理五标	中铁济南工程建设监理有限公司
8号线项目	施工	8号线 一工区	中交第二公路工程局有限公司
	监理	8号线 监理一标	北京铁城工程咨询有限公司
9号线项目	施工	9号线 六工区	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	9号线 监理七标	北京铁城工程咨询有限公司
轨道交通场段项目	施工	6号线位里车辆段五工区	济南四建（集团）有限责任公司
	监理	6号线场段监理三标	众成工程管理集团有限公司
低运量轨道交通高新东区环线项目	施工	低运量轨道交通高新东区环线施工四标	济南城建集团有限公司
	监理	低运量轨道交通高新东区环线监理三标	北京铁城建设监理有限责任公司
市政工程项目	施工	济南市王府片区市政道路建设工程一期一批施工二标段	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	济南东站四期、张马片区二期市政道路建设工程（第二批）监理	山东诚信建设项目管理有限公司
房建工程项目	施工	站前商务A-8居住项目	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	R2 线腊山站上盖开发项目监理	山东诚信建设项目管理有限公司

4号线机电、装修、铺轨项目	施工	4号线二十一工区（供电二标）	中国铁建电气化局集团有限公司
	监理	4号线一期工程轨道及疏散平台安装工程监理三标	山东济铁工程建设监理有限责任公司
6号线机电、装修、铺轨项目	施工	6号线 机电装修六工区	中铁三局集团有限公司
	监理	6号线 机电装修监理三标	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司/济南海河建设项目管理有限公司

表4 季度被约谈的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线 八工区	中铁十五局集团有限公司
	监理	4号线 监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司
6号线项目	施工	6号线 十工区	中铁十局集团有限公司
	监理	6号线 监理八标	山东省建设监理咨询有限公司
7号线项目	施工	7号线 四-2 工区	中建八局轨道交通建设有限公司
	监理	7号线 监理四标	山东省工程监理咨询有限公司
8号线项目	施工	8号线 二工区	中交路桥建设有限公司
	监理	8号线 监理三标	中咨工程管理咨询有限公司
9号线项目	施工	9号线 四工区	中国水利水电第十一工程局有限公司
	监理	9号线	山东易方达建设项目管理有限公司

		监理八标	
轨道交通场段项目	施工	4号线十六工区	中铁二十二局集团有限公司
	监理	6号线场段监理二标	北京中铁诚业工程建设监理有限公司
市政工程	施工	济南新东站二期市政道路建设工程冷水路（舜城大街-响泉街施工）	中铁建工集团有限公司
	监理	冷水沟村等四村城中村改造项目（新东站安置二区）配套市政道路工程项目监理	中天昊建设管理集团股份有限公司
房建工程项目	施工	济南轨道交通产业园（一期）施工总承包（1标段）二工区	山东长兴建设集团有限公司
	监理	济南轨道交通产业园（一期）监理合同（1标段）	众成工程管理集团有限公司
4号线机电、装修、铺轨项目	施工	4号线二十工区（供电一标）	中国铁建电气化局集团有限公司
	监理	4号线一期工程机电安装及装饰装修工程监理三标	北京中铁诚业工程建设监理有限公司
6号线机电、装修、铺轨项目	施工	6号线供电1工区	中铁十局集团有限公司
	监理	6号线轨道监理四标	中铁济南工程建设监理有限公司

六、工作要求

一是加强质量管理规章制度的多渠道宣贯工作，继续深化质量源头治理和质量责任制履行工作。严格落实参建各方主体质量责任，规范质量行为，坚守质量底线，建立工程质量管理长效工作机制。

二是坚持施工组织设计、技术方案、技术交底的审查工作，重点加强质量管控和隐患排查治理工作，全面抓实首件、关键工序、关键部位隐蔽工程持牌验收工作。

三是持续强化混凝土实体质量、第三方检测质量、工程质量通病等专项整治行动，强化现场质量监督工作，加大现场检查频次、力度，及时发现并消除质量隐患。

附件：

1. 4号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
2. 6号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
3. 7号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
4. 8号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
5. 9号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
6. 轨道交通场段项目月度考评评分汇总表—施工单位
7. 低运量轨道交通高新东区环线项目月度考评评分汇总表—施工单位
8. 市政工程项目月度考评评分汇总表—施工单位
9. 房建项目月度考评评分汇总表—施工单位

10. 其他项目月度考评评分汇总表—施工单位
11. 月度考评评分汇总表—监理单位
12. 季度考评评分汇总表—施工单位
13. 季度考评评分汇总表—监理单位

济南轨道交通集团有限公司

工程管理部

2024年7月15日

附表 13　　济南轨道交通集团有限公司

季度质量考核评分汇总表—监理单位（2024 年 第二 季度）

统计日期：7 月 15 日

序号	项目名称	被考评施工单位名称	4 月份得分	5 月份得分	6 月份得分	合计得分	名次
轨道交通 4 号线及 3 号线二期 项目							
1	3 号线二期监理二标	山东济铁工程建设监理有限责任公司	97.0	97.7	--	97.4	1
2	4 号线监理五标	中铁二院监理（成都）咨询监理有限公司	95.9	95.9	95.7	95.8	2
3	4 号线监理七标	上海同济监理咨询有限公司	93.3	96.0	93.5	94.3	3
4	4 号线奥体中心换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司	94.5	94.6	92.9	94.0	4
5	4 号线监理四标	河南长城铁路工程建设咨询有限公司	92.3	94.0	95.3	93.9	5
6	4 号线监理六标	英泰克工程顾问（上海）有限公司	93.0	93.6	94.9	93.8	6
7	4 号线监理八标	山东省工程监理咨询有限公司	93.6	94.0	--	93.8	7
8	4 号线监理三标	北京铁城工程咨询有限公司	92.6	92.6	93.5	92.9	8
9	4 号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司	87.4	92.3	89.6	89.8	9
轨道交通 6 号线 项目							
10	6 号线监理五标	上海三维工程建设咨询有限公司	93.9	94.7	96.7	95.10	1
11	6 号线监理四标	北京铁城工程咨询有限公司	92.5	93.3	96.0	93.91	2
12	6 号线监理三标	中铁济南工程建设监理有限公司	93.7	92.8	93.1	93.17	3
13	6 号线监理七标	山东贝特建筑项目管理咨询有限公司	89.0	90.4	96.2	91.89	4
14	6 号线监理六标	济南城建监理有限公司	91.4	95.0	89.1	91.81	5
15	6 号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司	88.6	92.6	92.8	91.33	6
16	6 号线监理九标	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	90.0	89.5	93.4	90.96	7

80	6号线轨道监理三标	北京铁城建设监理有限责任公司	—	97.0	97.3	97.16	2
81	6号线供电监理标	北京铁城工程咨询有限责任公司	97.8	95.0	97.9	96.92	3
82	6号线轨道监理一标	山东济铁工程建设监理有限责任公司	95.3	96.4	96.1	95.92	4
83	6号线机电装修监理一标	北京铁城工程咨询有限公司	95.3	94.8	96.6	95.58	5
84	6号线轨道监理四标	中铁济南工程建设监理有限公司	96.3	94.4	95.5	95.41	6

统计人：

质量考核办公室
（工程管理部代章）：

2024年第三季度履约评价：

济南轨道交通集团有限公司质量考核领导小组办公室

济轨质量考核〔2024〕10号

关于2024年9月份暨第三季度质量考核结果的通报

集团各部门、各直属中心、各子公司，各参建单位：

根据《济南轨道交通集团有限公司建设工程质量管理考核办法（试行）》和《城市轨道交通工程质量安全检查指南》，通过参建单位自查考核、子公司检查考核、集团督查考核对集团在建工程的各施工、监理单位进行了质量考核，现将结果通报如下：

一、参建单位自评情况

（一）施工单位自评

2024年9月1-25日，集团建设工程参建施工单位开展了9月份自评检查，共112家施工单位开展自评检查工作，发现质量问题270条。截至目前，问题均已整改闭环。

（二）监理单位自评

2024年9月1-25日，集团建设工程参建监理单位开展了9月份自评检查，共86家监理单位开展自评检查工作，发现问题186条。截至目前，问题均已整改闭环。

二、子公司检查情况

（一）对施工单位检查情况

2024年9月1-25日，集团各建设子公司开展了9月份月度检查，发现施工单位存在质量问题326条。截至目前，问题均已整改闭环。

（二）对监理单位检查情况

2024年9月1-25日，集团各建设子公司开展了9月份月度检查，发现监理单位存在质量问题154条。截至目前，问题均已整改闭环。

三、集团督查考核情况

（一）对施工单位督查情况

2024年9月1-31日，集团工程管理部根据《城市轨道交通工程质量安全检查指南》，针对各施工现场的不同特点，对集团范围内建设工程参建单位开展了9月份督查考核，从质量方面进行了检查，工程管理部下发《施工现场隐患整改通知单》213份，发现存在质量问题308条。截至目前，问题均已整改闭环。

（二）对监理单位督查情况

重点对监理责任落实、监理规划和实施细则、监理日志、旁站记录、监理通知单等进行了检查，共发现问题84条。截至目前，问题均已整改并回复。

四、月度考核结果

月度考核结束后，对各子公司所辖建设项目进行排名，对各项目排名前30%的参建单位只扣分，不处罚；对排名末位的参建单位，由各建设子公司分管领导约谈施工单位子公司分管领导，并将约谈会议纪要报工程管理部备案。各项目月度排名第一的参建单位见表1，各项目月度排名落后的参建单位见表2。

表1 各项目月度排名第一的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线项目	施工	4号线七-1工区	中铁十八局集团有限公司
	监理	4号线监理五标	中铁二院监理（成都）咨询监理有限公司
6号线项目	施工	6号线六工区	中铁一局集团有限公司
	监理	6号线监理五标	上海三维工程建设咨询有限公司
7号线项目	施工	7号线三工区	中建八局第一建设有限公司
	监理	7号线监理一标	山东贝特建筑项目管理咨询有限公司
8号线项目	施工	8号线二工区	中交路桥建设有限公司
	监理	8号线监理一部	北京铁城工程咨询有限公司
9号线项目	施工	9号线四工区	中国水利水电第十一工程局有限公司
	监理	9号线监理三标	江苏盛华工程监理咨询有限公司
轨道交通场段项目	施工	6号线位里车辆段三工区	中铁二局集团有限公司
	监理	6号线场段监理四标	北京铁城工程咨询有限公司
低运量轨道交通高新东区环线项目	施工	低运量轨道交通高新东区环线施工四标	济南城建集团有限公司
	监理	济南低运量轨道交通高新东区环线工程轨道、系统、车场及车站装修与机电工程监理二标	济南滨河建设项目管理有限公司
房建工程项目	施工	空天信息大学建设工程项目二标	济南四建（集团）有限责任公司
	监理	张马屯片区第四批用地项目A-4、A-5、A-8地块项目	山东诚信建设项目管理有限公司
4号线机电、装修、铺轨项目	施工	4号线二十八工区（机电四标）	中铁十五局集团有限公司
	监理	4号线一期工程机电安装及装饰装修工程监理二标	英泰克工程顾问（上海）有限公司
6号线机电、装修、铺轨项目	施工	6号线轨道3工区	中铁四局集团有限公司
	监理	6号线轨道监理三标	北京铁城建设监理有限责任公司
8号线机电、装修、铺轨项目	施工	8号线一期机电工区	北京瑞控电子技术发展有限公司
	监理	8号线一期工程供电系统、弱电系统、机电工程及轨道工程监理一标段	青岛建设监理研究有限公司
4、6号线弱电项目	施工	6号线弱电3工区	中铁武汉电气化局集团有限公司

	监理	4号线一期工程弱电系统及场段工艺设备监理	港投工程咨询有限公司

表 2 各项目月度排名落后的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线项目	施工	4号线 四工区	中铁十一局集团有限公司
	监理	4号线 监理四标	河南长城铁路工程建设咨询有限公司
6号线项目	施工	6号线 二工区	中铁发展投资有限公司
	监理	6号线 监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司
7号线项目	施工	7号线 四-2 工区	中建八局轨道交通建设有限公司
	监理	7号线 监理八标	山东易方达建设项目管理有限公司/山东诚信建设项目管理有限公司
8号线项目	施工	8号线 三工区	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	8号线 监理三部	中咨工程管理咨询有限公司
9号线项目	施工	9号线 六工区	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	9号线 监理八标	山东易方达建设项目管理有限公司
轨道交通场段项目	施工	6号线位里车辆段 二工区	中铁上海局集团有限公司
	监理	6号线场段监理三标	众成工程管理集团有限公司

低运量轨道交通高新东区环线项目	施工	低运量轨道交通高新东区环线施工二标	中铁建工集团有限公司
	监理	低运量轨道交通高新东区环线监理一标	英泰克工程顾问（上海）有限公司
房建工程项目	施工	站前商务 A-7、A-11 居住项目	济南一建集团有限公司
	监理	徐家庄地块租赁住房项目	天宇工程咨询有限公司
4号线机电、装修、铺轨 项目	施工	4号线二十五工区（机电一标）	中铁建设集团有限公司
	监理	4号线一期工程机电安装及装饰装修工程监理三标	北京中铁诚业工程建设监理有限公司
6号线机电、装修、铺轨 项目	施工	6号线 机电装修二工区	中铁一局集团有限公司
	监理	6号线 供电监理标	北京铁城工程咨询有限公司
8号线机电、装修、铺轨 项目	施工	8号线一期装饰装修工区	山东德才建设有限公司
	监理	8号线一期工程供电系统、弱电系统、机电工程及轨道工程监理三标段	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司
4、6号线弱电项目	施工	6号线 弱电 1 工区	中铁十局集团电务工程有限公司
	监理	6号线弱电监理	北京现代通号工程咨询有限公司

五、第三季度考核结果

根据《济南轨道交通集团有限公司建设工程质量管理考核办法（试行）》文件要求，结合工作实际，汇总 7、8、9 月份

考评成绩平均值为本季度考评成绩。对各子公司所辖参建项目进行排名，排名第一的参建项目部树立为榜样，并组织向排名第一的先进项目部学习。对各项目排名末位的参建单位，由各建设子公司主要领导约谈参建单位上级公司分管领导，集团工程管理部参加约谈会；情节严重的，可报请集团分管领导约谈。季度排名第一的参建单位见表 3，季度被约谈的参建单位见表 4。

表 3 季度排名第一的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和 3 号线二期项目	施工	4号线 七-1 工区	中铁十八局集团有限公司
	监理	4号线 监理五标	中铁二院监理（成都）咨询监理有限公司
6号线项目	施工	6号线 三工区	中铁上海局集团有限公司
	监理	6号线 监理三标	中铁济南工程建设监理有限公司
7号线项目	施工	7号线 三工区	中建八局第一建设有限公司
	监理	7号线 监理二标	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司/济南海河建设项目管理有限公司
8号线项目	施工	8号线 一工区	中交第二公路工程局有限公司
	监理	8号线 监理一部	北京铁城工程咨询有限公司
9号线项目	施工	9号线 四工区	中国水利水电第十一工程局有限公司
	监理	9号线 监理一标	中铁济南工程建设监理有限公司

轨道交通场段项目	施工	6号线位里车辆段三工区	中铁二局集团有限公司
	监理	6号线场段监理二标	北京中铁诚业工程建设监理有限公司
低运量轨道交通高新东区环线项目	施工	低运量轨道交通高新东区环线施工二标	济南城建集团有限公司
	监理	低运量轨道交通高新东区环线监理三标	北京铁城建设监理有限责任公司
房建工程项目	施工	站前商务 A-8 居住项目	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	华山北片区 A-1、A-3 居住项目监理	天宇工程咨询有限公司
4号线机电、装修、铺轨项目	施工	4号线二十六工区（机电二标）	中铁十九局集团有限公司
	监理	4号线一期工程轨道及疏散平台安装工程监理一标	中铁华铁工程设计集团有限公司
6号线机电、装修、铺轨项目	施工	6号线 轨道 3 工区	中铁四局集团有限公司
	监理	6号线 轨道监理三标	北京铁城建设监理有限责任公司
4、6号线弱电项目	施工	6号线 弱电 2 工区	中铁电气化局集团有限公司
	监理	6号线弱电监理	北京现代通号工程咨询有限公司

表 4　季度被约谈的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线四工区	中铁十一局集团有限公司
	监理	4号线监理六标	英泰克工程顾问（上海）有限公司
6号线项目	施工	6号线十工区	中铁十局集团有限公司
	监理	6号线监理九标	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司
7号线项目	施工	7号线一工区	中国建筑第六工程局有限公司
	监理	7号线监理四标	山东省工程监理咨询有限公司
8号线项目	施工	8号线二工区	中交路桥建设有限公司
	监理	8号线监理三标	中咨工程管理咨询有限公司
9号线项目	施工	9号线五工区	中国水利水电第四工程局有限公司
	监理	9号线监理八标	山东易方达建设项目管理有限公司
轨道交通场段项目	施工	6号线位里车辆段二工区	中铁上海局集团有限公司
	监理	6号线场段监理三标	众成工程管理集团有限公司
房建工程项目	施工	张马屯片区一二期C-4地块项目	中建八局第二建设有限公司
	监理	梁王新城加油站项目监理	济南市建设监理有限公司
4号线机电、装修、铺轨	施工	4号线二十五工区（机电一标）	中铁建设集团有限公司
项目	监理	4号线一期工程机电安装及装饰装修工程监理三标	北京中铁诚业工程建设监理有限公司
6号线机电、装修、铺轨项目	施工	6号线供电3工区	山东爱普电气设备有限公司
	监理	6号线轨道监理四标	中铁济南工程建设监理有限公司
4、6号线弱电项目	施工	4号线二十三工区（弱电一标）	中铁建电气化局集团第一工程有限公司
	监理	4号线一期工程弱电系统及场段工艺设备监理	港汝工程咨询有限公司

六、工作要求

一是全面梳理“质量月”期间的各项活动、培训及竞赛，总结成功经验与亮点举措，形成可复制的模式。评估“质量月”期间试用的“四新”技术的效果，择优规模推广。进一步深化质量文化的建设，加速科技驱动的创新步伐，以确保“质量月”的成果得以巩固，同时推动行业进一步深化改革，朝着更加高效能、高质量、高标准的目标前进。

二是持续开展质量教育与培训，强化全员质量意识，营造“质量至上”的企业文化氛围。积极推行了质量管理工作制度化、规范化，强化基础管理，让“质量意识深入人心、质量管理深入人心、质量提升深入人心”。激发了广大员工做好质量管理工作的积极性和主动性，推动质量管控工作整体水平不断进步和提升。

附件：

1. 4号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
2. 6号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
3. 7号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
4. 8号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
5. 9号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
6. 轨道交通场段项目月度考评评分汇总表—施工单位
7. 低运量轨道交通高新东区环线项目月度考评评分汇总表—施工单位
8. 市政工程项目月度考评评分汇总表—施工单位
9. 房建项目（建投）月度考评评分汇总表—施工单位
10. 房建项目（交投）月度考评评分汇总表—施工单位
11. 房建项目（资源经营）月度考评评分汇总表—施工单位
12. 其他项目月度考评评分汇总表—施工单位
13. 月度考评评分汇总表—监理单位
14. 季度考评评分汇总表—施工单位
15. 季度考评评分汇总表—监理单位

济南轨道交通集团有限公司

工程管理部

2024年10月11日

附表 15　　济南轨道交通集团有限公司

季度质量考核评分汇总表—监理单位（2024 年 第三 季度）

统计日期：10 月 11 日

序号	项目名称	被考评施工单位名称	7 月份得分	8 月份得分	9 月份得分	合计得分	名次
轨道交通 4 号线 项目							
1	4 号线监理五标	中铁二院监理（成都）咨询监理有限公司	94.8	95.0	97.2	95.7	1
2	4 号线监理七标	上海同济监理咨询有限公司	95.9	93.8	95.5	95.1	2
3	4 号线监理三标	北京铁城工程咨询有限公司	94.1	94.9	95.5	94.8	3
4	4 号线奥体中心换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司	93.3	95.2	95.3	94.6	4
5	4 号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司	91.8	94.9	96.4	94.4	5
6	4 号线监理四标	河南长城铁路工程建设咨询有限公司	92.4	96.7	93.2	94.1	6
7	4 号线监理六标	英泰克工程顾问（上海）有限公司	92.0	92.2	95.1	93.1	7
轨道交通 6 号线 项目							
8	6 号线监理三标	中铁济南工程建设监理有限公司	97.9	98.7	98.1	98.21	1
9	6 号线监理五标	上海三维工程建设咨询有限公司	97.4	97.4	98.3	97.68	2
10	6 号线监理四标	北京铁城工程咨询有限公司	96.5	94.0	97.3	95.91	3
11	6 号线监理六标	济南城建监理有限公司	94.4	96.3	96.3	95.63	4
12	6 号线监理八标	山东省建设监理咨询有限公司	93.5	94.8	96.9	95.05	5
13	6 号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司	94.5	94.0	93.9	94.13	6
14	6 号线监理七标	山东贝特建筑项目管理咨询有限公司	93.2	93.0	95.3	93.82	7
15	6 号线监理九标	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	91.9	92.0	94.0	92.65	8
轨道交通 7 号线 项目							

79	济南轨道交通8号线一期工程供电系统、弱电系统、机电工程及轨道工程监理一标段	青岛建设监理研究有限公司	93.4	93.2	93.9	93.5	1
80	济南轨道交通8号线一期工程供电系统、弱电系统、机电工程及轨道工程监理三标段	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	89.7	92.8	90.4	91.0	2
4、6号线弱电 项目							
81	6号线弱电监理	北京现代通号工程咨询有限公司	—	99.0	98.8	98.92	1
82	4号线一期工程弱电系统及场段工艺设备监理	港投工程咨询有限公司	—	96.6	99.3	97.94	2

统计人：

质量考核办公室
（工程管理部代章）：

2024年第四季度履约评价：

济南轨道交通集团有限公司质量考核领导小组办公室

济轨质量考核〔2025〕01号

关于2024年12月份暨四季度质量考核结果的通报

集团各部门、各直属中心、各子公司，各参建单位：

根据《济南轨道交通集团有限公司建设工程质量管理考核办法（试行）》和《城市轨道交通工程质量安全检查指南》，通过参建单位自查考核、子公司检查考核、集团督查考核对集团在建工程的各施工、监理单位进行了质量考核，现将结果通报如下：

一、参建单位自评情况

（一）施工单位自评

2024年12月1-25日，集团建设工程参建施工单位开展了12月份自评检查，共118家施工单位开展自评检查工作，发现质量问题328条。截至目前，问题均已整改闭环。

（二）监理单位自评

2024年12月1-25日，集团建设工程参建监理单位开展了12月份自评检查，共88家监理单位开展自评检查工作，发现问题192条。截至目前，问题均已整改闭环。

二、子公司检查情况

（一）对施工单位检查情况

2024年12月1-25日，集团各建设子公司开展了12月份月度检查，发现施工单位存在质量问题437条。截至目前，问题均已整改闭环。

（二）对监理单位检查情况

2024年12月1-25日，集团各建设子公司开展了12月份月度检查，发现监理单位存在质量问题177条。截至目前，问题均已整改闭环。

三、集团督查考核情况

（一）对施工单位督查情况

2024年12月1-31日，集团工程管理部根据《城市轨道交通工程质量安全检查指南》，针对各施工现场的不同特点，对集团范围内建设工程参建单位开展了12月份督查考核，从质量方面进行了检查，工程管理部下发《施工现场隐患整改通知单》123份，发现存在质量问题216条。截至目前，问题均已整改闭环。

（二）对监理单位督查情况

重点对监理责任落实、监理规划和实施细则、监理日志、旁站记录、监理通知单等进行了检查，共发现问题98条。截至目前，问题均已整改并回复。

四、月度考核结果

月度考核结束后，对各子公司所辖建设项目进行排名，对各项目排名前30%的参建单位只扣分，不处罚；对排名末位的参建单位，由各建设子公司分管领导约谈施工单位子公司分管领导，并将约谈会议纪要报工程管理部备案。各项目月度排名第一的参建单位见表1，各项目月度排名落后的参建单位见表2。

表1 各项目月度排名第一的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线项目	施工	4号线 五工区	中铁二十局集团有限公司
	监理	4号线 监理三标	北京铁城工程咨询有限公司
6号线项目	施工	6号线 九工区	中铁三局集团有限公司
	监理	6号线 监理八标	山东省建设监理咨询有限公司
7号线项目	施工	7号线 二工区	中建八局轨道交通建设有限公司
	监理	7号线 监理一标	山东贝特建筑项目管理咨询有限公司
8号线项目	施工	8号线 五工区	中交第三公路工程局有限公司
	监理	8号线 监理三部	中咨工程管理咨询有限公司
9号线项目	施工	9号线 四工区	中国水利水电第十一工程局有限公司
	监理	9号线 监理一标	中铁济南工程建设监理有限公司

轨道交通场段项目	施工	6号线梁王车辆基地二工区	中铁四局集团有限公司
	监理	6号线场段监理二标	北京中铁诚业工程建设监理有限公司
低运量轨道交通高新东区环线项目	施工	低运量轨道交通高新东区环线施工二标	中铁建工集团有限公司
	监理	低运量轨道交通高新东区环线监理二标	济南海河建设项目管理有限公司
市政工程项目	施工	华山北片区二期市政道路建设工程	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	济南东站三期、疏导工程及梁王新城南侧配套市政道路一标段	山东易方达建设管理集团有限公司
房建工程项目（建投公司）	施工	R2线腊山站上盖开发项目	山东三箭建设工程股份有限公司
	监理	R2线腊山站上盖开发项目监理	山东诚信建设项目管理有限公司
房建工程项目（交投公司）	施工	张马屯片区第四批用地C-6地块项目	山东鲁班建筑安装工程有限公司/山东长兴建设集团有限公司
	监理	张马屯片区一二期C-5地块	山东诚信建设项目管理有限公司
房建工程项目（资源经营）	施工	济南轨道交通产业园（一期）施工总承包（1标段）一工区	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	王府车辆段商业项目监理	济南海河建设项目管理有限公司
4号线机电、装修、铺轨项目	施工	4号线十七工区（铺轨一标）	中铁十二局集团有限公司
	监理	4号线一期工程轨道及疏散平台安装工程监理二标	北京铁城工程咨询有限公司
6号线机电、装修、铺轨项	施工	6号线机电装修二工区	中铁一局集团有限公司

目	监理	6号线供电监理标	北京铁城工程咨询有限公司
8号线机电、装修、铺轨项目	施工	轨道交通8号线一期弱电工区	北京瑞拓电子技术发展有限公司
	监理	济南轨道交通8号线一期工程供电系统、弱电系统、机电工程及轨道工程监理一标段	青岛建设监理研究有限公司
4、6号线弱电项目	施工	4号线二十三工区（弱电一标）	中铁建电气化局集团第一工程有限公司
	监理	4号线一期工程弱电系统及场段工艺设备监理	港投工程咨询有限公司

表2 各项目月度排名落后的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线项目	施工	4号线七-1工区	中铁十八局集团有限公司
	监理	4号线监理七标	上海同济监理咨询有限公司
6号线项目	施工	6号线七工区	中铁二局集团有限公司
	监理	6号线监理六标	济南城建监理有限公司
7号线项目	施工	7号线八工区	中建八局轨道交通建设有限公司
	监理	7号线监理七标	中咨工程管理咨询有限公司
8号线项目	施工	8号线一工区	中交第二公路工程局有限公司

	监理	8号线监理一部	北京铁城工程咨询有限公司
9号线项目	施工	9号线五工区	中国水利水电第四工程局有限公司
	监理	9号线监理六标	众成工程管理集团有限公司/上海市市政工程管理咨询有限公司
轨道交通场段项目	施工	4号线十六工区	中铁二十二局集团有限公司
	监理	7号线一期西周家庄监理1标	中咨工程管理咨询有限公司
低运量轨道交通高新东区环线项目	施工	低运量轨道交通高新东区环线施工四标	济南城建集团有限公司
	监理	低运量轨道交通高新东区环线监理三标	北京铁城建设监理有限责任公司
市政工程项目	施工	济南新东站二期市政道路建设工程冷水路（舜城大街—响泉街）项目	中铁建工集团有限公司
	监理	济南新东站二期市政道路建设工程冷水路（舜城大街—响泉街）施工项目	众成工程管理集团有限公司
房建工程项目（建投公司）	施工	轨道交通市立五院站综合体项目一期（A组团）	济南一建集团有限公司
	监理	轨道交通市立五院站综合体项目一期（AB组团）监理	山东恒诺建设工程咨询有限公司
房建工程项目（交投公司）	施工	张马屯片区一二期C-5地块	济南一建集团有限公司/山东鲁班建筑安装工程有限公司
	监理	响泉街以北60班九年一贯制学校项	山东泰山工程项目管理有限公司

		目	
房建工程项目（资源经营）	施工	张马屯片区一二期C-4地块项目	中建八局第二建设有限公司
	监理	济南轨道交通产业园（一期）施工总承包（2标段）监理二标	兆丰工程咨询有限公司
4号线机电、装修、铺轨 项目	施工	4号线二十工区(供电一标)	中国铁建电气化局集团有限公司
	监理	4号线一期工程机电安装及装饰装修工程监理三标	北京中铁诚业工程建设监理有限公司
6号线机电、装修、铺轨 项目	施工	6号线轨道2工区	中铁一局集团有限公司
	监理	6号线机电装修监理三标	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司/济南海河建设项目管理有限公司
8号线机电、装修、铺轨 项目	施工	8号线一期装饰装修工区	山东德才建设有限公司
	监理	济南轨道交通8号线一期工程供电系统、弱电系统、机电工程及轨道工程监理三标段	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司
4、6号线弱电项目	施工	4号线二十四工区（弱电二标）	中铁建大桥工程局电气化工程有限公司
	监理	6号线弱电监理	北京现代通号工程咨询有限公司

五、季度考核结果

根据《济南轨道交通集团有限公司建设工程质量管理考核办法（试行）》文件要求，结合工作实际，汇总10、11、12月份考评成绩平均值为本季度考评成绩。对各子公司所辖参建项目进行排名，排名第一的参建项目部树立为榜样，并组织向排名第一的先进项目部学习。对各项目排名末位的参建单位，由各建设子公司主要领导约谈参建单位上级公司分管领导，集团工程管理部参加约谈会；情节严重的，可报请集团分管领导约谈。季度排名第一的参建单位见表3，季度被约谈的参建单位见表4。

表3 季度排名第一的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线三工区	中铁二十四局集团有限公司
	监理	4号线监理三标	北京铁城工程咨询有限公司
6号线项目	施工	6号线三工区	中铁上海局集团有限公司
	监理	6号线监理三标	中铁济南工程建设监理有限公司
7号线项目	施工	7号线二工区	中建八局轨道交通建设有限公司
	监理	7号线监理七标	中咨工程管理咨询有限公司
8号线项目	施工	8号线五工区	中交第三公路工程有限公司
	监理	8号线监理Ⅲ部	中咨工程管理咨询有限公司
9号线项目	施工	9号线一工区	济南城建集团有限公司

	监理	9号线 监理七标	北京铁城工程咨询有限公司
轨道交通场段项目	施工	6号线位里车辆段一工区	中铁一局集团有限公司
	监理	6号线场段监理二标	北京中铁诚业工程建设监理有限公司
低运量轨道交通高新东区环线项目	施工	低运量轨道交通高新东区环线施工二标	中铁建工集团有限公司
	监理	济南低运量轨道交通高新东区环线工程 轨道、系统、车场及车站装修与机电工程监理三标	兆丰工程咨询有限公司
市政工程项目	施工	济南东站三期、疏导工程及梁王新城南侧配套市政道路	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	济南东站三期、疏导工程及梁王新城南侧配套市政道路一标段	山东易方达建设管理集团有限公司
房建工程项目（建投）	施工	R2线腊山站上盖开发项目	山东三箭建设工程股份有限公司
	监理	R2 线腊山站上盖开发项目监理	山东诚信建设项目管理有限公司
房建工程项目（交投）	施工	张马屯片区第四批用地C-6地块项目	山东鲁班建筑安装工程有限公司/山东长兴建设集团有限公司
	监理	张马屯片区一二期C-5地块	山东诚信建设项目管理有限公司
房建工程项目（资源经营）	施工	济南轨道交通产业园（一期）施工总承包（1标段）一工区	济南黄河路桥建设集团有限公司

	监理	华山北片区一期A组团AX-2地块15班幼儿园项目监理	济南海河建设项目管理有限公司
4号线机电、装修、铺轨项目	施工	4号线二十八工区（机电四标）	中铁十五局集团有限公司
	监理	4号线一期工程轨道及疏散平台安装工程监理二标	北京铁城工程咨询有限公司
6号线机电、装修、铺轨项目	施工	6号线机电装修六工区	中铁三局集团有限公司
	监理	6号线供电监理标	北京铁城工程咨询有限责任公司
8号线机电、装修、铺轨项目	施工	轨道交通8号线一期弱电工区	北京瑞拓电子技术发展有限公司
	监理	济南轨道交通8号线一期工程供电系统、弱电系统、机电工程及轨道工程监理一标段	青岛建设监理研究有限公司
4、6号线弱电项目	施工	4号线二十三工区（弱电一标）	中铁建电气化局集团第一工程有限公司
	监理	4号线一期工程弱电系统及场段工艺设备监理	港投工程咨询有限公司

表4 季度被约谈的参建单位

项目	类型	标段	单位
4号线和3号线二期项目	施工	4号线 二工区	中铁二十一局集团有限公司
	监理	4号线 监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司

6号线项目	施工	6号线 七工区	中铁二局集团有限公司
	监理	6号线 监理六标	济南城建监理有限公司
7号线项目	施工	7号线 四-2工区	中建八局轨道交通建设有限公司
	监理	7号线 监理三标	济南市建设监理有限公司
8号线项目	施工	8号线 一工区	中交第二公路工程局有限公司
	监理	8号线 监理Ⅰ部	北京铁城建设监理有限责任公司
9号线项目	施工	9号线 五工区	中国水利水电第四工程局有限公司
	监理	9号线 监理四标	青岛建设监理研究有限公司
轨道交通场段项目	施工	4号线 十六工区	中铁二十二局集团有限公司
	监理	4号线一期唐冶北车辆段场段监理	山东建院工程监理咨询有限公司
市政工程项目	施工	济南新东站二期市政道路建设工程冷水路（舜城大街-响泉街施工）	中铁建工集团有限公司
	监理	冷水沟村等四村城中村改造项目（新东站安置二区）配套市政道路工程项目监理	中天昊建设管理集团股份有限公司
房建工程项目(建投公司)	施工	轨道交通千佛山站TOD综合开发项目	中铁十四局集团有限公司
	监理	轨道交通市立五院站综合体项目	山东恒诺建设工程咨询有限公司

		一期（A组团）监理	
房建工程项目(交投公司)	施工	张马屯片区一二期C-5地块	济南一建集团有限公司/山东鲁班建筑安装工程有限公司
	监理	响泉街以北60班九年一贯制学校项目	山东泰山工程项目管理有限公司
房建工程项目(资源经营)	施工	新东站安置三区二期路家洼、裴家村城中村改造项目配套24班小学项目	山东三箭建设工程股份有限公司
	监理	站前商务A-7、A-8、A-11居住项目监理	山东诚信建设项目管理有限公司
4号线机电、装修、铺轨项目	施工	4号线二十五工区（机电一标）	中铁建设集团有限公司
	监理	4号线一期工程供电系统工程监理	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司
6号线机电、装修、铺轨项目	施工	6号线 轨道2工区	中铁一局集团有限公司
	监理	6号线轨道监理二标	中铁华铁工程设计集团有限公司
8号线机电、装修、铺轨项目	施工	轨道交通8号线一期装饰装修工区	山东德才建设有限公司
	监理	济南轨道交通8号线一期工程供电系统、弱电系统、机电工程及轨道工程监理三标段	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司
4、6号线弱电项目	施工	4号线二十四工区（弱电二标）	中铁建大桥工程局电气化工程有限公司

	监理	6号线 弱电监理	北京现代通号工程咨询有限公司

六、工作要求

一是持续加大工程质量管控力度，坚持“百年大计、质量为先”的理念，严把工程质量关，强化过程控制，全面集团提升建设工程项目质量管理水平，积极组织开展建设工程质量隐患排查工作，做到全面覆盖、全员参与、全面排查，切实把建设单位质量首要责任落到实处，严守工程质量底线。对分部分项工程、关键工序、重要部位、重点施工环节等进行重点摆排，预防各类质量事故及舆情发生。

二是实行优质要素集成供给，提升资源配置效率；各参建单位要进一步加大人力、物力、财力的投入力度，推动项目建设全面提速；要选择高效、专业的分包队伍，科学制定施工计划，特别是做好春节期间的施工安排、人员组织和物资保障，确保春节前后施工“不松劲”，管理“不打烊”。

三是树立精品意识，突出抓好施工质量管理。扎实推进工程质量管理标准化建设，强化工程建设全过程质量闭环管理，有效提升建筑原材料进场质量，持续提升各项工程验收质量和执行效率；全面提升工筹创优意识，完善质量创优机制，加强项目创优策划，积极争创国家级大奖，全力打造更多精品工程、优质工程。

附件：

1. 4号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
2. 6号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
3. 7号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
4. 8号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
5. 9号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
6. 轨道交通场段项目月度考评评分汇总表—施工单位
7. 低运量轨道交通高新东区环线项目月度考评评分汇总表—施工单位
8. 市政工程项目月度考评评分汇总表—施工单位
9. 房建项目（建投）月度考评评分汇总表—施工单位
10. 房建项目（交投）月度考评评分汇总表—施工单位
11. 房建项目（资源经营）月度考评评分汇总表—施工单位
12. 其他项目月度考评评分汇总表—施工单位
13. 月度考评评分汇总表—监理单位
14. 季度考评评分汇总表—施工单位
15. 季度考评评分汇总表—监理单位

济南轨道交通集团有限公司
工程管理部
2025年1月26日

85	8号线一期工程供电系统、弱电系统、机电工程及轨道工程监理二标段	北京铁研建设监理有限责任公司	94.0	91.5	93.2	92.9	2
86	济南轨道交通8号线一期工程供电系统、弱电系统、机电工程及轨道工程监理三标段	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	92.5	93.1	91.2	92.3	3
	4、6号线弱电 项目						
87	4号线一期工程弱电系统及场段工艺设备监理	港投工程咨询有限公司	99.80	99.58	99.96	99.78	1
88	6号线弱电监理	北京现代通号工程咨询有限公司	99.11	99.90	99.90	99.64	2
统计人：			质量考核办公室 （工程管理部代章）：				

附表 15　　济南轨道交通集团有限公司

季度质量考核评分汇总表—监理单位（2024 年第四季度）

统计日期：1 月 26 日

序号	项目名称	被考评施工单位名称	10 月份得分	11 月份得分	12 月份得分	合计得分	名次
	轨道交通 4 号线 项目						
1	4 号线监理三标	北京铁城工程咨询有限公司	98.16	97.00	97.94	97.70	1
2	4 号线监理五标	中铁二院监理（成都）咨询监理有限公司	95.76	97.48	95.32	96.19	2
3	4 号线监理四标	河南长城铁路工程建设咨询有限公司	97.56	96.18	93.46	95.73	3
4	4 号线监理六标	英泰克工程顾问（上海）有限公司	94.74	95.40	95.72	95.29	4
5	4 号线监理七标	上海同济监理咨询有限公司	96.00	94.58	92.42	94.33	5
6	4 号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司	93.12	92.52	93.10	92.91	6
	轨道交通 6 号线 项目						
7	6 号线监理三标	中铁济南工程建设监理有限公司	98.5	95.9	98.8	97.7	1
8	6 号线监理八标	山东省建设监理咨询有限公司	96.0	93.9	99.1	96.4	2
9	6 号线监理四标	北京铁城工程咨询有限公司	97.5	98.1	90.2	95.3	3
10	6 号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司	94.8	93.7	96.5	95.0	4
11	6 号线监理五标	上海三维工程建设咨询有限公司	98.9	98.3	86.9	94.7	5
12	6 号线监理九标	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	94.8	95.7	93.4	94.6	6
13	6 号线监理七标	山东贝特建筑项目管理咨询有限公司	94.2	97.1	90.9	94.1	7
14	6 号线监理六标	济南城建监理有限公司	96.9	97.6	77.9	90.8	8

2024 年度优秀参建单位表彰：

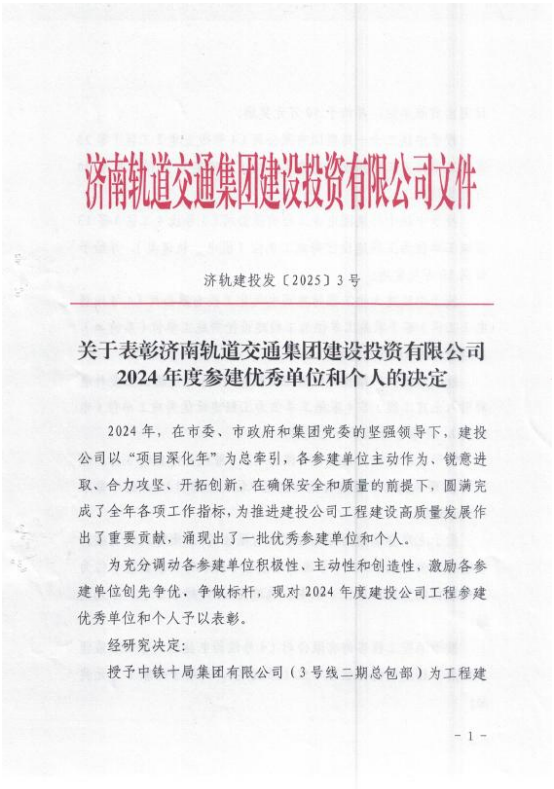

济南轨道交通集团建设投资有限公司文件

济轨建投发〔2025〕3 号

关于表彰济南轨道交通集团建设投资有限公司2024 年度参建优秀单位和个人的决定

2024 年，在市委、市政府和集团党委的坚强领导下，建投公司以“项目深化年”为总牵引，各参建单位主动作为、锐意进取、合力攻坚、开拓创新，在确保安全和质量的前提下，圆满完成了全年各项工作指标，为推进建投公司工程建设高质量发展作出了重要贡献，涌现出了一批优秀参建单位和个人。

为充分调动各参建单位积极性、主动性和创造性，激励各参建单位创先争优，争做标杆，现对 2024 年度建投公司工程参建优秀单位和个人予以表彰。

经研究决定：

授予中铁十局集团有限公司（3 号线二期总包部）为工程建

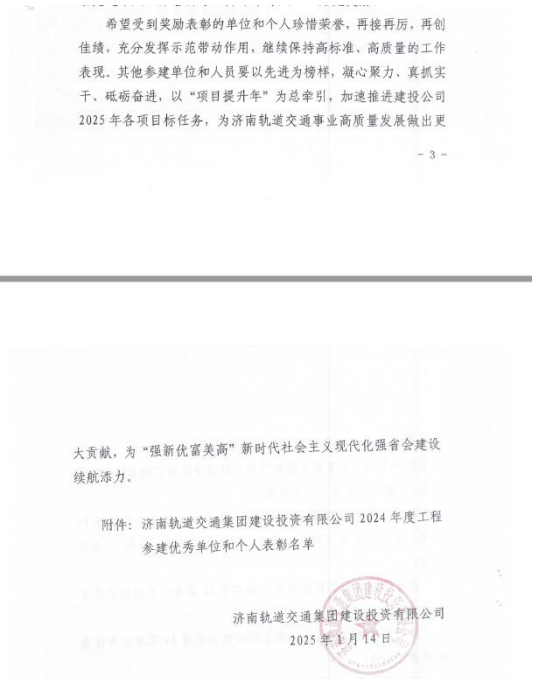

希望受到奖励表彰的单位和个人珍惜荣誉，再接再厉，再创佳绩，充分发挥示范带动作用，继续保持高标准、高质量的工作表现。其他参建单位和人员要以先进为榜样，凝心聚力、真抓实干、砥砺奋进，以“项目提升年”为总牵引，加速推进建投公司2025 年各项目标任务，为济南轨道交通事业高质量发展做出更

大贡献，为“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会建设续航添力。

附件：济南轨道交通集团建设投资有限公司 2024 年度工程参建优秀单位和个人表彰名单

济南轨道交通集团建设投资有限公司

2025 年 1 月 14 日

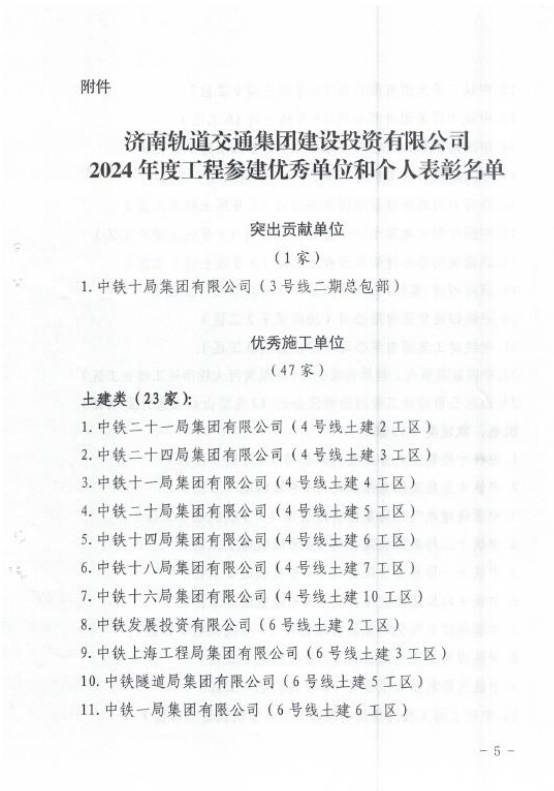

附件

济南轨道交通集团建设投资有限公司2024 年度工程参建优秀单位和个人表彰名单

突出贡献单位

（1 家）

1. 中铁十局集团有限公司（3 号线二期总包部）

优秀施工单位

（47 家）

土建类（23 家）：

1. 中铁二十一局集团有限公司（4 号线土建 2 工区）
2. 中铁二十四局集团有限公司（4 号线土建 3 工区）
3. 中铁十一局集团有限公司（4 号线土建 4 工区）
4. 中铁二十局集团有限公司（4 号线土建 5 工区）
5. 中铁十四局集团有限公司（4 号线土建 6 工区）
6. 中铁十八局集团有限公司（4 号线土建 7 工区）
7. 中铁十六局集团有限公司（4 号线土建 10 工区）
8. 中铁发展投资有限公司（6 号线土建 2 工区）
9. 中铁上海工程局集团有限公司（6 号线土建 3 工区）
10. 中铁隧道局集团有限公司（6 号线土建 5 工区）
11. 中铁一局集团有限公司（6 号线土建 6 工区）

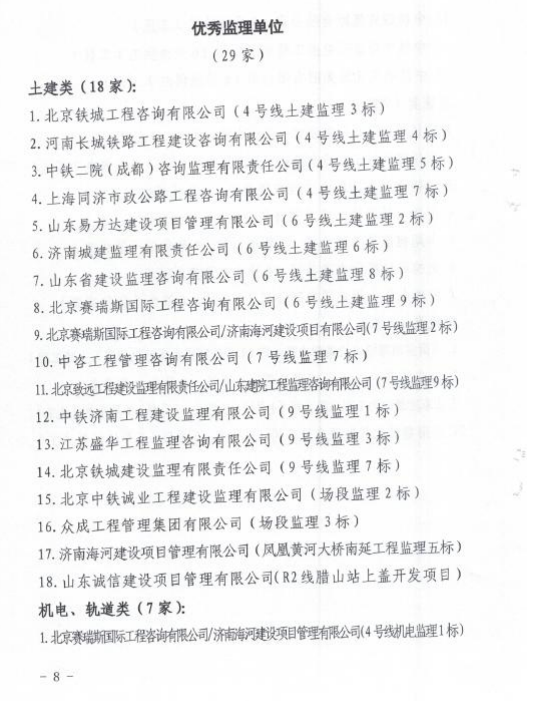

优秀监理单位

（29 家）

土建类（18 家）：

1. 北京铁城工程咨询有限公司（4 号线土建监理 3 标）
2. 河南长城铁路工程建设咨询有限公司（4 号线土建监理 4 标）
3. 中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司（4 号线土建监理 5 标）
4. 上海同济市政公路工程咨询有限公司（4 号线土建监理 7 标）
5. 山东易方达建设项目管理有限公司（6 号线土建监理 2 标）
6. 济南城建监理有限责任公司（6 号线土建监理 6 标）
7. 山东省建设监理咨询有限公司（6 号线土建监理 8 标）
8. 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司（6 号线土建监理 9 标）
9. 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司/济南海河建设项目有限公司(7 号线监理 2 标)
10. 中咨工程管理咨询有限公司（7 号线监理 7 标）
11. 北京致远工程建设监理有限责任公司/山东建院工程监理咨询有限公司 (7 号线监理 9 标)
12. 中铁济南工程建设监理有限公司（9 号线监理 1 标）
13. 江苏盛华工程监理咨询有限公司（9 号线监理 3 标）
14. 北京铁城建设监理有限责任公司（9 号线监理 7 标）
15. 北京中铁诚业工程建设监理有限公司（场段监理 2 标）
16. 众成工程管理集团有限公司（场段监理 3 标）
17. 济南海河建设项目管理有限公司（凤凰黄河大桥南延工程监理五标）
18. 山东诚信建设项目管理有限公司(R2 线腊山站上盖开发项目）

机电、轨道类（7 家）：

1. 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司/济南海河建设项目管理有限公司(4 号线机电监理 1 标)

2. 英泰克工程顾问（上海）有限公司（4 号线机电监理 2 标）

3. 中铁华铁工程设计集团有限公司（4 号线轨道监理 1 标）

4. 山东济铁工程建设监理有限责任公司（4 号线轨道监理 3 标）

5. 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司/济南海河建设项目管理有限公司(6 号线机电监理 3 标)

6. 北京铁城工程咨询有限公司（6 号线轨道监理 3 标）

7. 北京铁城工程咨询有限公司（6 号线供电监理）

系统类（2 家）:

1. 港投工程咨询有限公司（4 号线弱电监理）

2. 北京现代通号工程咨询有限公司（6 号线弱电监理）

市政类（2 家）:

1. 山东诚信工程建设监理有限公司（4 号线、6 号线、7 号线电气监理）

2. 公诚管理咨询有限公司（4 号线、6 号线、9 号线电气监理）

2024年年度履约评价：

济南轨道交通集团有限公司土建工程考评办公室

济轨土建考评办〔2025〕4号

关于2024年度安全文明施工考评结果的通报

集团各部门、直属中心、子公司，各参建单位：

根据《济南轨道交通集团建设工程安全文明施工管理考评办法》，汇总2024年1-12月月度考评成绩算术平均值为本年度考评成绩，各分项成绩汇总作为年度评优依据。按工程类别总评，对排名落后的单位由轨道集团约谈合同签订单位的主要领导。年度排名第一的参建单位见表1，年度被约谈的参建单位见表2。

表1 年度排名第一的参建单位

项目	类型	标段	单位
轨道交通4号线项目	施工	4号线 七-1工区	中铁十八局集团有限公司
	监理	4号线 监理五标	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司
轨道交通6号线项目	施工	6号线 六工区	中铁一局集团有限公司
	监理	6号线 监理五标	上海三维工程建设咨询有限公司
轨道交通7号线项目	施工	7号线 九工区	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	7号线 监理九标	北京致远工程建设监理有限责任公司/山东建院工程监理咨询有限公司

轨道交通8号线项目	施工	8号线 一工区	中交第二公路工程局有限公司
	监理	8号线 监理一标	北京铁城建设监理有限责任公司
轨道交通9号线项目	施工	9号线 六工区	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	9号线 监理二标	上海三维工程建设咨询有限公司
轨道交通场段项目	施工	位里庄 车辆段三工区	中铁二局集团有限公司
	监理	6号线 场段监理二标	北京中铁诚业工程建设监理有限公司
低运量轨道交通高新东区环线	施工	低运量轨道交通高新东区环线施工四标	济南城建集团有限公司
	监理	低运量轨道交通高新东区环线监理三标	北京铁城工程咨询有限责任公司
市政工程	施工	济南东站三期、疏导工程	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	济南新东站二期市政道路建设工程冷水路监理	众成工程管理集团有限公司
房建工程（资源经营）	施工	站前商务区西南A-8居住项目	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	新东站安置三区二期配套小学项目监理	济南海河建设项目管理有限公司
4号线机电、装修、铺轨项目	施工	4号线 30工区	中国铁建电气化局集团有限公司
	监理	4号线一期工程轨道及疏散平台安装工程监理三标	山东济铁工程建设监理有限责任公司

6号线机电、装修、铺轨项目	施工	6号线机电装修06工区	中铁三局集团有限公司
	监理	6号线机电装修监理三标	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司/济南海河建设项目管理有限公司

表2 被约谈的参建单位

项目	类型	标段	单位
轨道交通4号线项目	施工	4号线 八工区	中铁十五局集团有限公司
	监理	4号线 监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司
轨道交通6号线项目	施工	6号线 十工区	中铁十局集团有限公司
	监理	6号线 监理九标	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司
轨道交通7号线项目	施工	7号线 四-2工区	中国建筑第八工程局有限公司
	监理	7号线 监理六标	上海三维工程建设咨询有限公司
轨道交通8号线项目	施工	8号线 二工区	中交路桥建设有限公司
	监理	8号线 监理三标	中咨工程管理咨询有限公司
轨道交通9号线项目	施工	9号线 三工区	中铁十局集团有限公司
	监理	9号线 监理八标	山东易方达建设管理集团有限公司

轨道交通场段项目	施工	4号线 十六工区	中铁二十二局集团有限公司
	监理	4号线一期唐冷北车辆段监理	山东建院工程监理咨询有限公司
低运量轨道交通高新东区环线	施工	低运量轨道交通高新东区环线施工二标	中铁建工集团有限公司
	监理	低运量轨道交通高新东区环线监理一标	英泰克工程顾问（上海）有限公司
市政工程项目	施工	济南市张马片区二期、东站四期市政道路工程（第二批）	中建八局第二建设有限公司
	监理	济南市张马片区二期、东站四期市政道路工程（第二批）监理2标	中天昊建设管理集团股份有限公司
房建工程（资源经营）	施工	范村车辆基地租赁住房施工一标	山东铁信建设集团有限公司
	监理	张马屯片区一二期C-4地块项目监理	山东省建设监理咨询有限公司
4号线机电、装修、铺轨 项目	施工	4号线 25工区	中铁建设集团有限公司
	监理	4号线供电系统工程监理	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司
6号线机电、装修、铺轨 项目	施工	6号线 轨道4工区	中铁十局集团有限公司
	监理	6号线轨道监理四标	中铁济南工程建设监理有限公司

希望排名靠前的单位要戒骄戒躁，珍惜荣誉，保持击楫中流的劲头，不断发扬成绩，续写济南地铁建设新篇章；排名靠后的单位要积极对标先进，认真总结反思，深刻剖析问题根源，制定具体针对性措施，拿出实实在在行动，加快补齐短板弱项，奋起直追，援梯而上。2025 年度，各参建单位要以“项目提升年”为契机，坚定信心、攻坚克难，知重负重、知责担责，继续强化项目安全、文明施工管理，青衿之志、履践致远，为不断提升集团本质安全水平、维护集团高质量发展形势、加快建设“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会作出新的更大贡献。

附件：1. 2024 年度考评评分汇总表—施工单位

2. 2024 年度考评评分汇总表—监理单位

济南轨道交通集团有限公司土建工程考评办公室

2025 年 1 月 27 日

附件 2

济南轨道交通集团有限公司

年度综合考评评分汇总表—监理单位（ 2024 年）

统计日期： 2025 年 1 月 13 日

序号	项目名称	单位名称	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	合计得分	名次
轨道交通 4 号线 项目																
1	4 号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司	94.6	95.88	93.2	91.3	91.6	92.2	91.3	92.4	94.5	94.5	95.1	93.1	93.3	7
2	4 号线监理三标	北京铁城建设监理有限责任公司	95.1	95.9	96	94	92.9	94.7	93.5	92.9	93.8	95.1	97.1	94.5	94.6	5
3	4 号线监理四标	河南长城铁路工程建设咨询有限公司	91.7	94.5	97.1	95.3	95	94.2	95.12	94	96.7	93	95	95.3	94.7	4
4	4 号线监理五标	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	97.8	94	96.7	97	96.1	95.5	95.14	96.4	96.1	95.5	94.2	96.3	95.9	1
5	4 号线监理六标	英泰克工程顾问（上海）有限公司	95.6	94.8	95.6	94.9	96.4	95.2	91.9	93.8	93.7	92.3	94.4	93.76	94.4	6
6	4 号线监理七标	上海同济监理咨询有限公司	94.7	96.3	94.5	96.72	97	94.3	94.9	95.7	95.9	92	92.1	96.42	95.0	3
7	4 号线奥体中心换乘监理	北京中景恒基工程管理有限公司	97.3	96.8	95.8	96.68	95.1	92.7	94.8	93.5	93.5	--	--	--	95.1	2
轨道交通 6 号线 项目																
8	6 号线监理二标	山东易方达建设项目管理有限公司	86.7	95.7	86.9	90.6	96.5	95.1	94.3	93.3	91.5	94.7	92.3	95.0	92.8	4

2025 年第一季防尘治理通报评价：

济南轨道交通集团有限公司土建工程考评办公室

济轨土建考评办〔2025〕8 号

关于表彰 2025 年第一季度全市扬尘治理较好参建单位的通报

集团各部门、直属中心、子公司，各参建单位：

近日，济南市住房和城乡建设局印发《关于 2025 年第一季度全市扬尘治理督查情况的通报》，其中，济南城市轨道交通 4 号线一期工程土建 03 工区等 14 个项目（详见附件 1），因施工现场扬尘治理工作情况较好、各项措施落实及时到位，获全市通报表扬。

为表彰先进，充分发挥扬尘治理标准化工地的示范、带动作用，依据集团《建设工程安全文明施工管理考评办法》，经研究，决定对济南城市轨道交通 4 号线一期工程土建 03 工区等 14 个项目施工单位项目经理部、监理单位项目监理部给予奖励（详见附件 1）。

希望受表彰的参建单位珍惜荣誉，再接再厉，继续保持高标准做法，在我市建设工地扬尘治理工作中再创佳绩。其他参建单位要以先进为榜样，高度重视扬尘治理工作，增强扬尘污染防治工作的责任感和使命感，严格落实“八项扬尘防治措施”，推动扬尘治理水平稳步提升，助力我市环境空气质量持续改善。

1

附件：1. 扬尘治理较好的工程项目及参建单位

2. 关于 2025 年第一季度全市扬尘治理督查情况的通报

济南轨道交通集团有限公司

土建工程考评办公室

2025 年 4 月 25 日

2

序号	项目名称	监理单位	奖励金额（元）	施工单位	奖励金额（元）
6	济南城市轨道交通 4 号线一期工程土建 08 工区	英泰克工程顾问（上海）有限公司济南市轨道交通 4 号线一期工程土建工程六标段项目监理部	4000	中铁十五局集团有限公司济南城市轨道交通 4 号线一期工程 08 工区项目经理部	40000
7	济南市历城区济南轨交集团华山北片区 A-1、A-3 居住项目	天宇工程咨询有限公司华山北片区 A-1、A-3 居住项目工程监理项目部	4000	中国建筑一局（集团）有限公司华山北片区 A-1、A-3 居住项目施工总承包项目部	40000
8	空天信息大学建设工程项目二期二批次施工总承包（一标段）	营特国际工程咨询集团有限公司\山东诚信建设项目管理有限公司空天信息大学建设工程项目二期二批次监理部	4000	济南四建集团第四工程项目公司空天信息大学建设工程项目二期二批次施工总承包 1 标段项目部	40000
9	R2 线腊山站上盖开发项目	山东诚信建设项目管理有限公司第四监理项目部	4000	山东三箭建设工程股份有限公司 R2 线腊山站上盖开发项目项目部	40000
10	张马屯片区第四批用地 A-1、A-6、A-7 地块项目	山东三强建设咨询有限公司张马屯片区第四批用地 A-1、A-6、A-7 地块项目监理部	4000	中建八局第一建设有限公司张马屯片区第四批用地 A-1、A-6、A-7 地块项目施工总承包工程项目部	40000

4

济南市住房和城乡建设局

关于2025年第一季度全市扬尘治理督查情况的通报

各区县人民政府（管委会），市有关部门，各有关单位：

2025年第一季度，市住房城乡建设局认真履行扬尘污染防治综合协调职责，贯彻落实全市大气污染防治工作部署，常态化开展扬尘治理督查检查活动，持续推动扬尘治理精细化防控措施落实，全市扬尘污染综合整治工作有序推进。

第一季度，我市扬尘污染源点位仍呈现出体量大、类型多、分布广的态势，全市各类型扬尘源点位共有2342处，其中住房城乡建设领域房屋建筑、燃气、热力建设工程等1154个，城管领域建筑垃圾消纳场6个，生态环境领域工业企业物料堆场727个，自然资源和规划领域露天矿山22个、矿山修复21个、储备土地13处、集体土地拆迁工程105个，交通运输领域轨道交通、道路、铁路等建设工程222个，水务领域雨污分流、河道等水务水利建设工程43个，园林和林业绿化领域绿化项目29个。

第一季度，市住房城乡建设局出动检查组236组次，累计巡查检查各类扬尘源点位1349个次；对存在扬尘治理措施落实不到位的问题点位，下达责令改正告知文书88例，通过三级管理平台移交有关部门督办151件；依托建筑施工一体化平台视频监控系统，开展线上网络督查67轮次，累计巡查施工项目62533个次，派发问题工单308件。

检查发现绝大部分在建工程项目能严格落实各项扬尘治理措施，规范施工围挡设置、严格出场车辆冲洗管理、落实施工裸土覆盖、强化施工道路保洁等，决定对2025年第一季度中扬尘治理措施落实较好的**济南历山路安置住房项目**等45个工程项目及参建单位予以通报表扬，请各在建工程项目对标优秀、学习先进。

检查发现，部分施工项目扬尘污染防治水平低、管控成效差、扬尘污染问题突出，决定对**大辛庄考古遗址公园项目（一期）地块一**等22个项目及参建单位予以通报批评，列入重点监管名单，请各在建施工项目参建设各方提高认识、引以为戒，共同做好扬尘防治工作。

附件：1. 扬尘治理较好的工程项目及参建单位

2. 扬尘污染问题突出的项目及参建单位

济南市住房和城乡建设局

2025年4月17日

附件1

扬尘治理较好的工程项目及参建单位

序号	项目名称	建设单位	施工单位	监理单位
1	济南历山路安置住房项目	中国人民解放军联勤保障部队第四工程代建管理办公室	中铁建工集团有限公司	山东金厦工程项目管理咨询有限公司
2	济南中央商务区西片区城市更新项目（一期）B-4地块工程总承包（EPC）	济南历下城市发展集团城市更新有限公司	中建八局第二建设有限公司	山东易方达建设管理集团有限公司
3	CBD中央广场18#地块项目	济南中升置业有限公司	中建八局第二建设有限公司	山东建院工程监理咨询有限公司
4	轨道交通千佛山站TOD综合开发项目	济南慧山置业有限公司	中铁十四局集团有限公司	济南海河建设项目管理有限公司/山东省建设监理咨询有限公司
5	济南中央商务区西片区城市更新项目（一期）DMLX-02-06（原A6）、07、08、09地块	济南历下城市发展集团城市更新有限公司	中电建路桥集团有限公司	山东天金和建设项目管理有限公司/山东省华一建设项目管理有限公司
6	水利厅宿舍A地块项目	济南旧城开发投资集团有限公司	山东三箭建设工程股份有限公司	天宇工程咨询有限公司
7	山东三塑地块城市更新项目CGC-18-01-2地块及CGC-18-02地块工程总承包（Epc）	济南历下城市发展集团城市更新有限公司	济南四建（集团）有限责任公司	山东普利项目管理有限公司
8	明湖国际科技创新中心B7地块项目	济南中旗置业有限公司	中建八局第一建设有限公司	山东建院监理工程咨询有限公司
9	济南市第一人民医院新院区	济南市第一人民医院	中建八局第二建设有限公司	山东恒信建设监理有限公司
10	井家沟地块B、C商业地产开发项目工程总承包（EPC）	山东中博华远置业有限公司	中海建筑有限公司	山东泉景工程咨询有限公司
11	大庙屯片区剩余地块A-9建设项目一期施工总承包	济南夏润置业有限公司	山东省建设建工（集团）有限责任公司	山东易方达建设管理集团有限公司

序号	项目名称	建设单位	施工单位	监理单位
12	恒大御城 B 地块 11#商务办公楼、12#商务公寓及办公楼、地下车库	济南新翼发展投资有限公司	中铁十四局集团建筑工程有限公司	济南城建监理有限责任公司
13	济南轨道交通 4 号线一期工程土建 03 工区	济南轨道交通集团建设投资有限公司	中铁二十四局集团有限公司	北京铁城工程咨询有限公司
14	吉尔人才公寓项目	济南二机床集团有限公司	山东三箭建设工程股份有限公司	山东贝特建筑项目管理咨询有限公司
15	智能制造公共实训基地项目	济南二机床集团有限公司	山东三箭建设工程股份有限公司	众成工程管理集团有限公司
16	济南轨道交通 R2 线腊山站上盖项目	济南舜兴置业有限公司	山东三箭建设工程股份有限公司	山东诚信建设项目管理有限公司
17	济南西客站 TOD 综合体建设项目南区	济南龙湖世高房地产开发有限公司	山东天齐置业集团股份有限公司	山东鼎晟工程项目管理有限公司
18	槐荫区公共实训基地建设	济南市槐荫区国有资产运营有限公司	中建八局第二建设有限公司	众成工程管理集团有限公司
19	张庄村、刘庄村城中村改造项目安置房三期工程（A2、A3、A4 地块）A2 地块	济南西城投资开发集团有限公司	山东长兴建设集团有限公司	济南金诺公路工程监理有限公司
20	山东水昌供应链总部基地项目	山东水昌国际合作园区有限公司	济南四建（集团）有限责任公司	山东天桂建设监理咨询有限公司
21	天桥区王护北幸城中村安置房项目（安置地块一）	济南旺鑫投资发展有限公司	中国五冶集团有限公司	山东易方达建设管理集团有限公司
22	上药控股山东总部建设项目（一期）	上药（山东）物流有限公司	中国建筑第七工程局有限公司	山东高速建设科技有限公司
23	响泉街以北 60 班九年一贯制学校项目	济南市历城区教育和体育局	中建八局第二建设有限公司	山东泰山工程项目管理有限公司
24	济南凤凰黄河大桥南延工程四工区	济南轨道交通集团建设投资有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	山东省建设监理咨询有限公司

序号	项目名称	建设单位	施工单位	监理单位
25	华山北片区 A-1、A-3 地块居住项目	济南舜全建设发展有限公司	中国建筑一局（集团）有限公司	天宇工程咨询有限公司
26	张马屯片区第四批用地项目 B-3 地块	济南诚建置业有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	山东省建设监理咨询有限公司
27	张马屯片区第四批用地项目 C-6 地块	济南舜铂建设发展有限公司	山东长兴建设集团有限公司/山东鲁班建筑安装工程有限公司	山东海通恒安工程咨询管理有限公司
28	济南轨道交通七号线一期工程（第五工区）	济南轨道交通集团建设投资有限公司	中国建筑股份有限公司	山东省工程监理咨询有限公司
29	济南城市轨道交通 6 号线工程施工总承包腊王车辆基地 3 工区项目	济南轨道交通集团建设投资有限公司	中铁建工集团有限公司	北京中铁诚业工程建设监理有限公司
30	张马屯片区一二期 C-5 地块项目	济南轨道交通集团资源开发有限公司	济南一建集团有限公司	山东诚信建设项目管理有限公司
31	张马屯片区第四批用地 A-1 A-6 项目	济南舜盟建设发展有限公司	中建八局第一建设有限公司	山东三强建设咨询有限公司
32	大辛南区 A-4 地块住宅项目	济南历兴置业开发有限公司	中冶建工集团有限公司	中达安股份有限公司
33	济南医院迁建项目	济南医院	中国建筑第七工程局有限公司	山东易方达建设项目管理有限公司
34	山东省盲人按摩医院建设项目	山东省康复研究中心（山东省康复医院、山东省残疾人辅助器具中心）	济南一建集团有限公司	山东泰山工程项目管理有限公司
35	空天信息大学建设工程项目二期二批次施工总承包三标段	济南轨道交通集团资源经营管理公司	中建八局第一建设有限公司	雷特国际工程咨询集团有限公司
36	空天信息大学建设工程项目二期二批次施工总承包（一标段）	济南轨道交通集团资源经营管理公司	济南四建（集团）有限责任公司	雷特国际工程咨询集团有限公司/山东诚信建设项目管理有限公司
37	起步区地下空间综合开发利用及基础设施配套一期（DX-C2 地块）项目	济南先投城市发展投资集团有限公司	中铁十四局集团有限公司/中铁建发展集团有限公司	济南城建监理有限责任公司

序号	项目名称	建设单位	施工单位	监理单位
38	起步区综合医疗中心项目施工总承包（2 标段）	济南先投城市发展投资集团有限公司	中建八局第二建设有限公司	五洲工程顾问集团有限公司
39	济南新旧动能转换起步区黄河体育及科技园区基础设施一期工程体育馆施工	济南城建动能转换开发建设集团有限公司	中建八局第二建设有限公司	山东普华项目管理有限公司
40	济南起步区鹊山生态文化区（一期）A-2 项目	济南鹊华城更建设投资有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	山东新鲁建工程管理咨询有限公司
41	济南轨道交通 4 号线一期工程土建 08 工区	济南轨道交通集团建设投资有限公司	中铁十五局集团有限公司	英泰克工程顾问（上海）有限公司
42	孙村片区围子山以东、世纪大道以南、春秀路以西、科航路以北 R02 地块房地产开发项目（1#楼，2#楼，7#楼，8#楼，10#楼，11#楼，地下车库一标段）项目	济南东进产业发展有限公司	中铁十四局集团有限公司	山东鼎晟工程项目管理有限公司
43	凤凰路以西、新添大街以南 A 地块房地产开发项目（一期）（3#，18#，地下车库一标段）	济南高新城市更新有限公司	中建八局第一建设有限公司	山东建院工程监理咨询有限公司
44	庄科安置区村居提升工程（南区）-ZK-12 地块	济南东瓴发展投资开发有限公司	山东三箭建设工程股份有限公司	山东诚信工程建设监理有限公司
45	庄科安置区村居提升工程（北区）-ZK-09 地块	济南东瓴发展投资开发有限公司	山东泰山建工发展集团有限公司	山东易方达建设管理集团有限公司

2025 年 1 月份：

济南轨道交通集团有限公司土建工程考评办公室

济轨土建考评办〔2025〕5 号

关于2025年1月份安全文明施工月度考评结果的通报

集团各部门、直属中心、子公司，各参建单位：

根据《济南轨道交通集团有限公司建设工程安全文明施工管理考评办法》和《城市轨道交通工程质量安全检查指南》，通过参建单位自查考评、子公司检查考评、集团督查考评对集团在建工程的各施工、监理单位进行了考评，现将结果通报如下：

一、参建单位自评情况

（一）施工单位自评

2025 年 1 月 1～25 日，集团建设工程参建施工单位开展了 1 月份自评检查，共 116 家施工单位开展自评检查工作，发现问题 655 条，其中安全问题 501 条、文明施工问题 154 条。截至目前，问题均已整改闭环。

（二）监理单位自评

2025 年 1 月 1～25 日，集团建设工程参建监理单位开展了 1 月份自评检查，共 85 家监理单位开展自评检查工作，发现问题 325 条。截至目前，问题均已整改闭环。

完料净场地清”；办公室私拉乱接电源，使用电炉等大功率电器；动土作业缺少抑尘措施，部分道路浮土较厚，扬尘较大；现场随意抽烟，乱扔烟头；施工现场大门长时间开启，人员随意进出等问题。

（二）监理单位存在问题

一是针对施工单位存在的安全、文明施工问题，监理单位未及时采取监理措施或监理措施不到位。二是个别监理单位对专项方案审核把关不严，经审批的专项施工方案存在多处错误；监理规划内容不完善，实施细则缺乏针对性；针对施工单位隐患排查治理工作监督管理不严格，整改措施落实不到位；未定期进行危大工程巡视；未按期严格落实风险巡视工作；监理日志记录滞后等问题。

五、月度考评结果

月度考评结束后，对各子公司所辖建设项目进行排名，对各考评单元排名前 50%（数量四舍五入，下同）的参建单位，不追究违约责任；对剩余 50%的参建单位，由各建设子公司在次月计量支付款中扣除相应金额；对排名末位的参建单位，由各建设子公司约谈其后方单位相关领导。各项目安全文明施工月度排名第一的参建单位见表 1，各项目安全文明施工月度排名落后的参建单位见表 2。

表 1 各项目安全文明施工月度排名第一的参建单位

项目	类型	标段	单位
4 号线项目	施工	4 号线三工区	中铁二十四局集团有限公司
	监理	4 号线监理三标	北京铁城工程咨询有限公司

房建工程（建投）	施工	轨道交通千佛山站 TOD 综合开发项目	中铁十四局集团有限公司
	监理	轨道交通千佛山站 TOD 综合开发项目监理	济南海河建设项目管理有限公司
房建工程（交投）	施工	张马屯片区第四批用地 C-6 地块项目	山东鲁班建筑安装工程有限公司/山东长兴建设集团有限公司
	监理	张马屯片区一二期 C-5 地块项目监理	山东诚信建设项目管理有限公司
房建工程（资源经营）	施工	济南轨道交通产业园一标一工区	济南黄河路桥建设集团有限公司
	监理	范村车辆基地一标监理	山东建院工程监理咨询有限公司
4 号线机电、装修、铺轨项目	施工	4 号线二十七工区	中铁城建集团有限公司
	监理	4 号线机电安装及装饰装修工程监理二标	英泰克工程顾问（上海）有限公司
6 号线机电、装修、铺轨项目	施工	6 号线机电装修四工区	中铁一局集团有限公司
	监理	6 号线机电装修监理二标	中咨工程管理咨询有限公司
4/6 号线弱电项目	施工	4 号线二十三工区	中铁建电气化局集团第一工程有限公司
	监理	/	/
8 号线机电、装修、铺轨项目	施工	8 号线供电一工区	中交机电工程局有限公司
	监理	8 号线供电系统、弱电系统、机电工程及轨道工程监理一标段	青岛建设监理研究有限公司

3. 7 号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
4. 8 号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
5. 9 号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
6. 轨道交通场段项目月度考评评分汇总表—施工单位
7. 低运量轨道交通高新东区环线项目月度考评评分汇总表—施工单位
8. 凤凰路高架项目月度考评评分汇总表—施工单位
9. 市政工程项目月度考评评分汇总表—施工单位
10. 房建项目（建投）月度考评评分汇总表—施工单位
11. 房建项目（交投）月度考评评分汇总表—施工单位
12. 房建项目（资源经营）月度考评评分汇总表—施工单位
13. 其他项目月度考评评分汇总表—施工单位
14. 月度考评评分汇总表—监理单位

济南轨道交通集团有限公司土建工程考评办公室

2025 年 2 月 25 日

附件 14

济南轨道交通集团有限公司

安全文明施工月度考评评分汇总表—监理单位（2025 年 1 月）

统计日期：2 月 16 日

序号	项目名称	合同额（亿元）	被考评监理单位名称	监理单位自评（权重 20%）	子公司检查考评（权重 60%）			集团督查考评（权重 20%）			减分	总分	名次	扣除违约金（万元）	备注
				自评总分	监理行为得分（权重 70%）	监理效果得分（权重 30%）	总分	监理行为得分（权重 70%）	监理效果得分（权重 30%）	总分					
轨道交通 4 号线项目															
1	4 号线监理二标	16.8	山东易方达建设管理集团有限公司	97.0	94.7	93.3	94.3	94.7	93.3	94.3	0.0	94.8	5	0.35	
2	4 号线监理三标	26.1	北京铁城工程咨询有限公司	98.5	98.2	97.5	98.0	98.2	97.5	98.0	0.0	98.1	1	--	
3	4 号线监理四标	26.4	河南长城铁路工程建设咨询有限公司	98.5	96.5	95.9	96.3	96.5	95.9	96.3	0.0	96.7	3	-	
4	4 号线监理五标	15.3	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	98.1	97.7	95.6	97.1	97.7	95.6	97.1	0.0	97.3	2	--	
5	4 号线监理六标	19.2	英泰克工程顾问（上海）有限公司	99.2	92.1	95.1	93.0	92.1	95.1	93.0	0.0	94.2	6	0.45	
6	4 号线监理七标	11.9	上海同济监理咨询有限公司	98.5	95.9	95.7	95.8	95.9	95.7	95.8	0.0	96.3	4	0.18	
轨道交通 6 号线项目															
7	6 号线监理三标	16.90	中铁济南工程建设监理有限公司	97.7	96.8	97.5	97.0	96.8	97.5	97.0	0.0	97.1	3	0.20	

2025 年 2 月份：

济南轨道交通集团有限公司土建工程考评办公室

济轨土建考评办〔2025〕6 号

关于2025年2月份安全文明施工月度考评结果的通报

集团各部门、直属中心、子公司，各参建单位：

根据《济南轨道交通集团有限公司建设工程安全文明施工管理考评办法》和《城市轨道交通工程质量安全检查指南》，通过参建单位自查考评、子公司检查考评、集团督查考评对集团在建工程的各施工、监理单位进行了考评，现将结果通报如下：

一、参建单位自评情况

（一）施工单位自评

2025 年 2 月 1～25 日，集团建设工程参建施工单位开展了 2 月份自评检查，共 127 家施工单位开展自评检查工作，发现问题 1011 条，其中安全问题 743 条、文明施工问题 268 条。截至目前，问题均已整改闭环。

（二）监理单位自评

2025 年 2 月 1～25 日，集团建设工程参建监理单位开展了 2 月份自评检查，共 92 家监理单位开展自评检查工作，发现问题 490 条。截至目前，问题均已整改闭环。

超前预置防汛物资，切实提升应急保障水平。

（三）各子公司、各参建单位要高度重视大型机械设备安全管理工作，尤其是起重机械设备。一是明确风险抓辨识，要从物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落和其他伤害等各类伤害可能出发，全面细致辨识风险，并制定管控措施。二是明确责任抓落实，施工单位要全面落实风险辨识、管控主体责任，监理单位要从准入审核、人员资质核验、方案审查、条件核查、巡视巡查、使用环节、人员培训、定期维保等方面落实监督责任，各建设子公司要加强对施工、监理单位的监督管理，对现场管控不到位的单位进行严肃处理；对于情节严重、多次整改仍不达标的施工、监理人员，坚决予以清退，以此督促参建单位切实履行职责，提升起重机械管理质效。

附件：1. 4 号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
2. 6 号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
3. 7 号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
4. 8 号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
5. 9 号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
6. 轨道交通场段项目月度考评评分汇总表—施工单位
7. 低运量轨道交通高新东区环线项目月度考评评分汇总表—施工单位
8. 济阳线项目月度考评评分汇总表—施工单位

超前预置防汛物资，切实提升应急保障水平。

（三）各子公司、各参建单位要高度重视大型机械设备安全管理工作，尤其是起重机械设备。一是明确风险抓辨识，要从物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落和其他伤害等各类伤害可能出发，全面细致辨识风险，并制定管控措施。二是明确责任抓落实，施工单位要全面落实风险辨识、管控主体责任，监理单位要从准入审核、人员资质核验、方案审查、条件核查、巡视巡查、使用环节、人员培训、定期维保等方面落实监督责任，各建设子公司要加强对施工、监理单位的监督管理，对现场管控不到位的单位进行严肃处理；对于情节严重、多次整改仍不达标的施工、监理人员，坚决予以清退，以此督促参建单位切实履行职责，提升起重机械管理质效。

附件：1. 4 号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
2. 6 号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
3. 7 号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
4. 8 号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
5. 9 号线项目月度考评评分汇总表—施工单位
6. 轨道交通场段项目月度考评评分汇总表—施工单位
7. 低运量轨道交通高新东区环线项目月度考评评分汇总表—施工单位
8. 济阳线项目月度考评评分汇总表—施工单位

9. 凤凰路高架项目月度考评评分汇总表—施工单位
10. 市政工程项目月度考评评分汇总表—施工单位
11. 房建项目（建投）月度考评评分汇总表—施工单位
12. 房建项目（交投）月度考评评分汇总表—施工单位
13. 房建项目（资源经营）月度考评评分汇总表—施工单位
14. 其他项目月度考评评分汇总表—施工单位
15. 月度考评评分汇总表—监理单位

济南轨道交通集团有限公司土建工程考评办公室

2025 年 3 月 31 日

附件 15

济南轨道交通集团有限公司

安全文明施工月度考评评分汇总表—监理单位（2025 年 2 月）

统计日期：3 月 16 日

序号	项目名称	合同额（亿元）	被考评监理单位名称	监理单位自评（权重 20%）	子公司检查考评（权重 60%）			集团督查考评（权重 20%）			赋分	总分	名次	扣除违约金（万元）	备注
				自评总分	监理行为得分（权重 70%）	监理效果得分（权重 30%）	总分	监理行为得分（权重 70%）	监理效果得分（权重 30%）	总分					
轨道交通 4 号线项目															
1	4 号线监理二标	16.8	山东易方达建设管理集团有限公司	97.0	84.2	93.5	87.0	92.0	95.1	92.9	0.0	90.2	5	0.66	
2	4 号线监理三标	26.1	北京铁城工程咨询有限公司	97.5	96.2	95.9	96.1	84.5	89.8	86.1	0.0	94.4	2	—	
3	4 号线监理四标	26.4	河南长城铁路工程建设咨询有限公司	99.0	94.2	92.2	93.6	84.1	87.3	85.1	0.0	92.98	3	—	
4	4 号线监理五标	15.3	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	98.4	95.0	92.1	94.1	96.0	97.2	96.4	0.0	95.4	1	—	
5	4 号线监理六标	19.2	英泰克工程顾问（上海）有限公司	99.2	87.8	83.2	86.4	85.0	92.1	87.1	0.0	89.1	6	0.84	
6	4 号线监理七标	11.9	上海同济监理咨询有限公司	98.5	92.0	89.3	91.2	93.5	90.8	92.7	0.0	92.96	4	0.34	
轨道交通 6 号线项目															
7	6 号线监理三标	16.90	中铁济南工程建设监理有限公司	97.8	90.0	90.0	90.0	84.0	88.9	85.5	0.0	90.7	3	0.63	

3、沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场段改扩建工程电力隧道施工临理

中标通知书

沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场段改扩建工程

电力隧道施工监理

中 标 通 知 书

致投标人：英泰克工程顾问（上海）有限公司

招标项目名称：沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场段改扩建工程电力隧道施工监理

有关贵公司于 2021 年 4 月 6 日提交的上述招标项目的投标书，经我公司分析研究，并与贵公司对投标文件内容进行协商、补充及修正后，现正式通知贵公司，基于下列合同总价及条款，我公司已选定贵公司为本项目电力隧道施工监理之中标单位，并接纳贵公司的投标文件：

1. 本监理合同的监理费率为 1.63%（保留至小数点后两位），按此费率计算出来的投标总价为（大写）人民币壹仟零贰拾壹万叁仟陆佰肆拾伍元，（小写）RMB：10213645 元。

2. 贵公司须在接到本通知书后 14 天内办理完履约担保手续提交本公司，并按合同进度要求正式开展相关工作。

3. 贵公司必须在接到本通知书后 30 天内与本公司签署一份按投标文件经双方协商修正后编制的合同，作为正式合同文件。在正式合同制定、签署及执行以前，本通知书连同贵公司送回的投标文件、双方在协商期间的来往补充文件及协商同意的有关修改，将作为本合同的有效文件。

谨此函告！

委托人：深圳高速公路股份有限公司

（法人代表或授权代理人签名）

日期：2021 年 5 月 10 日

中 华 人 民 共 和 国
广 东 省 深 圳 市

沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场段改扩建工程项目

电力隧道施工监理合同

合约编号：JHG—F—02

签约单位：深圳高速公路股份有限公司（发包人）

英泰克工程顾问(上海)有限公司（监理人）

二〇二一年六月

合同文件总目录

第一卷

第一章	合同协议书及附件
第二章	中标通知书
第三章	投标承诺函
第四章	合同条款
第五章	合同附件
第六章	其他合同

第二卷

第七章	委托人要求

第三卷

第八章	工程项目管理手册（另册）
第九章	施工承包人投标文件（另册）
第十章	施工承包合同文件（另册）
第十一章	施工图纸（另册）
第十二章	施工技术规范（另册）

合同协议书

本协议书由深圳高速公路股份有限公司（以下简称“委托人”）为一方，与英泰克工程顾问(上海)有限公司（以下简称“监理人”）为另一方共同订立。

鉴于委托人已委托监理人为沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场段改扩建工程项目电力隧道提供监理服务，并已接受了监理人就此提出的投标文件，本监理合同的监理费率为1.63%（保留至小数点后两位），按此费率计算出来的合同总价为（大写）人民币壹仟零贰拾壹万叁仟陆佰肆拾伍元，(¥：10213645元)。

1. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及各种合同附件；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）委托人要求；

（8）监理服务费用清单；

（9）监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺；

（10）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.本项目总监理工程师为：刘锋。

4.监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。

5.委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

6. 本协议书在监理人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

7. 本协议书一式拾份，甲方执陆份，乙方执肆份。

8. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方：深圳高速公路股份有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字）

时　间：2021年6月18日

乙方：英泰克工程顾问（上海）有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字）

时　间：2021年　月　日

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.3 工程和监理

将公路工程专用合同条款第 1.1.3.1 款修改为：

1.1.3.1 本次进行施工监理招标的项目为沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场段改扩建工程电力隧道（以下简称“本项目”）。

工程概况：沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场段改扩建工程电力隧道施工，明挖隧道长度约为 142m（桩号为 JK0+000~JK0+142），净空断面为 B*H=2.8*3.5m。盾构法隧道长度约为 6673m（桩号为 JK0+142~JK6+815，包含始发井）。

1.4 合同文件的优先顺序

将公路工程专用合同条款第 1.4 款修改为：

组成合同文件的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如果出现含糊不清或相互矛盾的情况，除非合同另有规定，组成合同的各个文件的优先支配地位应依次如下：

（1）本合同协议书及各种合同附件；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）委托人要求；

（8）监理服务费用清单；

（9）监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺；

（10）其他合同文件。

1.6 文件的提供和照管

1.6.2 委托人提供的文件

将公路工程专用合同条款第 1.6.2 款修改为：

为了确保监理服务工作的顺利开展，委托人应及时向监理人提供下述文件、资料：

（1）委托人与承包人签订的正式工程承包合同（包括合同条款、技术规范、投标文件有关内容和施工设计图纸）；

（2）工程项目管理手册

（3）项目环境影响评价报告、水土保持方案。

1.8 转让和分包

将公路工程专用合同条款第 1.8.2 款修改为：

履约评价

2025 年第二季度：

深圳高速公路集团股份有限公司机荷改扩建项目管理处文件

机荷改扩建项目函〔2025〕406 号

关于对机荷改扩建项目 2025 年第 2 季度各监理单位合约检查情况的通报

各参建监理单位:

根据《关于开展机荷改扩建项目 2025 年第二季度综合检查的通知》（机荷改扩建项目函〔2025〕328 号），管理处于 2025 年 7 月 9 日至 15 日对主体工程第 1～6 合同段、110kv 及以上电力线路改迁工程第 1～3 合同段、电力隧道工程的各监理单位进行 2025 年第 2 季度人员履约及合约检查，现将本次检查结果通报如下:

一、总体情况

本次检查主要采用内业资料查阅的方式进行，重点对人员履约、合约管理、工程款支付“穿透式”检查、各合同段整改等情况进行检查。

二、检查存在的问题

（一）批复人员到岗情况

主体工程施工第 1 总监办缺勤 2 人。

（二）合约检查情况

1. 主体施工第 1 总监办: 分包台账未采用《实施细则》所

附格式；第3合同段3份变更预算上报不及时；4月份未按要求开展月度工程款支付“穿透式”核查工作；实体工程已计量，但材料调差工作开展存在滞后。

2.主体施工第2总监办：4月份未按要求开展月度工程款支付“穿透式”核查工作；未能发现第6合同段备案的两份劳务合作合同签约单位前后不一致；实体工程已计量，但未开展材料调差工作。

3.电力隧道监理办：支付台账、材料调差台账更新不及时。

三、合约处罚

对于主体工程第1监理办现场管理人员缺勤的情况，根据监理合同条款处以1万元金额罚款，罚款在下期期中支付中予以扣除。

四、整改要求

（一）根据市交通局《关于常态化开展工程款支付情况核查工作的通知》（深交字〔2023〕547号）相关要求，各监理办应高度重视工程款支付“穿透式”核查工作，每月对承包人工程款支付情况进行核查，即全面知晓项目工程款流向和工程项目全链条各环节工程款支付情况，直至掌握最末端的实际材料供应商、设备租赁商（及个人）、劳务人员收款情况，并形成工程款支付台账。

（二）根据省厅《关于公路工程施工分包管理实施细则的通知》（粤交〔2025〕1号）相关要求，要求各监理办加强对所监理合同段的施工分包活动的监理管理，督促各承包人严格按要求履行分包活动审查、备案程序，加强对备案合同的审查、

监管工作。

（三）规范变更管理。严格执行《工程变更管理程序》，按时提交预算审查意见书。

（四）对于检查中发现的问题，要求各监理单位立即进行整改并将整改情况于2025年8月5日前书面上报管理处。若对检查中指出的问题整改不及时或拒不整改的，将按合同相关约定进行处罚。

特此通报。

附件：1.人员到岗情况检查表

2.监理办合约检查表

深圳高速公路集团股份有限公司

机荷改扩建项目管理处

2025年7月28日

（联系人：张晓兰，电话：0755-36878579）

主送：机荷改扩建第1总监办、机荷改扩建第2总监办、机荷改扩建电力隧道监理部、机荷改扩建高压电力改迁监理办。

机荷改扩建项目管理处　　2025年7月31日印发

附表：监理人员到岗情况检查表(2025年7月)

项目名称：沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场段改扩建工程项目电力隧道监理

监理单位：英泰克工程顾问（上海）有限公司

职务	投标承诺		批复人员				备注
	数量	姓名	姓 名	持证情况	是否更换	签到	
总监理工程师	1	刘峰	李宁	国家注册监理工程师（公路工程）、高级工程师	是	李宁	
安全监理工程师	2	万登绪	李星	注册安全工程师	是	李星	
		张建国	张建国	注册安全工程师	否		退场2025.5
机电工程师	2	朱义	朱义	国家注册监理工程师（机电安装工程）	否	朱义	
		张吉柱	张吉柱	国家注册监理工程师（机电安装工程）	否		退场2025.5
土建工程师	1	初绍军	仲其根	国家注册监理工程师（桥隧工程）	是		退场2025.5
合约监理工程师	1	王永照	李伟营	注册造价工程师	是		已请假
试验监理工程师	1	王敏	刘海平	公路水运工程试验检测师	是		已请假
测量监理工程师	1	李宁	李宁	国家注册监理工程师（公路工程）	否		退场
监理员	1	姜磊	王毅	监理员证	是		退场
合约助理	1	孙驰	孙驰	监理员证	否		退场
资料员	1	/	张东山		新增		退场
档案工程师	1	/	吴剑		新增	吴剑	
说明（人员到位率、更换率情况等）	批复人员__人，实际到位____人，到位率_____%；更换___人，更换率____%。						

项目管理处：李国明 2025.7.14

项目总监简历表

投标人名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司

姓名	傅海政	性别	男	年龄	56 岁
学历及专业	本科/工程管理		职称及专业	高级工程师/工程管理	
参加工作年限	35 年		从事项目总监工作年限	20 年	
主要工作经历	2003 年 08 月至今，在英泰克工程顾问上海有限公司担任专业监理工程师、安全监理工程师、总监代表、总监理工程师。				

类似项目业绩

建设单位	项目名称	合同金额（万元）	合同范围及内容	竣工验收日期	履约评价情况	证明文件页码
福州地铁集团有限公司	滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程)第 6 标段(车站、区间工程)(监理）	3169.8572	本工程合同范围含施工阶段及保修阶段监理，工程隧道结构形式：采用盾构区间隧道	2024.01.18	2020 年上半年：90.47 分 2020 年第四季度暨年度：90.23 分，年度第二名 2021 年第一季度：87.49 分 2021 年第二季度：85.61 分 2021 年第三季度：78.86 分 2021 年第四季度：81.34 分 2022 年第一季度：84.47 分 2022 年第二季度：86.57 分 2022 年第三季度：85.08 分 2022 年第四季度：83.87 分 2023 年第一季度：75.75 分 2023 年第二季度：78.62 分 2023 年第三季度：81.07 分 2023 年第四季度：67.69 分 2024 年第一季度：76.87 分 2024 年第二季度：79.74 分 2024 年第三季度：84.10 分 2024 年第四季度：86.6 分	136
苏州市轨道交通集团有限公司	苏州市轨道交通 5 号线工程土建监理项目（V-JL01 标）	2443.512	施工及缺陷责任期修复监理服务。工程隧道结构形式：盾构区间超长隧道	2021.05.13		222

注：后附相关证明材料。

1、滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程)第 6 标段(车站、区间工程)(监理）监理合同

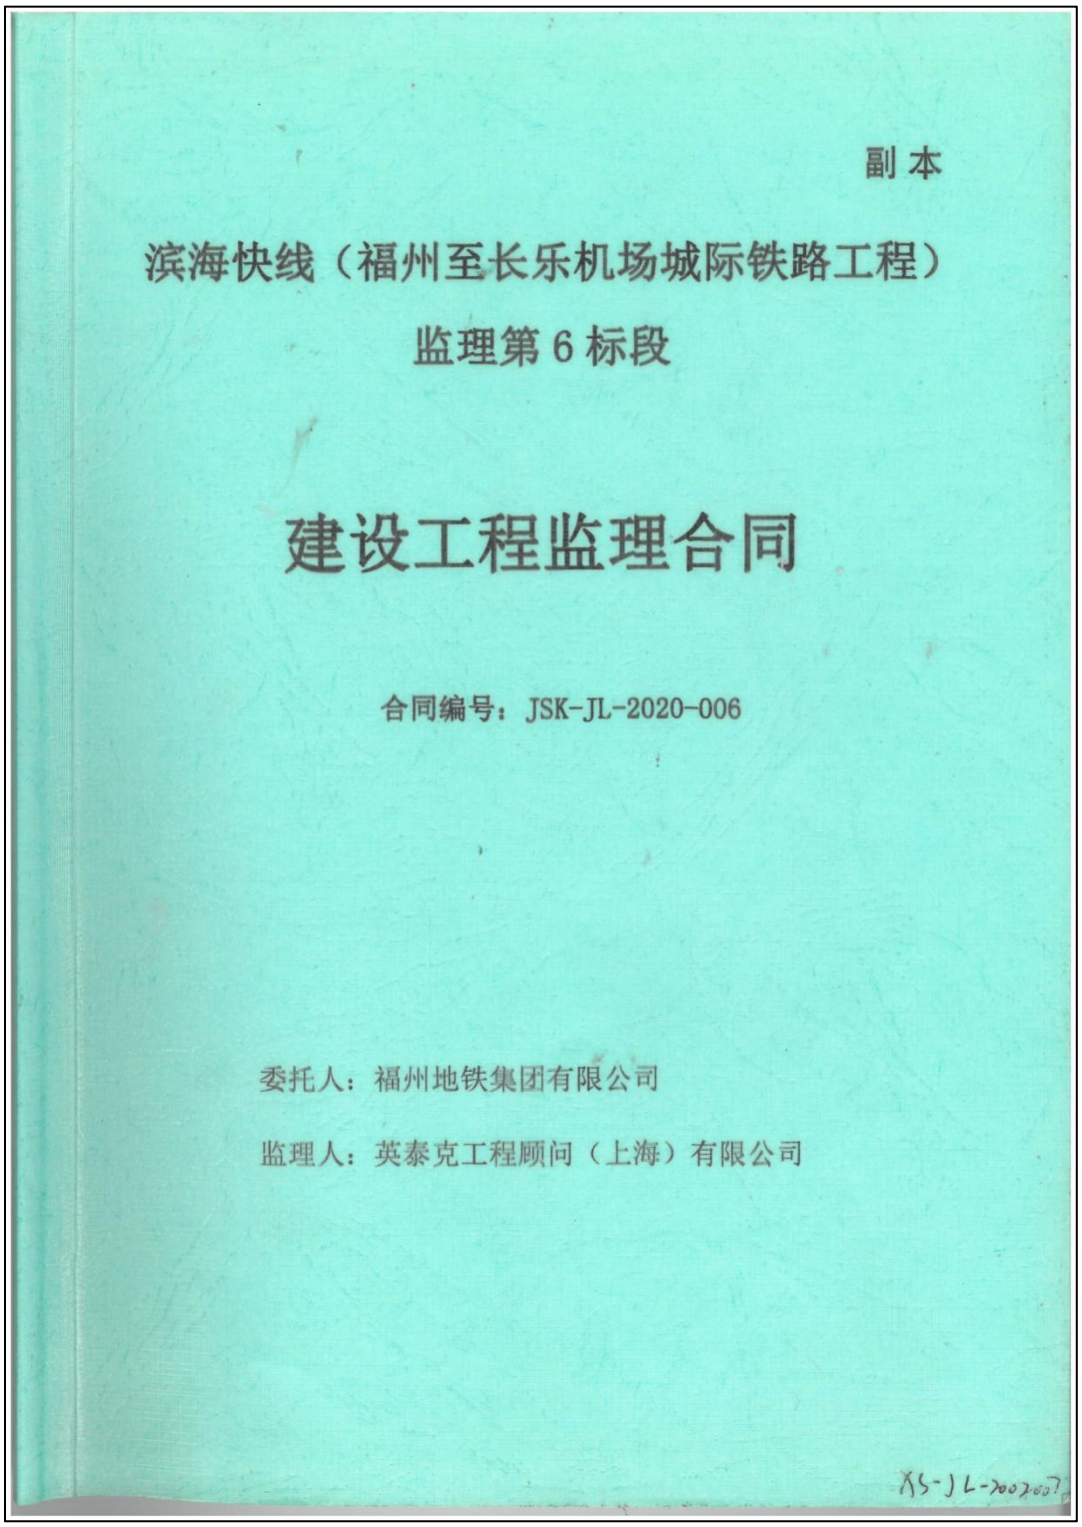

副本

滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）

监理第 6 标段

建设工程监理合同

合同编号：JSK-JL-2020-006

委托人：福州地铁集团有限公司

监理人：英泰克工程顾问（上海）有限公司

第一部分　合同协议书

委托人：福州地铁集团有限公司

监理人：英泰克工程顾问（上海）有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）第 6 标段（车站、区间工程）（监理）。

2. 工程地点：福州市。

3. 工程规模：福州至长乐机场城际铁路车站、区间工程、车辆段、停车场及基地工程起于起于福州火车站，终于大鹤站，线路总长约 62.32km，设站 15 座。全线设大鹤车辆段和东升停车场，主变电站 3 座（东升主变、首占主变、大鹤主变），新建控制中心 1 座。

4. 建筑安装工程费：暂按 279926 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录 A　相关服务的范围和内容

附录 B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：陈海兵，身份证号码：320981198010274733，注册号：31007507。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：人民币叁仟壹佰陆拾玖万捌仟伍佰柒拾贰元整（¥ 31698572 元）。

包括：

1. 建设工程施工阶段监理服务费：可将（有关收费指导意见）作为参考依据，本项目施工阶段监理服务费 31698572 元。

工程竣工结算时，以经有权部门最终审定的本工程施工结算总造价为本项目的监理服务费的计费额计取并参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670 号)中“1.0.8 施工监理服务收费的计费额”的相关规则确定和调整本项目的监理服务费的计费额，同时参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670 号)标准下浮 30%调整本项目的监理服务费。

2. 建设工程其他阶段监理服务费：可将《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670 号)下浮 30%作为参考依据。勘察阶段（若有）监理服务费 / 元；设计阶段（若有）监理服务费 / 元；保修阶段（若有）监理服务费 / 元。

六、期限

1. 施工阶段监理服务期：暂定为 1644 日历天，且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。

2. （1）勘察阶段服务期：/ 日历天。

（2）设计阶段服务期：/ 日历天。

（3）保修阶段服务期：_____日历天。

3. 其他相关服务期：_____日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2020 年 2 月 7 日。

2. 订立地点：福建省福州市台江区。

3. 本合同一式 拾 份，具有同等法律效力，委托人执 柒 份，监理人执 叁 份。

（本页无正文）

委托人：福州地铁集团有限公司（盖章）	监理人：英泰克工程顾问（上海）有限公司（盖章）
住所：福州市台江区达道路 156 号	住所：上海市浦东世纪大道 1500 号 1508 室
邮政编码：350009	邮政编码：200122
法定代表人	法定代表人
或授权代理人	或授权代理人：
开户银行：	开户银行： 中国银行上海漕河泾支行
账号：	账号： 457259250753
电话：0591-86308033	电话：021-68407646
传真：0591-86308065	传真：021-68407577
电子邮箱：	电子邮箱：Michael.chen@intertek.com

总监变更证明：施工许可证

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号 350100202203280101

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关 福州市城乡建设局

发证日期 2022年3月28日

建设单位	福州地铁集团有限公司		
工程名称	福州至长乐机场城际铁路F1线（滨海快线）滨海西站~大数据站区间		
建设地址	福州市长乐区滨海新城		
建设规模	51451.70平方米	合同价格	58911.46万元
合同工期	2019-12-31至2024-06-30		

参建单位

勘察单位	华东勘测设计院（福建）有限公司	项目负责人	郑有强
设计单位	中铁上海设计院集团有限公司	项目负责人	洪英维
施工单位	中交第三航务工程局有限公司	项目负责人	井光水
监理单位	英泰克工程顾问（上海）有限公司	总监理工程师	傅海政
工程总承包单位	无	项目经理	无
备注	滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）第3标段施工联合体主办方为中国交通建设股份有限公司，项目负责人为秦宝军。		

注意事项：
一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关检验施工许可证。
七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

福建省市政基础设施工程
竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

竣工项目审查

表1

工程名称	福州至长乐机场城际铁路F1线（滨海快线）滨海西站~大数据站区间	工程地址	福州市长乐区滨海新城
建设单位	福州地铁集团有限公司		
勘察单位	华东勘测设计院（福建）有限公司	结构形式	盾构区间隧道
设计单位	中铁上海设计院集团有限公司	工程规模	上行线全长3099.533m 下行线全长3099.542m
监理单位	英泰克工程顾问（上海）有限公司	开工日期	2020年6月6日
施工单位	中交第三航务工程局有限公司	竣工日期	2024年1月18日
施工许可证号	350100202203280101	总造价	58911.46万元

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 （一） 道路工程 1、路基部位 2、结构层部位 3、路面部位 4、附属工程 （二）桥梁工程 1、基础部位 2、下部结构 3、上部结构 4、桥面结构 5、附属工程 （三）排水工程 1、雨水工程 2、污水工程 （四）其他专业 1、矿山法隧道工程 2、盾构法隧道工程 3、车站工程 4、其他工程	已完成福州至长乐机场城际铁路F1线（滨海快线）滨海西站~大数据站区间单位工程，包含：区间整体土建工程子单位工程、附属土建工程子单位工程。

续表 1

二、完成合同约定情况 （一）总包合同约定 （二）分包合同约定 （三）专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容。
三、技术档案和施工管理资料 （一）建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 （二）监理技术档案和管理资料 （二）施工技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全、检查合格。
四、进场试验报告 （一）主要建筑材料 （二）构配件 （三）设备 （四）工程质量检测和功能性试验资料	所有进场试验报告齐全、符合要求；工程质量检测和功能性试验资料齐全，符合要求。
五、质量评价文件 （一）勘察单位质量检查报告 （二）设计单位质量检查报告 （三）施工单位竣工报告 （四）监理单位质量评估报告	质量评价文件齐全，符合要求。
六、工程质量保修书 （一）总、分包单位 （二）专业承包单位	已签署工程质量保修书。
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	已按合同约定支付工程款。
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	已全部整改完毕。
审查结论： 该工程按设计要求和规范要求施工，达到设计要求，工程施工质量合格，各项质保资料基本齐全，验收资料编制完整、齐全，同意竣工验收。 建设单位工程负责人：林继炯 2024 年 1 月 18 日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

（一）领导层

表 2

主　任	林家全
副主任	王振堃、潘宏、祁小兵、陈星
成　员	陈锋、肖昌南、井光北、傅海波、洪英维、郑清强、林继炳

（二）专业组

验收专业组	组　长	组　员
盾构法隧道工程	陈锋	林继炳、肖昌南
矿山法隧道工程		
车站工程		
档案		
其他		

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

（一）建设单位主持验收会议

（二）施工单位介绍施工情况

（三）监理单位介绍监理情况

（四）各验收专业组核查质保资料、并到现场检查

（五）各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明结论，建设单位做好记录

（六）验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

（七）其他单位发言

工 程 质 量 评 定

表 3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
盾构法隧道工程			
档案		共核查 8 项， 其中符合要求 8 项， 经鉴定符合 要求 8 项 结论：合格	检查总量 4 项 观感好 4 项 观感一般 0 项 观感差 0 项 结论：合格

单位工程评定等级

合格

（公章）

建设单位工程负责人：林滨(13)

2024年 1 月 13 日

执行标准		
	盾构法隧道工程	《盾构法隧道施工及验收规范》GB50446 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 《地下防水工程质量验收规范》GB50208 《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T50299 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204
	档案	《城市轨道交通工程档案管理规范》DB35-T 1833-2019

续表 3

验收机构意见	建设单位	同意验收
	勘察单位	同意验收
	设计单位	同意验收
	施工单位	同意验收
	监理单位	同意验收

竣工验收结论：

验收通过

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目经理：
（签字）	（签字）	（签字）	（签字）	（签字）
2024年1月18日	2024年1月18日	2024年1月18日	2024年1月18日	2024年1月18日

工程内容（盾构段长约 3099.533m，隧道断面外径 8.3m）施工证明文件：工程图纸



福州至长乐机场城际铁路工程

施工图设计

第五篇　区间

第十一册　滨海西站～大数据站（盾构区间）

第一分册　区间隧道

第一部分　区间隧道

总体单位：广州地铁设计研究院股份有限公司

设计单位：中铁上海设计院集团有限公司

工程设计证书：综合甲级　编号：A131000227

二〇二〇年九月　福州

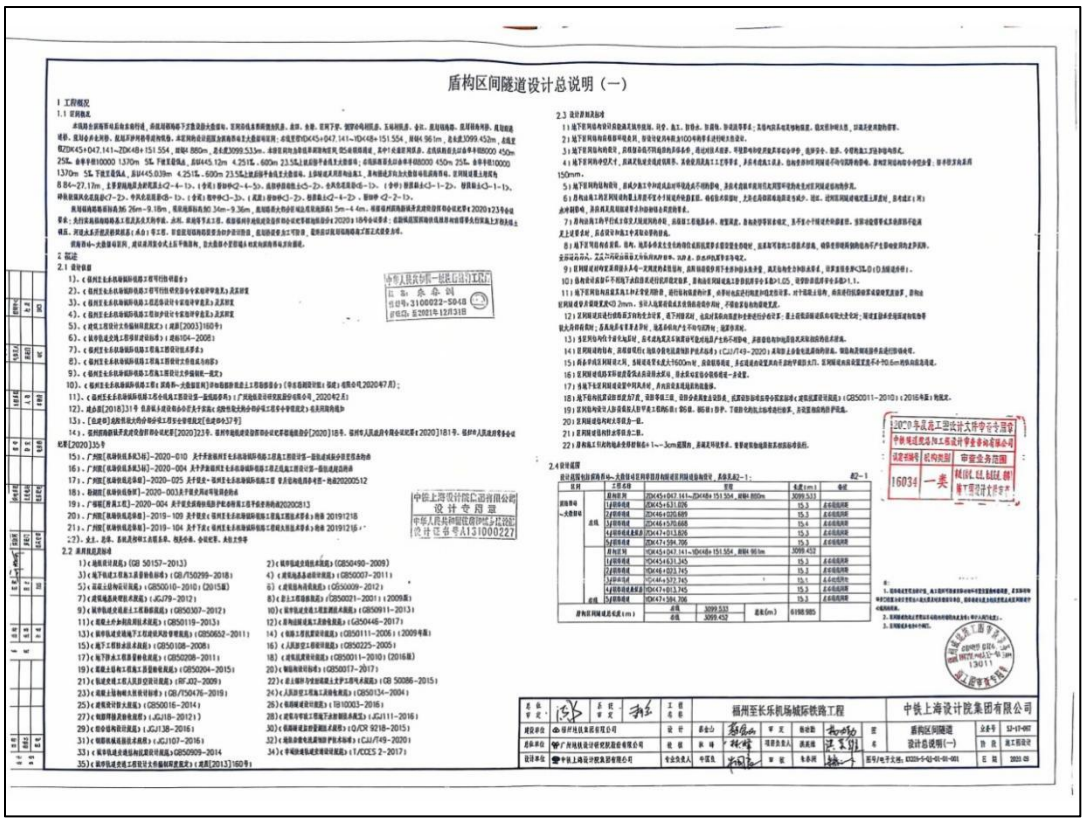

盾构区间隧道设计总说明（一）

盾构区间隧道设计总说明（一）

1 工程概况

1.1 区间概况

本线路出滨海西站后向东南行进，沿规划福海路下方敷设接大数据站。区间沿线东西两侧为民房、农田、鱼塘。区间下穿、侧穿沿岭村民房、五裕村民房、金江、规划福海路、规划福海河桥、规划南港道桥、规划金井北河桥、规划五沙河桥等建构筑物。本区间始设计范围为滨海西站至大数据站区间：右线里程YDK45+047.141～YDK48+151.554，短链4.961m，总长度3099.452m，左线里程ZDK45+047.141～ZDK48+151.554，短链4.880m，总长度3099.533m。本段区间均为单线单洞盾构区间，设5处联络通道，其中1处兼区间泵房。左线纵断面先以曲率半径8000 450m 25‰、曲率半径10000 1370m 5‰下坡至最低点，后以445.12m 4.251‰、600m 23.5‰上坡后接平曲线至大数据站；右线纵断面先以曲率半径8000 450m 25‰、曲率半径10000 1370m 5‰下坡至最低点，后以445.039m 4.251‰、600m 23.5‰上坡后接平曲线至大数据站。主体隧道采用盾构法施工，盾构掘进方向为大数据站往滨海西站。区间隧道覆土埋深约8.84～27.17m，主要穿越地层为淤泥质土<2-4-1>、（含泥）粉细砂<2-4-5>、残积砂质粘性土<5-2>、全风化花岗岩<6-1>、（含砂）粉质黏土<3-1-2>、粉质黏土<3-1-1>、碎块状强风化花岗岩<7-2>、中风化花岗岩<8-1>、（含泥）粗中砂<3-3>、（泥质）粉细砂<3-2>、粉质黏土<2-4-2>、粉细砂<2-2-1>。

规划福海路路面标高为6.26m～9.18m，现状地面标高为0.34m～9.36m，规划路面大部分区域比现状地面高1.5m～4.4m。根据福州滨海新城开发建设指挥部会议纪要【2020】23号会议要求：先行实施福海路路基工程及其交叉的市政、水利、绿地等节点工程。根据福州市地铁建设指挥部会议纪要都地铁指会【2020】18号会议要求：在新城范围滨海快线推准构首需要先行实施上方相关竖土碾压、河道水系开挖及桥梁桩基（承台）等工程。目前规划福海路提资为初步设计阶段，规划都提资为工可阶段，最终应以规划福海路施工图正式提资为准。

滨海西站～大数据站区间，建议采用复合式土压平衡盾构，自大数据小里程端头始发向滨海西站方向掘进。

2.3 设计原则及标准

1）地下区间结构设计应能满足

2）地下区间结构应根据环境类

3）地下区间结构的设计，应根

4）地下区间的净空尺寸，应满

150mm。

5）地下区间的结构设计，应成

6）盾构法施工的区间隧道的覆

水冲刷影响，并应满足规划航道要

7）盾构法施工的平行或立体交

足上述要求时，应在设计和施工中

8）地下区间结构在荷载、结构

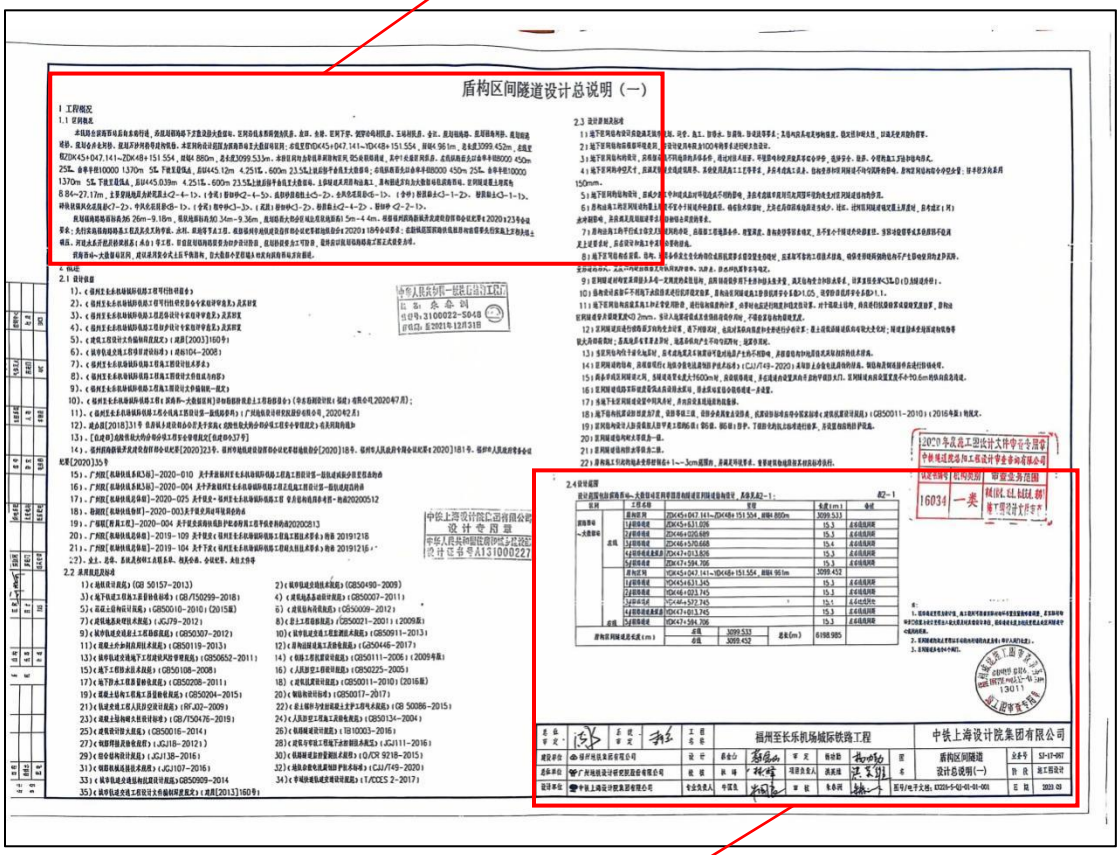

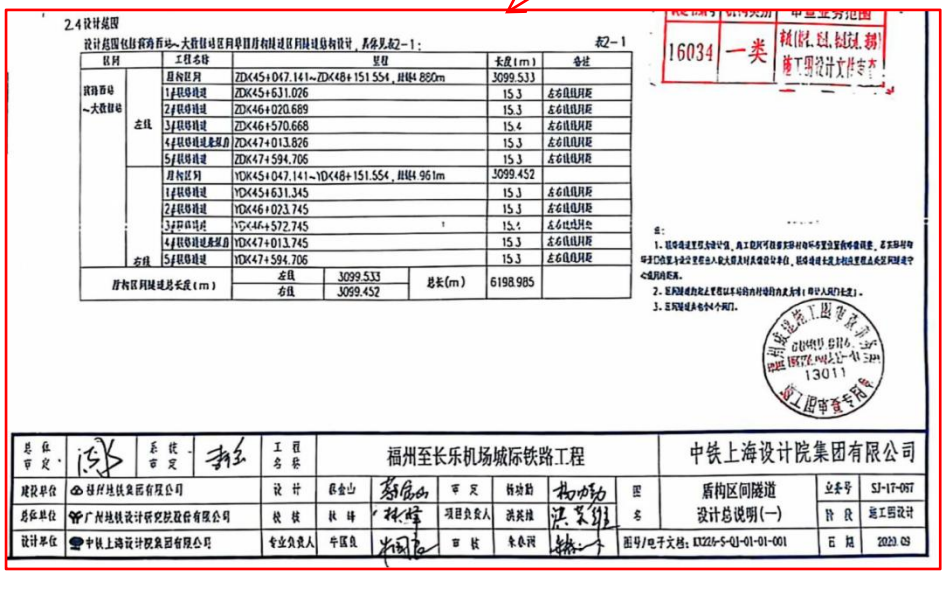

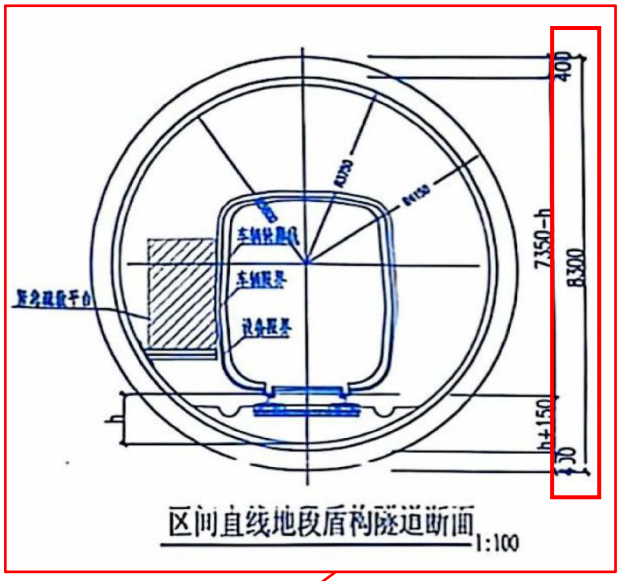
400
8300
7350-h
h+150
300
区间直线地段盾构隧道断面 1:100

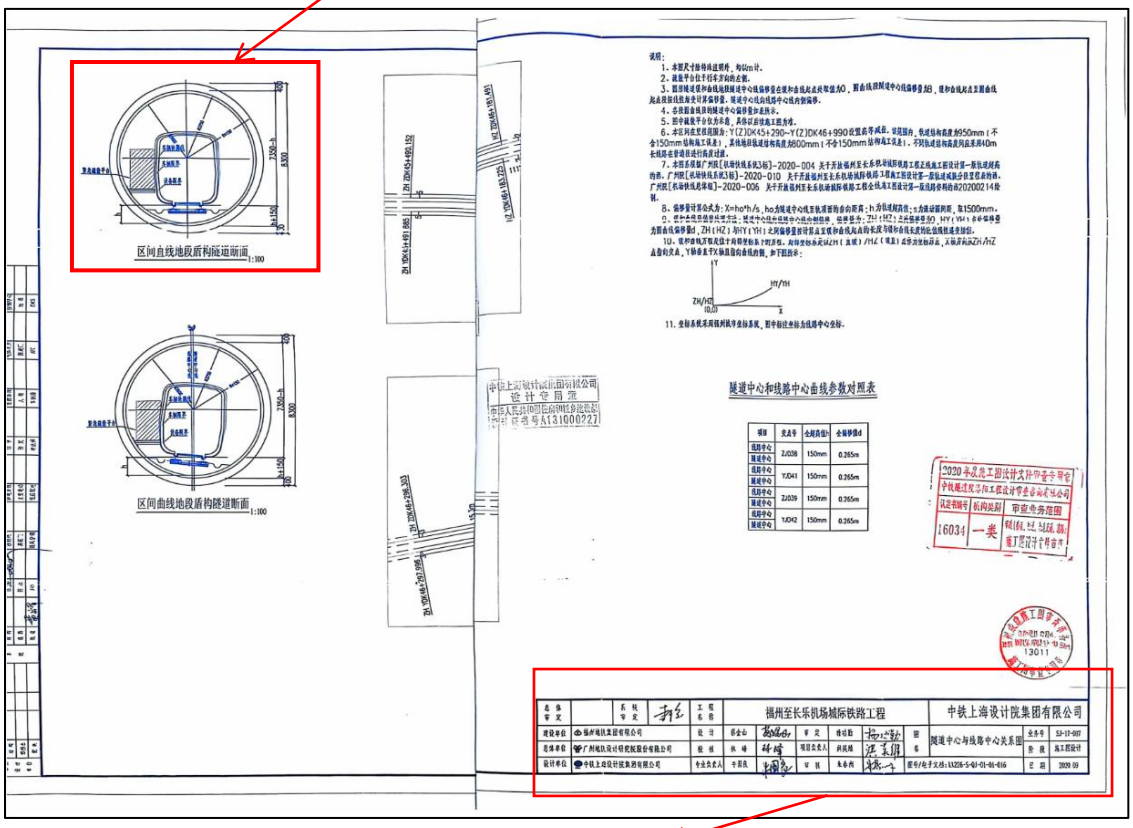
区间直线地段盾构隧道断面 1:100
区间曲线地段盾构隧道断面 1:100
隧道中心和线路中心曲线参数对照表
福州至长乐机场城际铁路工程
中铁上海设计院集团有限公司
隧道中心与线路中心关系图


福州至长乐机场城际铁路工程
中铁上海设计院集团有限公司
隧道中心与线路中心关系图
SJ-17-007
施工图设计
2020.09

履约评价

2020 年上半年：

福州地铁集团有限公司文件

榕地铁安〔2020〕128 号

福州地铁集团有限公司关于在建工程 2020 年上半年施工、监理单位信誉考评情况的通报

各施工、监理单位：

为综合体现 2020 年上半年福州地铁在建工程各施工管理情况，地铁集团于 2020 年 6 月 22 日-7 月 3 日组织相关部门，从人员到岗、进度节点目标、过程标准化、日常隐患排查治理、财务管理和不良影响等方面，对各施工、监理单位的管理情况进行了全面考核，现将考评情况通报如下：

一、基本情况

— 1 —

本次考评共覆盖了1号线（二期）、4号线、5号线、6号线、滨海快线所有在建工程的55个标段或工区单位（含风水电、铺轨），以及22个监理单位。结合结构渗漏水、土方回填质量、道路平整度提升等专项整治，重点检查了深基坑、高支模、大型设备、监测、标准化管理、轨行区管理等情况。各条线路安全质量总体受控，但部分单位安全质量管理还有待提高，现场存在问题较多（施工、监理单位具体问题见隐患排查系统履约考核部分）。

其中，6号线土建施工1标1工区潘墩站道路、井盖提升整治情况较好，举办了现场观摩会；1标6工区举办了安全月启动仪式暨应急演练观摩会。4号线土建施工2标7工区、8工区安全管理不到位，二季度发生了龙门吊倾覆和起重吊装事故。

二、考评结果

根据《福州地铁集团有限公司合同履约考评管理办法（2017年修订版）》，结合《福州地铁集团有限公司关于调整在建工程2020年一季度信誉考评工作的通知》，2020年上半年施工、监理单位各线路各标段和监理单位的考评结果如下：

1号线二期2020年上半年施工单位得分

标段及单位	人员到岗（8分）	工程进度（20分）	安全质量（40分）	过程标准化（15分）	财务管理（7分）	不良影响（10分）	总分	排名
土建施工4标（中铁一局）	5.6	13	34.70	12	5.25	9.7	80.25	1
土建施工1标（中铁八局）	4.4	13	34.71	11.85	5.25	8.9	78.11	2
土建施工2标（中铁四局）	8	6	33.93	12.9	5.25	7.7	73.78	3
土建施工3标（中铁十七局）	5.6	9	33.07	11.85	5.25	8.9	73.67	4

滨海快线2020年上半年施工单位得分

工区	人员到岗（8分）	工程进度（20分）	安全质量（40分）	过程标准化（15分）	财务管理（7分）	不良影响（10分）	总分	排名
3标5工区（中交四航局）	5.6	20	37.90	13.65	4.83	10	91.98	1
滨海路配套项目(中铁四局)	6	20	36.93	13.35	6.37	9.2	91.85	2
2标3工区（中铁二十四局）	5.6	20	37.30	13.17	4.83	10	90.9	3
2标2工区（中铁十一局）	5.6	20	36.20	13.43	4.83	10	90.06	4
3标4工区（中交三公局）	5.6	20	37.50	12	4.83	10	89.93	5
2标1工区（中铁十二局）	5.6	20	35.90	13.5	4.83	10	89.83	6
3标2工区（中交二航局）	5.6	20	36.10	12.9	4.83	10	89.43	7
2标4工区（中铁十七局）	5.6	20	35.90	11.66	4.83	10	87.99	8
1标3工区（中铁八局）	5.2	20	31.40	12.12	4.83	10	83.85	9

6、5、4及1号线二期、滨海快线2020年上半年监理单位得分

序号	线路名称	监理标段	监理单位	人员与设备（6分）	监理管理考核（44分）	过程隐患排查（20分）	不良影响（10分）	监理效果（20分）	总分
1	4号线	监理5标	中铁华铁	5.40	41.80	20.00	7.50	17.27	91.97
2	5号线	监理5标	北京正远、福州兢成	6.00	39.01	19.30	9.20	18.11	91.62
3	滨海快线	监理2标	北京四方	5.40	39.45	18.94	10.00	16.77	90.56
4	滨海快线	监理6标	英泰克	5.10	37.84	19.64	10.00	17.89	89.47

22	4号线	监理4标	江苏建科、驿涛管理	6.00	0.00	19.07	0.00	13.87	[illegible]

三、考核意见

根据以上考核结果，我司授予中铁一局福州市轨道交通1号线二期土建施工04标项目部“福州市轨道交通1号线二期流动红旗”；授予中建海峡福州市轨道交通4号线土建施工2标5工区项目部“福州市轨道交通4号线流动红旗”；授予中铁四局福州市轨道交通5号线土建施工1标2工区项目部“福州市轨道交通5号线流动红旗”；授予中铁十一局福州市轨道交通6号线土建施工1标6工区项目部“福州市轨道交通6号线流动红旗”；授予中交四航局福州市滨海快线土建施工3标5工区项目部“福州市轨道交通滨海快线流动红旗”。

四、下一步的工作要求

目前，1号线二期开通试运营在即，5号线、6号线已进入附属结构、铺轨、风水电施工，4号线、滨海快线土建工程处于施工高峰。时值汛期和台风季节，在建工程项目点多面广、部分工点专业施工相互交叉，且个别工点工期压力大，安全生产压力较大。为确保安全生产、工程质量，必须进一步加强以下工作：

1.时值汛期和台风季节，安全风险高、危害大，易造成各类事故频发。要求各单位严格按照我司《关于进一步强化建设工程汛期施工安全生产工作要求的通知》（榕地铁安〔2020〕89号）的要求，强化24小时防汛值班和领导带班制度，及时掌握气象

预报信息，认真分析查找涉水工程安全生产的薄弱环节，严格按设计要求做好基坑周边防汛墙和缺口处砂袋设置的工作，制定各项汛期安全生产工作措施和应急预案，并做好防汛应急演练工作，确保发生险情时能够及时、有效地进行应急处置，保障工程安全。

2. 各单位应严格落实《福州地铁集团有限公司关于进一步规范土方填筑施工的通知》（榕地铁安[2020]65号）的文件要求，从施工准备、原材料、施工工艺、检测验收等方面着手，进一步规范福州市轨道交通工程土方填筑施工，提升土方填筑施工质量。

3. 各单位要进一步工程主体结构渗漏水缺陷整治流程，结合本次考评建立的台账，日常参建各方，特别风水电等下道工序的单位应加强排查，根据检查结果对台账进行更新；原则上首次台账发现的渗漏，以及每上半个月发现的渗漏，需在每月底底前完成；在每月3日之前必须完成上个月的新增渗漏水点统计，每月初地铁公司进行汇总并通报。

4. 各单位要根据福州市城区道路平整提升专项行动工作方案和《关于做好市区道路井盖设施日常巡查和专项整治工作的通知》（榕城管委综[2020]187号）的文件精神，在巩固前期地铁站周边交通导改道路平整提升专项行动的活动成果基础上，进一步提升交

通导改道路施工质量，重点消除路面及人行道不平整、路面与井盖通道口接茬高差，实现路面“不跳、不响、不积水”目标。

5. 土建、风水电、装修、铺轨施工等专业严格按程序进行工前标准化验收，未经验收不得擅自开工，要结合各专业的特点，从安全文明施工、工地建设、工艺等三方面推进标准化建设。继续深化落实历次标准化观摩会的亮点做法，因地制宜，全面推进在建工程标准化，提升福州地铁标准化建设水平。

6. 各施工、监理单位要深刻汲取近期起重吊装事故的经验和教育，严格按照福州地铁相关起重吊装和大型设备相关管理办法，做好设备及相关特种人员的管理，加强人员安全交底和教育，严把现场吊装行为安全关，切实确保现场起重吊装的安全可控。

福州地铁集团有限公司

2020 年 7 月 13 日

福州地铁集团有限公司办公室　　2020 年 7 月 13 日印发

2020 年第四季度暨年度：

福州地铁集团有限公司文件

榕地铁安〔2021〕18 号

福州地铁集团有限公司
关于在建工程 2020 年四季度暨年度施工、监理单位信誉考评情况的通报

各施工、监理单位:

为综合体现 2020 年四季度福州地铁在建工程各施工管理情况，福州地铁集团于 2020 年 12 月 18 日-12 月 31 日组织相关部门，通过结合现场、核对内业资料等手段，从人员到岗、进度节点目标、过程标准化、日常隐患排查治理、财务管理和不良影响等方面，对 4 号线、5 号线、6 号线、滨海快线各施工、监理单位的管理情况进行了全面考核，按照《福州地铁集团有限公司合

同履约考评管理办法（2017年）修订版》要求，形成了2020年四季度考评结果，同时汇总了2020年上半年、三、四季度考评情况，形成了2020年年度考评；现将考评情况通报如下：

一、基本情况

本次考核共覆盖了4号线、5号线、6号线、滨海快线所有在建工程的57个土建标段或工区单位，以及24个监理单位。重点检查了关键节点条件核查，深基坑开挖、高支模、大型设备、监测、标准化管理、主体混凝土渗漏情况、消防安全情况、盾构管片安装质量、轨行区管理情况、平行检测情况、隐蔽验收记录情况、根治农民工工资欠薪冬季专项行动执行情况等情况。各条线路安全质量总体受控，但部分单位安全质量管理还有待提高，现场存在问题较多（施工、监理单位具体问题见隐患排查系统履约考核部分）。

二、季度考评结果

根据《福州地铁集团有限公司合同履约考评管理办法（2017年修订版）》，2020年四季度施工单位各线路各标段和监理单位的考评结果如下（具体打分详见附件1）：

1.4号线2020年四季度施工单位综合排名

第一名：土建2标5工区（中建海峡）；第二名：土建3标10工区（中交三航局）；第三名：土建3标11工区（中交一公局）；第四名：土建1标4工区（上海隧道）；第五名：土建2标6工区（中建海峡）；第六名：土建3标车辆段工区（中交四航局）；第七名：土建2标8工区（中建一局）；第八名：土建

2标1工区（中铁八局）；第六名：土建1标机电工区（中铁十二局）；第七名：土建1标2工区（中铁十九局）；第八名：土建1标3工区（中铁十七局）；第九名：土建3标2工区（水电一局）；第十名：土建2标3工区（中铁三局）；第十一名：土建2标车辆段咽喉工区（中铁三局）；第十二名：土建2标5工区（中铁上海局）；第十三名：土建1标4工区（中铁二十四局）。

4.滨海快线2020年四季度施工单位排名

第一名：土建2标2工区（中铁十一局）；第二名：土建1标1工区（中铁上海局）；第三名：土建1标4工区（中铁四局）；第四名：土建3标1工区（中交三航局）；第五名：土建2标1工区（中铁十二局）；第六名：土建3标5工区（中交四航局）；第七名：土建2标3工区（中铁二十四局）；第八名：土建1标3工区（中铁八局）；第九名：土建2标4工区（中铁十七局）；第十名：土建1标停车场工区（中铁六局）；第十一名：土建3标4工区（中交三公局）；第十二名：土建3标2工区（中交二航局）；第十三名：土建1标2工区（中铁七局）。

5.6、5、4及快线2020年四季度监理单位排名

第一名：4号线监理5标（中铁华铁）；第二名：滨海快线监理6标（英泰克）；第三名：5号线监理5标（北京正远、福州兢成）；第四名：4号线监理3标（西安铁一院、福州诺成）；第五名：滨海快线监理5标（上海同济）；第六名：5号线铺轨监理1标（上海先行）；第七名：滨海快线监理3标（上海建科）；第八名：5号线铺轨监理2标（甘肃铁科）；第九名：6号线监

日环境。

7. 要求各参建单位高度重视应急管理工作，尤其是在深基坑开挖、盾构始发和接收、联络通道开挖等高风险阶段施工前，要组织人员开展有针对性的应急演练。各总包单位加强对各自应急救援队伍和应急物资设备的管理，落实日常培训和操练计划，推广应急系统使用，确保发生险情时能够及时、有效地进行应急处置，保障工程安全。

附件：1. 2020 年四季度施工、监理单位考评得分

2. 2020 年度施工、监理单位综合得分

福州地铁集团有限公司

2021 年 1 月 19 日

抄送：投发部、财务部、合约部、安监部、各项目部。

福州地铁集团有限公司办公室　　2021 年 1 月 19 日印发

— 10 —

附件 1

2020 年四季度施工、监理单位考评得分

4 号线 2020 年四季度施工单位得分

工区	人员到岗(8分)	工程进度（20分）	安全质量		过程标准化(15分)	财务管理（7分）	不良影响（10分）	总分	名次
			过程隐患排查治理（20分）	安全文明质量（20分）					
土建2标5工区（中建海峡）	8	19.6	17.33	18.79	12.45	5.6	10	91.78	1
土建3标10工区（中交三航局）	8	18.4	15.49	19.07	12.9	6.3	10	90.16	2
土建3标11工区（中交一公局）	8	20	14.62	17.99	13.35	6.3	9.7	89.96	3
土建1标4工区（上海隧道）	7.6	19	16.62	17.54	12.75	6.3	10	89.81	4
土建2标6工区（中建海峡）	8	18.2	18.00	17.54	12.3	5.6	10	89.64	5
土建3标车辆段工区（中交四航局）	8	19.2	16.58	17.36	12.3	6.3	9.7	89.44	6
土建2标8工区（中建一局）	8	18.6	18.57	17.42	12.3	5.6	8.5	88.99	7
土建3标9工区（中交二航局）	8	17.6	14.19	19.08	13.35	6.3	9.2	87.73	8
土建1标3工区（上海隧道）	7.2	19.4	14.37	16.85	13.05	6.3	9.5	86.67	9
土建2标7工区（中建五局）	8	18.8	17.71	16.45	12	5.6	7.9	86.46	10

3标2工区（中交二航局）	7.6	20	15.83	17.60	12.6	5.32	9	87.95	12
1标2工区（中铁七局）	7.6	20	15.15	15.70	12.75	5.18	8.5	84.88	13

6、5、4及快线2020年第四季度监理单位得分

序号	线路名称	监理标段	监理单位	人员与设备（6分）	监理管理考核（44分）	过程隐患排查（20分）	不良影响（10分）	监理效果（20分）	总分
1	4号线	监理5标	中铁华铁	6.00	37.84	20.00	9.20	17.79	90.83
2	滨海快线	监理6标	英泰克	5.70	37.73	19.29	9.50	18.02	90.23
3	5号线	监理5标	北京正远、福州兢成	6.00	37.57	18.38	9.70	17.95	89.59
4	4号线	监理3标	西安铁一院、福州诺成	6.00	36.30	20.00	9.00	18.14	89.44
5	滨海快线	监理5标	上海同济	5.70	36.85	18.43	10.00	18.20	89.18
6	5号线	铺轨1标	上海先行	6.00	34.87	19.63	10.00	18.52	89.01
7	滨海快线	监理3标	上海建科	5.70	37.07	18.17	10.00	17.98	88.92
8	5号线	铺轨2标	甘肃铁科	6.00	35.04	19.00	10.00	18.43	88.47
9	6号线	监理2标	山西中煤、福建合诚	6.00	38.39	17.80	8.40	17.66	88.25
10	5号线	监理6标	天津成套	5.40	35.64	18.47	10.00	18.38	87.89
11	滨海快线	监理2标	北京四方	5.70	35.42	19.50	8.90	18.32	87.83
12	4号线	监理6标	四川铁科、福建易联升	5.40	35.42	17.90	9.70	17.94	86.36
13	滨海快线	监理4标	四川元丰	5.70	32.56	19.39	9.50	18.46	85.61

附件 2

2020 年度施工、监理单位综合得分

4 号线 2020 年度综合得分排名

工区	上半年换算分	第三季度换算分	第四季度换算分	年度综合得分	年度综合排名
土建 2 标 5 工区（中建海峡）	4	3	3	10	1
土建 3 标车辆段工区（中交四航局）	3.8	2.85	2.25	8.9	2
土建 3 标 10 工区（中交三航局）	2.8	2.4	2.85	8.05	3
土建 1 标 4 工区（上海隧道）	3.4	1.95	2.55	7.9	4
土建 3 标 9 工区（中交二航局）	3.6	2.25	1.95	7.8	5
土建 1 标 3 工区（上海隧道）	3.2	2.7	1.8	7.7	6
土建 2 标 6 工区（中建海峡）	2.6	2.1	2.4	7.1	7
土建 1 标停车场工区（上海隧道）	3	2.55	1.5	7.05	8
土建 3 标 11 工区（中交一公局）	2.4	1.65	2.7	6.75	9
土建 2 标 8 工区（中建一局）	2	1.8	2.1	5.9	10
土建 1 标 1 工区（上海隧道）	2.2	1.5	1.5	5.2	11
土建 2 标 7 工区（中建五局）	2	1.5	1.65	5.15	12
土建 1 标 2 工区（上海隧道）	2	1.5	1.5	5	13

5 号线 2020 年度综合得分排名

工区	上半年换算分	第三季度换算分	第四季度换算分	年度综合得分	年度综合排名
土建 1 标 2 工区（中铁四局）	4.00	3.00	2.70	9.70	1

上海局）					
土建1标2工区（中铁十九局）	2	1.5	2.1	5.6	8
土建2标3工区（中铁三局）	2	1.95	1.65	5.6	8
土建1标3工区（中铁十七局）	2	1.5	1.95	5.45	10
土建1标4工区（中铁二十四局）	2	1.8	1.5	5.3	11
土建2标车辆咽喉工区（中铁三局）	2	1.5	1.5	5	12

滨海快线2020年度综合得分排名

工区	上半年换算分	第三季度换算分	第四季度换算分	年度综合得分	年度综合排名
3标5工区（中交四航局）	4	3	2.25	9.25	1
2标2工区（中铁十一局）	3.4	2.7	3	9.1	2
2标3工区（中铁二十四局）	3.6	1.95	2.1	7.65	3
3标4工区（中交三公局）	3.2	2.85	1.5	7.55	4
2标1工区（中铁十二局）	3	1.65	2.4	7.05	5
2标4工区（中铁十七局）	2.6	2.25	1.8	6.65	6
3标2工区（中交二航局）	2.8	1.8	1.5	6.1	7
1标3工区（中铁八局）	2.4	1.5	1.95	5.85	8

各线路监理单位2020年度综合得分排名

线路名称	监理标段	监理单位	上半年换算分	第三季度换算分	第四季度换算分	年度综合得分	年度综合排名
4号线	监理5标	中铁华铁	4	3	3	10	1
滨海快线	监理6标	英泰克	3.4	2.85	2.85	9.1	2

2021 年第一季度：

福州地铁集团有限公司文件

榕地铁安〔2021〕69 号

关于在建工程 2021 年一季度施工、监理单位综合考评情况的通报

各施工、监理单位:

为综合体现 2021 年一季度福州地铁在建工程各施工管理情况，福州地铁集团于 2021 年 3 月 16 日-31 日组织相关部门，通过结合现场、核对内业资料等方式，从人员到岗、进度节点目标、过程标准化、日常隐患排查治理、财务管理和不良影响等方面，对 4 号线、5 号线、6 号线、滨海快线各施工、监理单位的管理情况进行了全面考核，按照《福州地铁集团有限公司合同履约考评管理办法（2017 年）修订版》要求，形成了 2021 年一季度考评结果，现

将情况通报如下：

一、4号线2021年一季度考评结果

1.施工单位综合排名

第一名：土建1标3工区（上海隧道）；第二名：土建3标10工区（中交三航局）；第三名：土建2标6工区（中建海峡）；第四名：土建2标8工区（中建一局）；第五名：土建3标车辆段工区（中交四航局）；第六名：土建2标5工区（中建海峡）；第七名：土建2标7工区（中建五局）；第八名：土建1标4工区（上海隧道）；第九名土建1标2工区（上海隧道），第十名：土建1标停车场工区（上海隧道）；第十一名：土建3标9工区（中交二航局）；第十二名：土建3标11工区（中交一公局）；第十三名土建1标1工区（上海隧道）。

2.监理单位综合排名

第一名：土建监理5标（中铁华铁）；第二名：土建监理3标（西安铁一院、福州诺诚）；第三名：土建监理4标（江苏建科、驿涛管理）；第四名：土建监理2标（江苏盛华、台州建设）；第五名：土建监理1标（浙江明康、中龙建）；第六名：土建监理6标（四川铁科、亿联升）。

二、5号线2021年一季度考评结果

1.施工单位综合排名

第一名：土建1标机电工区（中铁二局）；第二名：土建3标2工区（中铁十二局）；第三名：土建1标2工区（中铁四局）；

2. 监理单位综合排名

第一名：土建监理 6 标（英泰克）；第二名：土建监理 3 标（上海建科）；第三名：土建监理 2 标（北京四方）；第四名：土建监理 4 标（四川元丰）；第五名：土建监理 5 标（上海同济）；第六名：土建监理 7 标（重庆联盛）；第七名：土建监理 1 标（上海建通）。

附件：2021 年一季度施工、监理单位考评得分

福州地铁集团有限公司

2021 年 4 月 28 日

（联系人：陈志　电话：18396191866）

福州地铁集团有限公司办公室　　2021 年 4 月 28 日印发

滨海快线2021年一季度监理组排名

监理标段	监理单位	人员与设备（6分）	监理管理考核（44分）	过程隐患排查（20分）	不良影响（10分）	监理效果（20分）	总分	名次
土建监理6标	英泰克	4.5	35.2	19.90	10	17.89	87.49	1
土建监理3标	上海建科	5.70	34.32	20.00	9.50	17.73	87.25	2
土建监理2标	北京四方	6.00	32.56	20.00	8.20	17.42	84.18	3
土建监理4标	四川元丰	5.70	33	20.00	7.40	18.00	84.10	4
土建监理5标	上海同济	5.70	29.92	19.86	9.00	17.21	81.68	5
土建监理7标	重庆联盛	5.1	29.92	18.20	10	17.34	80.56	6
土建监理1标	上海建通	5.10	27.72	19.75	8.00	17.25	77.82	7

2021 年第二季度：

福州地铁集团有限公司文件

榕地铁安〔2021〕150 号

关于轨道交通滨海快线 2021 年二季度施工、监理单位综合考评情况的通报

各施工、监理单位：

为综合体现 2021 年二季度轨道交通滨海快线各施工管理情况，福州地铁集团于 2021 年 7 月 2 日-12 日组织相关部门，通过结合现场、核对内业资料等方式，从投资进度、安全质量、合同信息和社会影响等方面，对滨海快线各施工、监理单位的管理情况进行了全面考核，按照地铁集团相关考核办法的要求，形成了滨海快线 2021 年二季度考评结果，现将情况通报如下：

一、土建施工单位（工区）考核

第一名：土建 2 标 2 工区（中铁十一局）；第二名：土建 3 标 1 工区（中交三航局）；第三名：土建 2 标 1 工区（中铁十二局）；第四名：福海路配套项目（中铁四局）；第五名：土建 1 标 3 工区（中铁八局）；第六名：土建 1 标 4 工区（中铁四局）；第七名：土建 1 标停车场工区（中铁六局）；第八名：土建 1 标 2 工区（中铁七局）；第九名：土建 3 标 5 工区（中交四航局）；第十名：土建 2 标 3 工区（中铁二十四局）；第十一名：土建 1 标 1 工区（中铁上海局）；第十二名：土建 2 标 4 工区（中铁十七局）。

二、土建施工单位（标段）考核

第一名：中国铁建；第二名：中国交建；第三名：中国中铁。

三、土建监理单位考核

第一名：土建监理 6 标（英泰克）；第二名：土建监理 2 标（北京四方）；第三名：福海路配套工程监理（中咨工程）；第四名：土建监理 4 标（四川元丰）；第五名：土建监理 3 标（上海建科）；第六名：土建监理 5 标（上海同济）；第七名：土建监理 7 标（重庆联盛）；第八名：土建监理 1 标（上海建通）。

四、相关事项

1. 根据相关管理办法，单线路季度参与排名的施工单位在 5（不含）-14 个（含）的，对前两名且季度综合评分高于 90 分（含 90 分）的施工单位颁发流动红旗。根据以上考核结果，授予中铁十一局福州市轨道交通滨海快线土建施工 2 标 2 工区项目部“福州市轨道交通滨海快线流动红旗”。

2. 各施工、监理单位应严格按要求加强合同履约管理，做好年度考核工作。合同履约考核年度评分由全年各季度评分计算得出，年度评分在90分以上（含90分）为A级，75-90分（含75分）为B级，60-75分（含60分）为C级，60分以下为D级。

3. 各施工、监理单位要重点防范发生社会影响事件，根据地铁公司相关管理办法，社会影响扣分主要包括事故、险情、返工处理、群体性时间、廉政问题，以及被各级主管部门、地铁集团通报批评或违规违约处理等方面。加分主要包括各级观摩会、突出贡献等方面。

附件：滨海快线2021年二季度施工、监理单位考评得分

福州地铁集团有限公司

2021年8月4日

福州地铁集团有限公司办公室　　2021年8月4日印发

滨海快线2021年二季度土建监理单位得分汇总

标段（单位名称）	人员与设备（8分）	监理管理考核（45分）	过程隐患排查治理（20分）	合约管理（7分）	监理效果（20分）	社会影响（额外）	总分	名次	备注
监理6标（英泰克）	6.4	38.10	18.67	5.6	17.84	-1	85.61	1	地铁集团下发通报一次扣1分。
监理2标（北京四方）	8	37.05	18.51	6.3	15.55	-1	84.41	2	地铁集团下发处罚一次扣1分。
福海路配套工程监理（中咨工程）	6.8	34.35	18.53	6.3	16.33	0	82.31	3	
监理4标（四川元丰）	7.2	34.20	18.74	4.9	18.25	-2	81.29	4	地铁集团下发通报两次扣2分。
监理3标（上海建科）	7.6	33.90	15.47	4.9	15.17	0	77.04	5	
监理5标（上海同济）	8	31.80	19.15	4.9	14.67	-4	74.52	6	地铁集团下发通报两次扣2分，二季度检查返工一次扣2分。
监理7标（重庆联盛）	7.2	33.75	16.41	6.3	15.06	-5	73.72	7	地铁集团下发通报一次扣1分，二季度检查返工两次扣4分。
监理1标（上海建通）	7.2	32.55	16.10	5.6	14.71	-3	73.16	8	地铁集团下发处罚一次扣1分，二季度检查返工一次扣2分。

2021 年第三季度：

福州地铁集团有限公司文件

榕地铁工建〔2021〕9 号

关于轨道交通滨海快线 2021 年第三季度施工及监理单位综合考评情况的通报

各施工、监理单位：

为综合体现 2021 年第三季度轨道交通滨海快线各施工管理情况，地铁集团于 2021 年 9 月 23 日-9 月 30 日组织相关部门，通过踏勘现场、核对内业资料等方式，对滨海快线各施工、监理单位的投资进度、安全质量、合同信息和社会影响等管理情况进行了全面考评，现将滨海快线 2021 年第三季度考评结果通报如下：

一、土建施工单位（工区）考评

共 14 个土建施工单位工区参与考评，其中较好的工区是土

建2标2工区(中铁十一局)、土建1标停车场工区(中铁六局)、土建2标1工区(中铁十二局)，较差的工区是土建1标2工区(中铁七局)、土建3标2工区(中交二航局)、土建1标1工区(中铁上海局)，具体排名和评分情况详见附件。

二、土建施工单位（标段）考评

第一名中国铁建，得分82.67；**第二名中国交建**，得分78.32分；**第三名中国中铁**，77.85分。

三、土建监理单位考评

共8个土建监理单位参与考评，其中较好的单位是福海路配套工程监理（中咨工程），较差的单位是土建监理1标（上海建通）。具体排名和评分情况详见附件。

四、典型情况

土建2标2工区（中铁十一局）投资进度任务完成较好，现场安全质量、标准化始终保持较高水平；土建1标4工区（中铁四局）积极打造现场安全质量亮点，并于9月承办了福州地铁“质量月”观摩活动；土建1标1工区（中铁上海局）进度节点管控较差，投资任务完成不理想，现场安全质量问题较多，需进一步加强项目管理。

五、相关事项

1.根据相关管理办法，单线路季度参与排名的施工单位在5（不含）-14个（含）的，对前两名且季度综合评分高于90分（含90分）的施工单位颁发流动红旗。根据以上考核结果，授

予中铁十一局福州市轨道交通滨海快线土建施工2标2工区项目部“福州市轨道交通滨海快线流动红旗”。

2.各施工、监理单位应按照福州地铁“攻坚120天”专项行动要求，层层落实工作责任，制订强有力的工作措施，加强施工过程投资进度、防疫、质量、安全、标准化等各方面的管理工作，按时完成各项攻坚目标任务。

3.各施工、监理单位应严格按要求加强合同履约管理，做好年度考核工作。合同履约考核年度评分由全年各季度评分计算得出，年度评分在90分以上（含90分）为A级，75-90分（含75分）为B级，60-75分（含60分）为C级，60分以下为D级。

4.各施工、监理单位要重点防范发生社会影响事件，根据地铁公司相关管理办法，社会影响扣分主要包括事故、险情、返工处理、群体性时间、廉政问题，以及被各级主管部门、地铁公司通报批评或违规违约处理等；加分主要包括各级观摩会、突出贡献等（本季度加减分事项详见附件）。

附件：滨海快线2021年第三季度施工、监理单位考评得分和社会影响评分明细表

福州地铁集团有限公司

2021年10月19日

福州地铁集团有限公司办公室　　2021年10月19日印发

— 3 —

滨海快线2021年第三季度土建监理单位得分汇总

标段（单位名称）	人员与设备（8分）	监理管理考核（45分）	过程隐患排查治理（20分）	合约管理（7分）	监理效果（20分）	社会影响（额外）	总分	名次
福海路配套工程监理（中咨工程）	7.2	35.33	19.20	5.95	15.63	0	83.31	1
土建监理3标（上海建科）	7.87	36.45	16.47	5.25	17.14	0	83.18	2
土建监理4标（四川元丰）	8	33.98	18.87	5.25	17.4	-1	82.50	3
土建监理5标（上海同济）	7.6	38.70	19.08	5.25	15.67	-4	82.30	4
土建监理2标（北京四方）	8	34.88	19.30	5.6	15.9	-4	79.68	5
土建监理7标（重庆联盛）	7.2	34.20	18.28	5.95	15.65	-2	79.28	6
土建监理6标（英泰克）	5.2	35.55	19.48	5.95	15.68	-3	78.86	7
土建监理1标（上海建通）	7.6	36.23	18.97	5.25	14.45	-5	77.49	8

2021 年第四季度：

福州地铁集团有限公司文件

榕地铁工建〔2022〕4 号

福州地铁集团有限公司关于在建工程 2021 年第四季度施工、监理单位 综合考评情况通报

各参建单位：

为综合体现 2021 年第四季度福州地铁在建工程建设管理情况，2021 年 1 月 10 日-14 日，地铁集团组织相关部门，结合现场、核对内业资料等方式，对福州地铁 4、5、6 号线、滨海快线，置业开发、苏洋防洪排涝等工程项目的施工、监理单位的投资进度、安全质量、合同管理和社会影响情况进行了全面考核，现将考评情况通报如下：

一、总体情况

理结果上报地铁集团。同时，要求各参建单位引以为戒，加强日常施工管理、工序验收工作，杜绝再次出现类似问题。

（四）各监理单位要切实履行监理职责，加强现场检查、旁站和验收工作，及时反馈现场出现的问题，严禁无故拖延验收，同时要重点监督施工单位主要管理人员在岗情况，及时反馈至地铁集团。

（五）各施工、监理单位要重点防范发生社会影响事件，对于事故、险情、返工处理、群体性事件、廉政问题，以及被各级主管部门、地铁公司通报批评或违规违约处理等方面，将在季度考评中直接扣分（本季度加减分事项详见附件）。

附件：各在建线路2021年第四季度施工、监理单位考评得分和社会影响统计表

福州地铁集团有限公司

2022年1月21日

福州地铁集团有限公司办公室　　2022年1月21日印发

— 10 —

滨海快线2021年第四季度土建监理单位得分汇总

标段（单位名称）	人员与设备（8分）	监理管理考核（45分）	过程隐患排查治理（20分）	合约管理（7分）	监理效果（20分）	社会影响（额外）	总分	名次
监理2标（北京四方）	8	38.93	17.63	6.16	16.32	-1	86.04	1
监理3标（上海建科）	7.6	38.03	16.80	6.09	16.22	-0.5	84.24	2
福海路配套工程监理（中咨工程）	5.6	33.75	20.00	6.16	16.39	0	81.90	3
监理6标（英泰克）	5.74	37.13	18.77	5.32	15.89	-1.5	81.34	4
监理4标（四川元丰）	8	34.88	18.07	4.97	17.72	-2.5	81.13	5
监理5标（上海同济）	6.8	36.23	18.36	5.46	15.94	-3	79.78	6
监理7标（重庆联盛）	7.87	33.53	18.53	6.02	16.17	-3.5	78.62	7
监理1标（上海建通）	7.36	31.95	17.60	4.9	15.62	-4	73.43	8

2022 年第一季度：

福州地铁集团有限公司文件

榕地铁工建〔2022〕17 号

关于在建工程 2022 年第一季度施工、监理单位综合考评情况的通报

各参建单位：

为综合体现 2022 年第一季度福州地铁在建工程建设管理情况，2022 年 4 月 6 日-13 日，地铁集团组织相关部门，结合现场、核对内业资料等方式，对福州地铁 4 号线、5 号线、滨海快线、置业开发、苏洋防洪排涝等工程项目的施工、监理单位的投资进度、安全质量、合同管理和社会影响情况进行了全面考核，现将考评情况通报如下：

一、总体情况

本次考核共 44 个标段（工区）施工单位，24 个监理单位，

4. 各施工、监理单位要重点防范发生社会影响事件，根据地铁公司相关管理办法，社会影响扣分主要包括事故、险情、返工处理、群体性时间、廉政问题，以及被各级主管部门、地铁公司通报批评或违规违约处理等方面；加分主要包括各级观摩会、突出贡献等方面（本季度加减分事项详见附件）。

附件：各在建线路2022年第一季度施工、监理单位考评得分和社会影响统计表

福州地铁集团有限公司

2022年4月24日

福州地铁集团有限公司办公室　　2022年4月24日印发

滨海快线2022年第一季度土建监理单位得分汇总

标段（单位名称）	人员与设备（8分）	监理管理考核（45分）	过程隐患排查治理（20分）	合约管理（7分）	监理效果（20分）	社会影响（额外）	总分	名次
监理7标（重庆联盛）	8	39.38	18.77	5.95	17	0	89.09	1
监理3标（上海建科）	7.2	39.83	18.57	5.95	16.64	-1	87.18	2
监理5标（上海同济）	6.8	39.83	19.06	5.81	16.42	-2.5	85.42	3
监理1标（上海建通）	7.6	36.68	19.01	6.02	16.48	-0.5	85.29	4
监理2标（北京四方）	7.2	38.25	19.03	5.74	16.05	-1.5	84.77	5
监理6标（英泰克）	7.34	40.05	19.39	5.74	15.95	-4	84.47	6
监理4标（四川元丰）	6.8	36.00	19.25	5.6	18.23	-1.5	84.38	7
福海路配套工程监理（中咨工程）	7.2	39.83	13.80	6.02	16.6	0	83.45	8

2022 年第二季度：

福州地铁集团有限公司文件

榕地铁工建〔2022〕25 号

福州地铁集团有限公司关于在建工程 2022 年第二季度施工、监理单位 综合考评情况的通报

各参建单位:

为综合体现 2022 年第二季度福州地铁在建工程建设管理情况，2022 年 6 月 22 日-30 日，地铁集团组织相关部门，结合现场检查，核对内业资料等方式，对福州地铁 4、5 号线、滨海快线，置业开发、苏洋防洪排涝等工程项目的施工、监理单位的投资进度、安全质量、合同管理和社会影响情况进行了全面考核，现将考评情况通报如下:

一、总体情况

和验收工作，及时反馈现场出现的问题，严禁无故拖延验收，同时要重点监督施工单位主要管理人员在岗情况，及时反馈至地铁集团。

（四）各施工、监理单位要重点防范发生社会影响事件，根据地铁公司相关管理办法，社会影响扣分主要包括事故、险情、返工处理、群体性事件、廉政问题，以及被各级主管部门、地铁公司通报批评或违规违约处理等方面；加分主要包括各级观摩会、突出贡献等方面。

附件：各在建线路2022年第二季度施工、监理单位考评得分

福州地铁集团有限公司

2022年7月18日

福州地铁集团有限公司办公室　　2022年7月18日印发

滨海快线2022年第二季度土建监理单位得分汇总

标段（单位名称）	人员与设备（8分）	监理管理考核（45分）	过程隐患排查治理（20分）	合约管理（7分）	监理效果（20分）	社会影响（额外）	总分	名次
监理3标（上海建科）	8	38.03	18.47	6.3	17.35	-1	87.15	1
监理6标（英泰克）	8	38.03	19.73	6.3	16.51	-2	86.57	2
监理7标（重庆联盛）	8	37.13	19.23	6.58	15.79	-1.5	85.23	3
监理2标（北京四方）	8	37.58	18.97	6.23	16.22	-2	85.00	4
福海路配套工程监理（中咨工程）	8	35.55	16.00	6.3	16.47	0	82.32	5
监理5标（上海同济）	8	37.13	18.85	6.37	15.21	-3.5	82.06	6
监理4标（四川元丰）	8	35.78	18.43	6.44	16.78	-5	80.43	7
监理1标（上海建通）	8	37.80	17.20	5.88	15.93	-4.5	80.31	8

2022 年第三季度：

福州地铁集团有限公司文件

榕地铁工建〔2022〕34 号

关于在建工程 2022 年第三季度施工、监理、第三方服务单位综合考评情况的通报

各参建单位:

为综合体现 2022 年第三季度福州地铁在建工程建设管理情况，2022 年 9 月 22 日-30 日，地铁集团组织相关部门，结合现场检查，核对内业资料等方式，对福州地铁 4 号线、5 号线、滨海快线，置业开发、苏洋防洪排涝等工程项目的施工、监理单位的投资进度、安全质量、合同管理和社会影响情况进行了全面考核，现将考评情况通报如下:

一、总体情况

本次考核共 43 个标段（工区）施工单位，23 个监理单位，

析，制订整改措施，明确整改期限、责任人，坚决整改。同时，由施工总承包单位牵头，举一反三，对在建工点再开展一次全面自查。

（三）各监理单位要切实履行监理职责，加强现场检查、旁站和验收工作，及时反馈现场出现的问题，严禁无故拖延验收，司时要重点监督施工单位主要管理人员在岗情况，及时反馈至地铁集团。

（四）各施工、监理单位要重点防范发生社会影响事件，根据地铁公司相关管理办法，社会影响扣分主要包括事故、险情、返工处理、群体性事件、廉政问题，以及被各级主管部门、地铁公司通报批评或违规违约处理等方面；加分主要包括各级观摩会、突出贡献等方面。

附件：各在建线路2022年第三季度施工、监理、第三方服务单位考评得分

福州地铁集团有限公司

2022年10月18日

福州地铁集团有限公司办公室　　2022年10月18日印发

滨海快线2022年第三季度土建监理单位得分汇总

标段（单位名称）	人员与设备（8分）	监理管理考核（45分）	过程隐患排查治理（20分）	合约管理（7分）	监理效果（20分）	社会影响（额外）	总分	名次
监理7标（重庆联盛）	8.00	37.80	17.03	6.3	17.17	-0.5	85.80	1
监理5标（上海同济）	8.00	38.48	17.91	5.74	16.42	-1	85.55	2
监理3标（上海建科）	8.00	36.90	18.87	6.79	16.77	-2	85.33	3
监理6标（英泰克）	8.00	37.35	18.00	6.23	17	-1.5	85.08	4
福海路配套工程监理（中咨工程）	8.00	35.33	19.07	6.44	17.18	-1	85.01	5
监理4标（四川元丰）	8.00	36.00	18.20	5.88	16.74	-2	82.82	6
监理2标（北京四方）	7.20	37.58	17.87	6.37	15.3	-3	81.31	7
监理1标（上海建通）	7.60	38.70	15.03	6.3	15.86	-3	80.49	8

2022 年第四季度：

福州地铁集团有限公司文件

榕地铁工建〔2023〕3 号

关于在建工程 2022 年第四季度施工、监理及第三方服务单位综合考评情况的通报

集团各部门及专班、建设公司、二延六调公司、置业公司，各参建单位：

为综合体现 2022 年第四季度福州地铁在建工程建设管理情况，2022 年 12 月 22 日-2023 年 1 月 5 日，地铁集团组织相关部门及专班、分子公司结合现场检查，核对内业资料等方式，对福州地铁 4 号线、5 号线、滨海快线、2 号线东延线、6 号线东调段以及置业开发、苏洋防洪排涝等工程项目的施工、监理、第三方单位的投资进度、质量安全、合同管理和社会影响情况等进行了全

面考核，现将考评情况通报如下：

一、总体情况

本次考核共37个标段（工区）施工单位，22个监理单位以及9个第三方服务单位，重点检查了第四季度进度、“项目攻坚落实年”专项行动、“冲刺50天，提质增效促生产”劳动竞赛、消防安全、临时用电、“三类”事故、高架桥梁、深基坑、高支模、起重吊装和大型设备、危大工程和关键节点条件核查、标准化、渗漏水、机电系统调试、轨行区管理、试验检测等内容。各条线路进度、质量安全总体受控，但部分单位投资进度、形象进度节点完成情况不理想，质量安全管理还有待提高（施工、监理单位质量安全具体问题另文下发）。

二、4号线考核情况

（一）土建施工单位（工区）考核

共11个土建施工单位（工区）参与排名，其中：

1.前三名如下：

第一名：土建1标机电工区（上海隧道），总分91.81；

第二名：土建2标6工区（中建海峡），总分87.14；

第三名：土建2标5工区（中建海峡），总分86.30；

2.后三名如下：

第九名：土建1标2工区（上海隧道），总分79.91；

第十名：土建3标车辆段工区（中交四航局），总分79.52；

第十一名：土建2标8工区（中建一局），总分77.33。

划，强化生产要素保障，尤其要加强现阶段仍处于富水砂层开挖的车站、已见底的深基坑，或仍处于软土、复杂地层、过江等掘进的盾构区间的关键风险点管控，做好应急保障。

3. 针对本次履约考评暴露的各类问题，要求责任单位认真分析，制订整改措施，明确整改期限、责任人，坚决整改彻底。同时，由施工总承包单位牵头，举一反三，结合2023年春节前安全检查和地铁集团下发的《关于进一步加强年终岁尾安全生产工作的通知》等文件精神，对在建工点再开展一次全面自查，突出整治施工围挡和周边道路，营造清爽的节日环境。

4. 各监理单位要切实履行监理职责，加强现场检查、旁站和验收工作，及时反馈现场出现的问题，严禁无故拖延验收。同时要重点监督施工单位关键岗位人员在岗履职情况，并将情况过程及时反馈至地铁集团。

5. 各施工、监理单位要深刻领会要义，抓好《福州地铁在建项目建设及节前维稳工作推进会会议纪要》精神落实，重点防范发生社会影响事件，全力保障农民工工资支付和中小企业账款支付等工作，确保安全稳定。

附件：1. 地铁4号线2022年第四季度施工、监理单位考评得分

2. 地铁5号线2022年第四季度施工、监理单位考评得分

3. 地铁滨海快线 2022 年第四季度施工、监理单位考评得分

4. 地铁 2 号线东延线 2022 年第四季度施工、监理单位考评得分

5. 地铁 6 号线东调段 2022 年第四季度施工、监理单位考评得分

6. 2022 年第四季度第三方服务单位考评得分

福州地铁集团有限公司

2023 年 1 月 12 日

福州地铁集团有限公司办公室　　2023 年 1 月 12 日印发

地铁滨海快线2022年第四季度土建监理单位得分汇总

标段（单位名称）	人员与设备（8分）	监理管理考核（45分）	过程隐患排查治理（20分）	合约管理（7分）	监理效果（20分）	社会影响（额外）	总分	名次
监理4标（四川元丰）	8.00	38.48	18.47	6.16	17.82	0.0	88.93	1
监理2标（北京四方）	8.00	38.70	18.87	6.37	17.11	-3.0	86.05	2
监理3标（上海建科）	8.00	36.90	18.47	5.74	15.83	-1.0	83.94	3
监理6标（英泰克）	8.00	36.00	18.53	6.23	17.61	-2.5	83.87	4
监理7标（重庆联盛）	8.00	37.80	17.33	6.30	16.39	-2.5	83.33	5
监理5标（上海同济）	8.00	36.23	18.25	6.02	16.25	-2.5	82.24	6
监理1标（上海建通）	8.00	35.33	17.27	4.62	16.09	-3.0	78.30	7

2023 年第一季度：

福州地铁集团有限公司文件

榕地铁工建〔2023〕16 号

关于在建工程 2023 年第一季度施工、监理及第三方服务单位综合考评情况的通报

集团各部门及线路专班、建设公司、二延公司、六调公司、置业公司，各参建单位：

为综合体现 2023 年第一季度福州地铁在建工程建设管理情况，2023 年 3 月 27 日-3 月 31 日，地铁集团组织专家、相关部门及线路专班、分子公司结合现场检查、核对内业等方式，对福州地铁 4 号线、滨海快线、2 号线东延线、6 号线东调段以及 5 号线剩余工程、置业开发、苏洋防洪排涝等工程项目的施工、监理、第三方单位的投资进度、质量安全、合同管理、财务管理和社会影响等情况等进行了全面考核，现将考评情况通报如下：

4号线流动红旗”；授予中铁十二局福州市轨道交通滨海快线土建施工2标1工区项目部“福州市轨道交通滨海快线流动红旗”。2号线东延线本季度排名第一的单位得分未超过90分、6号线东调段本季度参评单位不足3个（含3个），因此本季度“福州市轨道交通2号线东延线流动红旗”和“福州市轨道交通6号线东调段流动红旗”不予颁发。

2.各部门及线路专班、各单位要结合地铁集团下发的《关于印发福州地铁在建项目实施“深学争优、敢为争先、实干争效”专项行动工作方案的通知》等要求，扎实推进项目攻坚增效，锚定目标任务，提早谋划，将一季度落下的任务主动加压，强化生产要素保障，全力推进工程建设进度。同时，要加强地铁4号线、5号线空载试运行期间的安全管理，强化过江盾构、交叉施工等风险管控，提前落实好各项准备措施和应急保障。

3.针对本次合同履约考评暴露的各类问题，要求责任单位认真分析，制订整改措施，明确整改期限、责任人，整改彻底，于4月底前完成整改并分别反馈至建设公司、2延公司、6调公司。同时，由施工总承包单位牵头，举一反三，结合汛期各项准备工作落实情况，对在建工点再开展一次全面自查，确保防汛备汛措施落地。

4.各监理单位要切实履行监理职责，加强现场检查、旁站和验收工作，及时反馈现场出现的问题，把好防汛备汛措施落实。同时，要重点监督施工单位关键岗位人员在岗履职情况，并将过程情况及时反馈至地铁集团。

附件：1. 地铁 4 号线 2023 年第一季度施工、监理单位考评得分

2. 地铁滨海快线 2023 年第一季度施工、监理单位考评得分

3. 地铁 2 号线东延线 2023 年第一季度施工、监理单位考评得分

4. 地铁 6 号线东调段 2023 年第一季度施工、监理单位考评得分

5. 2023 年第一季度第三方服务单位考评得分

福州地铁集团有限公司

2023 年 4 月 13 日

福州地铁集团有限公司办公室　　2023 年 4 月 14 日印发

— 9 —

地铁滨海快线2023年第一季度土建监理单位得分汇总

标段（单位名称）	人员与设备（8分）	监理管理考核（45分）	过程隐患排查治理（20分）	合约管理（7分）	监理效果（20分）	社会影响（额外）	总分	名次
监理4标（四川元丰）	8.00	38.48	17.83	6.60	17.73	-0.5	88.13	1
监理2标（北京四方）	8.00	38.93	17.50	6.33	16.57	-0.5	86.82	2
监理3标（上海建科）	8.00	36.68	17.07	6.43	16.75	0.0	84.92	3
监理5标（上海同济）	8.00	35.78	16.62	6.44	16.00	0.0	82.84	4
监理1标（上海建通）	7.20	38.56	16.73	6.43	16.68	-3.0	82.61	5
监理7标（重庆联盛）	8.00	37.13	15.93	6.29	16.23	-2.5	81.07	6
监理6标（英泰克）	7.44	35.10	18.03	6.17	16.01	-7.0	75.75	7

2023 年第二季度：

福州地铁集团有限公司文件

榕地铁工建〔2023〕33 号

关于在建工程 2023 年第二季度施工、监理及第三方服务单位综合考评情况的通报

集团各部门及线路专班、建设公司、二延公司、六调公司、置业公司：

根据《福州地铁集团有限公司施工、监理及第三方服务单位合同履约考核评价办法（第二次修订）》，为综合体现 2023 年二季度福州地铁在建项目的施工管理情况，2023 年 6 月 26 日-7 月 3 日，集团组织专家和相关人员结合现场检查、核对内业等方式，对地铁 4 号线、滨海快线、2 号线东延线、6 号线东调段以及置业开发等项目的施工、监理、第三方单位的投资进度、质量

安全、合同管理、财务管理和社会影响等情况等进行了全面考核，现将考评情况通报如下：

一、总体情况

本次考核共29个标段（工区）施工单位，16个监理单位以及10个第三方服务单位。重点检查了深学争优、敢为争先、实干争效、项目攻坚增效年、项目竞赛等专项行动、防汛备汛、交通安全设备设施、地铁保护、深基坑、高支模、起重吊装和大型设备、危大工程和关键节点、标准化、机电系统调试、轨行区管理、试验检测及财务合约等内容。各项目进度、质量安全总体受控，但部分单位进度节点完成情况不理想，质量安全等管理还有待提高。

二、进度完成情况

二季度，完成投资29.57亿元（合同口径，下同），年累完成投资56.82亿元，占全年计划投资额113.15亿的50.2%，与序时进度基本持平。在建项目共下达191个节点，完成146个，完成率约为76.4%，**未完成45个，主要是4号线1标1工区（上海隧道）承建的半洲站3号出入口主体结构未封顶（正土方开挖）；滨海快线2标4工区（中铁十七局）承建的莲滨区间右线滞后100环（未贯通）；2号线东延线1工区（中建四局）承建的中间风井主体结构滞后3块板（正底板钢筋绑扎）；6号线东调段2工区（中铁八局）承建的文十区间右线滞后100环。**项目攻坚增效年中二季度的10个前期节点全部完成，年累完成33个，

程质量安全风险隐患排查整治，杜绝不履职、不尽责乱象。同时要重点监督施工单位关键岗位人员在岗履职情况，并将过程情况及时反馈至地铁集团。

附件：1. 地铁 4 号线 2023 年第二季度施工、监理单位考评得分

2. 地铁滨海快线 2023 年第二季度施工、监理单位考评得分

3. 地铁 2 号线东延线 2023 年第二季度施工、监理单位考评得分

4. 地铁 6 号线东调段 2023 年第二季度施工、监理单位考评得分

5. 2023 年第二季度第三方服务单位考评得分

福州地铁集团有限公司

2023 年 7 月 17 日

抄送：中国中铁股份有限公司，中国铁建股份有限公司，中国交通建设股份有限公司，中国建筑股份有限公司，上海隧道工程有限公司。

福州地铁集团有限公司办公室　　2023 年 7 月 17 日印发

地铁滨海快线2023年第二季度土建监理单位得分汇总

标段（单位名称）	人员与设备（8分）	监理管理考核（40分）	过程隐患排查治理（20分）	合约管理（12分）	监理效果（20分）	社会影响（额外）	总分	名次
监理4标（四川元丰）	8.00	35.40	17.78	10.76	17.61	-1.0	88.55	1
监理2标（北京四方）	8.00	35.90	17.77	10.55	16.92	-1.5	87.64	2
监理5标（上海同济）	8.00	35.10	17.10	10.80	16.14	-0.5	86.64	3
监理3标（上海建科）	7.60	31.20	16.47	10.63	16.50	-1.0	81.39	4
监理7标（重庆联盛）	7.60	32.50	14.47	10.56	17.13	-1.0	81.26	5
监理6标（英泰克）	7.20	33.40	18.43	10.46	17.13	-8.0	78.62	6
监理1标（上海建通）	8.00	31.00	13.87	10.48	15.69	-5.0	74.03	7

2023 年第三季度：

福州地铁集团有限公司文件

榕地铁工建〔2023〕46 号

关于在建工程 2023 年第三季度施工、监理及第三方服务单位综合考评情况的通报

集团各部门及线路专班、建设公司、二延公司、六调公司、置业公司：

为综合体现 2023 年第三季度福州地铁在建项目施工管理情况，2023 年 9 月 16 日-9 月 22 日，集团组织相关人员结合现场检查、核对内业等方式，对地铁 4 号线后通段、滨海快线、2 号线东延线、6 号线东调段以及置业开发等项目的施工、监理、第三方单位的投资进度、质量安全、合同管理、财务管理和社会影响等情况等进行了全面考核，现将考评情况通报如下：

工作一线，打通内部投诉、上访渠道，重点防范险情事故以及群体性稳定事件等社会影响问题，强化矛盾纠纷排查化解，按照各项工作部署抓实抓好“两清零”工作。

5. 针对本次合同履约考评暴露的各类问题，要求责任单位认真分析，制定整改措施，明确整改期限和责任人，于 9 月底前完成整改并分别反馈至对应线路专班或分子公司。同时，由线路专班及分子公司牵头，举一反三，结合防汛、消防相关工作全面检查，确保安全。

附件：1. 地铁 4 号线 2023 年第三季度施工、监理单位考评得分

2. 地铁滨海快线 2023 年第三季度施工、监理单位考评得分

3. 地铁 2 号线东延线 2023 年第三季度施工、监理单位考评得分

4. 地铁 6 号线东调段 2023 年第三季度施工、监理单位考评得分

5. 2023 年第三季度第三方服务单位考评得分

福州地铁集团有限公司

2023 年 9 月 27 日

地铁滨海快线2023年第三季度土建监理单位得分汇总

标段（单位名称）	人员与设备（8分）	监理管理考核（40分）	过程隐患排查治理（20分）	合约管理（12分）	监理效果（20分）	社会影响（额外）	总分	名次
监理4标（四川元丰）	8.00	34.20	19.11	11.34	17.62	-0.5	89.77	1
监理2标（北京四方）	8.00	33.60	17.00	10.94	17.94	0.0	87.48	2
监理5标（上海同济）	8.00	33.60	16.23	11.02	16.28	-1.5	83.63	3
监理7标（重庆联盛）	8.00	34.00	15.47	11.17	17.13	-3.5	82.27	4
监理6标（英泰克）	8.00	35.00	16.03	11.17	17.37	-6.5	81.07	5
铺轨监理标（上海唯智）	6.80	34.40	18.93	11.02	18.11	-15.0	74.27	6
监理3标（上海建科）	6.40	30.00	14.33	11.17	15.19	-3.0	74.09	7
监理1标（上海建通）	8.00	34.80	14.70	11.26	15.05	-13.0	70.81	8

2023 年第四季度：

福州地铁集团有限公司文件

榕地铁工建〔2024〕2 号

关于在建工程 2023 年第四季度施工、监理及第三方服务单位综合考评情况的通报

集团各部门及线路专班、建设公司、二延公司、六调公司、置业公司：

为综合体现 2023 年第四季度福州地铁在建项目施工管理情况，2023 年 12 月 21 日-12 月 27 日，集团组织相关人员结合现场检查、核对内业等方式，对地铁滨海快线、2 号线东延线、6 号线东调段以及置业开发等项目的施工、监理、第三方单位的投资进度、质量安全、合同管理、财务管理和社会影响等情况等进行了全面考核，现将考评情况通报如下：

路专班及分子公司牵头，结合近期集团下发的安全生产文件要求，举一反三，对在建工点再开展一次全面自查，突出管控关键风险点，重点整治施工围挡和周边道路、窨井盖等民生工程，营造清爽安全的环境。

附件：1. 地铁滨海快线2023年第四季度施工、监理单位考评得分

2. 地铁2号线东延线2023年第四季度施工、监理单位考评得分

3. 地铁6号线东调段2023年第四季度施工、监理单位考评得分

4. 2023年第四季度第三方服务单位考评得分

福州地铁集团有限公司

2024年1月12日

地铁滨海快线2023年第四季度土建监理单位得分汇总

标段（单位名称）	人员与设备（8分）	监理管理考核（40分）	过程隐患排查治理（20分）	合约管理（12分）	监理效果（20分）	社会影响（额外）	总分	名次
监理2标（北京四方）	8.00	35.20	18.98	11.02	17.98	-0.5	90.68	1
监理4标（四川元丰）	8.00	36.00	19.28	11.27	17.36	-3.5	88.42	2
监理5标（上海同济）	8.00	34.80	17.90	10.94	16.29	-0.5	87.42	3
监理7标（重庆联盛）	8.00	35.00	15.21	11.17	17.54	-2.5	84.42	4
监理3标（上海建科）	7.60	35.60	13.53	11.17	15.08	-2.5	80.49	5
监理1标（上海建通）	8.00	34.20	16.59	10.94	16.97	-7.0	79.70	6
铺轨监理标（上海唯智）	8.00	28.80	20.00	10.60	18.01	-8.0	77.41	7
监理6标（英泰克）	8.00	35.80	13.80	11.09	18.00	-19.0	67.69	8

2024 年第一季度：

福州地铁集团有限公司文件

榕地铁工建〔2024〕12 号

关于在建工程 2024 年第一季度施工、监理及第三方服务单位综合考评情况的通报

集团各部门及线路专班、建设公司、二延公司、六调公司、置业公司：

为综合体现 2024 年第一季度福州地铁在建项目施工管理情况，2024 年 3 月 18 日-3 月 24 日，集团组织相关人员结合现场检查、核对内业等方式，对滨海快线、2 号线东延线、6 号线东调段及置业开发等项目的施工、监理、第三方单位的投资进度、质量安全、合同管理、财务管理和社会影响等情况等进行了全面考核，现将考评情况通报如下：

— 1 —

一次全面检查。

附件：1. 地铁滨海快线 2024 年第一季度施工、监理单位考评得分

2. 地铁 2 号线东延线 2024 年第一季度施工、监理单位考评得分

3. 地铁 6 号线东调段 2024 年第一季度施工、监理单位考评得分

4. 2024 年第一季度第三方服务单位考评得分

福州地铁集团有限公司

2024 年 3 月 29 日

抄送：中国中铁股份有限公司，中国铁建股份有限公司，中国交通建设股份有限公司，中国建筑股份有限公司，中国电力建设股份有限公司。

福州地铁集团有限公司办公室　　2024 年 3 月 29 日印发

— 6 —

地铁滨海快线2024年第一季度土建监理单位得分汇总

标段（单位名称）	人员与设备（8分）	监理管理考核（40分）	过程隐患排查治理（20分）	合约管理（12分）	监理效果（20分）	社会影响（额外）	总分	名次
监理2标（北京四方）	8.00	33.40	19.03	10.64	17.73	-2.0	86.80	1
铺轨监理标（上海唯智）	8.00	30.60	20.00	10.68	18.09	-1.0	86.37	2
监理4标（四川元丰）	8.00	34.40	18.90	10.62	17.44	-3.0	86.36	3
监理5标（上海同济）	8.00	31.60	17.83	10.62	17.46	-2.0	83.51	4
监理3标（上海建科）	8.00	32.00	16.22	10.72	16.05	-5.5	77.61	5
监理6标（英泰克）	8.00	29.40	16.07	10.80	16.60	-4.0	76.87	6
监理7标（重庆联盛）	6.00	29.60	17.11	10.88	16.94	-6.0	74.53	7
监理1标（上海建通）	8.00	27.40	16.78	10.79	16.77	-6.5	73.24	8

上边距

2024 年第二季度：

福州地铁集团有限公司文件

榕地铁工建〔2024〕21 号

福州地铁集团有限公司关于在建工程 2024 年第二季度施工、监理及第三方服务单位综合考评情况的通报

集团各部门及线路专班、建设公司、二延公司、六调公司、置业公司：

为综合体现 2024 年第二季度福州地铁在建项目施工管理情况，2024 年 6 月 19 日～26 日，地铁集团组织相关人员结合现场检查、核对内业等方式，对滨海快线、4 号线后通段、2 号线东延线、6 号线东调段及置业开发等项目的施工、监理、第三方单位的投资进度、质量安全、合同管理、财务管理和社会影响等情况等

进行了全面考核，现将考评情况通报如下：

一、总体情况

本次考核共28个标段（工区）施工单位、15个监理单位以及9个第三方服务单位。重点检查了落实“市属城建项目竞赛”、“项目攻坚突破年”、“市重点项目劳动竞赛福州地铁专场”等专项行动开展情况；交通安全设备设施、地铁保护、起重吊装和大型设备、深基坑、高支模、盾构区间、危大工程和关键节点、标准化、轨行区管理、试验检测以及财务合约等内容。各项目进度、质量安全总体受控，但个别单位进度节点完成情况不理想，现场施工管理不到位，存在部分安全质量隐患。

二、进度完成情况

二季度，完成投资23.18亿元（合同口径，下同），开累完成41.05亿元，占全年计划投资71.15亿元的57.70%，超序时进度7.7个百分点。在建项目共下达考核节点185个，其中节点调整9个，调整率为4.86%；完成172个（含节点调整9个），完成率92.97%；未完成13个，主要是滨海快线1标2工区（中铁七局）承建的闽都站1号风亭土方未开挖；滨海快线1标3工区（中铁八局）承建的南三区间3#、4#联络通道施工较计划滞后约60%；2号线东延线1标2工区（中建海峡）承建的儒江站地连墙较计划滞后2幅；5号线便民补短板项目（中建海峡、中铁十一局）承建的金山站、东岭站的风水电装修施工较计划滞后约30%。项目攻坚突破年中二季度的10个前期节点已全部完成，年累已完成16个，占年计划28个的57.14%。

措施和应急保障，坚决杜绝责任事故，确保在建项目安全平稳。

3.针对本次合同履约考评暴露的问题，要求责任单位认真分析，制订整改措施，明确整改期限和责任人，于7月3日前完成整改并分别反馈至对应线路专班或分子公司。同时，今年汛期已至，为确保防汛措施落到实处，由线路专班及分子公司牵头，定期对在建工点开展全面检查。

附件：1.2024年第二季度滨海快线土建施工单位考评得分

2.2024年第二季度滨海快线土建监理单位考评得分

3.2024年第二季度滨海快线机电施工、监理单位考评得分

4.2024年第二季度2号线东延线土建施工、监理单位考评得分

5.2024年第二季度6号线东调段土建施工、监理单位考评得分

6.2024年第二季度地铁在建工程第三方服务单位考评得分

福州地铁集团有限公司

2024年7月3日

附件2

2024年第二季度滨海快线土建监理单位考评得分

标段（单位名称）	人员与设备（8分）	监理管理考核（40分）	过程隐患排查治理（20分）	合约管理（12分）	监理效果（20分）	社会影响（额外）	总分	名次
监理4标（四川元丰）	8.00	36.00	17.63	10.74	18.56	-2.5	88.43	1
铺轨监理标（上海唯智）	8.00	32.88	20.00	10.68	18.54	-2.5	87.60	2
监理5标（上海同济）	8.00	35.28	15.70	10.66	18.56	-1.0	87.20	3
监理2标（北京四方）	8.00	33.76	17.93	10.42	17.85	-3.5	84.46	4
监理1标（上海建通）	8.00	32.96	15.96	10.82	17.85	-1.5	84.09	5
监理3标（上海建科）	8.00	32.96	15.93	10.56	17.27	-1.0	83.72	6
监理7标（重庆联盛）	6.00	33.20	15.91	10.87	17.99	-2.0	81.97	7
监理6标（英泰克）	8.00	33.36	14.53	10.70	17.64	-4.5	79.74	8

2024 年第三季度：

福州地铁集团有限公司文件

榕地铁工建〔2024〕29 号

福州地铁集团有限公司关于在建工程 2024 年第三季度施工、监理及第三方服务单位综合考评情况的通报

集团各部门及线路专班、建设公司、二延公司、六调公司、置业公司：

为综合体现 2024 年第三季度福州地铁在建项目施工管理情况，2024 年 9 月 18 日～24 日，地铁集团组织相关人员结合现场检查、核对内业等方式，对滨海快线、4 号线后通段、5 号线洪塘站、2 号线东延线、6 号线东调段及置业开发等项目的施工、监理、第三方单位的投资进度、质量安全、合同管理、财务管理和社

会影响等情况等进行了全面考核，现将考评情况通报如下：

一、总体情况

本次考核共检查了27个项目（工区）施工单位、16个监理单位以及9个第三方服务单位。重点检查了落实“市属城建项目竞赛”、“项目攻坚突破年”、“市重点项目劳动竞赛福州地铁专场”等专项行动开展情况；交通安全设备设施、地铁保护、起重吊装和大型设备、深基坑、高支模、盾构区间、危大工程和关键节点、标准化、轨行区管理、试验检测以及财务合约等内容。各项目进度、质量安全总体受控，但个别单位进度节点完成情况不理想，现场施工管理不到位，存在部分安全质量隐患。

二、进度完成情况

三季度，完成投资18.52亿元（合同口径，下同），开累完成59.04亿元，占全年计划投资71.15亿元的83.0%，超序时进度8.0个百分点。在建项目共下达考核节点192个，其中节点调整变更6个（含取消1个节点），调整率为3.1%；完成节点有183个（含调整完成5个节点），完成率95.8%，其中滨海快线1标1工区（中铁上海局）承建的福东区间完成双线贯通，取得全线洞通的重要阶段性成果；未完成节点有9个（含取消1个节点），主要是滨海快线1标2工区（中铁七局）承建的闽都站1号风亭结构施工进度滞后较多，原计划结构封顶，实际土方开挖仅完成30%；滨海快线1标5工区（中铁六局）承建的东升停车场维修后勤楼施工进度滞后较多，原计划完成地上8层，实际仅完成地上2层；6号线东调段（中铁八局）承建的国际学校站B出入口

东延线3工区中建海峡在下德站~马江渡站区间举办省级成型隧道质量观摩会；四是6号线东调段2工区中铁八局在十八孔闸站举办联络通道和车站风水电及装修标准化施工观摩会。

五、其他事项

1.根据相关管理办法和以上考核结果，**第三季度授予福州市轨道交通滨海快线土建1标机电工区项目部（中铁二局）和轨道3标项目部（中交二公局）“福州市轨道交通滨海快线流动红旗”；授予福州市轨道交通2号线东延线土建3工区项目部（中建海峡）“福州市轨道交通2号线东延线流动红旗”。**6号线东调段不满足“流动红旗”授予条件，不予颁发。

2.各部门、各单位要以“项目攻坚突破年”为基调，锚定年度任务目标，提早谋划组织，将三季度落下的任务主动加压，强化生产要素保障，主动协调解决难点堵点，全力推进工程建设进度。同时，要慎始如终，持续强化盾构富水砂层掘进、冷冻法联络通道交叉施工、深基坑开挖、轨行区管理等风险管控，提前落实好各项准备措施和应急保障，坚决杜绝责任事故，确保在建项目安全平稳。

3.针对本次合同履约考评暴露的问题，要求责任单位认真分析，制订整改措施，明确整改期限和责任人，于10月10日前完成整改并分别反馈至对应线路专班或分子公司。

附件：1.2024年第三季度滨海快线土建施工单位考评得分

2.2024年第三季度滨海快线土建监理单位考评得分

3.2024年第三季度滨海快线机电施工、监理单位考评得分

4.2024年第三季度2号线东延线土建施工、监理单位考评得分

5.2024年第三季度6号线东调段土建施工、监理单位考评得分

6.2024年第三季度地铁在建工程第三方服务单位考评得分

福州地铁集团有限公司

2024年10月1日

附件2

2024年第三季度滨海快线土建监理单位考评得分

标段（单位名称）	人员与设备（8分）	监理管理考核（40分）	过程隐患排查治理（20分）	合约管理（12分）	监理效果（20分）	社会影响（额外）	总分	名次
铺轨监理标（上海唯智）	8.00	36.88	20.00	11.23	18.18	-2.0	92.3	1
监理4标（四川元丰）	8.00	36.32	17.10	10.99	18.02	0.0	90.4	2
监理5标（上海同济）	8.00	37.52	17.77	10.75	18.02	-2.0	90.1	3
监理7标（重庆联盛）	7.44	37.04	14.91	10.87	17.61	-0.5	87.4	4
监理2标（北京四方）	8.00	35.92	18.10	10.51	17.69	-3.0	87.2	5
监理3标（上海建科）	7.60	36.72	18.20	10.39	16.42	-5.0	84.3	6
监理6标（英泰克）	8.00	36.96	13.85	10.49	17.80	-3.0	84.1	7
监理1标（上海建通）	6.80	36.24	15.98	10.39	17.60	-6.0	81.0	8

2024 年第四季度：

福州地铁集团有限公司文件

榕地铁工建〔2025〕3 号

福州地铁集团有限公司关于在建工程 2024 年第四季度施工、监理及第三方服务单位综合考评情况的通报

集团各部门、建设公司、二延公司、六调公司、置业公司：

为综合体现 2024 年第四季度福州地铁在建项目施工管理情况，2024 年 12 月 18 日～25 日，地铁集团组织相关人员结合现场检查、核对内业等方式，对 4 号线后通段、滨海快线、2 号线东延线、6 号线东调段及置业开发等项目的施工、监理、第三方单位的投资进度、质量安全、合同管理、财务管理和社会影响等情况等进行了全面考核，现将考评情况通报如下：

一线，及时疏通化解矛盾风险，重点防范发生社会影响事件，全力保障农民工工资支付和中小企业账款支付等工作，确保安全稳定。

5. 针对本次合同履约考评暴露的问题，要求责任单位认真分析，制订整改措施，明确整改期限和责任人，于 1 月 10 日前完成整改并分别反馈至对应的分子公司。

附件：1. 2024 年第四季度 4 号线后通段土建施工、监理单位考评得分

2. 2024 年第四季度滨海快线土建施工单位考评得分

3. 2024 年第四季度滨海快线土建监理单位考评得分

4. 2024 年第四季度滨海快线机电施工、监理单位考评得分

5. 2024 年第四季度 2 号线东延线土建施工、监理单位考评得分

6. 2024 年第四季度 6 号线东调段土建施工、监理单位考评得分

7. 2024 年第四季度帝封江线网中心施工、监理单位考评得分

8. 2024 年第四季度地铁在建工程第三方服务单位考评得分

福州地铁集团有限公司

2025 年 1 月 6 日

附件3

2024年第四季度滨海快线土建监理单位考评得分

标段（单位名称）	人员与设备（8分）	监理管理考核（40分）	过程隐患排查治理（20分）	合约管理（12分）	监理效果（20分）	社会影响（额外）	总分	名次
铺轨监理标（上海唯智）	8.00	35.07	20.00	10.66	18.30	-2.0	90.0	1
监理4标（四川元丰）	8.00	35.73	17.40	11.04	17.56	-0.5	89.2	2
监理2标（北京四方）	8.00	35.73	18.33	10.70	17.67	-3.0	87.4	3
监理6标（英泰克）	8.00	35.33	15.53	10.94	17.82	-1.0	86.6	4
监理1标（上海建通）	8.00	35.07	17.93	10.79	17.42	-3.0	86.2	5
监理7标（重庆联盛）	6.80	34.27	15.63	11.04	17.82	-0.5	85.1	6
监理3标（上海建科）	7.60	33.20	15.93	10.44	16.85	-3.5	80.5	7

2、苏州市轨道交通 5 号线工程土建监理项目（V-JL01 标）

监理合同

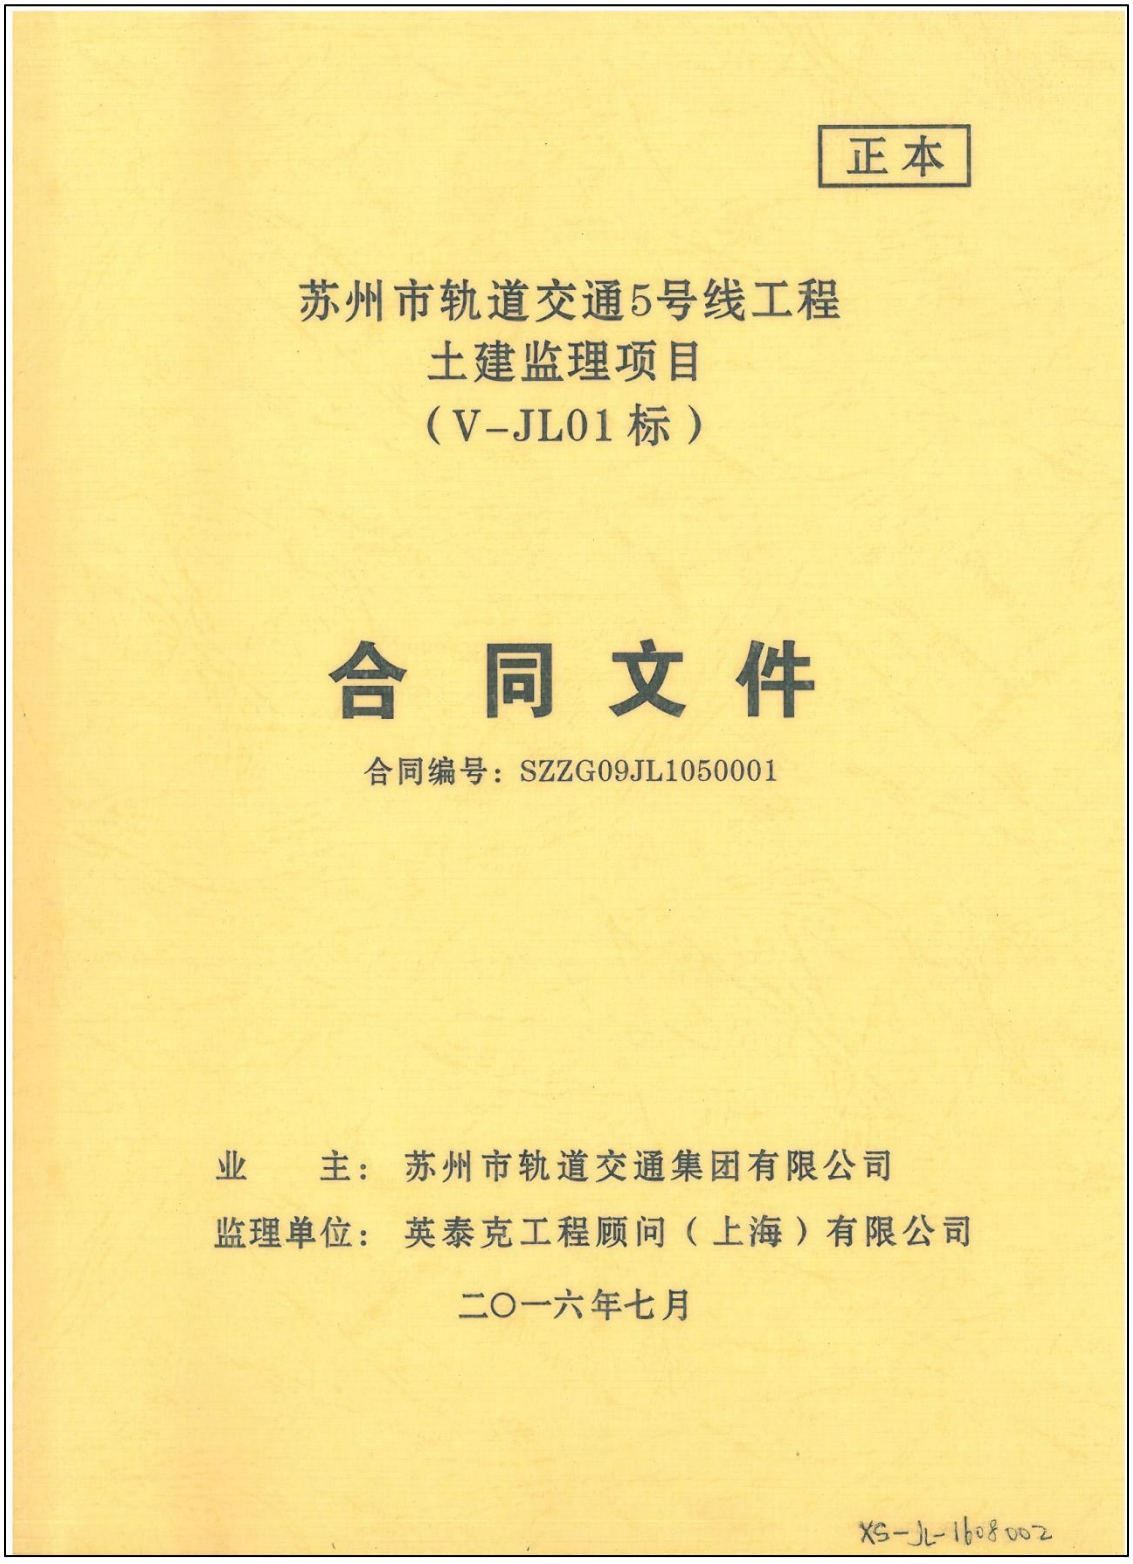
正本

苏州市轨道交通5号线工程
土建监理项目
（V-JL01 标）

合 同 文 件

合同编号：SZZG09JL1050001

业　　主：苏州市轨道交通集团有限公司

监理单位：英泰克工程顾问（上海）有限公司

二〇一六年七月

XS-JL-1608002

合同协议书

业　　主(全称)：　　苏州市轨道交通集团有限公司

监理单位(全称)：　　英泰克工程顾问（上海）有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致，订立本合同。

一、业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：

工程名称：苏州市轨道交通 5 号线工程土建监理项目 V-JL01 标

工程地点：江苏省苏州市

工程范围：苏州市轨道交通 5 号线车站、区间、车辆段/停车场土建（含人防土建、土方运输、管片生产、车辆段绿化等）施工及缺陷责任期修复监理服务。业主有权根据工程实际情况对工期进行调整，投标人应服从调整并不得由此提出额外要求。由于投标人的原因引起的工期的延误，投标人应承担相应的责任。

本标段具体范围为：胥口车辆段出入段线、茅蓬路站（含）～枫瑞路站（含）区段土建施工监理服务（含人防土建监理服务）；胥口车辆段出入段线、胥口车辆段（如有土方外运）、集散中心站～港务路站（含）所有土方运输监理服务。对应施工标段：V-TS-01 标、V-TS-02 标、V-TS-03 标、土方 01 标。业主为方便管理，将可能对各土方运输范围及管片供应范围进行调整，费用相应调整，监理单位必须服从。

关于土方运输监理的说明：土方监理工作分为土建标段车站等范围内土方日常监理工作（该部分按土方运输合同造价的 30%计）和土建标段车站等范围外土方运输监理工作（该部分按土方运输合同造价的 70%计）。其中，土建标段车站等范围的定义为工地大门两侧 120 米范围。车站范围内土方日常监理工作由相应标段的土建监理负责；车站范围外土方运输监理工作为负责监督车站及区间土方外运工作，包括巡查土方运输路线，防止抛洒滴漏、乱倒、卖土，以及弃土场土方量的控制及管理等，由相应的土运监理负责。

关于管片监理说明：管片监理工作分为管片到现场后的日常监理（该部分按管片供应合同造价的 50%计）和管片生产厂的监理及管片出厂到现场的运输监理（该部分按管片供应合同造价的 50%计）两部分。管片到现场后的日常监理在各土建监

理标的工作范围内；管片生产厂的监理、管片出厂到现场的运输监理由相应的管片生产监理负责。

总监理工程师：**傅海政**

监理服务期：自项目开工之日起，至工程保修期结束止。分为：施工阶段监理服务期2016年7月31日～2019年12月31日，施工阶段监理服务期约41个月；工程保修服务期至所监项目缺陷责任期结束。

二、监理范围：

工程范围内的施工、竣工及保修的监理，在工程实施过程中工程规模的调整及各种工程变更均属于本监理范围。监理单位还应协助业主开展本工程竣工验收和工程结算等工作。

三、监理合同价款：

合同价款为：人民币 **贰仟肆佰肆拾叁万伍仟壹佰贰拾元** 整(RMB 24435120元)，最终合同价款按合同条件6.1、6.4款规定调整。

四、本合同中的措辞和用语与所属的监理合同条件及有关附件同义。

五、下列文件均为本合同的组成部分：

(1)本合同协议书；

(2)中标通知书；

(3)投标书及其附录；

(4)合同条件；

(5)合同附件

附件A 《苏州轨道交通监理管理办法》（暂行）

附件B 监理组织机构及人员配备表

附件C 监理组织机构及人员分工表

附件D 监理人员按服务区域分配备表

附件E 监理人员按时间分配备表

附件F 监理工程师现场办公、生活用房及设施表（业主提供）

附件G 监理合同价款分析表

附件H 监理合同价款支付表

附件I 监理工程师办公、生活用房及设施表（监理单位自备）

附件J 履约保函（格式）

附件K 现场监理机构必备仪器设备表

附件L 授权委托书

附件M 廉政责任书

(6)经业主批准的监理大纲、监理规划、监理细则等监理管理文件。

上述文件将相互补充，若有不明确或不一致处，以上述排序在前者为准。在实施过程中共同签署的补充与修正文件作为本合同协议书的组成部分，其解释顺序在合同协议书前。

六、监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同中议定范围内的监理业务。

七、业主同意按照本协议书注明的期限和方式，向监理单位支付根据本协议书规定应支付的款项，作为监理单位履行合同的报酬。

八、本合同经双方签字盖章即生效，至监理服务期满并结清监理合同价款报酬时终止。

九、本合同正本一式贰份，具有同等法律效力，业主、监理单位各执壹份。副本拾贰份，业主执捌份，监理单位执肆份。

十、本协议书以下内容如有变化，一方应及时通知另一方。

业主：苏州市轨道交通集团有限公司 监理单位：英泰克工程顾问(上海)有限公司

(盖章) (盖章)

法定代表人 法定代表人

或授权代理人： 或授权代理人：

地址：苏州市干将西路668号 地址：上海市浦东新区世纪大道1500号1508室

邮编：215004 邮编：200122

电话：0512-69899107 电话：021-68407645

传真：0512-69899100 传真：021-68407577

签约地点：江苏省苏州市

签约时间： 2016 年 7 月 26 日

苏州市房屋建筑工程□、市政基础设施工程□

竣 工 验 收 报 告

苏州市建设局印制

工程名称	苏州市轨道交通 5 号线工程土建施工项目 V-TS-01 标	工程地址	苏州市吴中区孙武路、茅蓬路		
建设单位	苏州市轨道交通集团有限公司	结构形式	框架结构、装配式衬砌		
勘察单位	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	层　数	地下二层	栋数	
设计单位	广州地铁设计研究院股份有限公司 中铁工程设计咨询集团有限公司	工程规模	37073.00 平方米		
监理单位	英泰克工程顾问（上海）有限公司	其他工程概　况			
施工单位	宏润建设集团股份有限公司				
施工证许可号	320501202104120599	开工日期	2017 年 11 月 27 日		
施工图设计审查批准书	（5HX-S-1704-JZ、JG）第 007 号 （5HX-S-1704-QJ）第 008 号	竣工日期	2021 年 4 月 30 日		

建设单位审查项目及审查结论	审　查　项　目	审　查　结　论
	1、勘察、设计单位的质量检查报告	合格 项目负责人签字 王宏利
	2、施工单位的施工竣工报告	合格 项目负责人签字 王宏利
	3、工程监理单位的质量评估报告	合格 项目负责人签字 王宏利
	4、与施工单位签订的工程质量保修文件	已签订 项目负责人签字 王宏利
	5、参建各方完成合同约定情况	已完成合同约定所有内容 项目负责人签字 王宏利
规划、公安消防、环保等部门的专项验收情况及意见： 合格		
竣工验收日期：2021 年 4 月 30 日		

竣工验收组织实施情况

一、 验收机构

1、领导层

姓　名	职　务	备　注（必须有一人为项目负责人）
王宏琳	苏州轨道公司建设分公司土建安装三部主任	

2、各专业组

房屋建筑工程□　　验收专业组 市政基础设施工程□　　验收专业组	组　长	组　员
基础、主体、装饰、屋面工程 （　　）	王宏琳	傅海政、李正坤、王瑾、吴梦、郑春华、张艳平、韩幸运、袁永华、何经宇、刘洋
给排水、燃气工程 （　　）		
建筑电气安装工程 （　　）		
通风与空调工程 （　　）		
智能建筑工程 （　　）		
电梯安装工程 （　　）		
室外工程 （　　）		

注：建设、监理、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、 验收组织程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 施工单位介绍施工情况。
3. 监理单位介绍监理情况。
4. 各验收专业组核查质保资料，并到现场检查。
5. 各验收专业组总结发言，建设单位做好记录。
6. 建设单位宣布竣工验收结论，各参建单位签字盖章。

工程质量竣工验收记录

工程竣工验收记录表汇总装订栏				
竣工验收结论：合格				
建设单位（鉴章） 项目负责人： 2021年4月30日	勘察单位（鉴章） 项目负责人： 2021年4月30日	设计单位（鉴章） 设计负责人： 2021年4月30日	监理单位（鉴章） 总监理工程师： 2021年4月30日	施工单位（鉴章） 项目经理： 法定代表人（委托代理人）： 2021年4月30日

苏州市房屋建筑工程□、市政基础设施工程☑

竣 工 验 收 报 告

苏州市建设局印制

工程名称	苏州市轨道交通5号线工程土建施工项目V-TS-02标	工程地址	苏州市吴中区孙武路、金山路		
建设单位	苏州市轨道交通集团有限公司	结构形式	车站：钢筋混凝土结构 区间：盾构区间		
勘察单位	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	层　数	地下3层/地下2层	栋数	
设计单位	中铁上海设计院集团有限公司/广州地铁设计研究院股份有限公司	工程规模	两站两区间（木渎南站、金山路站、上供路站-木渎南站-金山路站）		
监理单位	英泰克工程顾问（上海）有限公司	其他工程概　况			
施工单位	中铁四局集团有限公司				
施工证许可号	320501202105110199	开工日期	2016年11月6日		
施工图设计审查批准书		竣工日期	2021年5月13日		

建设单位审查项目及审查结论	审　查　项　目	审　查　结　论
	1、勘察、设计单位的质量检查报告	合格 项目负责人签字 王宇祥
	2、施工单位的施工竣工报告	合格 项目负责人签字 王宇祥
	3、工程监理单位的质量评估报告	合格 项目负责人签字 王宇祥
	4、与施工单位签订的工程质量保修文件	已签订 项目负责人签字 王宇祥
	5、参建各方完成合同约定情况	已完成合同约定的主体内容 项目负责人签字 王宇祥
规划、公安消防、环保等部门的专项验收情况及意见：		合格
竣工验收日期：2021.5.13		

竣工验收组织实施情况

一、 验收机构

1、领导层

姓 名	职 务	备 注（必须有一人为项目负责人）
徐红军	轨道集团公司副总工	

2、各专业组

市政基础设施工程	验收专业组	王宏琳	吴梦、邢澄、傅海政、闫宝珠、李正坤、周维、符刚

注：建设、监理、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、 验收组织程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 施工单位介绍施工情况。
3. 监理单位介绍监理情况。
4. 各验收专业组核查质保资料，并到现场检查。
5. 各验收专业组总结发言，建设单位做好记录。
6. 建设单位宣布竣工验收结论，各参建单位签字盖章。

工程质量竣工验收记录

工程竣工验收记录表汇总装订栏
竣工验收结论： 合格，同意验收

建设单位（签章）	勘察单位（签章）	设计单位（签章）	监理单位（签章）	施工单位（签章）
项目负责人：	项目负责人：	设计负责人：吴梦	总监理工程师：	项目经理：
2021年5月15日	2021年5月15日	2021年5月15日	2021年5月15日	法定代表人（委托代理人）： 2021年5月15日

苏州市房屋建筑工程□、市政基础设施工程□

竣 工 验 收 报 告

苏州市建设局印制

工程名称	苏州市轨道交通5号线工程土建施工项目（首批）V-TS-03标	工程地址	江苏省苏州市吴中区		
建设单位	苏州市轨道交通集团有限公司	结构形式	框架结构、装配式衬砌		
勘察单位	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	层　数	地下二层	栋数	
设计单位	苏交科集团股份有限公司、中铁上海设计院集团有限公司、广州地铁设计研究院股份有限公司	工程规模	36007.6 ㎡		
监理单位	英泰克工程顾问（上海）有限公司	其他工程概　况			
施工单位	中铁十六局集团有限公司				
施工证许可号	320506202102080202	开工日期	2016 年 11 月 08 日		
施工图设计审查批准书	（5HX.S.0601-JZ、JG）第001号、（5HX.S.0601-QJ）第002号	竣工日期	2021 年 04 月 30 日		

建设单位审查项目及审查结论	审查项目	审查结论
	1、勘察、设计单位的质量检查报告	合格 项目负责人签字
	2、施工单位的施工竣工报告	合格 项目负责人签字
	3、工程监理单位的质量评估报告	合格 项目负责人签字
	4、与施工单位签订的工程质量保修文件	已签订 项目负责人签字
	5、参建各方完成合同约定情况	已完成合同约定所有内容 项目负责人签字

规划、公安消防、环保等部门的专项验收情况及意见：

合格，同意验收。

竣工验收日期：2021年04月30日

竣工验收组织实施情况

一、 验收机构

1、领导层

姓 名	职 务	备 注（必须有一人为项目负责人）
姚振康	总经理	
王占生	副总经理	
王宏琳	项目负责人	

2、各专业组

房屋建筑工程□ 验收专业组 市政基础设施工程□ 验收专业组	组 长	组 员
基础、主体、装饰、屋面工程 （ ）	谢波	吴志明、王军、尹建璋、徐红军
给排水、燃气工程 （ ）		
建筑电气安装工程 （ ）	盛金国	尹振宇、陈铖、廖志国、凌松涛
通风与空调工程 （ ）		
智能建筑工程 （ ）		
电梯安装工程 （ ）		
室外工程 （ ）		

注：建设、监理、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、 验收组织程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 施工单位介绍施工情况。
3. 监理单位介绍监理情况。
4. 各验收专业组核查质保资料，并到现场检查。
5. 各验收专业组总结发言，建设单位做好记录。
6. 建设单位宣布竣工验收结论，各参建单位签字盖章。

工程质量竣工验收记录

工程竣工验收记录表汇总装订栏

竣工验收结论：

本工程已按设计约定的各项内容全部施工完成，各项资料齐全完整，工程质量评定为合格，具备工程竣工验收条件，同意通过验收。

建设单位（鉴章）	勘察单位（鉴章）	设计单位（鉴章）	监理单位（鉴章）	施工单位（鉴章）
项目负责人：	项目负责人：	设计负责人：	总监理工程师：	项目经理： 法定代表人（委托代理人）：
2021年4月30日	2021年4月30日	2021年4月30日	2021年4月30日	2021年4月30日

工程完工证明书

由 英泰克工程顾问（上海）有限公司 监理的 苏州市轨道交通5号线工程土建监理项目V-JL01标 ，总监理工程师：傅海政，身份证号：510702196811099015。监理服务期为2016年7月31日～2019年12月31日，**共约41个月**；监理合同价款为**2443.512万元**，V-JL01标所监理工程投资概算为**19.7343亿元**。

本监理标段范围土建工程共6站6区间。**木渎南站为地下三层**，其它5站为地下二层；上供路站至胥口车辆段的出入段线区间为明挖区间，其它5个区间均为盾构区间，其中**木～金盾构区间为约1700米的超长隧道**，且下穿两段岩石段各约200米（岩层主要为中风化砂岩及部分中、强风化花岗岩）和700米1-3层房屋及河流。

该项目于 2016 年 11 月 06 日正式开工，于 2020 年 11 月 30 日基本完工，现已完成设计图纸及合同约定的全部内容，正在组织验收中。

特此证明。

建设单位：苏州市轨道交通集团有限公司

建设分公司

日 期： 2020 年 12 月 7 日

项目管理机构配备情况表

投标人名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
1	项目总监	傅海政	高级工程师	注册监理工程师	国家级	31008290	市政公用工程 通信工程
2	安全监理工程师	沙宏伟	高级工程师	注册安全工程师	国家级	31120131042	建筑施工安全
3	土建专业监理工程师	朱　义	高级工程师	注册监理工程师	国家级	31010743	市政公用工程 公路工程
4	土建专业监理工程师	张小林	高级工程师	注册监理工程师	国家级	31009925	市政公用工程 公路工程
5	结构专业监理工程师	陈小龙	高级工程师	注册监理工程师	国家级	44003723	房屋建筑工程 市政公用工程
6	给排水专业监理工程师	夏　英	工程师	注册监理工程师	国家级	31012931	房屋建筑工程 市政公用工程
7	道路专业监理工程师	邓　尖	工程师	专业监理工程师	市级	B20191528	房屋建筑工程 市政公用工程
8	电气专业监理工程师	况永利	工程师	专业监理工程师	市级	B20230265	市政公用工程 机电安装工程
9	试验专业监理工程师	翟　晨	工程师	专业监理工程师	市级	JS3101410713	土建

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
10	合约造价工程师	张会云	中级经济师	注册造价工程师	一级	建[造]11223100008049	土木建筑
11	监理员	郑　龙	工程师	专业监理工程师	市级	JS3101410715T	土建
12	监理员	林明兵	工程师	专业监理工程师	市级	JS3101411422	土建
13	监理员	朱利东	工程师	专业监理工程师	市级	JS3100410262	土建
14	资料员	丘咏划	工程师	专业监理工程师	市级	B20191955	房屋建筑工程 市政公用工程
15	项目统筹管理人员（土建）	胡　颖	工程师	职称证	中级	20150113805	道路与桥梁
16	项目统筹管理人员（机电）	南君礼	工程师	职称证	中级	1800101056815 号	机电

注：后附相关证明材料。

1、项目总监：傅海政

国家注册监理工程师证

使用有效期：2025年07月11日
- 2026年01月07日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：傅海政

性　　别：男

出生日期：1968年11月09日

注册编号：31008290

注册执业单位：英泰克工程顾问（上海）有限公司

注册有效期：2026年01月28日

注册专业：市政公用工程
通信工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：

签名日期：2025.7.11

发证日期：2022年12月08日

注册证书网页截图

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
傅海政
证件类型
居民身份证
证件号码
510702**********15
性别
男
注册证书所在单位名称
英泰克工程顾问（上海）有限公司
执业注册信息
个人工程业绩
个人业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
注册监理工程师
注册单位：英泰克工程顾问（上海）有限公司
证书编号：00390945
注册编号/执业印章号：31008290
注册专业：通信工程
有效期：2026年01月28日
注册专业：市政公用工程
有效期：2026年01月28日
2023-11-09 - 变更注册 - 市政公用工程,通信工程
英泰克工程顾问(上海)有限公司
2022-12-08 - 延续注册 - 市政公用工程,房屋建筑工程
英泰克工程顾问(上海)有限公司
2022-11-23 - 变更注册 - 市政公用工程,房屋建筑工程
英泰克工程顾问(上海)有限公司

职称证

傅海政 同志

经 上海市工程系列土建施工专业高级专业技术职务任职资格评审委员会评审，确认你具备 高级工程师 任职资格。

通过日期 2015年3月24日

编 号 15C2020671

姓 名 傅海政

性 别 男

出生年月 1968.11

专 业 工程管理

工作单位 英泰克工程顾问(上海)有限公司

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 傅海政 性别 男，

学号 079240233，一九六八年十一月九日生，于二〇〇七年九月至二〇〇九年七月在本校工程管理(网络教育)专业专科起点四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长:

校 名: 同济大学

二〇〇九年七月一日

证书序列号: NO.10909714

证书编号: 102477200905003049

社保证明

单位参加城镇社会保险基本情况

2025 年 09 月

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司

社会保险码：00052006

参加社会保险登记年月	1999年06月	
参保所在地	浦东	
住所或地址	静安区场中路1988弄15－16号天祥公司一楼前台（三楼人事部）	
单位类型	企业	
法定代表人(负责人)	邓卫	
统一社会信用代码	91310000631191544Q	
《社会保险登记证》号		
《社会保险登记证》发证日期		
截至 2025 年 08 月缴费状态	正常缴费	
截至 2025 年 08 月单位参保人数信息	账户人数	208 人
	缴费人数	208 人
	领取养老待遇人数	75 人
截至 2020年9月缴费情况	无欠款	
	欠缴险种及金额	

特别提示：

自2020年11月起，本市社会保险费征管职责划转至税务部门，涉及参保单位2020年10月及以后的社会保险费缴纳信息，由税务部门负责提供。

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 09 月 05日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司　　社会保险码:00052006

697	杨源华	422431197309146015	参保缴费
702	彭凤莲	510203197902032020	参保缴费
709	靳英	130502199309290027	参保缴费
721	付峰	210402196710144131	参保缴费
722	徐佳音	310106198006092026	参保缴费
725	李广军	320831196901060052	参保缴费
737	杨国梁	211481196603092053	参保缴费
750	郑晓革	220502197109131219	参保缴费
766	张定安	320721196903021411	参保缴费
787	张吉柱	342622197612231591	参保缴费
788	傅海政	510702196811099015	参保缴费
796	张艳	372823197109298804	参保缴费
804	张柏森	152104198512013510	参保缴费
809	梁永进	320823197108263035	参保缴费
828	刘喜春	232700197803101038	参保缴费
844	蔡兵	320625196512305433	参保缴费
851	邹俊涛	370102196810133016	参保缴费
861	李其标	320823196905031013	参保缴费
874	周业锋	32108819790417555X	参保缴费
880	温义兵	150203196609150616	参保缴费
885	庄昆	320811196512161532	参保缴费
896	康青枫	310115198901023840	参保缴费
914	韩幸运	320924196709118076	参保缴费
922	魏然	320322199106187329	参保缴费

第 3 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 09 月 05日

单位参加城镇社会保险基本情况

2025 年 10 月

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司

社会保险码：00052006

参加社会保险登记年月	1999年06月	
参保所在地	浦东	
住所或地址	静安区场中路1988弄15－16号天祥公司一楼前台（三楼人事部）	
单位类型	企业	
法定代表人(负责人)	邓卫	
统一社会信用代码	91310000631191544Q	
《社会保险登记证》号		
《社会保险登记证》发证日期		
截至 2025 年 09 月缴费状态	正常缴费	
截至 2025 年 09 月单位参保人数信息	账户人数	205 人
	缴费人数	205 人
	领取养老待遇人数	75 人
截至 2020年9月缴费情况	无欠款	
	欠缴险种及金额	

特别提示：

自2020年11月起，本市社会保险费征管职责划转至税务部门，涉及参保单位2020年10月及以后的社会保险费缴纳信息，由税务部门负责提供。

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 10 月 09日

业务专用章

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司　　社会保险码:00052006

697	杨源华	422431197309146015	参保缴费
702	彭凤莲	510203197902032020	参保缴费
709	靳英	130502199309290027	参保缴费
721	付峰	210402196710144131	参保缴费
722	徐佳音	310106198006092026	参保缴费
725	李广军	320831196901060052	参保缴费
737	杨国梁	211481196603092053	参保缴费
750	郑晓革	220502197109131219	参保缴费
766	张定安	320721196903021411	参保缴费
787	张吉柱	342622197612231591	参保缴费
788	傅海政	510702196811099015	参保缴费
796	张艳	372823197109298804	参保缴费
804	张柏森	152104198512013510	参保缴费
809	梁永进	320823197108263035	参保缴费
828	刘喜春	232700197803101038	参保缴费
844	蔡兵	320625196512305433	参保缴费
851	邹俊涛	370102196810133016	参保缴费
861	李其标	320823196905031013	参保缴费
874	周业锋	32108819790417555X	参保缴费
880	温义兵	150203196609150616	参保缴费
885	庄昆	320811196512161532	参保缴费
896	康青枫	310115198901023840	参保缴费
914	韩幸运	320924196709118076	参保缴费
922	魏然	320322199106187329	参保缴费

第 3 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 10 月 09日

单位参加城镇社会保险基本情况

2025 年 11 月

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司

社会保险码：00052006

参加社会保险登记年月	1999年06月	
参保所在地	浦东	
住所或地址	静安区场中路1988弄15－16号天祥公司一楼前台（三楼人事部）	
单位类型	企业	
法定代表人(负责人)	邓卫	
统一社会信用代码	91310000631191544Q	
《社会保险登记证》号		
《社会保险登记证》发证日期		
截至 2025 年 10 月缴费状态	正常缴费	
截至 2025 年 10 月单位参保人数信息	账户人数	200 人
	缴费人数	200 人
	领取养老待遇人数	75 人
截至 2020年9月缴费情况	无欠款	
	欠缴险种及金额	

特别提示：

自2020年11月起，本市社会保险费征管职责划转至税务部门，涉及参保单位2020年10月及以后的社会保险费缴纳信息，由税务部门负责提供。

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 11 月 05日

业务专用章

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司　　社会保险码:00052006

697	杨源华	422431197309146015	参保缴费
702	彭凤莲	510203197902032020	参保缴费
709	靳英	130502199309290027	参保缴费
721	付峰	210402196710144131	参保缴费
722	徐佳音	310106198006092026	参保缴费
725	李广军	320831196901060052	参保缴费
737	杨国梁	211481196603092053	参保缴费
750	郑晓革	220502197109131219	参保缴费
766	张定安	320721196903021411	参保缴费
787	张吉柱	342622197612231591	参保缴费
788	傅海政	510702196811099015	参保缴费
796	张艳	372823197109298804	参保缴费
804	张柏森	152104198512013510	参保缴费
809	梁永进	320823197108263035	参保缴费
828	刘喜春	232700197803101038	参保缴费
844	蔡兵	320625196512305433	参保缴费
851	邹俊涛	370102196810133016	参保缴费
861	李其标	320823196905031013	参保缴费
874	周业锋	32108819790417555X	参保缴费
880	温义兵	150203196609150616	参保缴费
885	庄昆	320811196512161532	参保缴费
896	康青枫	310115198901023840	参保缴费
914	韩幸运	320924196709118076	参保缴费
922	魏然	320322199106187329	参保缴费

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 11 月 05日

2、安全监理工程师：沙宏伟

国家注册安全工程师证

姓　　名　沙宏伟

性　　别　男

执业资格证书编号　0156631

发证日期　2012年11月29日

持证人签名

执 业 证 号　31120131042

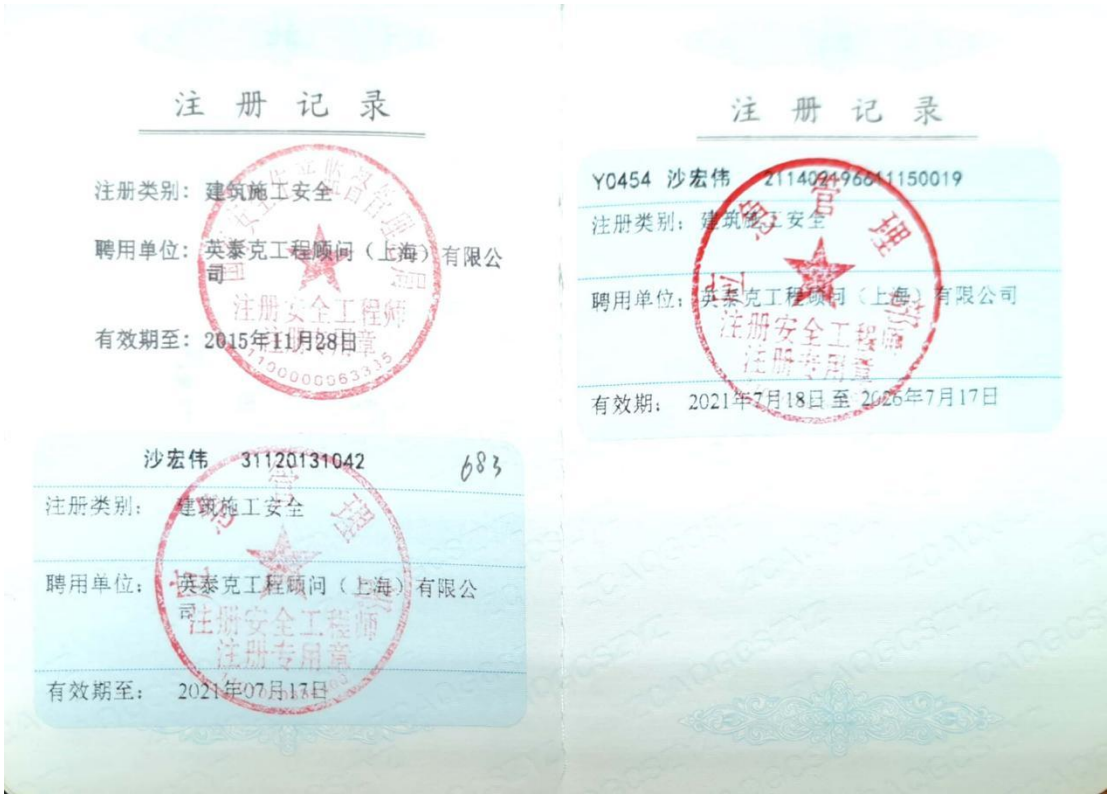

注 册 记 录

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：英泰克工程顾问（上海）有限公司

有效期至：2015年11月28日

注册安全工程师

注册专用章

注 册 记 录

Y0454 沙宏伟 211402496811150019

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：英泰克工程顾问（上海）有限公司

有效期：2021年7月18日至2026年7月17日

沙宏伟 31120131042 683

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：英泰克工程顾问（上海）有限公司

有效期至：2021年07月17日

职称证

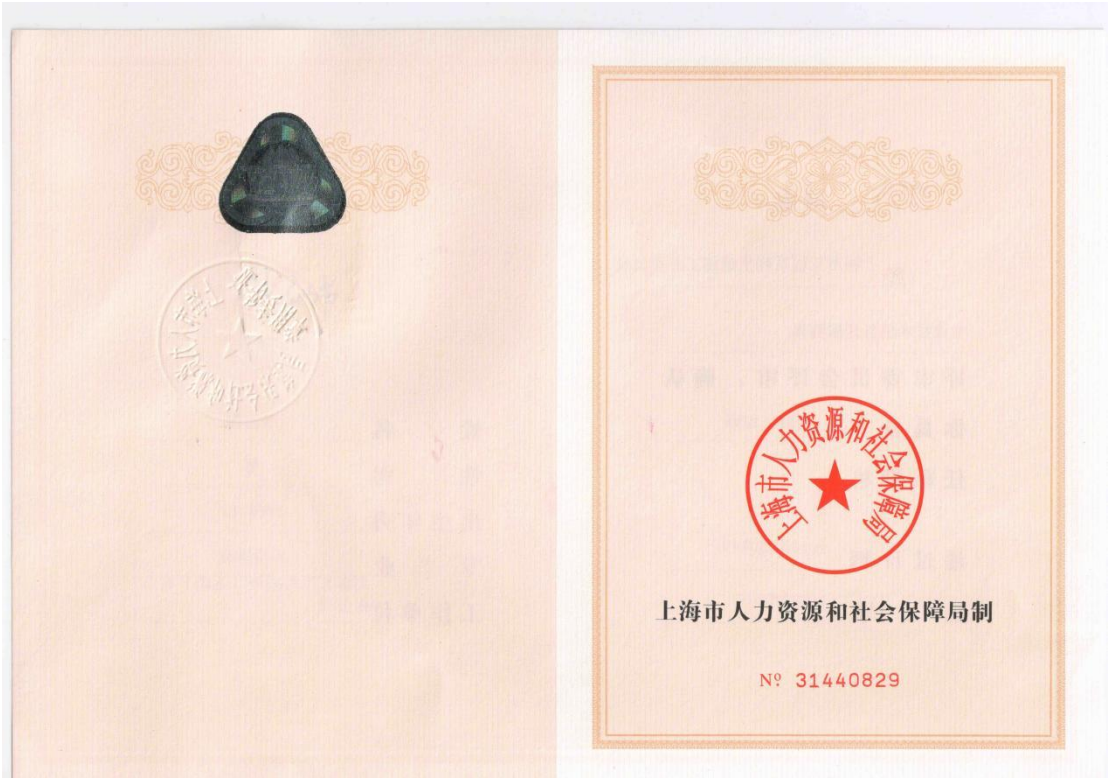
上海市人力资源和社会保障局制
№ 31440829

沙宏伟 同志
经 上海市工程系列土建施工专业高级
专业技术职务任职资格
评审委员会评审，确认
你具备 高级工程师
任职资格。
通过日期 2014年12月19日
编 号 14C2020095
姓 名 沙宏伟
性 别 男
出生年月 1966.11
专 业 工程管理
工作单位 英泰克工程顾问（上海）有限公司

毕业证

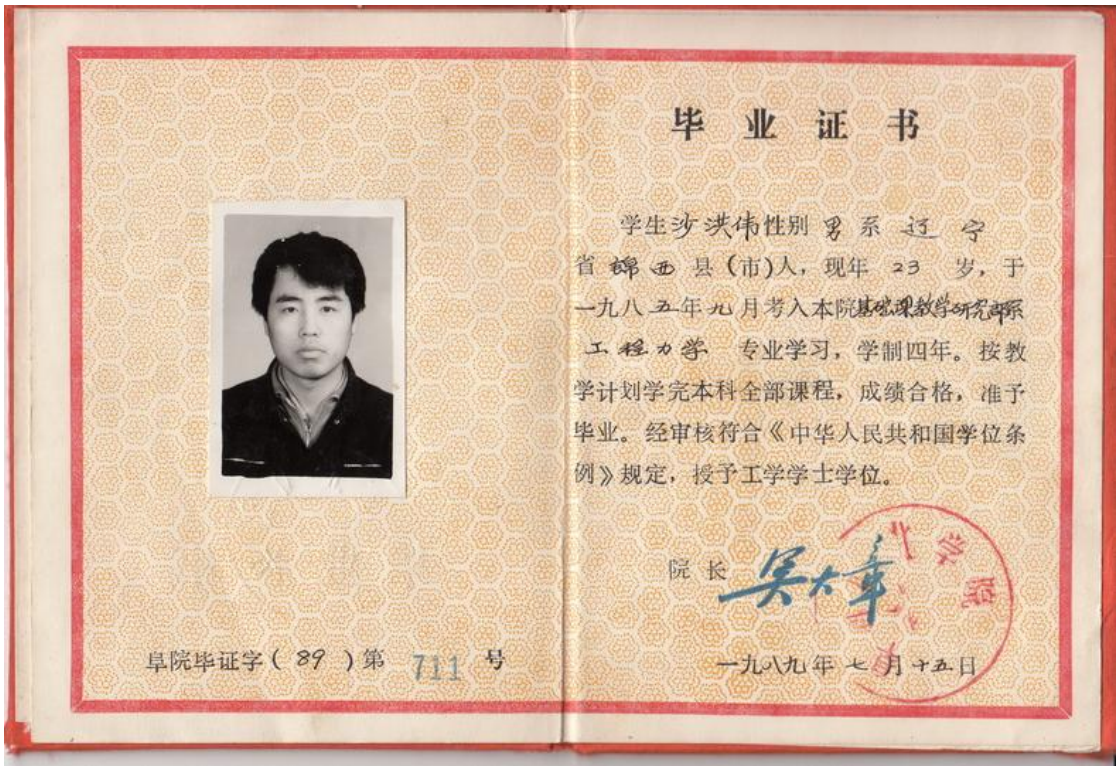

毕 业 证 书

学生汤洪伟性别男系辽宁省锦西县(市)人，现年23岁，于一九八五年九月考入本院基础课教学研究部系工程力学专业学习，学制四年。按教学计划学完本科全部课程，成绩合格，准予毕业。经审核符合《中华人民共和国学位条例》规定，授予工学学士学位。

院长 吴大章

阜院毕证字（89）第 711 号

一九八九年七月十五日

国家注册监理工程师证

使用有效期：2025年07月11日
- 2026年01月07日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：沙宏伟

性　　别：男

出生日期：1966年11月15日

注册编号：31000143

注册执业单位：英泰克工程顾问（上海）有限公司

注册有效期：2027年11月23日

注册专业：市政公用工程
通信工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：沙宏伟

签名日期：2025.7.11

发证日期：2024年10月31日

社保证明

单位参加城镇社会保险基本情况

2025 年 09 月

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司

社会保险码：00052006

参加社会保险登记年月	1999年06月	
参保所在地	浦东	
住所或地址	静安区场中路1988弄15－16号天祥公司一楼前台（三楼人事部）	
单位类型	企业	
法定代表人(负责人)	邓卫	
统一社会信用代码	91310000631191544Q	
《社会保险登记证》号		
《社会保险登记证》发证日期		
截至 2025 年 08 月缴费状态	正常缴费	
截至 2025 年 08 月单位参保人数信息	账户人数	208 人
	缴费人数	208 人
	领取养老待遇人数	75 人
截至 2020年9月缴费情况	无欠款	
	欠缴险种及金额	

特别提示：

自2020年11月起，本市社会保险费征管职责划转至税务部门，涉及参保单位2020年10月及以后的社会保险费缴纳信息，由税务部门负责提供。

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 09 月 05日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司　　社会保险码:00052006

序号	姓名	证件号码	上月缴费状态
14	施敏霞	310230197805102527	参保缴费
68	张祖成	320322196907027356	参保缴费
94	蒋崇山	230803196810050070	参保缴费
122	马新	320219197409253554	参保缴费
142	祝建新	21040219660906353X	参保缴费
157	卜佩珏	310115198306160429	参保缴费
158	周伟	230804196710280019	参保缴费
164	王笑莺	310225197801203821	参保缴费
166	周佩佩	330382198409067141	参保缴费
176	黄军	310115198211016010	参保缴费
188	屠菁	31011019820331514X	参保缴费
202	陈剑	320926197504278911	参保缴费
222	倪向群	342501196802190274	参保缴费
226	方霞君	310110198305022743	参保缴费
257	沙宏伟	211402196611150019	参保缴费
263	莫恩清	110108196611242359	参保缴费
274	杨海渠	41302319660408055X	参保缴费
275	顾峥嵘	31010419670329481X	参保缴费
277	何学思	150203196511274530	参保缴费
279	邵谦	32072219691001083X	参保缴费
280	陈海兵	320981198010274733	参保缴费
283	汪益荣	340223197312152819	参保缴费
291	张金华	230103196603104939	参保缴费
320	邵凤密	320301196704160614	参保缴费

第 1 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 09月 05日

单位参加城镇社会保险基本情况

2025 年 10 月

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司

社会保险码：00052006

参加社会保险登记年月	1999年06月	
参保所在地	浦东	
住所或地址	静安区场中路1988弄15－16号天祥公司一楼前台（三楼人事部）	
单位类型	企业	
法定代表人(负责人)	邓卫	
统一社会信用代码	91310000631191544Q	
《社会保险登记证》号		
《社会保险登记证》发证日期		
截至 2025 年 09 月缴费状态	正常缴费	
截至 2025 年 09 月单位参保人数信息	账户人数	205 人
	缴费人数	205 人
	领取养老待遇人数	75 人
截至 2020年9月缴费情况	无欠款	
	欠缴险种及金额	

特别提示：

自2020年11月起，本市社会保险费征管职责划转至税务部门，涉及参保单位2020年10月及以后的社会保险费缴纳信息，由税务部门负责提供。

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 10 月 09日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司　　社会保险码:00052006

序号	姓名	证件号码	上月缴费状态
14	施敏霞	310230197805102527	参保缴费
68	张祖成	320322196907027356	参保缴费
94	蒋崇山	230803196810050070	参保缴费
122	马新	320219197409253554	参保缴费
142	祝建新	21040219660906353X	参保缴费
157	卜佩珏	310115198306160429	参保缴费
158	周伟	230804196710280019	参保缴费
164	王笑莺	310225197801203821	参保缴费
166	周佩佩	330382198409067141	参保缴费
176	黄军	310115198211016010	参保缴费
188	屠菁	31011019820331514X	参保缴费
202	陈剑	320926197504278911	参保缴费
222	倪向群	342501196802190274	参保缴费
226	方霞君	310110198305022743	参保缴费
257	沙宏伟	211402196611150019	参保缴费
263	莫恩清	110108196611242359	参保缴费
274	杨海渠	41302319660408055X	参保缴费
275	顾峥嵘	31010419670329481X	参保缴费
277	何学思	150203196511274530	参保缴费
279	邵谦	32072219691001083X	参保缴费
280	陈海兵	320981198010274733	参保缴费
283	汪益荣	340223197312152819	参保缴费
291	张金华	230103196603104939	参保缴费
320	邵凤密	320301196704160614	参保缴费

第 1 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 10 月 09日

单位参加城镇社会保险基本情况

2025 年 11 月

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司

社会保险码：00052006

参加社会保险登记年月	1999年06月	
参保所在地	浦东	
住所或地址	静安区场中路1988弄15－16号天祥公司一楼前台（三楼人事部）	
单位类型	企业	
法定代表人(负责人)	邓卫	
统一社会信用代码	91310000631191544Q	
《社会保险登记证》号		
《社会保险登记证》发证日期		
截至 2025 年 10 月缴费状态	正常缴费	
截至 2025 年 10 月单位参保人数信息	账户人数	200 人
	缴费人数	200 人
	领取养老待遇人数	75 人
截至 2020年9月缴费情况	无欠款	
	欠缴险种及金额	

特别提示：

自2020年11月起，本市社会保险费征管职责划转至税务部门，涉及参保单位2020年10月及以后的社会保险费缴纳信息，由税务部门负责提供。

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 11 月 05日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司　　社会保险码:00052006

序号	姓名	证件号码	上月缴费状态
14	施敏霞	310230197805102527	参保缴费
68	张祖成	320322196907027356	参保缴费
94	蒋崇山	230803196810050070	参保缴费
122	马新	320219197409253554	参保缴费
142	祝建新	21040219660906353X	参保缴费
157	卜佩珏	310115198306160429	参保缴费
158	周伟	230804196710280019	参保缴费
164	王笑莺	310225197801203821	参保缴费
166	周佩佩	330382198409067141	参保缴费
176	黄军	310115198211016010	参保缴费
188	屠菁	31011019820331514X	参保缴费
202	陈剑	320926197504278911	参保缴费
222	倪向群	342501196802190274	参保缴费
226	方霞君	310110198305022743	参保缴费
257	沙宏伟	211402196611150019	参保缴费
263	莫恩清	110108196611242359	参保缴费
274	杨海渠	41302319660408055X	参保缴费
275	顾峥嵘	31010419670329481X	参保缴费
277	何学思	150203196511274530	参保缴费
279	邵谦	32072219691001083X	参保缴费
280	陈海兵	320981198010274733	参保缴费
283	汪益荣	340223197312152819	参保缴费
291	张金华	230103196603104939	参保缴费
320	邵凤密	320301196704160614	参保缴费

第 1 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 11 月 05日

3、土建专业监理工程师：朱义

国家注册监理工程师证

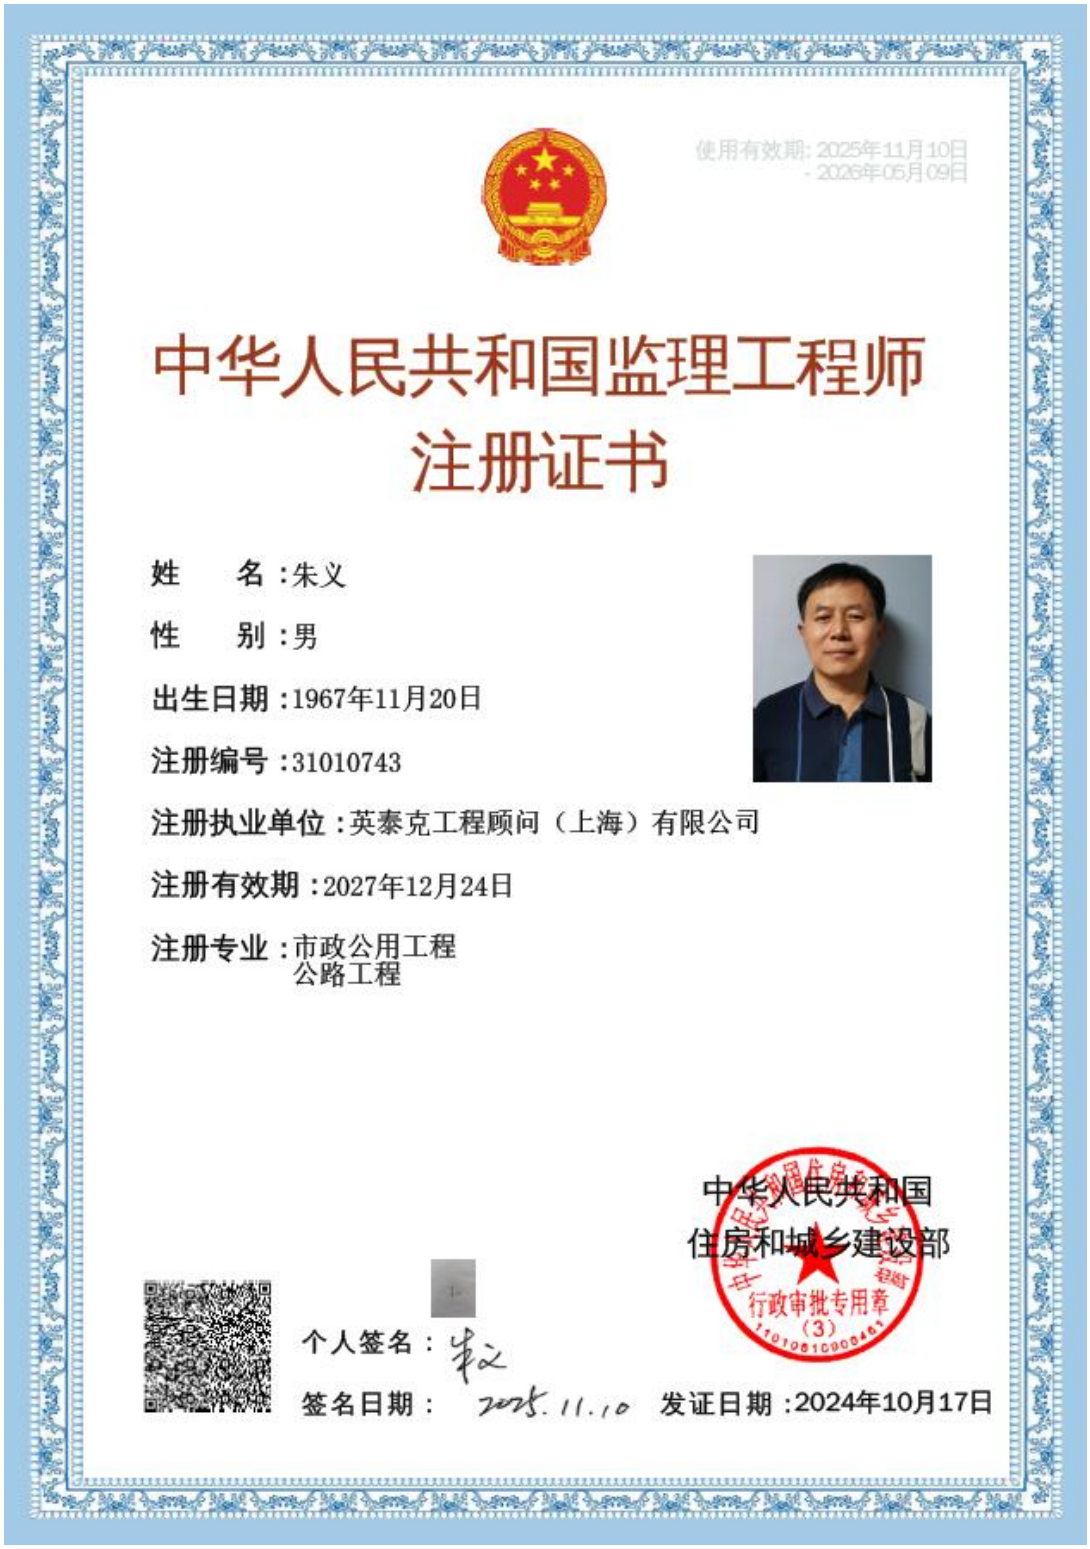

使用有效期：2025年11月10日
- 2026年05月09日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：朱义

性　　别：男

出生日期：1967年11月20日

注册编号：31010743

注册执业单位：英泰克工程顾问（上海）有限公司

注册有效期：2027年12月24日

注册专业：市政公用工程
公路工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：朱义

签名日期：2025.11.10　　发证日期：2024年10月17日

职称证

This certificate is printed by Department of Human Resources and Social Security of Anhui Province. This is to certify the corresponding specialty level and abilities of the bearer in professional & technical positions of none stateowned economic organization.

No.

持证人签名
Signature of the bearer

姓　　名 朱义
Full Name

性　　别 男
Sex

出生年月 1967年11月
Date of Birth

工作单位 安徽建工集团
Working Unit

系列名称 工程
Category Appellation

专业名称 建筑工程
Specialty Appellation

资格名称 高级工程师
Qualification Appellation

评审时间 2017年01月
Appraisal Date

评委会（章）
Commission(Sign)

2017 年 07 月 26 日
Y M D

毕业证

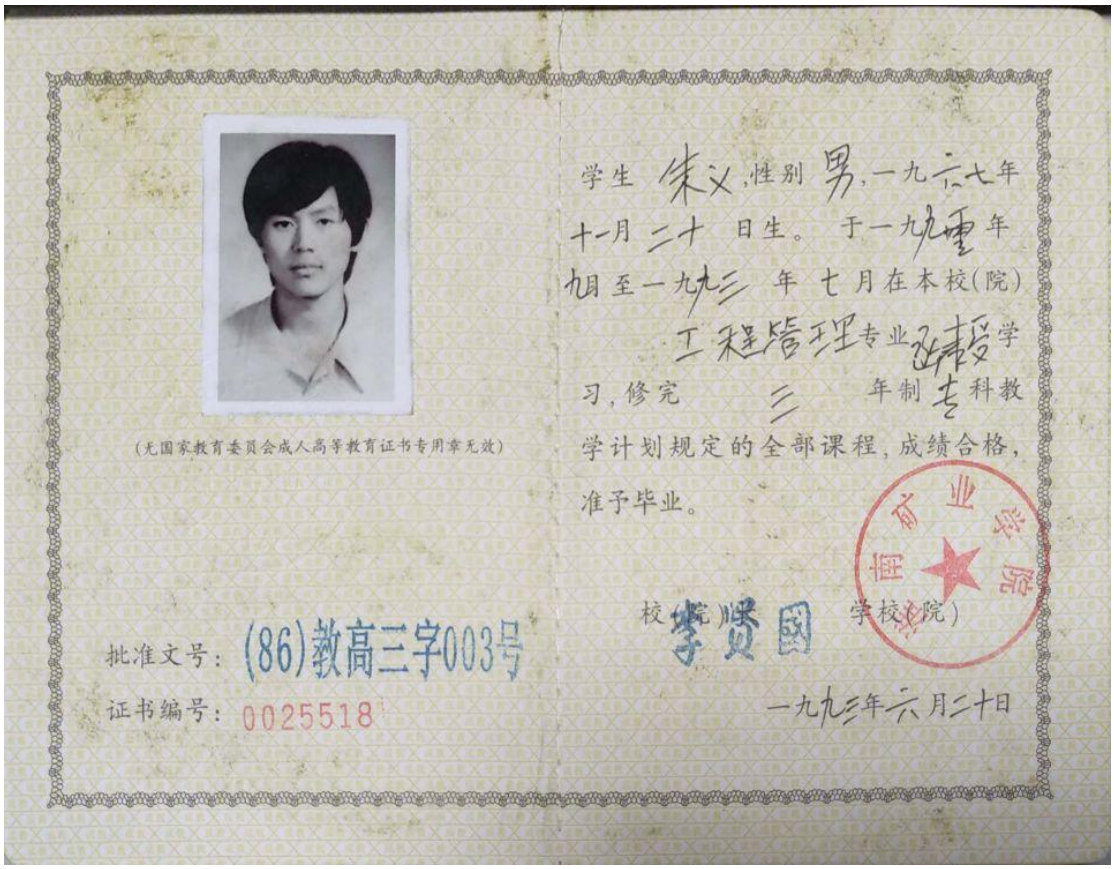

（无国家教育委员会成人高等教育证书专用章无效）

学生 朱义，性别 男，一九六七年十一月二十 日生。于一九九零年九月至一九九三 年 七月在本校（院）工程管理专业 函授 学习，修完 三 年制 专科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长 李贤国 学校（院）

一九九三年六月二十日

批准文号：(86)教高三字003号

证书编号：0025518

郑州大学 ZHENGZHOU UNIVERSITY

毕 业 证 书

朱义，男，一九六七年 十一月 二十 日生。于二〇一九年 九 月至二〇二二年 六 月在本校 土木工程（专升本） 专业 2.5 年制网络教育 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

郑州大学

校 长：李蓬

证书编号：104597202205505792

二〇二二 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保证明

单位参加城镇社会保险基本情况

2025 年 09 月

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司

社会保险码：00052006

参加社会保险登记年月	1999年06月	
参保所在地	浦东	
住所或地址	静安区场中路1988弄15－16号天祥公司一楼前台（三楼人事部）	
单位类型	企业	
法定代表人(负责人)	邓卫	
统一社会信用代码	91310000631191544Q	
《社会保险登记证》号		
《社会保险登记证》发证日期		
截至 2025 年 08 月缴费状态	正常缴费	
截至 2025 年 08 月单位参保人数信息	账户人数	208 人
	缴费人数	208 人
	领取养老待遇人数	75 人
截至 2020年9月缴费情况	无欠款	
	欠缴险种及金额	

特别提示：

自2020年11月起，本市社会保险费征管职责划转至税务部门，涉及参保单位2020年10月及以后的社会保险费缴纳信息，由税务部门负责提供。

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 09 月 05日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司　　社会保险码:00052006

929	邱鸿	320831196901020253	参保缴费
933	于立军	232622197004184618	参保缴费
939	杨军卫	310225197106245210	参保缴费
941	王延昭	130403198709192131	参保缴费
952	王彦波	320823196706153210	参保缴费
966	吴雷涛	410221198611023419	参保缴费
968	张青岩	320721199309141211	参保缴费
971	姜磊	320683199204080815	参保缴费
988	张学海	320624196606110817	参保缴费
992	黄政军	320622197501082639	参保缴费
1025	李辉超	32038219890401343X	参保缴费
1034	夏万青	342622196804107531	参保缴费
1095	张鹏	310105198602070417	参保缴费
1099	张哲	32032219860903731X	参保缴费
1105	郭雨落	150203196708150750	参保缴费
1115	苏立永	412924197204021939	参保缴费
1119	王磊	230603199205043713	参保缴费
1122	郭育森	220402197111185034	参保缴费
1136	刘海波	230207198508060018	参保缴费
1137	蒋鹰	51021319700305021X	参保缴费
1139	朱义	34040319671120121X	参保缴费
1141	徐鹏	320683199603280814	参保缴费
1144	陈玉言	342201198012078221	参保缴费
1153	马层林	342622197008210997	参保缴费

第 4 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 09月 05日

单位参加城镇社会保险基本情况

2025 年 10 月

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司

社会保险码：00052006

参加社会保险登记年月	1999年06月	
参保所在地	浦东	
住所或地址	静安区场中路1988弄15－16号天祥公司一楼前台（三楼人事部）	
单位类型	企业	
法定代表人(负责人)	邓卫	
统一社会信用代码	91310000631191544Q	
《社会保险登记证》号		
《社会保险登记证》发证日期		
截至 2025 年 09 月缴费状态	正常缴费	
截至 2025 年 09 月单位参保人数信息	账户人数	205 人
	缴费人数	205 人
	领取养老待遇人数	75 人
截至 2020年9月缴费情况	无欠款	
	欠缴险种及金额	

特别提示：

自2020年11月起，本市社会保险费征管职责划转至税务部门，涉及参保单位2020年10月及以后的社会保险费缴纳信息，由税务部门负责提供。

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 10 月 09日

业务专用章

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司　　社会保险码:00052006

929	邱鸿	320831196901020253	参保缴费
933	于立军	232622197004184618	参保缴费
939	杨军卫	310225197106245210	参保缴费
941	王延昭	130403198709192131	参保缴费
952	王彦波	320823196706153210	参保缴费
966	吴雷涛	410221198611023419	参保缴费
968	张青岩	320721199309141211	参保缴费
971	姜磊	320683199204080815	参保缴费
988	张学海	320624196606110817	参保缴费
992	黄政军	320622197501082639	参保缴费
1025	李辉超	32038219890401343X	参保缴费
1034	夏万青	342622196804107531	参保缴费
1095	张鹏	310105198602070417	参保缴费
1099	张哲	32032219860903731X	参保缴费
1105	郭雨落	150203196708150750	参保缴费
1115	苏立永	412924197204021939	参保缴费
1119	王础	230603199205043713	参保缴费
1122	郭育森	220402197111185034	参保缴费
1136	刘海波	230207198508060018	参保缴费
1137	蒋鹰	51021319700305021X	参保缴费
1139	朱义	340403196711201 21X	参保缴费
1141	徐鹏	320683199603280814	参保缴费
1144	陈玉言	342201198012078221	参保缴费
1153	马层林	342622197008210997	参保缴费

第 4 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 10 月 09日

单位参加城镇社会保险基本情况

2025 年 11 月

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司

社会保险码：00052006

参加社会保险登记年月	1999年06月	
参保所在地	浦东	
住所或地址	静安区场中路1988弄15－16号天祥公司一楼前台（三楼人事部）	
单位类型	企业	
法定代表人(负责人)	邓卫	
统一社会信用代码	91310000631191544Q	
《社会保险登记证》号		
《社会保险登记证》发证日期		
截至 2025 年 10 月缴费状态	正常缴费	
截至 2025 年 10 月单位参保人数信息	账户人数	200 人
	缴费人数	200 人
	领取养老待遇人数	75 人
截至 2020年9月缴费情况	无欠款	
	欠缴险种及金额	

特别提示：

自2020年11月起，本市社会保险费征管职责划转至税务部门，涉及参保单位2020年10月及以后的社会保险费缴纳信息，由税务部门负责提供。

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 11 月 05日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司　　社会保险码:00052006

929	邱鸿	320831196901020253	参保缴费
933	于立军	232622197004184618	参保缴费
939	杨军卫	310225197106245210	参保缴费
941	王延昭	130403198709192131	参保缴费
952	王彦波	320823196706153210	参保缴费
966	吴雷涛	410221198611023419	参保缴费
968	张青岩	320721199309141211	参保缴费
971	姜磊	320683199204080815	参保缴费
988	张学海	320624196606110817	参保缴费
992	黄政军	320622197501082639	参保缴费
1025	李辉超	32038219890401343X	参保缴费
1034	夏万青	342622196804107531	参保缴费
1095	张鹏	310105198602070417	参保缴费
1099	张哲	32032219860903731X	参保缴费
1105	郭雨落	150203196708150750	参保缴费
1119	王磊	230603199205043713	参保缴费
1122	郭育森	220402197111185034	参保缴费
1136	刘海波	230207198508060018	参保缴费
1137	蒋鹰	51021319700305021X	参保缴费
1139	朱义	34040319671120121X	参保缴费
1141	徐鹏	320683199603280814	参保缴费
1144	陈玉言	342201198012078221	参保缴费
1153	马层林	342622197008210997	参保缴费
1162	王延斌	150203196611082413	参保缴费

第 4 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 11月 05日

4、土建专业监理工程师：张小林

国家注册监理工程师证

使用有效期: 2025年07月31日
- 2026年01月27日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名 :张小林

性　　别 :男

出生日期 :1987年01月27日

注册编号 :31009925

注册执业单位 :英泰克工程顾问（上海）有限公司

注册有效期 :2026年04月27日

注册专业 :房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：

发证日期 :2023年02月22日

职称证

上海市高级专业技术职称证书

姓　　名：张小林

性　　别：男

出 生 年 月：1987-01

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：440222198701271514

工 作 单 位：英泰克工程顾问（上海）有限公司

职 称 名 称：高级工程师

专 业 名 称：工程管理

评 审 机 构：上海市工程系列土建施工专业高级职称评审委员会

取得职称时间：2022-12-30

证 书 编 号：22GEEBCH0532

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局 专业技术资格证书 专用章

电子印章

毕业证

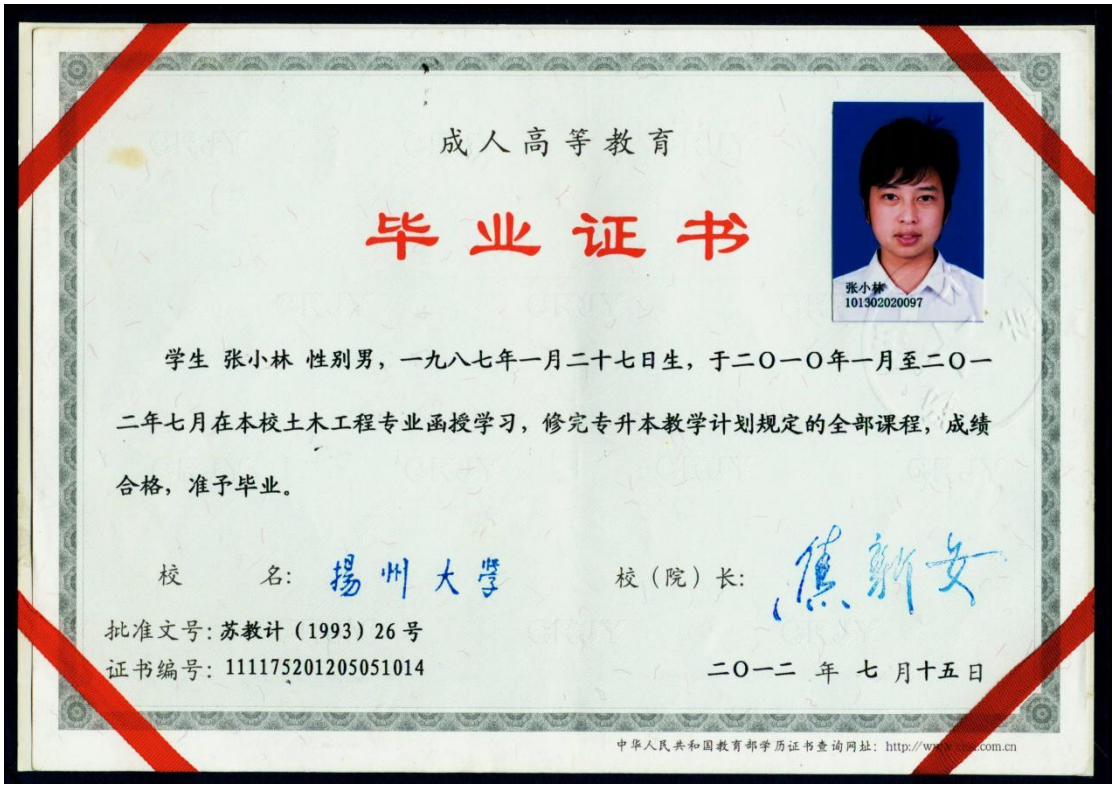

成人高等教育

毕业证书

学生 张小林 性别男，一九八七年一月二十七日生，于二〇一〇年一月至二〇一二年七月在本校土木工程专业函授学习，修完专升本教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：扬州大学　　校（院）长：

批准文号：苏教计（1993）26号

证书编号：111175201205051014

二〇一二 年 七 月十五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保证明

单位参加城镇社会保险基本情况

2025 年 09 月

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司

社会保险码：00052006

参加社会保险登记年月	1999年06月	
参保所在地	浦东	
住所或地址	静安区场中路1988弄15－16号天祥公司一楼前台（三楼人事部）	
单位类型	企业	
法定代表人(负责人)	邓卫	
统一社会信用代码	91310000631191544Q	
《社会保险登记证》号		
《社会保险登记证》发证日期		
截至 2025 年 08 月缴费状态	正常缴费	
截至 2025 年 08 月单位参保人数信息	账户人数	208 人
	缴费人数	208 人
	领取养老待遇人数	75 人
截至 2020年9月缴费情况	无欠款	
	欠缴险种及金额	

特别提示：

自2020年11月起，本市社会保险费征管职责划转至税务部门，涉及参保单位2020年10月及以后的社会保险费缴纳信息，由税务部门负责提供。

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 09 月 05日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司　　社会保险码:00052006

1262	刘培勋	370111196610122036	参保缴费
1269	夏铁军	310225198210312238	参保缴费
1274	朱晨光	211402198306080818	参保缴费
1280	廖海	420881198912225816	参保缴费
1284	张小林	440222198701271514	参保缴费
1290	潘元蒙	372922199611082329	参保缴费
1291	张会云	370285199108156525	参保缴费
1293	罗杰	511123199703045355	参保缴费
1294	王星	320821199211184710	参保缴费
1295	邹正清	320831196811062417	参保缴费
1298	张冬梅	152626198101023920	参保缴费
1316	张萍	310102197610030024	参保缴费
1331	周鹏	430403197512301011	参保缴费
1348	赵一鸣	310107197701162032	参保缴费
1361	马云苇	310115199109130911	参保缴费
1368	李神选	62050319930616161X	参保缴费
1370	李证科	500110199507190411	参保缴费
1380	杨志	532531199809060816	参保缴费
1389	李胜利	330719197107095318	参保缴费
1395	仝玉博	371523199706217250	参保缴费
1396	周峰	150203197701280012	参保缴费
1397	杨天祥	310102199504173610	参保缴费
1399	冯向虎	612725198902240239	参保缴费
1406	黄遵林	413027197901045611	参保缴费

第 6 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 09月 05日

单位参加城镇社会保险基本情况

2025 年 10 月

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司

社会保险码：00052006

参加社会保险登记年月	1999年06月	
参保所在地	浦东	
住所或地址	静安区场中路1988弄15－16号天祥公司一楼前台（三楼人事部）	
单位类型	企业	
法定代表人(负责人)	邓卫	
统一社会信用代码	91310000631191544Q	
《社会保险登记证》号		
《社会保险登记证》发证日期		
截至 2025 年 09 月缴费状态	正常缴费	
截至 2025 年 09 月单位参保人数信息	账户人数	205 人
	缴费人数	205 人
	领取养老待遇人数	75 人
截至 2020年9月缴费情况	无欠款	
	欠缴险种及金额	

特别提示：

自2020年11月起，本市社会保险费征管职责划转至税务部门，涉及参保单位2020年10月及以后的社会保险费缴纳信息，由税务部门负责提供。

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 10 月 09日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司　　社会保险码:00052006

1262	刘培勋	370111196610122036	参保缴费
1269	夏铁军	310225198210312238	参保缴费
1274	朱晨光	211402198306080818	参保缴费
1280	廖海	420881198912225816	参保缴费
1284	张小林	440222198701271514	参保缴费
1290	潘元蒙	372922199611082329	参保缴费
1291	张会云	370285199108156525	参保缴费
1293	罗杰	511123199703045355	参保缴费
1294	王星	320821199211184710	参保缴费
1295	邹正清	320831196811062417	参保缴费
1298	张冬梅	152626198101023920	参保缴费
1316	张萍	310102197610030024	参保缴费
1331	周鹏	430403197512301011	参保缴费
1348	赵一鸣	310107197701162032	参保缴费
1361	马云苇	310115199109130911	参保缴费
1368	李神选	62050319930616161X	参保缴费
1370	李证科	500110199507190411	参保缴费
1380	杨志	532531199809060816	参保缴费
1389	李胜利	330719197107095318	参保缴费
1395	仝玉博	371523199706217250	参保缴费
1396	周峰	150203197701280012	参保缴费
1397	杨天祥	310102199504173610	参保缴费
1399	冯向虎	612725198902240239	参保缴费
1406	黄遵林	413027197901045611	参保缴费

第 6 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 10月 09日

单位参加城镇社会保险基本情况

2025 年 11 月

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司

社会保险码：00052006

参加社会保险登记年月	1999年06月	
参保所在地	浦东	
住所或地址	静安区场中路1988弄15－16号天祥公司一楼前台（三楼人事部）	
单位类型	企业	
法定代表人(负责人)	邓卫	
统一社会信用代码	91310000631191544Q	
《社会保险登记证》号		
《社会保险登记证》发证日期		
截至 2025 年 10 月缴费状态	正常缴费	
截至 2025 年 10 月单位参保人数信息	账户人数	200 人
	缴费人数	200 人
	领取养老待遇人数	75 人
截至 2020年9月缴费情况	无欠款	
	欠缴险种及金额	

特别提示：

自2020年11月起，本市社会保险费征管职责划转至税务部门，涉及参保单位2020年10月及以后的社会保险费缴纳信息，由税务部门负责提供。

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 11 月 05日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司　　社会保险码:00052006

1274	朱晨光	211402198306080818	参保缴费
1280	廖海	420881198912225816	参保缴费
1284	张小林	440222198701271514	参保缴费
1290	潘元蒙	372922199611082329	参保缴费
1291	张会云	370285199108156525	参保缴费
1293	罗杰	511123199703045355	参保缴费
1294	王星	320821199211184710	参保缴费
1295	邹正清	320831196811062417	参保缴费
1298	张冬梅	152626198101023920	参保缴费
1316	张萍	310102197610030024	参保缴费
1331	周鹏	430403197512301011	参保缴费
1348	赵一鸣	310107197701162032	参保缴费
1361	马云苇	310115199109130911	参保缴费
1368	李神选	62050319930616161X	参保缴费
1370	李证科	500110199507190411	参保缴费
1380	杨志	532531199809060816	参保缴费
1389	李胜利	330719197107095318	参保缴费
1395	仝玉博	371523199706217250	参保缴费
1396	周峰	150203197701280012	参保缴费
1397	杨天祥	310102199504173610	参保缴费
1399	冯向虎	612725198902240239	参保缴费
1406	黄遵林	413027197901045611	参保缴费
1412	陈海华	31022619710228231X	参保缴费
1416	郭俊宝	152601199511213118	参保缴费

第 6 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 11 月 05日

5、结构专业监理工程师：陈小龙

国建注册监理工程师证

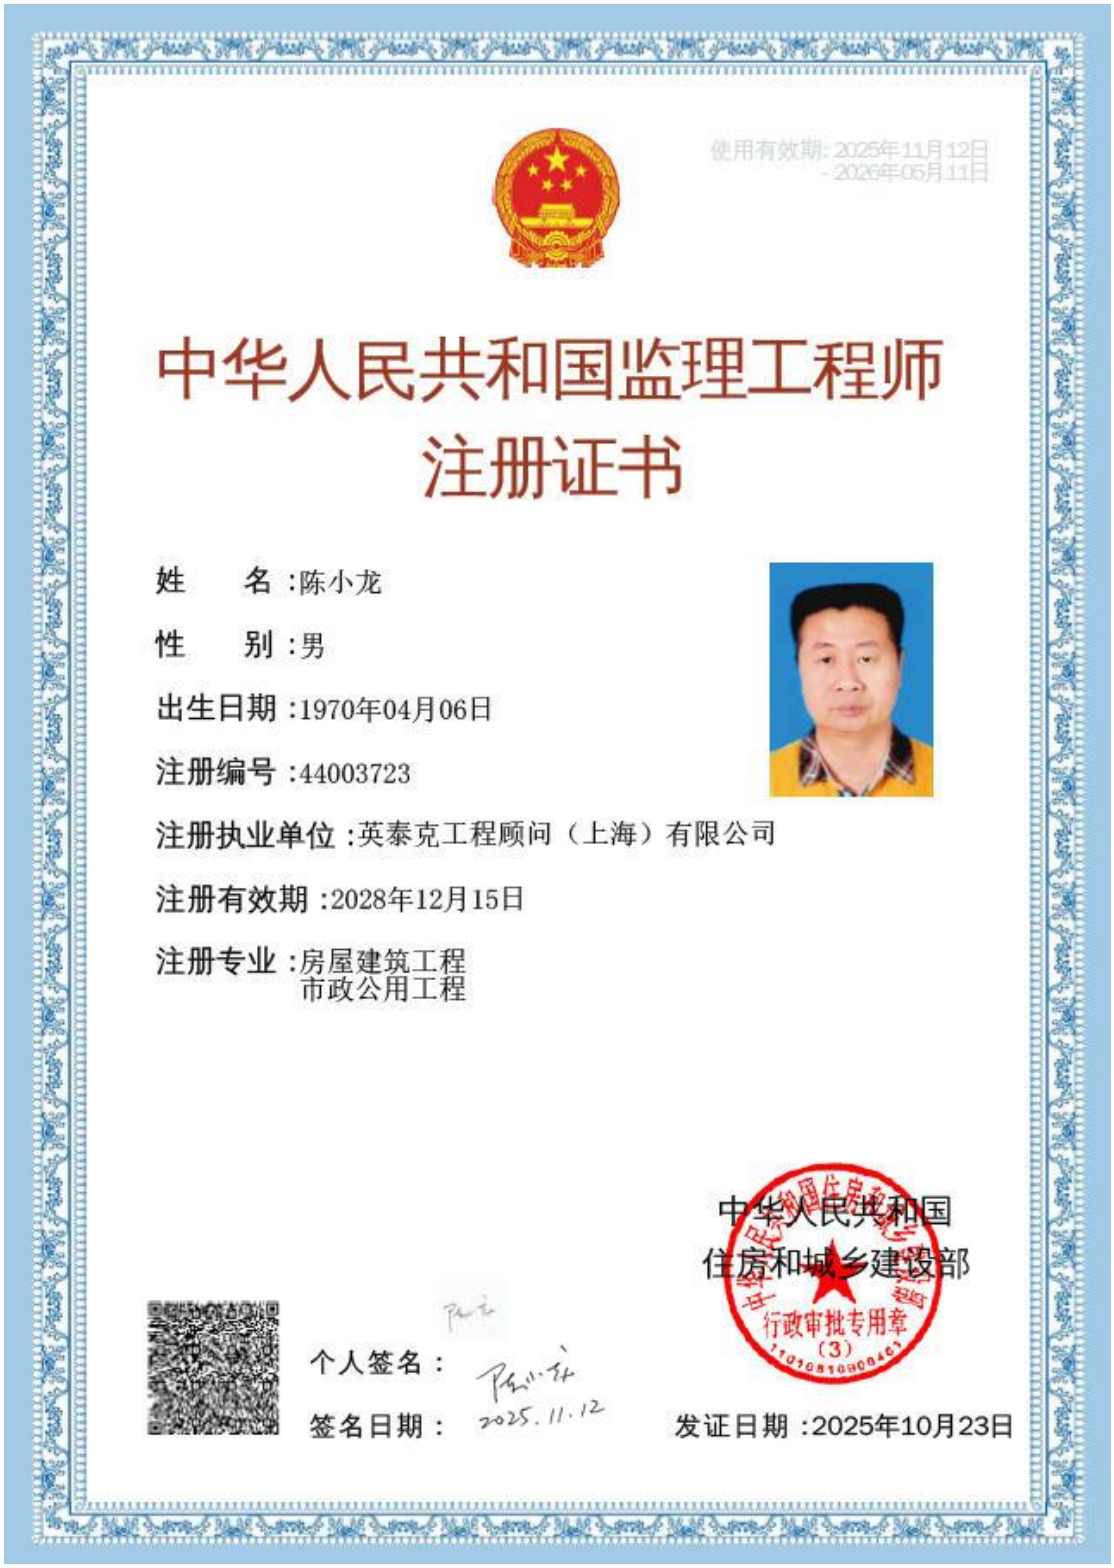

使用有效期：2025年11月12日
-2026年05月11日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：陈小龙

性　　别：男

出生日期：1970年04月06日

注册编号：44003723

注册执业单位：英泰克工程顾问（上海）有限公司

注册有效期：2028年12月15日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
（3）

个人签名：

签名日期：2025.11.12

发证日期：2025年10月23日

职称证

广东省职称证书

姓　　名：陈小龙

身份证号：210902197004065016

职称名称：高级工程师

专　　业：施工管理

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年06月14日

评审组织：深圳市建筑专业高级专业技术资格第七评审委员会

证书编号：2003001046157

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年10月15日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

毕业证

毕 业 证 书

阜委培毕证字第（97107）号

学生陈小龙性别 男 系 湖北 省 黄 石 县（市）人，现年二十七岁，于一九九五 年 四 月至一九九七 年 九 月在本校工业与民用建筑专业学习，按教学计划学完专科全部课程，成绩合格，准予毕业。

辽宁工程技术大学

校 长

一九九七 年 九月二十日

西安交通大学

毕 业 证 书

学生 陈小龙 性别 男，一九七〇年 四 月 六 日生，于二〇一五 年 三 月至 二〇一七年 七 月在本校网络教育学院 土木工程 专业 专科起点本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西安交通大学 校 长：王树国

证书编号：106987201705015230

二〇一七 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：Http://www.chsi.com.cn

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈小龙　　社保电脑号：607503095　　身份证号码：210902197004065016　　页码：2

参保单位名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司深圳分公司　　单位编号：119232　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	02	119232	13263.0	1989.45	1061.04	1	13263	822.31	265.26	1	13263	59.68	13263	9.28	2360	16.52	7.08
2022	03	119232	13263.0	1989.45	1061.04	1	13263	822.31	265.26	1	13263	59.68	13263	9.28	2360	16.52	7.08
2022	04	119232	13263.0	1989.45	1061.04	1	13263	796.78	265.26	1	13263	59.68	13263	9.28	2360	16.52	7.08
2022	05	119232	13263.0	1989.45	1061.04	1	13263	796.78	265.26	1	13263	59.68	13263	14.85	2360	16.52	7.08
2022	06	119232	13263.0	1989.45	1061.04	1	13263	796.78	265.26	1	13263	59.68	13263	14.85	2360	16.52	7.08
2022	07	119232	13325.0	1998.75	1066.0	1	13325	799.5	266.5	1	13325	59.96	13325	14.92	2360	16.52	7.08
2022	08	119232	13325.0	1998.75	1066.0	1	13325	799.5	266.5	1	13325	59.96	13325	14.92	2360	16.52	7.08
2022	09	119232	13325.0	1998.75	1066.0	1	13325	799.5	266.5	1	13325	59.96	13325	14.92	2360	16.52	7.08
2022	10	119232	13325.0	1998.75	1066.0	1	13325	826.15	266.5	1	13325	59.96	13325	14.92	2360	16.52	7.08
2022	11	119232	13325.0	1998.75	1066.0	1	13325	826.15	266.5	1	13325	59.96	13325	14.92	2360	16.52	7.08
2022	12	119232	13325.0	1998.75	1066.0	1	13325	826.15	266.5	1	13325	59.96	13325	14.92	2360	16.52	7.08
2023	01	119232	13325.0	1998.75	1066.0	1	13325	826.15	266.5	1	13325	66.63	13325	14.92	2360	16.52	7.08
2023	02	119232	13325.0	1998.75	1066.0	1	13325	826.15	266.5	1	13325	66.63	13325	14.92	2360	16.52	7.08
2023	03	119232	13325.0	1998.75	1066.0	1	13325	826.15	266.5	1	13325	66.63	13325	14.92	2360	16.52	7.08
2023	04	119232	13325.0	1998.75	1066.0	1	13325	826.15	266.5	1	13325	66.63	13325	14.92	2360	16.52	7.08
2023	05	119232	13325.0	1998.75	1066.0	1	13325	826.15	266.5	1	13325	66.63	13325	18.66	2360	16.52	7.08
2023	06	119232	13325.0	1998.75	1066.0	1	13325	826.15	266.5	1	13325	66.63	13325	18.66	2360	16.52	7.08
2023	07	119232	13325.0	1998.75	1066.0	1	13325	826.15	266.5	1	13325	66.63	13325	18.66	2360	16.52	7.08
2023	08	119232	13325.0	1998.75	1066.0	1	13325	826.15	266.5	1	13325	66.63	13325	18.66	2360	16.52	7.08
2023	09	119232	13325.0	1998.75	1066.0	1	13325	826.15	266.5	1	13325	66.63	13325	18.66	2360	16.52	7.08
2023	10	119232	13325.0	1998.75	1066.0	1	13325	799.5	266.5	1	13325	66.63	13325	18.66	2360	16.52	7.08
2023	11	119232	13325.0	1998.75	1066.0	1	13325	799.5	266.5	1	13325	66.63	13325	18.66	2360	16.52	7.08
2023	12	119232	13325.0	1998.75	1066.0	1	13325	799.5	266.5	1	13325	66.63	13325	18.66	2360	16.52	7.08
2024	01	119232	13325.0	1998.75	1066.0	1	13325	666.25	266.5	1	13325	66.63	13325	18.66	13325	106.6	26.65
2024	02	119232	13325.0	1998.75	1066.0	1	13325	666.25	266.5	1	13325	66.63	13325	18.66	13325	106.6	26.65
2024	03	119232	13325.0	1998.75	1066.0	1	13325	666.25	266.5	1	13325	66.63	13325	37.31	13325	106.6	26.65
2024	04	119232	13325.0	2132.0	1066.0	1	13325	666.25	266.5	1	13325	66.63	13325	37.31	13325	106.6	26.65
2024	05	119232	13325.0	2132.0	1066.0	1	13325	666.25	266.5	1	13325	66.63	13325	37.31	13325	106.6	26.65
2024	06	119232	13325.0	2132.0	1066.0	1	13325	666.25	266.5	1	13325	66.63	13325	37.31	13325	106.6	26.65
2024	07	119232	13325.0	2132.0	1066.0	1	13325	666.25	266.5	1	13325	66.63	13325	53.3	13325	106.6	26.65
2024	08	119232	13325.0	2132.0	1066.0	1	13325	666.25	266.5	1	13325	66.63	13325	53.3	13325	106.6	26.65
2024	09	119232	13325.0	2132.0	1066.0	1	13325	666.25	266.5	1	13325	66.63	13325	53.3	13325	106.6	26.65
2024	10	119232	13325.0	2132.0	1066.0	1	13325	666.25	266.5	1	13325	66.63	13325	53.3	13325	106.6	26.65
2024	11	119232	13325.0	2132.0	1066.0	1	13325	666.25	266.5	1	13325	66.63	13325	53.3	13325	106.6	26.65
2024	12	119232	13325.0	2132.0	1066.0	1	13325	666.25	266.5	1	13325	66.63	13325	53.3	13325	106.6	26.65
2025	01	119232	13325.0	2265.25	1066.0	1	13325	666.25	266.5	1	13325	66.63	13325	53.3	13325	106.6	26.65
2025	02	119232	13325.0	2265.25	1066.0	1	13325	666.25	266.5	1	13325	66.63	13325	53.3	13325	106.6	26.65
2025	03	119232	13325.0	2265.25	1066.0	1	13325	666.25	266.5	1	13325	66.63	13325	53.3	13325	106.6	26.65
2025	04	119232	13325.0	2265.25	1066.0	1	13325	666.25	266.5	1	13325	66.63	13325	53.3	13325	106.6	26.65
2025	05	119232	13325.0	2265.25	1066.0	1	13325	666.25	266.5	1	13325	66.63	13325	53.3	13325	106.6	26.65
2025	06	119232	13325.0	2265.25	1066.0	1	13325	666.25	266.5	1	13325	66.63	13325	53.3	13325	106.6	26.65
2025	07	119232	14317.0	2433.89	1145.36	1	14317	715.85	286.34	1	14317	71.59	14317	57.27	14317	114.54	28.63
2025	08	119232	14317.0	2433.89	1145.36	1	14317	715.85	286.34	1	14317	71.59	14317	57.27	14317	114.54	28.63
2025	09	119232	14317.0	2433.89	1145.36	1	14317	715.85	286.34	1	14317	71.59	14317	57.27	14317	114.54	28.63
2025	10	119232	14317.0	2433.89	1145.36	1	14317	715.85	286.34	1	14317	71.59	14317	57.27	14317	114.54	28.63
合计				178124.21	97929.92			65751.05	24482.48			5737.18		1922.92		1406.44	1105.59

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f27888061b77 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
119232	英泰克工程顾问（上海）有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年11月10日

6、给排水专业监理工程师：夏英

国家注册监理工程师证

使用有效期：2025年07月14日
- 2026年01月10日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：夏英

性　　别：男

出生日期：1982年11月16日

注册编号：31012931

注册执业单位：英泰克工程顾问（上海）有限公司

注册有效期：2027年08月19日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：夏英

签名日期：2025.9.5

发证日期：2024年06月13日

职称证

江西省非国有企业专业技术

资 格 证 书

江西省人力资源和社会保障厅

编号：№ 12078914

姓　　名：夏英

身份证号：420502198211160018

资格名称：工程师

专业名称：给排水工程

批准日期：2018 年 12 月 28 日

批复文件：鹰职称办〔2019〕1 号

工作单位：江西诚益建设有限公司

非国有管理号：非 3600618300511

证书查询网址：www.ythrss.gov.cn

签发单位盖章：

签发日期：2019 年 1 月 16 日

毕业证

成人高等教育

毕业证明书

学生 夏英 性别 男 ，一九八二 年十一 月 十六 日生，于 二〇〇七 年 一 月至二〇〇九 年 一 月在本校 工程管理 专业 脱产 学习，修完 二 年制 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，取得毕业证书（证书编号 104075200905000214 ），因证书遗失，兹具毕业证明书为凭。

校 名：

校（院）长：杨斌

批准文号：（86）教高三字004号

补 证 号：10407920162001

二〇一六 年 九 月八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：夏英　　社保电脑号：639688553　　身份证号码：420502198211160018　　页码：2

参保单位名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司深圳分公司　　单位编号：119232　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	119232	9642.0	1446.3	771.36	1	9642	597.8	192.84	1	9642	43.39	9642	10.8	2360	16.52	7.08
2022	11	119232	9642.0	1446.3	771.36	1	9642	597.8	192.84	1	9642	43.39	9642	10.8	2360	16.52	7.08
2022	12	119232	9642.0	1446.3	771.36	1	9642	597.8	192.84	1	9642	43.39	9642	10.8	2360	16.52	7.08
2023	01	119232	9642.0	1446.3	771.36	1	9642	597.8	192.84	1	9642	48.21	9642	10.8	2360	16.52	7.08
2023	02	119232	9642.0	1446.3	771.36	1	9642	597.8	192.84	1	9642	48.21	9642	10.8	2360	16.52	7.08
2023	03	119232	9642.0	1446.3	771.36	1	9642	597.8	192.84	1	9642	48.21	9642	10.8	2360	16.52	7.08
2023	04	119232	9642.0	1446.3	771.36	1	9642	597.8	192.84	1	9642	48.21	9642	10.8	2360	16.52	7.08
2023	05	119232	9642.0	1446.3	771.36	1	9642	597.8	192.84	1	9642	48.21	9642	13.5	2360	16.52	7.08
2023	06	119232	9642.0	1446.3	771.36	1	9642	597.8	192.84	1	9642	48.21	9642	13.5	2360	16.52	7.08
2023	07	119232	10925.0	1638.75	874.0	1	10925	677.35	218.5	1	10925	54.63	10925	15.3	2360	16.52	7.08
2023	08	119232	10925.0	1638.75	874.0	1	10925	677.35	218.5	1	10925	54.63	10925	15.3	2360	16.52	7.08
2023	09	119232	10925.0	1638.75	874.0	1	10925	677.35	218.5	1	10925	54.63	10925	15.3	2360	16.52	7.08
2023	10	119232	10925.0	1638.75	874.0	1	10925	655.5	218.5	1	10925	54.63	10925	15.3	2360	16.52	7.08
2023	11	119232	10925.0	1638.75	874.0	1	10925	655.5	218.5	1	10925	54.63	10925	15.3	2360	16.52	7.08
2023	12	119232	10925.0	1638.75	874.0	1	10925	655.5	218.5	1	10925	54.63	10925	15.3	2360	16.52	7.08
2024	01	119232	10925.0	1638.75	874.0	1	10925	546.25	218.5	1	10925	54.63	10925	15.3	10925	87.4	21.85
2024	02	119232	10925.0	1638.75	874.0	1	10925	546.25	218.5	1	10925	54.63	10925	15.3	10925	87.4	21.85
2024	03	119232	10925.0	1638.75	874.0	1	10925	546.25	218.5	1	10925	54.63	10925	30.59	10925	87.4	21.85
2024	04	119232	10925.0	1748.0	874.0	1	10925	546.25	218.5	1	10925	54.63	10925	30.59	10925	87.4	21.85
2024	05	119232	10925.0	1748.0	874.0	1	10925	546.25	218.5	1	10925	54.63	10925	30.59	10925	87.4	21.85
2024	06	119232	10925.0	1748.0	874.0	1	10925	546.25	218.5	1	10925	54.63	10925	30.59	10925	87.4	21.85
2024	07	119232	12342.0	1974.72	987.36	1	12342	617.1	246.84	1	12342	61.71	12342	49.37	12342	98.74	24.68
2024	08	119232	12342.0	1974.72	987.36	1	12342	617.1	246.84	1	12342	61.71	12342	49.37	12342	98.74	24.68
2024	09	119232	12342.0	1974.72	987.36	1	12342	617.1	246.84	1	12342	61.71	12342	49.37	12342	98.74	24.68
2024	10	119232	12342.0	1974.72	987.36	1	12342	617.1	246.84	1	12342	61.71	12342	49.37	12342	98.74	24.68
2024	11	119232	12342.0	1974.72	987.36	1	12342	617.1	246.84	1	12342	61.71	12342	49.37	12342	98.74	24.68
2024	12	119232	12342.0	1974.72	987.36	1	12342	617.1	246.84	1	12342	61.71	12342	49.37	12342	98.74	24.68
2025	01	119232	12342.0	2098.14	987.36	1	12342	617.1	246.84	1	12342	61.71	12342	49.37	12342	98.74	24.68
2025	02	119232	12342.0	2098.14	987.36	1	12342	617.1	246.84	1	12342	61.71	12342	49.37	12342	98.74	24.68
2025	03	119232	12342.0	2098.14	987.36	1	12342	617.1	246.84	1	12342	61.71	12342	49.37	12342	98.74	24.68
2025	04	119232	12342.0	2098.14	987.36	1	12342	617.1	246.84	1	12342	61.71	12342	49.37	12342	98.74	24.68
2025	05	119232	12342.0	2098.14	987.36	1	12342	617.1	246.84	1	12342	61.71	12342	49.37	12342	98.74	24.68
2025	06	119232	12342.0	2098.14	987.36	1	12342	617.1	246.84	1	12342	61.71	12342	49.37	12342	98.74	24.68
2025	07	119232	11880.0	2019.6	950.4	1	11880	594.0	237.6	1	11880	59.4	11880	47.52	11880	95.04	23.76
2025	08	119232	11880.0	2019.6	950.4	1	11880	594.0	237.6	1	11880	59.4	11880	47.52	11880	95.04	23.76
2025	09	119232	11880.0	2019.6	950.4	1	11880	594.0	237.6	1	11880	59.4	11880	47.52	11880	95.04	23.76
2025	10	119232	11880.0	2019.6	950.4	1	11880	594.0	237.6	1	11880	59.4	11880	47.52	11880	95.04	23.76
合计				119238.71	64219.2			42733.32	16054.8			3804.72		1428.86		2380.97	947.42

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f27887f0599v ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
119232	英泰克工程顾问（上海）有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2025年11月10日

7、道路专业监理工程师：邓尖

专业监理工程师证

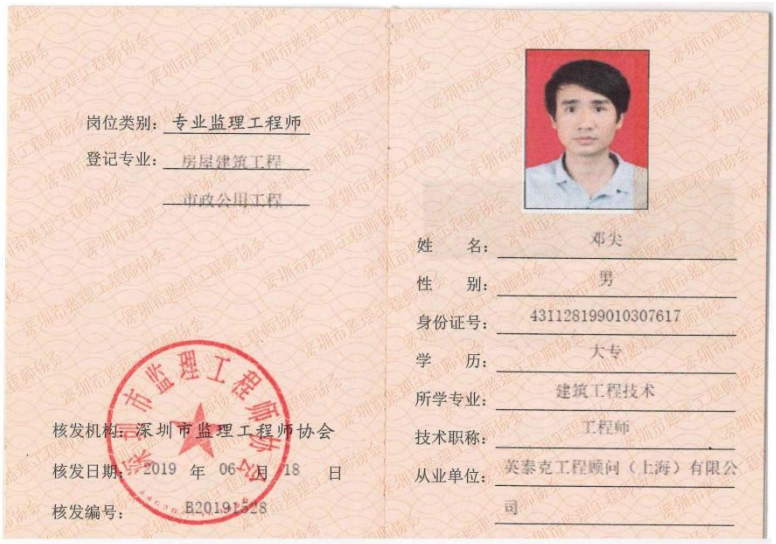

岗位类别：专业监理工程师
登记专业：房屋建筑工程
市政公用工程

姓　　名：邓尖
性　　别：男
身份证号：431128199010307617
学　　历：大专
所学专业：建筑工程技术
技术职称：工程师
从业单位：英泰克工程顾问（上海）有限公司

核发机构：深圳市监理工程师协会
核发日期：2019 年 06 月 18 日
核发编号：B20191528



个人信用年审贴签页

已通过2020年度深圳市监理工程师协会会员年审
已通过2021年度深圳市监理工程师协会会员年审
已通过2022年度深圳市监理工程师协会会员年审
已通过2023年度深圳市监理工程师协会会员年审
已通过2024年度深圳市监理工程师协会会员年审

综合监理知识年度继续教育贴签页

已参加2020年度工程监理综合知识继续教育培训
已参加2021年度工程监理综合知识继续教育培训
已参加2022年度工程监理综合知识继续教育培训
已参加2023年度工程监理综合知识继续教育培训
已参加2024年度工程监理综合知识继续教育培训

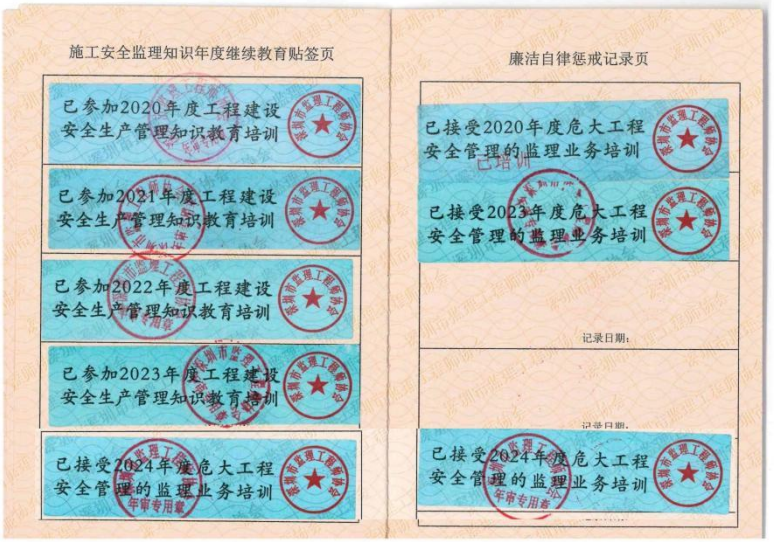

施工安全监理知识年度继续教育贴签页

已参加2020年度工程建设安全生产管理知识教育培训
已参加2021年度工程建设安全生产管理知识教育培训
已参加2022年度工程建设安全生产管理知识教育培训
已参加2023年度工程建设安全生产管理知识教育培训
已接受2024年度危大工程安全管理的监理业务培训

廉洁自律惩戒记录页

已接受2020年度危大工程安全管理的监理业务培训
已接受2023年度危大工程安全管理的监理业务培训
记录日期：
已接受2024年度危大工程安全管理的监理业务培训

职称证

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

四川省人力资源和社会保障厅

编号：成建局中16126
NO

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.

Department of Human Resources and Social Security of Sichuan Province

姓　　名　邓尖

性　　别　男

出生年月　1990年10月30日

专业名称　建筑工程

资格名称　工程师

评审组织　成都市住房和城乡建设局建筑工程技术中级职务评审委员会

审批机关　成都市住房和城乡建设局职称改革工作领导小组

批准时间　2016年10月10日

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 邓尖 性别 男，一九九0 年 十 月三十 日生，于二00七年 九 月至二0一0 年 六 月在本校 建筑工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西昌学院 校（院）长：

证书编号：106281201006010142 二0一0 年 六 月三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邓尖　　社保电脑号：8020418S1　　身份证号码：431128199010307617　　页码：2

参保单位名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司深圳分公司　　单位编号：119232　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	119232	6641.0	996.15	531.28	1	6641	332.05	132.82	1	6641	33.21	6641	26.56	6641	53.13	13.28
2024	12	119232	6641.0	996.15	531.28	1	6641	332.05	132.82	1	6641	33.21	6641	26.56	6641	53.13	13.28
2025	01	119232	6641.0	1062.56	531.28	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6641	26.56	6641	53.13	13.28
2025	02	119232	6641.0	1062.56	531.28	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6641	26.56	6641	53.13	13.28
2025	03	119232	6641.0	1062.56	531.28	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6641	26.56	6641	53.13	13.28
2025	04	119232	6641.0	1062.56	531.28	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6641	26.56	6641	53.13	13.28
2025	05	119232	6641.0	1062.56	531.28	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6641	26.56	6641	53.13	13.28
2025	06	119232	6641.0	1062.56	531.28	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6641	26.56	6641	53.13	13.28
2025	07	119232	6390.0	1022.4	511.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6390	25.56	6390	51.12	12.78
2025	08	119232	6390.0	1022.4	511.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6390	25.56	6390	51.12	12.78
2025	09	119232	6390.0	1022.4	511.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6390	25.56	6390	51.12	12.78
2025	10	119232	6390.0	1022.4	511.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6390	25.56	6390	51.12	12.78
合计				51808.39	28555.52			22648.36	8190.82			1733.53		722.13		1728.0	540.06

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f27887f1592s ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
119232	英泰克工程顾问（上海）有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年11月10日

8、电气专业监理工程师：况永利

专业监理工程师证

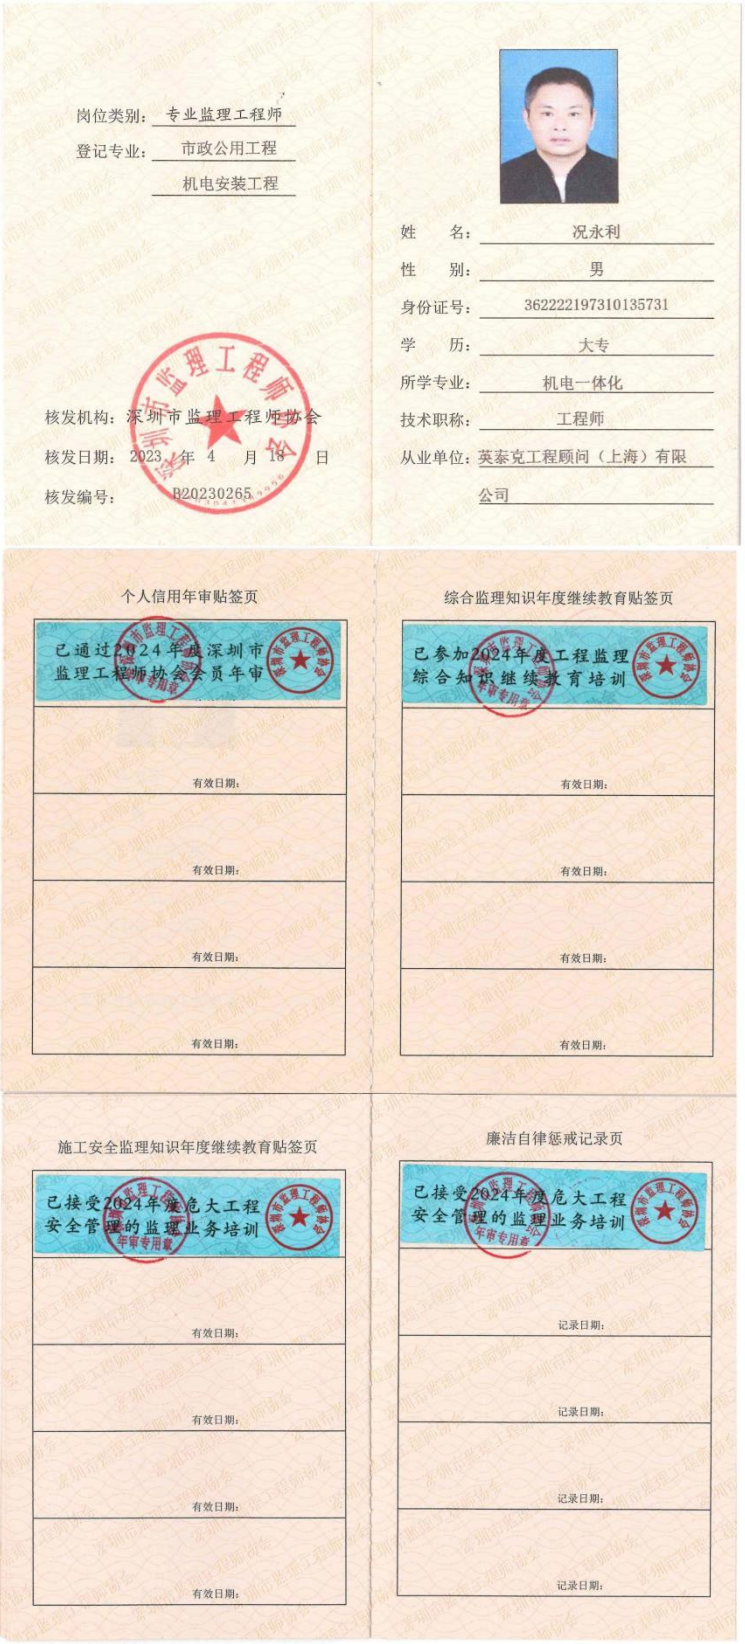

岗位类别：专业监理工程师

登记专业：市政公用工程

机电安装工程

核发机构：深圳市监理工程师协会

核发日期：2023 年 4 月 18 日

核发编号：B20230265

姓　　名：况永利

性　　别：男

身份证号：362222197310135731

学　　历：大专

所学专业：机电一体化

技术职称：工程师

从业单位：英泰克工程顾问（上海）有限公司

个人信用年审贴签页

已通过2024年度深圳市监理工程师协会会员年审

有效日期：

有效日期：

有效日期：

有效日期：

综合监理知识年度继续教育贴签页

已参加2024年度工程监理综合知识继续教育培训

有效日期：

有效日期：

有效日期：

有效日期：

施工安全监理知识年度继续教育贴签页

已接受2024年度危大工程安全管理的监理业务培训

有效日期：

有效日期：

有效日期：

有效日期：

廉洁自律惩戒记录页

已接受2024年度危大工程安全管理的监理业务培训

记录日期：

记录日期：

记录日期：

记录日期：

职称证



江西省非国有企业专业技术

资格证书

持证人签名：

姓　　名：况永利

身份证号：362222197310135731

专业资格：工程师

专业类别：水　电

批准日期：2008年11月

工作单位：高安市石脑建筑总公司

赣职证字：第　　号
赣集中字0246000869

毕业证

普通高等学校

毕业证书

中华人民共和国教育部制

No. 0018994

学生 况永利 性别 男，

一九七三年 十 月 十三日生，于一九九七年

九 月至 二000年 七 月在本校

机电一体化 专业

三 年制专科学习，修完教学计划规

定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长: 邱小林

校 名: 江西理工学院

二000 年 七 月 一 日

学校编号: 10609205170093116 4

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：况永利　　社保电脑号：647365525　　身份证号码：362222197310135731　　页码：1

参保单位名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司深圳分公司　　单位编号：119232　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	04	119232	6840.0	957.6	547.2	1	7778	482.24	155.56	1	6840	34.2	6840	7.66	2360	16.52	7.08
2023	05	119232	6840.0	957.6	547.2	1	7778	482.24	155.56	1	6840	34.2	6840	9.58	2360	16.52	7.08
2023	06	119232	6840.0	957.6	547.2	1	7778	482.24	155.56	1	6840	34.2	6840	9.58	2360	16.52	7.08
2023	07	119232	6840.0	957.6	547.2	1	7778	482.24	155.56	1	6840	34.2	6840	9.58	2360	16.52	7.08
2023	08	119232	6840.0	957.6	547.2	1	7778	482.24	155.56	1	6840	34.2	6840	9.58	2360	16.52	7.08
2023	09	119232	6840.0	957.6	547.2	1	7778	482.24	155.56	1	6840	34.2	6840	9.58	2360	16.52	7.08
2023	10	119232	6840.0	957.6	547.2	1	6840	410.4	136.8	1	6840	34.2	6840	9.58	2360	16.52	7.08
2023	11	119232	6840.0	957.6	547.2	1	6840	410.4	136.8	1	6840	34.2	6840	9.58	2360	16.52	7.08
2023	12	119232	6840.0	957.6	547.2	1	6840	410.4	136.8	1	6840	34.2	6840	9.58	2360	16.52	7.08
2024	01	119232	6840.0	957.6	547.2	1	6840	342.0	136.8	1	6840	34.2	6840	9.58	6840	54.72	13.68
2024	02	119232	6840.0	957.6	547.2	1	6840	342.0	136.8	1	6840	34.2	6840	9.58	6840	54.72	13.68
2024	03	119232	6840.0	957.6	547.2	1	6840	342.0	136.8	1	6840	34.2	6840	19.15	6840	54.72	13.68
2024	04	119232	6840.0	1026.0	547.2	1	6840	342.0	136.8	1	6840	34.2	6840	19.15	6840	54.72	13.68
2024	05	119232	6840.0	1026.0	547.2	1	6840	342.0	136.8	1	6840	34.2	6840	19.15	6840	54.72	13.68
2024	06	119232	6840.0	1026.0	547.2	1	6840	342.0	136.8	1	6840	34.2	6840	19.15	6840	54.72	13.68
2024	07	119232	8237.0	1235.55	658.96	1	8237	411.85	164.74	1	8237	41.19	8237	32.95	8237	65.9	16.47
2024	08	119232	8237.0	1235.55	658.96	1	8237	411.85	164.74	1	8237	41.19	8237	32.95	8237	65.9	16.47
2024	09	119232	8237.0	1235.55	658.96	1	8237	411.85	164.74	1	8237	41.19	8237	32.95	8237	65.9	16.47
2024	10	119232	8237.0	1235.55	658.96	1	8237	411.85	164.74	1	8237	41.19	8237	32.95	8237	65.9	16.47
2024	11	119232	8237.0	1235.55	658.96	1	8237	411.85	164.74	1	8237	41.19	8237	32.95	8237	65.9	16.47
2024	12	119232	8237.0	1235.55	658.96	1	8237	411.85	164.74	1	8237	41.19	8237	32.95	8237	65.9	16.47
2025	01	119232	8237.0	1317.92	658.96	1	8237	411.85	164.74	1	8237	41.19	8237	32.95	8237	65.9	16.47
2025	02	119232	8237.0	1317.92	658.96	1	8237	411.85	164.74	1	8237	41.19	8237	32.95	8237	65.9	16.47
2025	03	119232	8237.0	1317.92	658.96	1	8237	411.85	164.74	1	8237	41.19	8237	32.95	8237	65.9	16.47
2025	04	119232	8237.0	1317.92	658.96	1	8237	411.85	164.74	1	8237	41.19	8237	32.95	8237	65.9	16.47
2025	05	119232	8237.0	1317.92	658.96	1	8237	411.85	164.74	1	8237	41.19	8237	32.95	8237	65.9	16.47
2025	06	119232	8237.0	1317.92	658.96	1	8237	411.85	164.74	1	8237	41.19	8237	32.95	8237	65.9	16.47
2025	07	119232	8672.0	1387.52	693.76	1	8672	433.6	173.44	1	8672	43.36	8672	34.69	8672	69.38	17.34
2025	08	119232	8672.0	1387.52	693.76	1	8672	433.6	173.44	1	8672	43.36	8672	34.69	8672	69.38	17.34
2025	09	119232	8672.0	1387.52	693.76	1	8672	433.6	173.44	1	8672	43.36	8672	34.69	8672	69.38	17.34
2025	10	119232	8672.0	1387.52	693.76	1	8672	433.6	173.44	1	8672	43.36	8672	34.69	8672	69.38	17.34
合计				35440.1	18890.56			12853.24	4835.2			1180.72		714.22		1545.38	412.8

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f27887f2a91d ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
119232	英泰克工程顾问（上海）有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年11月10日

9、试验专业监理工程师：翟晨

专业监理工程师证

根据上海建设工程监理工程师从业能力行业标准，经考核合格。

特发此证。

上海市建设工程咨询行业协会

发证单位（印）

发证日期：2014年7月8日

姓名 翟晨 性别 男

从事专业 土建

身份证号码

321284199002022014

证书编号：

JS3101410713

工作单位（章）

年 月 日

培训单位（章）

2014 年 月 日

验证栏
验证专用章
有效期至 2020-01-13
上海市建设工程咨询行业协会
验证单位（章）
2017年1月13日
验证专用章
有效期至 2023-05-31
上海市建设工程咨询行业协会
验证单位（章）
年 月 日
验证专用章
有效期至 2026-05-31
上海市建设工程咨询行业协会
验证单位（章）
年 月 日
继续教育记录栏
1.
2.
3.
4.

职称证

资格证书
姓 名 翟晨
性 别 男
出生年月 1990年2月2日
专 业 土木工程
任职资格 工程师
发证单位
中国建筑工程总公司
中级工程技术职务评审委员会
二〇二〇年 九月 十 日
中国建筑工程总公司制
XBY-20-203
证书编号：

毕业证

普通高等学校

毕业证书

翟晨
09802120

学生　翟晨　性别 男，1990 年 02 月 02 日生，于 2009 年 09 月至 2012 年 06 月在本校　工程监理 专业　3　年制　专　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：无锡南洋职业技术学院　校（院）长：

证书编号：129231201206001487　2012 年 06 月 30 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

成人高等教育

毕业证书

学生 翟晨　性别男，一九九〇年二月二日生，于二〇二〇年三月至二〇二二年七月在本校　土木工程　专业函授学习，修完本　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：南京工程学院　校（院）长：史金飞

批准文号：教培［1989］16号

证书编号：112765202205700539　二〇二二年七月五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http

试验专监翟晨业绩证明：

中 标 通 知 书

项目编号：

备案编号：

打印验证码：2017年11月29日

英泰克工程顾问（上海）有限公司：

你方 2017 年 11 月 23 日所递交的南通市城市轨道交通 1 号线一期工程土建施工监理 05 标投标文件已被我方接受，被确定为中标人。本中标通知书发出之日起 30 日内，我方将依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。签订的合同须报招标投标办公室备案。在限期内不签订合同协议作放弃中标处理。

招标人（公章）　　法定代表人（签名）

中标范围	南通市轨道交通 1 号线一期工程土建施工监理工作内容主要包括但不限于：（1）南通市轨道交通 1 号线一期工程标段施工图范围内土建结构；防水工程；降水工程；机电设备、市政公用设施、管网等的预埋件和预留孔洞；防迷流；接地网工程以及临时性工程的施工、安装与拆除等项目的监理服务；（2）管片生产及运输、验收等项目的监理服务。	工程规模：世纪大道站（不含）～中央商务区站～南通大学站～盘香路站～太平路站～通沪大道站（不含）、管片生产监理，4 站 5 区间土建施工监理服务；管片生产及运输的监理服务等。
		工期：满足招标文件《主要工作内容及要求》
中标价 22300000 元	其中：暂估价 / 元	中标质量：符合现行的国家规范、规程和地方法规规定，满足招标文件《主要工作内容及要求》等技术文件要求。
	发包人供应材料 / 元	最高限价（招标控制价）：24830000 元
	暂列金 / 元	
中标单位资质等级	工程监理综合资质	资质证书号：EW131000323
项目负责人：邵谦	项目负责人资质等级：国家注册监理工程师/高级工程师	证书编号：00193444/4413002864

项目部其他主要成员

成员姓名	岗位职责	成员姓名	岗位职责	成员姓名	岗位职责	成员姓名	岗位职责
邵谦	总监理工程师	刘雨晴	试验工程师	黄政军	土建监理工程师	倪福弟	监理员
赵从松	总监理工程师代表	潘九红	试验工程师	翟晨	监理员	蔡耀忠	监理员
董俊平	总监理工程师代表	张玉青	试验工程师	吴雷涛	监理员	李建新	监理员
傅海政	安全工程师	舒爱红	土建监理工程师	周志荣	监理员	王才林	监理员
沙宏伟	安全工程师	王海超	土建监理工程师	范耀全	监理员	杨小伟	监理员
周伟	合约工程师	黄沙	土建监理工程师	林明兵	监理员	吴志明	监理员
邵凤密	合约工程师	周春	土建监理工程师	叶国林	监理员	施惠冲	监理员
路兴	结构工程师	陈松江	土建监理工程师	金建明	监理员	牟昕	监理员
马明彦	结构工程师	邱鸿	土建监理工程师	唐华	监理员	刘元元	资料员
莫恩清	地质工程师	陈海兵	土建监理工程师	明智	监理员	冯荣	资料员
张红军	测量工程师	李广军	土建监理工程师	胡超	监理员	安慧君	资料员
房占成	测量工程师	丁小峰	土建监理工程师				

备注：

南通市招标投标办公室 通知书备案章

经办人：

2017年11月29日

2017年11月29日

说明：

1、本通知书一式八份、招标人执五份、中标人、招标办、招标代理各执一份，无备案章、复印件均无效。

2、本中标通知书的内容，可登陆南通市工程建设网 www.ntcetc.cn 查询。

XSJL-180304

社保证明

单位参加城镇社会保险基本情况

2025 年 09 月

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司

社会保险码：00052006

参加社会保险登记年月	1999年06月	
参保所在地	浦东	
住所或地址	静安区场中路1988弄15－16号天祥公司一楼前台（三楼人事部）	
单位类型	企业	
法定代表人(负责人)	邓卫	
统一社会信用代码	91310000631191544Q	
《社会保险登记证》号		
《社会保险登记证》发证日期		
截至 2025 年 08 月缴费状态	正常缴费	
截至 2025 年 08 月单位参保人数信息	账户人数	208 人
	缴费人数	208 人
	领取养老待遇人数	75 人
截至 2020年9月缴费情况	无欠款	
	欠缴险种及金额	

特别提示：

自2020年11月起，本市社会保险费征管职责划转至税务部门，涉及参保单位2020年10月及以后的社会保险费缴纳信息，由税务部门负责提供。

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 09 月 05日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司　　社会保险码:00052006

321	熊春军	310104198111203637	参保缴费
344	赵从松	320821197604106319	参保缴费
356	谢倩	310109198311290060	参保缴费
372	翟晨	321284199002022014	参保缴费
399	林明兵	522725198308195218	参保缴费
404	陆春燕	320926197902122023	参保缴费
408	王丽丽	310225198509253826	参保缴费
409	陆军	31022519760116205X	参保缴费
411	吴雪明	310225197011073057	参保缴费
412	胡文君	31022519660519381X	参保缴费
422	莫让国	512223196602218512	参保缴费
430	李二军	320828197801083616	参保缴费
442	朱利东	310230197005221472	参保缴费
445	陈艳敏	310107198608020026	参保缴费
471	张龚辉	310225198202114039	参保缴费
513	常明伟	310104197110253611	参保缴费
571	郑龙	310110198403134474	参保缴费
575	高洁	410305198801123547	参保缴费
629	王佳士	310109198801173510	参保缴费
633	倪善忠	320625197110145435	参保缴费
650	卢世达	430304198807080274	参保缴费
665	周翰	42050219670216011X	参保缴费
668	卢华兵	341122196510150018	参保缴费
669	陈伟	320822198111214814	参保缴费

第 2 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 09月 05日

单位参加城镇社会保险基本情况

2025 年 10 月

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司

社会保险码：00052006

参加社会保险登记年月	1999年06月	
参保所在地	浦东	
住所或地址	静安区场中路1988弄15－16号天祥公司一楼前台（三楼人事部）	
单位类型	企业	
法定代表人(负责人)	邓卫	
统一社会信用代码	91310000631191544Q	
《社会保险登记证》号		
《社会保险登记证》发证日期		
截至 2025 年 09 月缴费状态	正常缴费	
截至 2025 年 09 月单位参保人数信息	账户人数	205 人
	缴费人数	205 人
	领取养老待遇人数	75 人
截至 2020年9月缴费情况	无欠款	
	欠缴险种及金额	

特别提示：

自2020年11月起，本市社会保险费征管职责划转至税务部门，涉及参保单位2020年10月及以后的社会保险费缴纳信息，由税务部门负责提供。

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 10 月 09日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司　　社会保险码:00052006

321	熊春军	310104198111203637	参保缴费
344	赵从松	320821197604106319	参保缴费
356	谢倩	310109198311290060	参保缴费
372	翟晨	321284199002022014	参保缴费
399	林明兵	522725198308195218	参保缴费
404	陆春燕	320926197902122023	参保缴费
408	王丽丽	310225198509253826	参保缴费
409	陆军	3102251976011620 5X	参保缴费
411	吴雪明	310225197011073057	参保缴费
412	胡文君	3102251966051938 1X	参保缴费
422	莫让国	512223196602218512	参保缴费
430	李二军	320828197801083616	参保缴费
442	朱利东	310230197005221472	参保缴费
445	陈艳敏	310107198608020026	参保缴费
471	张龚辉	310225198202114039	参保缴费
513	常明伟	310104197110253611	参保缴费
571	郑龙	310110198403134474	参保缴费
575	高洁	410305198801123547	参保缴费
629	王佳士	310109198801173510	参保缴费
633	倪善忠	320625197110145435	参保缴费
650	卢世达	430304198807080274	参保缴费
665	周翰	42050219670216011X	参保缴费
668	卢华兵	341122196510150018	参保缴费
669	陈伟	320822198111214814	参保缴费

第 2 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 10月 09日

单位参加城镇社会保险基本情况

2025 年 11 月

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司

社会保险码：00052006

参加社会保险登记年月	1999年06月	
参保所在地	浦东	
住所或地址	静安区场中路1988弄15－16号天祥公司一楼前台（三楼人事部）	
单位类型	企业	
法定代表人(负责人)	邓卫	
统一社会信用代码	91310000631191544Q	
《社会保险登记证》号		
《社会保险登记证》发证日期		
截至 2025 年 10 月缴费状态	正常缴费	
截至 2025 年 10 月单位参保人数信息	账户人数	200 人
	缴费人数	200 人
	领取养老待遇人数	75 人
截至 2020年9月缴费情况	无欠款	
	欠缴险种及金额	

特别提示：

自2020年11月起，本市社会保险费征管职责划转至税务部门，涉及参保单位2020年10月及以后的社会保险费缴纳信息，由税务部门负责提供。

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 11 月 05日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司　　社会保险码:00052006

321	熊春军	310104198111203637	参保缴费
344	赵从松	320821197604106319	参保缴费
356	谢倩	310109198311290060	参保缴费
372	翟晨	321284199002022014	参保缴费
399	林明兵	522725198308195218	参保缴费
404	陆春燕	320926197902122023	参保缴费
408	王丽丽	310225198509253826	参保缴费
409	陆军	31022519760116205X	参保缴费
411	吴雪明	310225197011073057	参保缴费
412	胡文君	31022519660519381X	参保缴费
422	莫让国	512223196602218512	参保缴费
430	李二军	320828197801083616	参保缴费
442	朱利东	310230197005221472	参保缴费
445	陈艳敏	310107198608020026	参保缴费
471	张龚辉	310225198202114039	参保缴费
513	常明伟	310104197110253611	参保缴费
571	郑龙	310110198403134474	参保缴费
575	高洁	410305198801123547	参保缴费
629	王佳士	310109198801173510	参保缴费
633	倪普忠	320625197110145435	参保缴费
650	卢世达	430304198807080274	参保缴费
665	周翰	42050219670216011X	参保缴费
668	卢华兵	341122196510150018	参保缴费
669	陈伟	320822198111214814	参保缴费

第 2 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 11 月 05日

10、合约造价工程师：张会云

注册造价工程师注册证

姓　　名：张会云

身份证号码：370285199108156525

性　　别：女

专　　业：土木建筑

聘用单位：英泰克工程顾问（上海）有限公司

证书编号：建[造]11223100008049

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

初始注册日期：2022 年 07 月 25 日

发证日期：2022 年 07 月 25 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

张会云

证件类型	居民身份证	证件号码	370285*********25	性别	女
注册证书所在单位名称	英泰克工程顾问（上海）有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位：英泰克工程顾问（上海）有限公司　证书编号：建[造]11223100008049　注册编号/执业印章号：B11223100008049

注册专业：土建　有效期：2026年07月24日

2022-06-13 - 初始注册

英泰克工程顾问（上海）有限公司

职称证

经济专业技术资格

Economics Professional Qualification

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得相应的专业技术资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

姓　　名：张会云

证件号码：370285199108156525

性　　别：女

出生年月：1991年08月

级　　别：中级

专　　业：建筑与房地产经济

批准日期：2020年11月22日

管 理 号：20201100137000003046

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生　张会云　性别女，一九九一年　八　月　十五　日生，于二〇一七年　三　月至二〇一九年　七　月在本校网络教育学院专科起点　工程管理（工程造价管理方向）　专业　2.5　年制　本　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：重庆大学

校（院）长：

证书编号：106117201905205039

二〇一九　年　七　月　一　日

社保证明

单位参加城镇社会保险基本情况

2025 年 09 月

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司

社会保险码：00052006

参加社会保险登记年月	1999年06月	
参保所在地	浦东	
住所或地址	静安区场中路1988弄15－16号天祥公司一楼前台（三楼人事部）	
单位类型	企业	
法定代表人(负责人)	邓卫	
统一社会信用代码	91310000631191544Q	
《社会保险登记证》号		
《社会保险登记证》发证日期		
截至 2025 年 08 月缴费状态	正常缴费	
截至 2025 年 08 月单位参保人数信息	账户人数	208 人
	缴费人数	208 人
	领取养老待遇人数	75 人
截至 2020年9月缴费情况	无欠款	
	欠缴险种及金额	

特别提示：

自2020年11月起，本市社会保险费征管职责划转至税务部门，涉及参保单位2020年10月及以后的社会保险费缴纳信息，由税务部门负责提供。

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 09 月 05日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司　　社会保险码:00052006

1262	刘培勋	370111196610122036	参保缴费
1269	夏铁军	310225198210312238	参保缴费
1274	朱晨光	211402198306080818	参保缴费
1280	廖海	420881198912225816	参保缴费
1284	张小林	440222198701271514	参保缴费
1290	潘元蒙	372922199611082329	参保缴费
1291	张会云	370285199108156525	参保缴费
1293	罗杰	511123199703045355	参保缴费
1294	王星	320821199211184710	参保缴费
1295	邹正清	320831196811062417	参保缴费
1298	张冬梅	152626198101023920	参保缴费
1316	张萍	310102197610030024	参保缴费
1331	周鹏	430403197512301011	参保缴费
1348	赵一鸣	310107197701162032	参保缴费
1361	马云苇	310115199109130911	参保缴费
1368	李神选	62050319930616161X	参保缴费
1370	李证科	500110199507190411	参保缴费
1380	杨志	532531199809060816	参保缴费
1389	李胜利	330719197107095318	参保缴费
1395	仝玉博	371523199706217250	参保缴费
1396	周峰	150203197701280012	参保缴费
1397	杨天祥	310102199504173610	参保缴费
1399	冯向虎	612725198902240239	参保缴费
1406	黄遵林	413027197901045611	参保缴费

第 6 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 09月 05日

单位参加城镇社会保险基本情况

2025 年 10 月

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司

社会保险码：00052006

参加社会保险登记年月	1999年06月	
参保所在地	浦东	
住所或地址	静安区场中路1988弄15－16号天祥公司一楼前台（三楼人事部）	
单位类型	企业	
法定代表人(负责人)	邓卫	
统一社会信用代码	91310000631191544Q	
《社会保险登记证》号		
《社会保险登记证》发证日期		
截至 2025 年 09 月缴费状态	正常缴费	
截至 2025 年 09 月单位参保人数信息	账户人数	205 人
	缴费人数	205 人
	领取养老待遇人数	75 人
截至 2020年9月缴费情况	无欠款	
	欠缴险种及金额	

特别提示：

自2020年11月起，本市社会保险费征管职责划转至税务部门，涉及参保单位2020年10月及以后的社会保险费缴纳信息，由税务部门负责提供。

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 10 月 09 日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司　　社会保险码:00052006

1262	刘培勋	370111196610122036	参保缴费
1269	夏铁军	310225198210312238	参保缴费
1274	朱晨光	211402198306080818	参保缴费
1280	廖海	420881198912225816	参保缴费
1284	张小林	440222198701271514	参保缴费
1290	潘元蒙	372922199611082329	参保缴费
1291	张会云	370285199108156525	参保缴费
1293	罗杰	511123199703045355	参保缴费
1294	王星	320821199211184710	参保缴费
1295	邹正清	320831196811062417	参保缴费
1298	张冬梅	152626198101023920	参保缴费
1316	张萍	310102197610030024	参保缴费
1331	周鹏	430403197512301011	参保缴费
1348	赵一鸣	310107197701162032	参保缴费
1361	马云苇	310115199109130911	参保缴费
1368	李神选	62050319930616161X	参保缴费
1370	李证科	500110199507190411	参保缴费
1380	杨志	532531199809060816	参保缴费
1389	李胜利	330719197107095318	参保缴费
1395	仝玉博	371523199706217250	参保缴费
1396	周峰	150203197701280012	参保缴费
1397	杨天祥	310102199504173610	参保缴费
1399	冯向虎	612725198902240239	参保缴费
1406	黄遵林	413027197901045611	参保缴费

第 6 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 10月 09日

单位参加城镇社会保险基本情况

2025 年 11 月

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司

社会保险码：00052006

参加社会保险登记年月	1999年06月	
参保所在地	浦东	
住所或地址	静安区场中路1988弄15－16号天祥公司一楼前台（三楼人事部）	
单位类型	企业	
法定代表人(负责人)	邓卫	
统一社会信用代码	91310000631191544Q	
《社会保险登记证》号		
《社会保险登记证》发证日期		
截至 2025 年 10 月缴费状态	正常缴费	
截至 2025 年 10 月单位参保人数信息	账户人数	200 人
	缴费人数	200 人
	领取养老待遇人数	75 人
截至 2020年9月缴费情况	无欠款	
	欠缴险种及金额	

特别提示：

自2020年11月起，本市社会保险费征管职责划转至税务部门，涉及参保单位2020年10月及以后的社会保险费缴纳信息，由税务部门负责提供。

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 11 月 05日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司　　社会保险码:00052006

1274	朱晨光	211402198306080818	参保缴费
1280	廖海	420881198912225816	参保缴费
1284	张小林	440222198701271514	参保缴费
1290	潘元蒙	372922199611082329	参保缴费
1291	张会云	370285199108156525	参保缴费
1293	罗杰	511123199703045355	参保缴费
1294	王星	320821199211184710	参保缴费
1295	邹正清	320831196811062417	参保缴费
1298	张冬梅	152626198101023920	参保缴费
1316	张萍	310102197610030024	参保缴费
1331	周鹏	430403197512301011	参保缴费
1348	赵一鸣	310107197701162032	参保缴费
1361	马云羊	310115199109130911	参保缴费
1368	李神选	62050319930616161X	参保缴费
1370	李证科	500110199507190411	参保缴费
1380	杨志	532531199809060816	参保缴费
1389	李胜利	330719197107095318	参保缴费
1395	仝玉博	371523199706217250	参保缴费
1396	周峰	150203197701280012	参保缴费
1397	杨天祥	310102199504173610	参保缴费
1399	冯向虎	612725198902240239	参保缴费
1406	黄遵林	413027197901045611	参保缴费
1412	陈海华	31022619710228231X	参保缴费
1416	郭俊宝	152601199511213118	参保缴费

第 6 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 11月 05日

11、监理员 1：郑龙

专业监理工程师证

根据上海建设工程
监理工程師从业能力行
业标准，经考核合格。
特发此证。

上海市建设工程咨询行业协会

发证单位（印）

发证日期：2014年 7月 8日

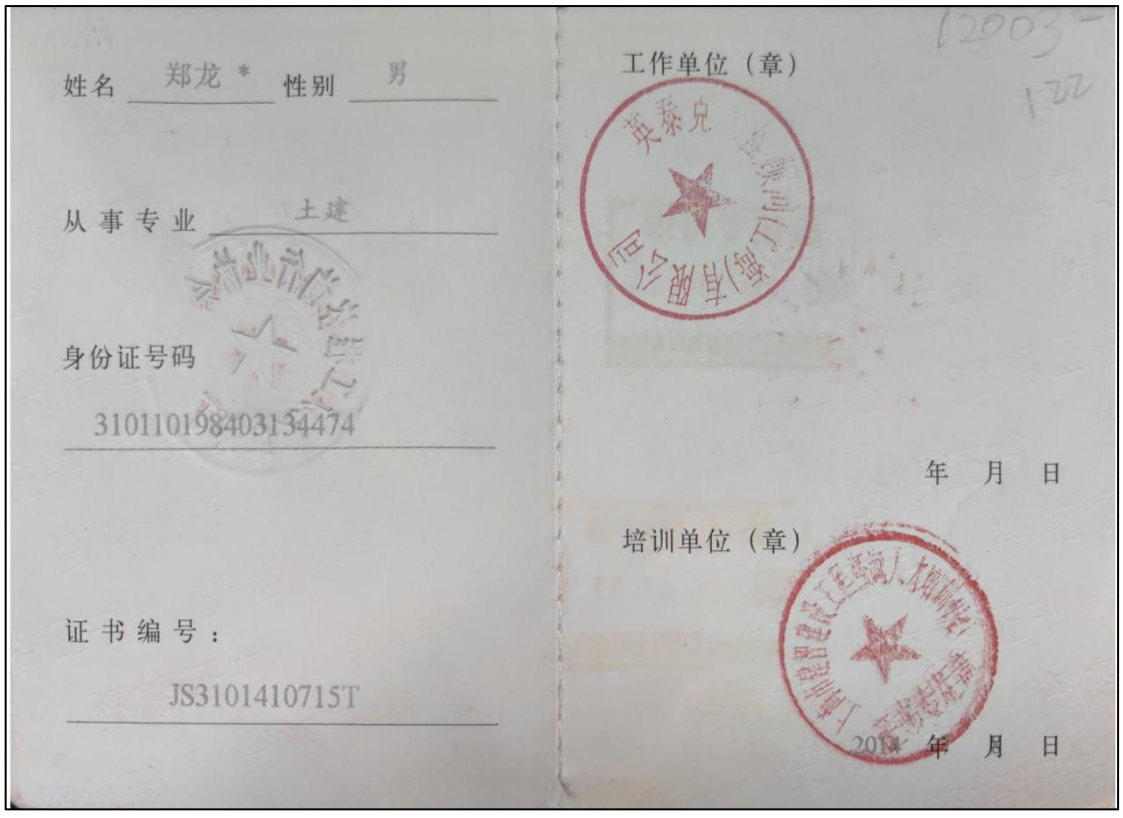
姓名 郑龙 * 性别 男

从事专业 土建

身份证号码

310110198403134474

证书编号：

JS3101410715T

工作单位（章）

年 月 日

培训单位（章）

2014 年 月 日

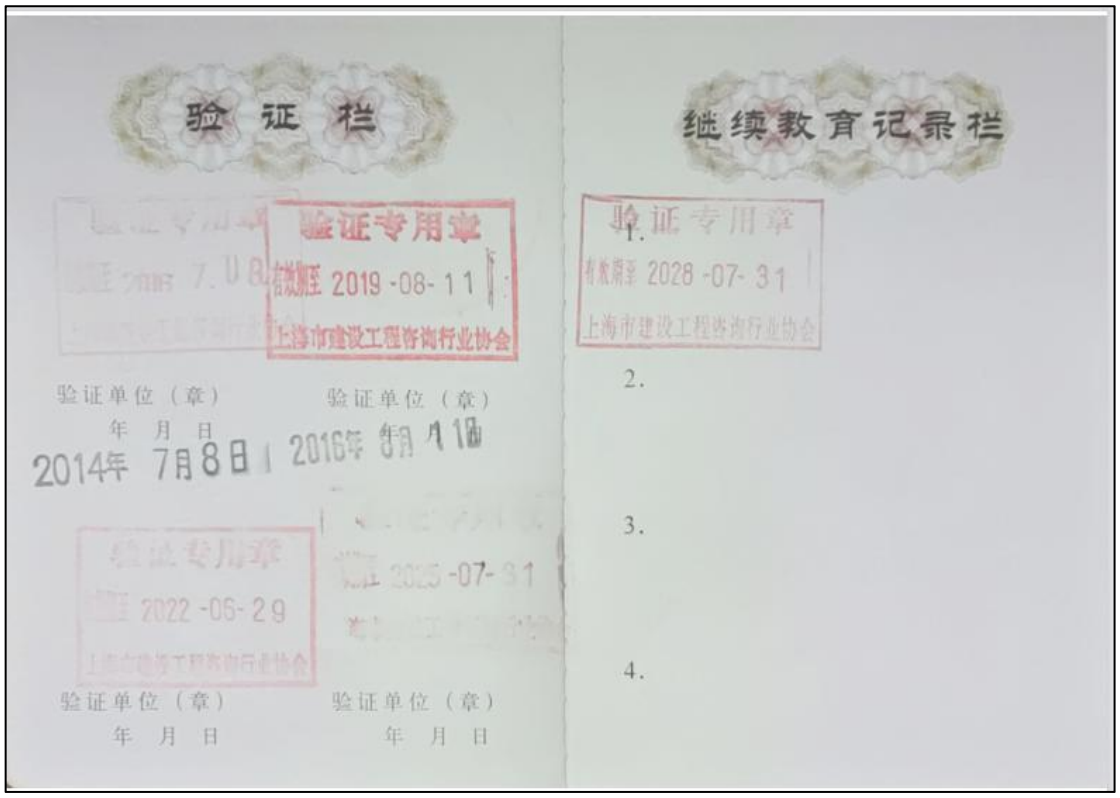
验证栏
验证专用章
有效期至 2019-08-11
上海市建设工程咨询行业协会
验证单位（章）
年 月 日
2014年 7月8日
验证单位（章）
年 月 日
2016年 8月 1日
验证专用章
2022-06-29
验证单位（章）
年 月 日
验证单位（章）
年 月 日
继续教育记录栏
验证专用章
有效期至 2028-07-31
上海市建设工程咨询行业协会
1.
2.
3.
4.

职称证

姓 名: 郑龙
性 别: 男
证书编号: M09301660
发证日期: 2010年10月
出生年月: 1984年3月
专业名称: 土木工程
资格名称: 工程师
批准时间: 2010年10月21日
批准单位: 仙桃市人事局
批准文号: 仙人职[2010]63号
评审组织: 湖北省仙桃市工程技术中级职务评审委员会

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生　郑龙　性别　男，一九八四年　三　月　十三　日生，于　二〇二〇年　三　月至二〇二二年　七　月在本校网络教育　建筑工程技术专业　2.5　年制　专　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：中国地质大学（武汉）　校（院）长：王炳辉

证书编号：10491720220659402I　二〇二二年　七　月　一　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

12、监理员 2：林明兵

专业监理工程师证

根据上海建设工程
监理工程师从业能力行
业标准，经考核合格。
特发此证。

上海市建设工程咨询行业协会

发证单位（印）

发证日期：2014年10月14日

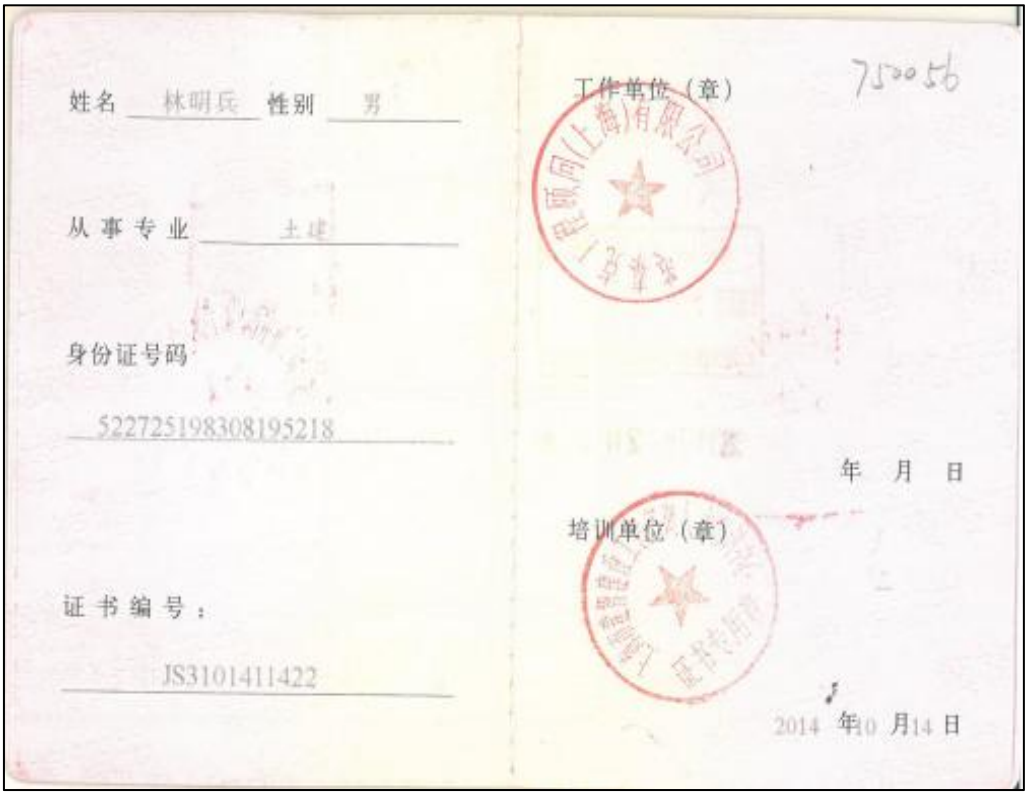

姓名 林明兵 性别 男

从事专业 土建

身份证号码

522725198308195218

证书编号：

JS3101411422

工作单位（章）

75056

年 月 日

培训单位（章）

2014 年10 月14 日

验证栏
验证专用章
有效期至 2016.10.14
上海市建设工程咨询行业协会
验证专用章
有效期至 2020-02-23
上海市建设工程咨询行业协会
验证单位（章）
2014年10月14日
验证单位（章）
2017年2月23日
验证专用章
有效期至 2023-08-31
验证专用章
有效期至 2026-08-31
上海市建设工程咨询行业协会
验证单位（章）
年 月 日
验证单位（章）
年 月 日
继续教育记录栏
1.
2.
3.
4.

职称证

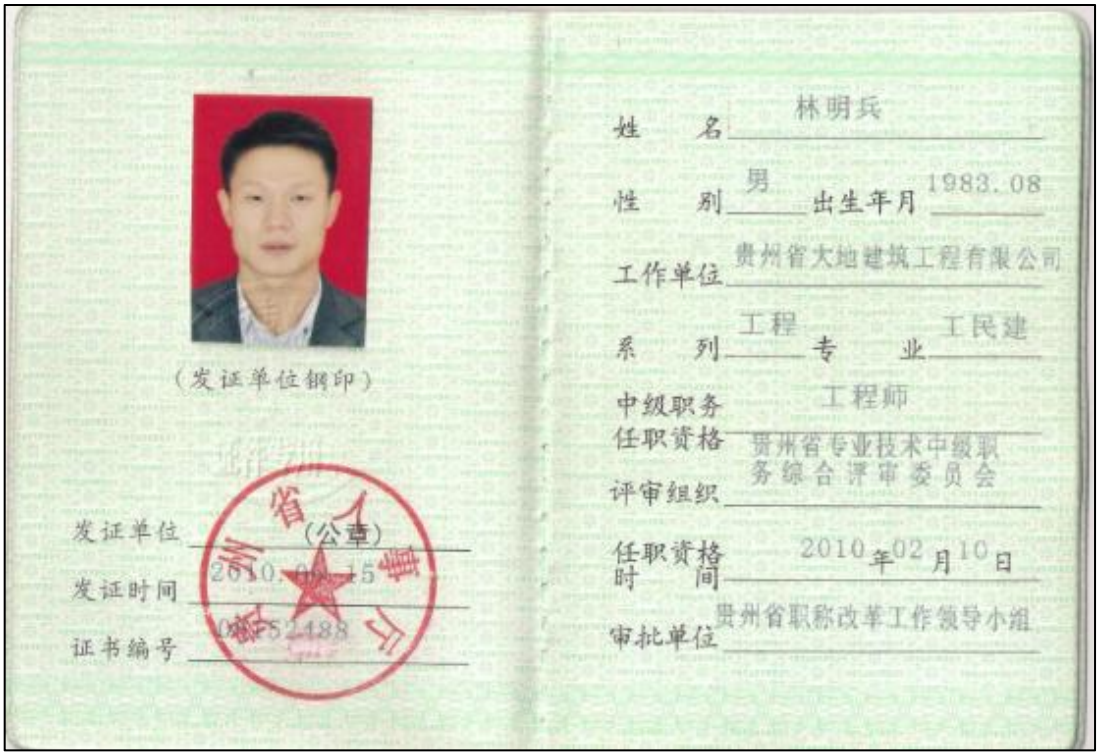
（发证单位钢印）
发证单位 （公章）
发证时间 2010.02.15
证书编号 0052488
姓 名 林明兵
性 别 男 出生年月 1983.08
工作单位 贵州省大地建筑工程有限公司
系 列 工程 专 业 工民建
中级职务任职资格 工程师
评审组织 贵州省专业技术中级职务综合评审委员会
任职资格时间 2010年02月10日
审批单位 贵州省职称改革工作领导小组

毕业证

成人高等教育

毕业证书

学生 林明兵 性别 男，一九八三 年 八 月 十九 日生，于 二000 年 九 月至 二00三 年 七 月在本校 工业与民用建筑 专业学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：贵州工业大学 校（院）长：朱立军

批准文号：[illegible]

证书编号：106585200306006554

二00三 年 一 月 十六 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 中华人民共和国教育部监制

13、监理员 3：朱利东

专业监理工程师证

根据上海建设工程
监理工程師从业能力行
业标准，经考核合格。
特发此证。

上海市建设工程咨询行业协会

发证单位（印）

发证日期：2004年 7月 28日

姓名 朱利东 性别 男

从事专业 土建

身份证号码

310230700522147

证书编号：

JS3100410262

工作单位（章）

2004 年 8 月 17 日

培训单位（章）

2004 年 7 月 23 日

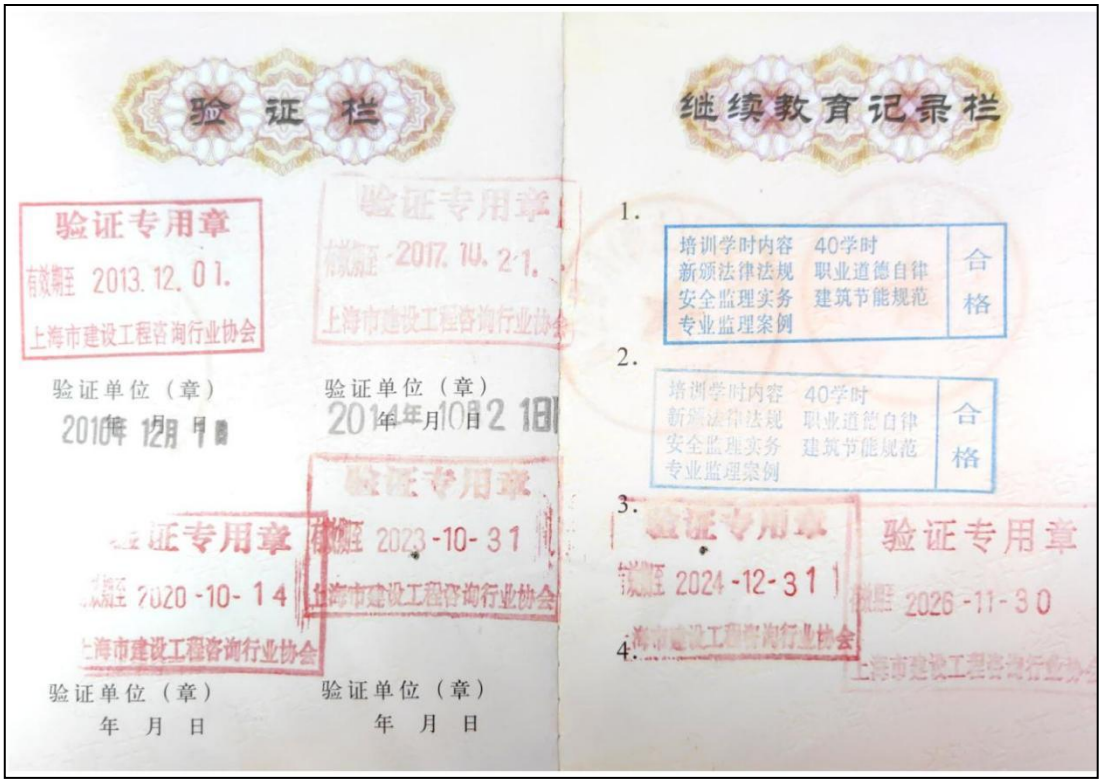

验证栏

验证专用章
有效期至 2013.12.01.
上海市建设工程咨询行业协会

验证单位（章）
2010年12月1日

验证专用章
有效期至 2017.10.21.
上海市建设工程咨询行业协会

验证单位（章）
2014年10月21日

验证专用章
有效期至 2020-10-14
上海市建设工程咨询行业协会

验证单位（章）
年 月 日

验证专用章
有效期至 2023-10-31
上海市建设工程咨询行业协会

验证单位（章）
年 月 日

继续教育记录栏

1.

培训学时内容 40学时 新颁法律法规 职业道德自律 安全监理实务 建筑节能规范 专业监理案例		合格

2.

培训学时内容 40学时 新颁法律法规 职业道德自律 安全监理实务 建筑节能规范 专业监理案例		合格

3.

验证专用章
有效期至 2024-12-31
上海市建设工程咨询行业协会

4.

验证专用章
有效期至 2026-11-30
上海市建设工程咨询行业协会

工作单位变更栏

自 年 月 日
变更至

章
年 月 日

自 年 月 日
变更至

章
年 月 日

自 年 月 日
变更至

章
年 月 日

自 年 月 日
变更至英泰克工程顾问(上海)有限公司

章
年 月 日

使用说明

一、本证书持有人已通过规定的监理业务培训。本证书是“上海监理工程师”的从业上岗证明，持证人可以履行项目监理机构专业监理工程师的职责。

二、本证书发证部门为上海市建设工程咨询行业协会，同时必须有工作单位加盖的印章方能生效。

三、本证书各栏目，作出相关登记后，须加盖相关部门印章方为有效。

四、本证书限于本人上岗期间使用。本人保管，不得转让、出借、涂改、伪造。持证人脱离监理岗位或取得监理工程师注册证书后，须将本证书交还发证部门核销。

备注：

0000314

职称证

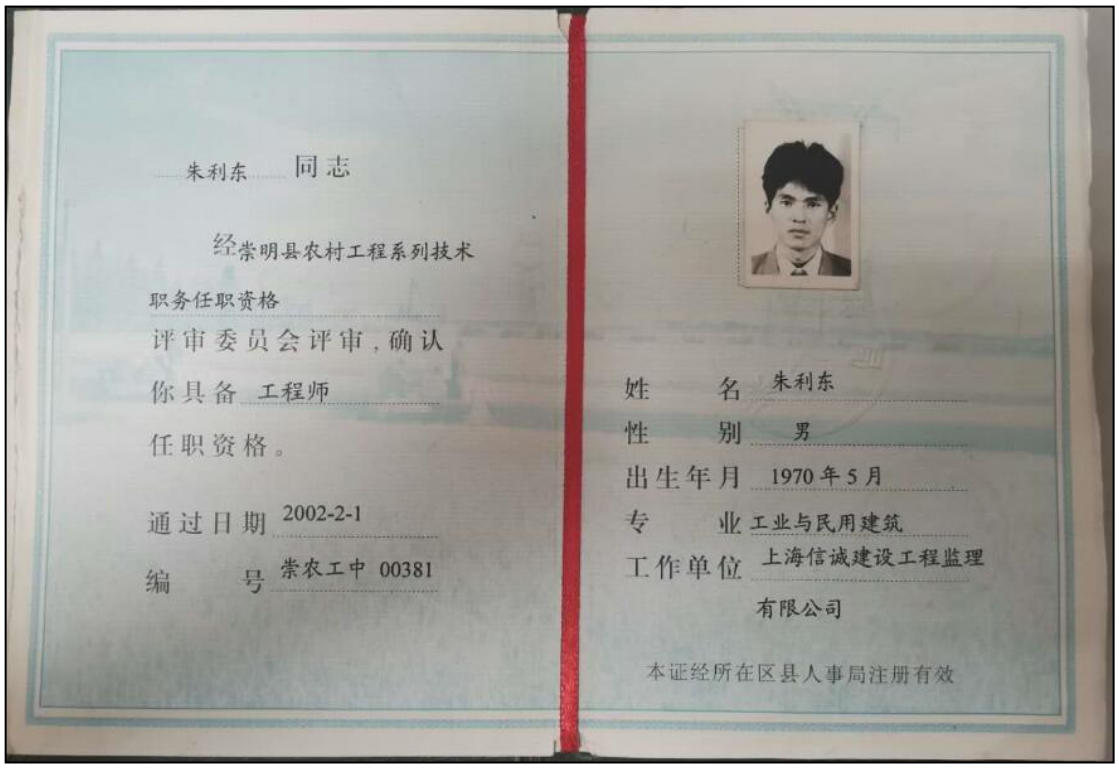

朱利东 同志

经崇明县农村工程系列技术职务任职资格评审委员会评审，确认你具备 工程师 任职资格。

通过日期 2002-2-1

编 号 崇农工中 00381

姓 名 朱利东

性 别 男

出生年月 1970年5月

专 业 工业与民用建筑

工作单位 上海信诚建设工程监理有限公司

本证经所在区县人事局注册有效

毕业证

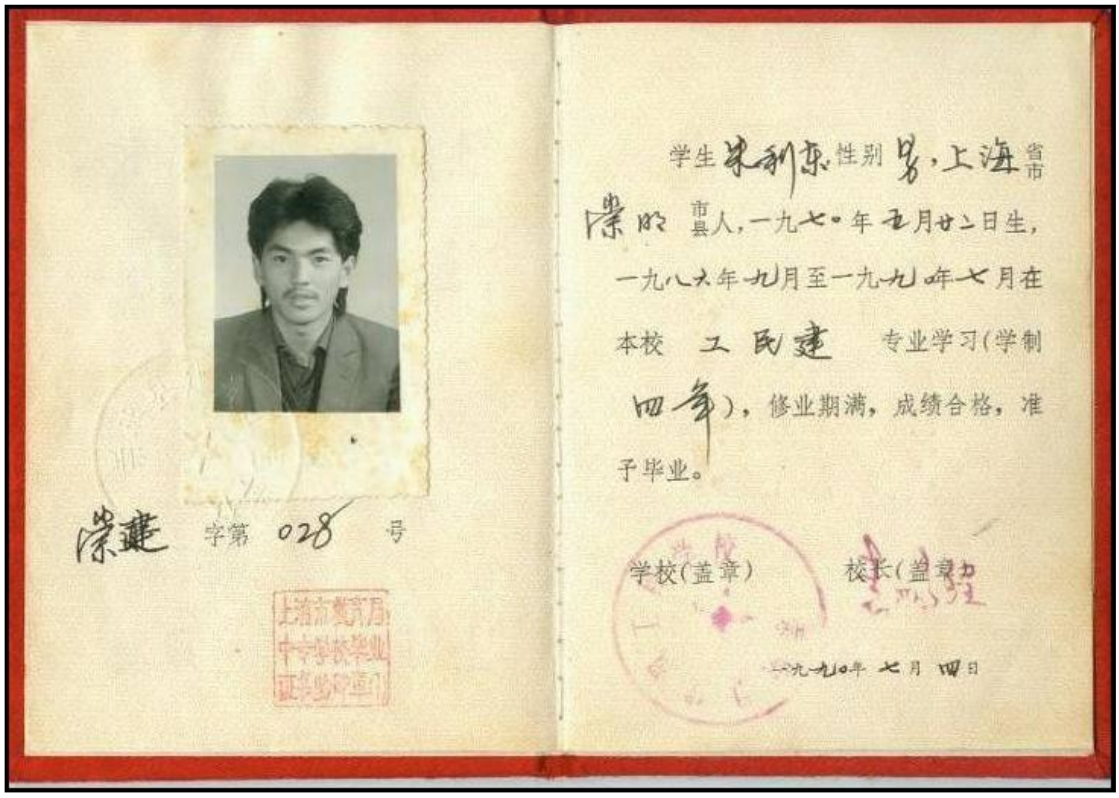

学生朱利东性别男，上海省市崇明市县人，一九七〇年七月廿二日生，一九八六年九月至一九九〇年七月在本校工民建专业学习(学制四年)，修业期满，成绩合格，准予毕业。

学校(盖章) 校长(盖章)

一九九〇年七月四日

崇建字第028号

社保证明（郑龙、林明兵、朱利东）

单位参加城镇社会保险基本情况

2025 年 09 月

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司

社会保险码：00052006

参加社会保险登记年月	1999年06月	
参保所在地	浦东	
住所或地址	静安区场中路1988弄15－16号天祥公司一楼前台（三楼人事部）	
单位类型	企业	
法定代表人(负责人)	邓卫	
统一社会信用代码	91310000631191544Q	
《社会保险登记证》号		
《社会保险登记证》发证日期		
截至 2025 年 08 月缴费状态	正常缴费	
截至 2025 年 08 月单位参保人数信息	账户人数	208 人
	缴费人数	208 人
	领取养老待遇人数	75 人
截至 2020年9月缴费情况	无欠款	
	欠缴险种及金额	

特别提示：

自2020年11月起，本市社会保险费征管职责划转至税务部门，涉及参保单位2020年10月及以后的社会保险费缴纳信息，由税务部门负责提供。

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 09 月 05日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司　　社会保险码:00052006

321	熊春军	310104198111203637	参保缴费
344	赵从松	320821197604106319	参保缴费
356	谢倩	310109198311290060	参保缴费
372	翟晨	321284199002022014	参保缴费
399	林明兵	522725198308195218	参保缴费
404	陆春燕	320926197902122023	参保缴费
408	王丽丽	310225198509253826	参保缴费
409	陆军	3102251976011620 5X	参保缴费
411	吴雪明	310225197011073057	参保缴费
412	胡文君	3102251966051938 1X	参保缴费
422	莫让国	512223196602218512	参保缴费
430	李二军	320828197801083616	参保缴费
442	朱利东	310230197005221472	参保缴费
445	陈艳敏	310107198608020026	参保缴费
471	张龚辉	310225198202114039	参保缴费
513	常明伟	310104197110253611	参保缴费
571	郑龙	310110198403134474	参保缴费
575	高洁	410305198801123547	参保缴费
629	王佳士	310109198801173510	参保缴费
633	倪善忠	320625197110145435	参保缴费
650	卢世达	430304198807080274	参保缴费
665	周翰	42050219670216011X	参保缴费
668	卢华兵	341122196510150018	参保缴费
669	陈伟	320822198111214814	参保缴费

第 2 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 09月 05日

单位参加城镇社会保险基本情况

2025 年 10 月

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司

社会保险码：00052006

参加社会保险登记年月	1999年06月	
参保所在地	浦东	
住所或地址	静安区场中路1988弄15－16号天祥公司一楼前台（三楼人事部）	
单位类型	企业	
法定代表人(负责人)	邓卫	
统一社会信用代码	91310000631191544Q	
《社会保险登记证》号		
《社会保险登记证》发证日期		
截至 2025 年 09 月缴费状态	正常缴费	
截至 2025 年 09 月单位参保人数信息	账户人数	205 人
	缴费人数	205 人
	领取养老待遇人数	75 人
截至 2020年9月缴费情况	无欠款	
	欠缴险种及金额	

特别提示：

自2020年11月起，本市社会保险费征管职责划转至税务部门，涉及参保单位2020年10月及以后的社会保险费缴纳信息，由税务部门负责提供。

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 10 月 09日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司　　社会保险码:00052006

321	熊春军	310104198111203637	参保缴费
344	赵从松	320821197604106319	参保缴费
356	谢倩	310109198311290060	参保缴费
372	翟晨	321284199002022014	参保缴费
399	林明兵	522725198308195218	参保缴费
404	陆春燕	320926197902122023	参保缴费
408	王丽丽	310225198509253826	参保缴费
409	陆军	3102251976011620 5X	参保缴费
411	吴雪明	310225197011073057	参保缴费
412	胡文君	3102251966051938 1X	参保缴费
422	莫让国	512223196602218512	参保缴费
430	李二军	320828197801083616	参保缴费
442	朱利东	310230197005221472	参保缴费
445	陈艳敏	310107198608020026	参保缴费
471	张龚辉	310225198202114039	参保缴费
513	常明伟	310104197110253611	参保缴费
571	郑龙	310110198403134474	参保缴费
575	高洁	410305198801123547	参保缴费
629	王佳士	310109198801173510	参保缴费
633	倪善忠	320625197110145435	参保缴费
650	卢世达	430304198807080274	参保缴费
665	周翰	42050219670216011X	参保缴费
668	卢华兵	341122196510150018	参保缴费
669	陈伟	320822198111214814	参保缴费

第 2 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 10月 09日

单位参加城镇社会保险基本情况

2025 年 11 月

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司

社会保险码：00052006

参加社会保险登记年月	1999年06月	
参保所在地	浦东	
住所或地址	静安区场中路1988弄15－16号天祥公司一楼前台（三楼人事部）	
单位类型	企业	
法定代表人(负责人)	邓卫	
统一社会信用代码	91310000631191544Q	
《社会保险登记证》号		
《社会保险登记证》发证日期		
截至 2025 年 10 月缴费状态	正常缴费	
截至 2025 年 10 月单位参保人数信息	账户人数	200 人
	缴费人数	200 人
	领取养老待遇人数	75 人
截至 2020年9月缴费情况	无欠款	
	欠缴险种及金额	

特别提示：

自2020年11月起，本市社会保险费征管职责划转至税务部门，涉及参保单位2020年10月及以后的社会保险费缴纳信息，由税务部门负责提供。

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 11 月 05日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司　　社会保险码:00052006

321	熊春军	310104198111203637	参保缴费
344	赵从松	320821197604106319	参保缴费
356	谢倩	310109198311290060	参保缴费
372	翟晨	321284199002022014	参保缴费
399	林明兵	522725198308195218	参保缴费
404	陆春燕	320926197902122023	参保缴费
408	王丽丽	310225198509253826	参保缴费
409	陆军	31022519760116205X	参保缴费
411	吴雪明	310225197011073057	参保缴费
412	胡文君	31022519660519381X	参保缴费
422	莫让国	512223196602218512	参保缴费
430	李二军	320828197801083616	参保缴费
442	朱利东	310230197005221472	参保缴费
445	陈艳敏	310107198608020026	参保缴费
471	张龚辉	310225198202114039	参保缴费
513	常明伟	310104197110253611	参保缴费
571	郑龙	310110198403134474	参保缴费
575	高洁	410305198801123547	参保缴费
629	王佳士	310109198801173510	参保缴费
633	倪善忠	320625197110145435	参保缴费
650	卢世达	430304198807080274	参保缴费
665	周翰	42050219670216011X	参保缴费
668	卢华兵	341122196510150018	参保缴费
669	陈伟	320822198111214814	参保缴费

第 2 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2025 年 11 月 05日

14、资料员：丘咏划

专业监理工程师证

岗位类别：专业监理工程师

登记专业：房屋建筑工程

市政公用工程

核发机构：深圳市监理工程师协会

核发日期：2019 年 11 月 14 日

核发编号：S820191955

姓　　名：丘咏划

性　　别：男

身份证号：441523197406267570

学　　历：大专

所学专业：生物系观赏园艺

技术职称：工程师

从业单位：英泰克工程顾问（上海）有限公司

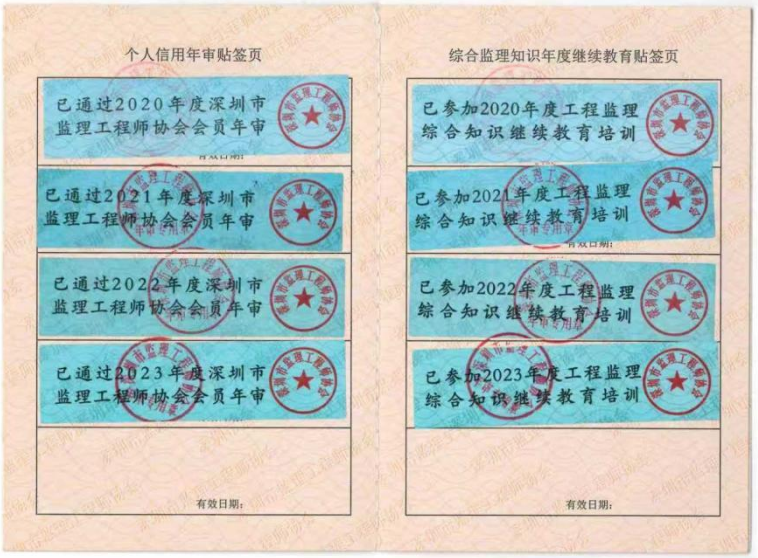

个人信用年审贴签页

已通过2020年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2021年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2022年度深圳市监理工程师协会会员年审

已通过2023年度深圳市监理工程师协会会员年审

有效日期：

综合监理知识年度继续教育贴签页

已参加2020年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2021年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2022年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2023年度工程监理综合知识继续教育培训

有效日期：

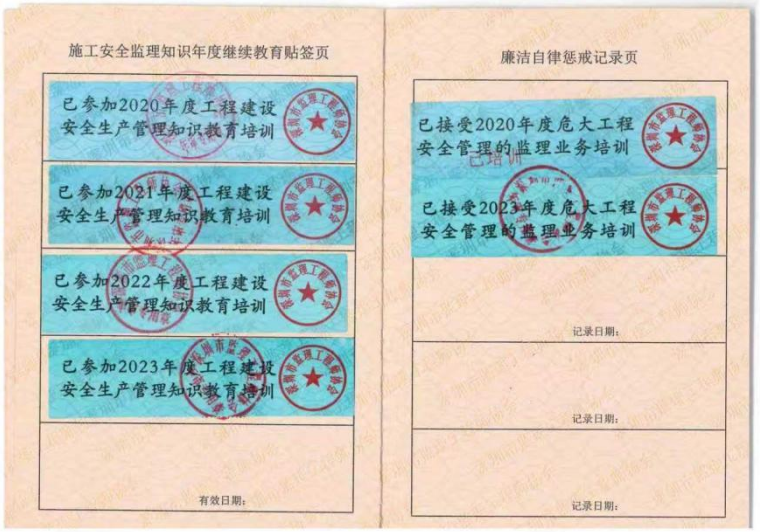

施工安全监理知识年度继续教育贴签页

已参加2020年度工程建设安全生产管理知识教育培训

已参加2021年度工程建设安全生产管理知识教育培训

已参加2022年度工程建设安全生产管理知识教育培训

已参加2023年度工程建设安全生产管理知识教育培训

有效日期：

廉洁自律惩戒记录页

已接受2020年度危大工程安全管理的监理业务培训

已接受2023年度危大工程安全管理的监理业务培训

记录日期：

记录日期：

记录日期：

职称证

丘咏划 于二〇一五年

八 月，经 清远市建筑系列

中级专业技术资格

评审委员会评审通过，

具备 建筑施工工程师

资格。特发此证。

广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 160921606013 92 号

清远市人力资源和社会保障局 专业技术资格证件专用章

发证机关:

二〇一六 年 一 月 十二 日

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 丘咏划 性别 男，一九七四 年

十 月 日生， 于一九九五 年 九 月

至 一九九八 年 六 月在本校

生物系 观赏园艺 专业叁年制

专科学习，修完教学计划规定的全部课

程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

校 名：

一九九八 年 六 月 三十日

学校编号：980476

中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 00317665

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：丘咏划　　社保电脑号：614798310　　身份证号码：441523197406267570　　页码：2

参保单位名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司深圳分公司　　单位编号：119232　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	09	119232	7925.0	1188.75	634.0	1	7925	491.35	158.5	1	7925	39.63	7925	11.1	2360	16.52	7.08
2023	10	119232	7925.0	1188.75	634.0	1	7925	475.5	158.5	1	7925	39.63	7925	11.1	2360	16.52	7.08
2023	11	119232	7925.0	1188.75	634.0	1	7925	475.5	158.5	1	7925	39.63	7925	11.1	2360	16.52	7.08
2023	12	119232	7925.0	1188.75	634.0	1	7925	475.5	158.5	1	7925	39.63	7925	11.1	2360	16.52	7.08
2024	01	119232	7925.0	1188.75	634.0	1	7925	396.25	158.5	1	7925	39.63	7925	11.1	7925	63.4	15.85
2024	02	119232	7925.0	1188.75	634.0	1	7925	396.25	158.5	1	7925	39.63	7925	11.1	7925	63.4	15.85
2024	03	119232	7925.0	1188.75	634.0	1	7925	396.25	158.5	1	7925	39.63	7925	22.19	7925	63.4	15.85
2024	04	119232	7925.0	1268.0	634.0	1	7925	396.25	158.5	1	7925	39.63	7925	22.19	7925	63.4	15.85
2024	05	119232	7925.0	1268.0	634.0	1	7925	396.25	158.5	1	7925	39.63	7925	22.19	7925	63.4	15.85
2024	06	119232	7925.0	1268.0	634.0	1	7925	396.25	158.5	1	7925	39.63	7925	22.19	7925	63.4	15.85
2024	07	119232	8725.0	1396.0	698.0	1	8725	436.25	174.5	1	8725	43.63	8725	34.9	8725	69.8	17.45
2024	08	119232	8725.0	1396.0	698.0	1	8725	436.25	174.5	1	8725	43.63	8725	34.9	8725	69.8	17.45
2024	09	119232	8725.0	1396.0	698.0	1	8725	436.25	174.5	1	8725	43.63	8725	34.9	8725	69.8	17.45
2024	10	119232	8725.0	1396.0	698.0	1	8725	436.25	174.5	1	8725	43.63	8725	34.9	8725	69.8	17.45
2024	11	119232	8725.0	1396.0	698.0	1	8725	436.25	174.5	1	8725	43.63	8725	34.9	8725	69.8	17.45
2024	12	119232	8725.0	1396.0	698.0	1	8725	436.25	174.5	1	8725	43.63	8725	34.9	8725	69.8	17.45
2025	01	119232	8725.0	1483.25	698.0	1	8725	436.25	174.5	1	8725	43.63	8725	34.9	8725	69.8	17.45
2025	02	119232	8725.0	1483.25	698.0	1	8725	436.25	174.5	1	8725	43.63	8725	34.9	8725	69.8	17.45
2025	03	119232	8725.0	1483.25	698.0	1	8725	436.25	174.5	1	8725	43.63	8725	34.9	8725	69.8	17.45
2025	04	119232	8725.0	1483.25	698.0	1	8725	436.25	174.5	1	8725	43.63	8725	34.9	8725	69.8	17.45
2025	05	119232	8725.0	1483.25	698.0	1	8725	436.25	174.5	1	8725	43.63	8725	34.9	8725	69.8	17.45
2025	06	119232	8725.0	1483.25	698.0	1	8725	436.25	174.5	1	8725	43.63	8725	34.9	8725	69.8	17.45
2025	07	119232	9077.0	1543.09	726.16	1	9077	453.85	181.54	1	9077	45.39	9077	36.31	9077	72.62	18.15
2025	08	119232	9077.0	1543.09	726.16	1	9077	453.85	181.54	1	9077	45.39	9077	36.31	9077	72.62	18.15
2025	09	119232	9077.0	1543.09	726.16	1	9077	453.85	181.54	1	9077	45.39	9077	36.31	9077	72.62	18.15
2025	10	119232	9077.0	1543.09	726.16	1	9077	453.85	181.54	1	9077	45.39	9077	36.31	9077	72.62	18.15
合计				84131.59	45276.16			30124.43	11319.04			2688.72		1012.49		2246.84	725.22

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f27c465885at ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
119232	英泰克工程顾问（上海）有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2025年11月11日
社保费缴纳清单
证明专用章

15、项目统筹管理人员（土建）：胡颖

职称证

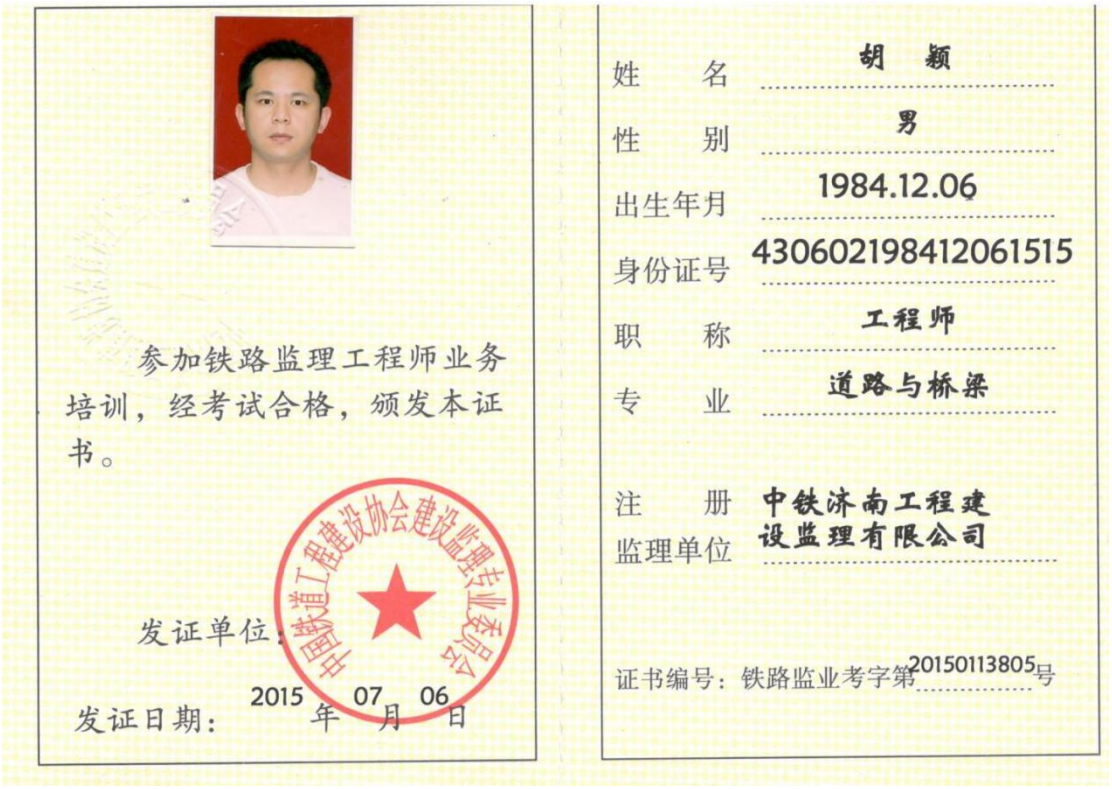

参加铁路监理工程师业务培训，经考试合格，颁发本证书。

发证单位：中国铁道工程建设协会建设监理专业委员会

发证日期：2015 年 07 月 06 日

姓　　名　胡　颖

性　　别　男

出生年月　1984.12.06

身份证号　430602198412061515

职　　称　工程师

专　　业　道路与桥梁

注册监理单位　中铁济南工程建设监理有限公司

证书编号：铁路监业考字第20150113805号

毕业证

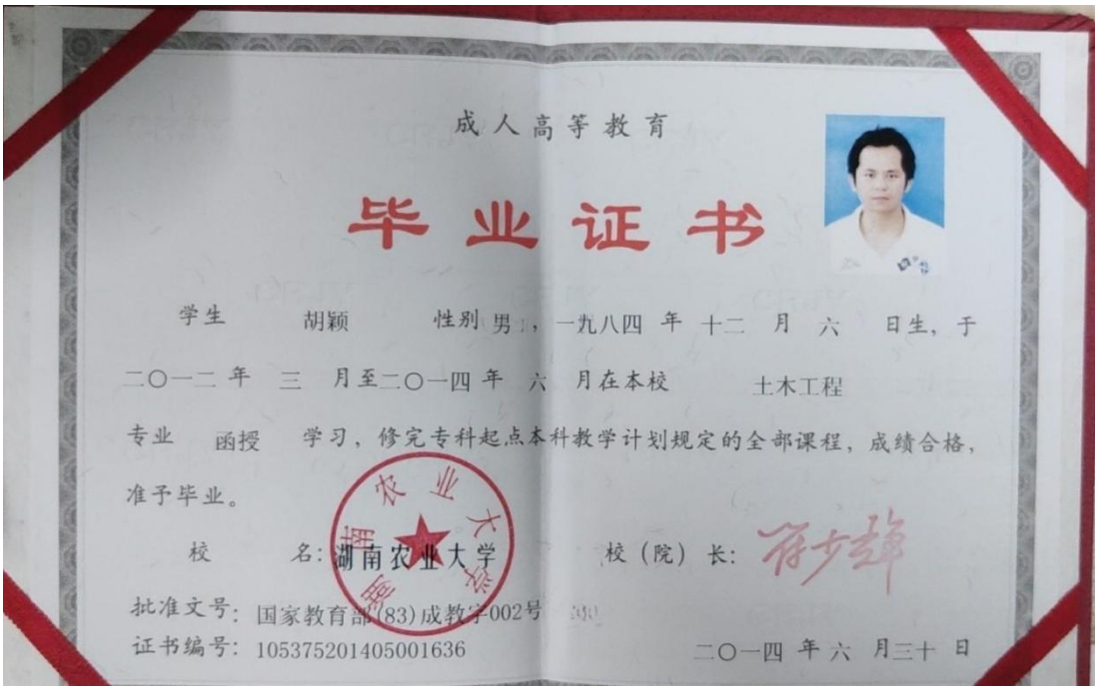

成人高等教育

毕业证书

学生　胡颖　性别　男，一九八四　年　十二　月　六　日生，于二〇一二　年　三　月至二〇一四　年　六　月在本校　土木工程　专业　函授　学习，修完专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：湖南农业大学　　校（院）长：

批准文号：国家教育部(83)成教字002号

证书编号：10537520140500163 6

二〇一四　年　六　月三十　日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：胡颖　　社保电脑号：643575669　　身份证号码：430602199412061515　　页码：2

参保单位名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司深圳分公司　　单位编号：119232　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	119232	5100.0	714.0	408.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5100	14.28	5100	40.8	10.2
2024	04	119232	5100.0	765.0	408.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5100	14.28	5100	40.8	10.2
2024	05	119232	5100.0	765.0	408.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5100	14.28	5100	40.8	10.2
2024	06	119232	5100.0	765.0	408.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5100	14.28	5100	40.8	10.2
2024	07	119232	5115.0	767.25	409.2	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5115	20.46	5115	40.92	10.23
2024	08	119232	5115.0	767.25	409.2	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5115	20.46	5115	40.92	10.23
2024	09	119232	5115.0	767.25	409.2	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5115	20.46	5115	40.92	10.23
2024	10	119232	5115.0	767.25	409.2	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5115	20.46	5115	40.92	10.23
2024	11	119232	5115.0	767.25	409.2	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5115	20.46	5115	40.92	10.23
2024	12	119232	5115.0	767.25	409.2	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5115	20.46	5115	40.92	10.23
2025	01	119232	5115.0	818.4	409.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5115	20.46	5115	40.92	10.23
2025	02	119232	5115.0	818.4	409.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5115	20.46	5115	40.92	10.23
2025	03	119232	5115.0	818.4	409.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5115	20.46	5115	40.92	10.23
2025	04	119232	5115.0	818.4	409.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5115	20.46	5115	40.92	10.23
2025	05	119232	5115.0	818.4	409.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5115	20.46	5115	40.92	10.23
2025	06	119232	5115.0	818.4	409.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5115	20.46	5115	40.92	10.23
2025	07	119232	5125.0	820.0	410.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5125	20.5	5125	41.0	10.25
2025	08	119232	5125.0	820.0	410.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5125	20.5	5125	41.0	10.25
2025	09	119232	5125.0	820.0	410.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5125	20.5	5125	41.0	10.25
2025	10	119232	5125.0	820.0	410.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5125	20.5	5125	41.0	10.25
合计				47389.9	27046.4			24756.35	9142.88			1786.12		605.21		1570.44	533.48

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f27887f4bc09 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
119232	英泰克工程顾问（上海）有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年11月10日

16、项目统筹管理人员（机电）：南君礼

职称证

毕业证

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：南君礼　　社保电脑号：622256177　　身份证号码：620422198511054812　　页码：3

参保单位名称：英泰克工程顾问（上海）有限公司深圳分公司　　单位编号：119232　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	119232	6505.0	975.75	520.4	1	7778	482.24	155.56	1	6505	32.53	6505	9.11	2360	16.52	7.08
2023	07	119232	6650.0	997.5	532.0	1	7778	482.24	155.56	1	6650	33.25	6650	9.31	2360	16.52	7.08
2023	08	119232	6650.0	997.5	532.0	1	7778	482.24	155.56	1	6650	33.25	6650	9.31	2360	16.52	7.08
2023	09	119232	6650.0	997.5	532.0	1	7778	482.24	155.56	1	6650	33.25	6650	9.31	2360	16.52	7.08
2023	10	119232	6650.0	997.5	532.0	1	6650	399.0	133.0	1	6650	33.25	6650	9.31	2360	16.52	7.08
2023	11	119232	6650.0	997.5	532.0	1	6650	399.0	133.0	1	6650	33.25	6650	9.31	2360	16.52	7.08
2023	12	119232	6650.0	997.5	532.0	1	6650	399.0	133.0	1	6650	33.25	6650	9.31	2360	16.52	7.08
2024	01	119232	6650.0	997.5	532.0	1	6650	332.5	133.0	1	6650	33.25	6650	9.31	6650	53.2	13.3
2024	02	119232	6650.0	997.5	532.0	1	6650	332.5	133.0	1	6650	33.25	6650	9.31	6650	53.2	13.3
2024	03	119232	6650.0	997.5	532.0	1	6650	332.5	133.0	1	6650	33.25	6650	18.62	6650	53.2	13.3
2024	04	119232	6650.0	1064.0	532.0	1	6650	332.5	133.0	1	6650	33.25	6650	18.62	6650	53.2	13.3
2024	05	119232	6650.0	1064.0	532.0	1	6650	332.5	133.0	1	6650	33.25	6650	18.62	6650	53.2	13.3
2024	06	119232	6650.0	1064.0	532.0	1	6650	332.5	133.0	1	6650	33.25	6650	18.62	6650	53.2	13.3
2024	07	119232	6850.0	1096.0	548.0	1	6850	342.5	137.0	1	6850	34.25	6850	27.4	6850	54.8	13.7
2024	08	119232	6850.0	1096.0	548.0	1	6850	342.5	137.0	1	6850	34.25	6850	27.4	6850	54.8	13.7
2024	09	119232	6850.0	1096.0	548.0	1	6850	342.5	137.0	1	6850	34.25	6850	27.4	6850	54.8	13.7
2024	10	119232	6850.0	1096.0	548.0	1	6850	342.5	137.0	1	6850	34.25	6850	27.4	6850	54.8	13.7
2024	11	119232	6850.0	1096.0	548.0	1	6850	342.5	137.0	1	6850	34.25	6850	27.4	6850	54.8	13.7
2024	12	119232	6850.0	1096.0	548.0	1	6850	342.5	137.0	1	6850	34.25	6850	27.4	6850	54.8	13.7
2025	01	119232	6850.0	1164.5	548.0	1	6850	342.5	137.0	1	6850	34.25	6850	27.4	6850	54.8	13.7
2025	02	119232	6850.0	1164.5	548.0	1	6850	342.5	137.0	1	6850	34.25	6850	27.4	6850	54.8	13.7
2025	03	119232	6850.0	1164.5	548.0	1	6850	342.5	137.0	1	6850	34.25	6850	27.4	6850	54.8	13.7
2025	04	119232	6850.0	1164.5	548.0	1	6850	342.5	137.0	1	6850	34.25	6850	27.4	6850	54.8	13.7
2025	05	119232	6850.0	1164.5	548.0	1	6850	342.5	137.0	1	6850	34.25	6850	27.4	6850	54.8	13.7
2025	06	119232	6850.0	1164.5	548.0	1	6850	342.5	137.0	1	6850	34.25	6850	27.4	6850	54.8	13.7
2025	07	119232	7078.0	1203.26	566.24	1	7078	353.9	141.56	1	7078	35.39	7078	28.31	7078	56.62	14.16
2025	08	119232	7078.0	1203.26	566.24	1	7078	353.9	141.56	1	7078	35.39	7078	28.31	7078	56.62	14.16
2025	09	119232	7078.0	1203.26	566.24	1	7078	353.9	141.56	1	7078	35.39	7078	28.31	7078	56.62	14.16
2025	10	119232	7078.0	1203.26	566.24	1	7078	353.9	141.56	1	7078	35.39	7078	28.31	7078	56.62	14.16
合计				94515.1	52402.08			39259.64	13777.68			3316.48		1525.56		3273.17	1421.7

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f27887f7687v ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
119232	英泰克工程顾问（上海）有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年11月10日

投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书

致招标人：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

为了确保本工程招投标工作顺利进行，同时保证优质高效、文明施工，我方将严格执行建设工程管理的法律法规，规范自身行为，并完全接受 妈湾电厂-松湖变电站220千伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理 工程的招标文件所有内容。同时，我方本次投标拟派项目总监及其他项目管理机构人员，将严格按照《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》（深府〔2015〕73号）《深圳市住房和建设局关于印发《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》的通知》（深建规〔2022〕1号）《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》（深府规〔2024〕8号）等文件的规定执行。对此，我司作出如下承诺：

1．近3年内（从招标公告发布之日起倒算）我方或者我方法定代表人无行贿犯罪记录。

2．近1年内（从截标之日起倒算）无因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的情形。

3．无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的情形。

4．无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的情形。

5．近2年内（从截标之日起倒算）未曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形。

6．无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、挂靠以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的情形。

7．无因违纪、违法受到监察机关、司法机关惩处或被列入行贿黑名单且仍在有效期内的情形。

8．我方接受招标人定标前审核我方拟派项目总监任职情况及评估拟派项目总监能否到位履职，并在定标时综合考虑该因素。

9．投标文件中提供的项目总监的信息真实、准确，如信息有误，由我方承担所有不利后果。

10．在同一时间段内，如我方派出同一人参加多个“中标后不能更换项目总监”的项目投标，一经中标且项目总监任职项目数量达到规定限额的，会立即书面通知招标人，避免对

其造成不利影响。

11．本工程中标后拟派项目总监在取得施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续前不更换（符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）第五十四条第（一）、（八）项以及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1号）第四条第（三）项、第八条第（三）项规定情形的除外），否则我方自行承担被招标人取消中标资格并解除合同的责任。

12．本工程拟派项目总监没有因不良行为、红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形，并确保在办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续时任职项目数量未达到规定限额，如因存在上述情形而导致不能办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续的，我方自行承担被招标人取消中标资格并解除合同的责任。

13．本工程中标后拟派项目总监从本项目办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续当日至竣工验收之前均不更换（符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）以及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1号）规定情形的除外），否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

14．本工程中标后拟派项目管理机构成员不变更，否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

15．我方接受招标人对于建设工程项目的廉洁要求，中标后签订《廉洁协议》。

16．我方如有违反以上承诺，招标人有权将我方列入供应商不良行为负面清单，并向主管部门反映相关情况。招标人在过多投标人淘汰和定标环节中对我方以上违反承诺的情形所作出的处理及相关决定，我方对此无条件接受。

承诺单位：英泰克工程顾问（上海）有限公司（公章）

法定代表人（签字/盖章）：

承诺日期：2025 年 11 月 17 日
