

标段编号：2507-440307-04-01-929353002001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：岗头西站地下连通通道工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：中铁六局集团有限公司

日期：2026年07月14日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业业绩情况	业绩要求：投标人提供近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模方面最具代表性的已完工同类工程业绩（数量上限为 5 项，超过 5 项的，只认前 5 项业绩）。 证明资料：中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息（如工程造价、竣工时间等），招标人有可能做出对投标人不利的判断。 注：1. 优先提供同类项目规模较大项目业绩；2. 若投标人提供项目的业绩为投标人作为联合体成员参与的施工项目，则需提供投标人在该项目中业绩所占比例的情况说明；3. 项目完工时间以竣工验收日期为准。
2	企业获奖情况	近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）投标人获得同类工程市、省、国家级奖项和荣誉证明（优先提供较高等级的奖项）；证明资料为获奖证书扫描件和合同关键页扫描件（合同关键页是指含工程名称、工程类别、合同签字盖章页等页面）。（数量上限为 3 项，超过 3 项的，只认前 3 项） 注：1. 若暂未颁发获奖证书，可用发证单位官方网站公布的截图替代证书文件，作为获奖证明。 2. 国家级奖项包括：国家工程建设质量奖审定委员会评选的《国家优质工程金、银质奖》；中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班奖》；中国市政工程协会评选的《全国市政金杯示范工程奖》、《市政工程最高质量水平评价》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国公路建设行业协会评选的《公路交通优质工程奖》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国水利工程协会评选的《水利工程大禹奖》（仅限于水利水电类项目招标）；中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》；中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程奖》；中国钢结构协会评选的《钢结构金奖》（仅限于钢结构项目招标）；中国建筑装饰协会评选的《全国建筑装饰奖》（仅限于装饰项目招标）； 省级奖

		项包括但不限于各省级优质工程奖、优质结构奖、金匠奖。
3	项目经理(建造师)专业、职称和业绩情况	提供相关职称证明, 及在投标人处交纳社保证明(优先提供较好专业技术职称人员担任)。业绩要求: 近五年(从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推)投标人提供自认为规模方面最具代表性的已完工同类工程业绩(数量上限为 2 项, 超过 2 项的, 只认前 2 项业绩, 需按照规模从大到小排序); 证明资料: 1、中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件; 合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页及涉及项目经理或项目负责人名字等页面, 竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页, 其它内容可不附。 2、一个月的社保证明(截标当月及前两个月内均有效)
4	项目管理机构设置及其他人员配备要求	提供项目经理、各相关专业技术责任人(工程师)、项目安全主任、质量主任及六大员(施工员、安全员、质检员、预算员、材料员、资料员)等相应的资格证书、上岗证书(担任安全岗位的需 B 或 C 证)、职称证明(提供高工证明、毕业证等相关证明材料)、社保证明(截标当月及前两个月内均有效)。注: 1. 项目管理机构配备情况表需按上述要求进行填写; 2. 项目管理机构最低配置请参考第 3 章管理机构人员配置表

备注: 资信要素不进行评审, 真实性通过公示予以监督。

[8]的具体要求源自《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》(深府规〔2024〕8号)第九条。

[9]-[11]的具体要求源自《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》(深府规〔2024〕8号)第五、七、九条, 以及《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》(深府〔2015〕73号)第四十七条。

目录

一、企业业绩情况	5
企业同类工程业绩一览表	5
1、临汾市五一路快速通道工程总承包（EPC）	8
2、新泉州站站前广场及市政配套工程项目工程总承包（EPC）	21
3、广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目、湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目（EPC）设计施工总承包	54
4、淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目	73
5、黄石新港（物流）工业园区村镇改造设计施工EPC总承包	157
6、天龙山路（西中环南延-滨河西路）建设工程一标段	167
7、京密路（太阳宫北街-机场南线）道路工程5#标段	173
二、企业获奖情况	183
1、临汾市五一路快速通道工程总承包（EPC）——2022-2023年度国家优质工程奖	184
2、淮南孔李淮河大桥工程——2020-2021年度国家优质工程奖	194
3、太古供热项目（古交兴能电厂至太原供热主管线及中继能源站工程）——第十九届中国土木工程詹天佑奖	197
三、项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况	202
项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）	202
项目经理（建造师）孙岩相关证件	204
项目经理（建造师）孙岩业绩	213
1、黄石新港（物流）工业园区村镇改造设计施工EPC总承包	213
2、东古城街（K0+135-景行路）、涌翠西路（东古城街-兆善大街）道路工程	223
四、项目管理机构设置及其他人员配备要求	233
1.项目管理机构配备情况表	233
2.项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）	236
项目经理（建造师）孙岩相关证件	238
3.技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）	247
技术负责人杜子君相关证件	248
4.质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）	253
质量负责人（质量主任）邵华相关证件	254
5.安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）	259

安全负责人（安全主任）张景飞相关证件.....	260
6. 安全员信息表（每个项目可多个，必填项）	268
安全员吴健相关证件	269
安全员郑昱相关证件	275
7. 劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）	281
劳资专管员高志朋相关证件	282
施工员张英伟相关证件	288
施工员赵自硕相关证件	294
质检员杜楷相关证件	300
质检员孔德俊相关证件	305
预算员段松华相关证件	310
材料员张虎进相关证件	316
资料员滕家星相关证件	321
项目副经理裴强相关证件	326
造价工程师陈艳格相关证件	336
道路专业工程师楚浩冲相关证件	342
岩土专业工程师马杰相关证件.....	346
机电专业工程师刘彦章相关证件	350
交通专业工程师武云龙相关证件	355
8. 项目管理机构情况辅助证明材料.....	359
人员社保证明详见“四、项目管理机构配备情况表后附资料	359
五、其他资料	363
投标人履约评价情况表.....	363
1、宝同路东段、新能源四路东段、宝龙六局北段工程	364
2、市桥水道-沙湾水道流域（中部系统）村居雨污分流改造工程-樟边村.....	366
3、番禺区前锋南部流域第二批排水单元配套公共管网完善工程.....	367
企业在深圳市建筑市场主体信用等级	368

一、企业业绩情况

企业同类工程业绩一览表

序号	工程名称	建设单位	工程规模	开竣工时间	合同金额(元)	备注
1	临汾市五一路快速通道工程总承包(EPC)	临汾市政府工程建设服务中心	主线设计速度 50km/h, 辅路设计速度 40km/h.道路全长 3884.871m, 规划红线宽 55 米, 为城市生活性主干道。主辅分离, 主路设计速度 50km/h, 辅路设计速度 40km/h。 中铁六局负责承建五一路东段, 起讫里程 K1+960-K3+629.015, 全长 1.669km。 建设项目主要内容包 括道路工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、给水工程、照明工程、交通工程、通信工程、电力工程、绿化工程等配套工程。	2021.07.02-2022.08.31	896230338.50 元 (中铁六局 340592624.70 元)	2022-2023 年度国家 优质工程 奖
2	新泉州东站站前广场及市政配套工程项目工程总承包(EPC)	泉州台商投资区城市建设发展有限公司(发包人一); 泉州台商投资区水务投资经营有限公司(发包人二); 泉州台商投资区市政管理有限责任公司(发包人三)	市政配套道路总长约3.7 km, 设计速度: 主干路50km/h, 次干路40km/h。本项目是一个集建筑、结构、道路、轨道交通等于一体的综合性枢纽工程, 涉及到建筑工程、结构工程、市政道路工程、景观工程、给排水工程、电力工程、公共交通站点、停车场工程、轨道交通工程以及工程概预算等专业。站北路(海山大道至海城大道)为次干路, 道路全长 2.28km, 设计车速40km/h, 双向4 车道, 红线宽30m; 东纬一路(海山大道至站前大道)为主干路, 道路全长 517m, 设计车速50km/h, 双向6 车道, 红线宽53.5m; 站前大道(滨湖北路至站北路)为主干路, 道路全长 568m, 设计车速50km/h, 双向6 车道, 红线宽50m; 滨湖北路(海山大道至站前大道)为主干路道路全长 388m, 设计车速50km/h, 双向6 车道, 红线宽55m。	2020.12.24-2024.07.17	1889157900	/

			站前广场上跨站前大道两座人行天桥，面积约1000m ² ，东纬二路、站前一路、东纬支九路下穿福厦客专段总计409m。			
3	广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目、湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目（EPC）设计施工总承包	广东惠侨投资开发有限公司	设计时速 40km/h，本工程建设内容共计7条城市次干路和一条临时连接线；7条城市次干路分别为规划的裕廊北路、吉隆坡南路、清迈南路、文莱北路、曼谷南路、清迈中路和东盟北路，路线总长约4.836km，本次实施道路宽度除桥梁外均按 26m；采用沥青混凝土路面结构。另外为了路网闭合，增设巴厘南路和东盟北路连接线工程，全长约1.1km，采用水泥混凝土路面结构，参照城市支路标准实施。工程实施内容包括：道路、桥涵、给排水、交通安全设施（道路标志标线）、照明和绿化工程等。	2020.10.09-2023.11.28	508640923.72	/
4	淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目	淮南市重点工程建设管理局	中铁六局施工内容包括：中兴北路及中兴南路的道路工程、排水工程、桥涵工程、交通工程、照明工程、绿化工程、管廊工程。	2019.12.26-2022.07.28	596589111.44	/
5	黄石新港（物流）工业园区村镇改造设计施工EPC总承包	黄石新港开发有限公司	黄石市韦源口镇的三洲村、春湖村、广言村以及太子镇的凡庄村在内的四个乡村街道改造工程。包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、外立面改造、安装工程、修建停车场、其它零星工程。	2021.04.01-2023.05.26	146600000	/
6	天龙山路（西中环南延-滨河西路）建设工程一标段	太原市城市建设管理中心	道路全长约 1.1 公里，设计速度：城市主干路：60km/h；城市次干路：40km/h；建设内容：道路、排水、电力、桥梁等。	2020.06.10-2021.07.30	258202156.01	/
7	京密路（太阳宫北街-机场南线）道路工程 5#标段	北京市首都公路发展集团有限公司	本标段路线全长1076.5m，施工内容主要包括标段内的道路（主辅路）、标段内的主路跨线桥（K6+503.5~K7+198.197）、辅路跨河桥（北小河左辅路桥和北小河右辅路桥）、标段内的雨水排除设施、旧桥拆除、	2022.07.28-2025.01.06	388036699.89	/

			五环立交新建匝道(D、E、H)、主路上跨铁路桥、辅路下穿铁路顶进箱涵。 道路规划等级为城市快速路，本标段设计速度：路 80km/h，辅路 40km/h。			
--	--	--	--	--	--	--

1、临汾市五一路快速通道工程总承包（EPC）

中标通知书

中 标 通 知 书

山西一建集团有限公司、西安市政设计研究院有限公司、中铁六局集团有限公司、

中铁十局集团建筑工程有限公司（联合体）：

你方于 2021 年 6 月 24 日所递交的临汾市五一路快速通道工程总承包（EPC）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：89623.03385 万元

工 期：365 日历天

质量标准：设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度；工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准

工程总承包项目经理：武生

设计负责人：成华

施工负责人：李秀丽

请你方在接到本通知书后 30 日内到临汾市政府工程建设服务中心与我方签订总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4.1 款规定向我方提交履约担保。

特此通知

招标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

2021 年 6 月 27 日

注：1、本中标通知书一式四份，与招标投标监督机构发的中标备案表配套使用。

2、招标人、中标人、招标代理机构、招标投标监督机构各执一份。

----- 中 标 人 留 存 -----

合同协议书

山西一建集团有限公司
施工合同 2021 年 149 号 -2

正本

GF-2020-0216

建设工程总承包合同

(示范文本)

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局

制定

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 临汾市政府工程建设服务中心

承包人(全称): 山西一建集团有限公司·西安市政设计研究院有限公司·中铁六局集团有限公司·中铁十局集团建筑工程有限公司联合体

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就临汾市五一路快速通道工程总承包(EPC)项目的工程总承包及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 临汾市五一路快速通道工程总承包(EPC)。
2. 工程地点: 临汾市五一路。
3. 工程审批、核准或备案文号: 临行审发【2021】269号。
4. 资金来源: 市财政筹措解决。

5. 工程内容及规模: 新建快速通道西起现状滨河东路,东至现状脸谱桥西桥头,全长 3884.871m,红线宽 55m。包括道路工程、桥梁工程(桥梁、下穿通道)、雨水工程、污水工程、给水工程、照明工程、交通工程、电力工程、通信工程、绿化工程等配套工程。

6. 工程承包范围: 从工程设计开始到质保期结束为止所涉及到的所有工作,包括工程施工图设计、工程施工及相关采购、竣工验收和最终交付等所有工作。

二、合同工期

计划开始工作日期：2021 年 7 月 1 日。

计划开始现场施工日期：以发包人或发包人委托的监理工程师下发的开工通知书为准。

计划竣工日期：2022 年 6 月 30 日。

工期总日历天数：365 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和招标文件要求的设计深度；工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）捌亿玖仟陆佰贰拾叁万零叁佰叁拾捌元伍角
（¥ 896230338.5 元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）壹仟捌佰捌拾伍万叁仟玖佰陆拾贰元整
（¥ 18853962.00 元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）壹佰零陆万柒仟贰佰零伍元肆角（¥1067205.4 元）；

（2）设备购置费（含税）：

人民币（大写）（¥ 元）；适用税率：%，税金为人民币（大写）（¥ 元）；

（3）建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）捌亿柒仟柒佰叁拾柒万陆仟叁佰柒拾陆元伍

角(¥877376376.5元);适用税率: 9 %,税金为人民币(大写)柒仟贰佰肆拾肆万叁仟玖佰贰拾壹元(¥72443921元);

(4) 暂估价(含税):

人民币(大写)_____ (¥_____元)。

(5) 暂列金额(含税):

人民币(大写)_____ (¥_____元)。

(6) 双方约定的其他费用(含税):

人民币(大写)_____ (¥_____元);适用税率: _____%,税金为人民币(大写)_____ (¥_____元)。

2. 合同价格形式:

固定综合单价,在投标报价中列出的任何工程量和价格数据应仅限用于暂定合同价格的参考资料,而不能用于其他目的。中间计价按财评评审报告中的综合单价计算。最终结算按审计部门审计认定的金额为准。

设计费的计量按财政评审报告中的金额为准,最终结算价按审计部门审计认定的金额为准。

合同当事人对合同价格形式的其他约定: /。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理: 武生。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及投标函附录(如果有);

- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件;
- (4) 通用合同条件;
- (5) 承包人建议书;
- (6) 价格清单;
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2021 年 6 月 30 日订立。

九、订立地点

本合同在 临汾市政府工程建设服务中心 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立,并自 发包人、承包人双方签字盖章后 生效。

十一、合同份数

本合同一式 叁拾 份,均具有同等法律效力,发包人执 玖 份,承包人执 贰拾 份,监理人 壹 份。

发包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:
(签字)



统一社会信用代码: _____
地址: _____
邮政编码: _____
法定代表人: _____
委托代理人: _____
电话: _____
传真: _____
电子信箱: _____
开户银行: _____
账号: _____

承包人 (联合体牵头人): (公
章)



法定代表人或其委托代理人:
(签字)



统一社会信用代码: 911400001131517291
地址: 山西示范区新化路8号1幢B座五层
邮政编码: 030032
法定代表人: 杨韶勇
委托代理人: 武生
电话: 0351-8720055
传真: 0351-8721165
电子信箱: sxyjvfgsvsk@126.com
开户银行: 中国建设银行股份有限公司侯
马支行
账号: 14001716208050013800

承包人：联合体成员一（公章）



法定代表人或其委托代理人：

（签字）

高中俊印

统一社会信用代码：91610103220736087X

地址：西安市碑林区朱雀大街100号

邮政编码：710068

法定代表人：高中俊

委托代理人：

电话：029-88426296

传真：029-88422024

电子信箱：xmedri@163.com

开户银行：中国工商银行股份有限公司西

安含光路支行

账号：3700023109089348566

承包人：联合体成员二（公章）



法定代表人或其委托代理人：

（签字）

韦国印

统一社会信用代码：

91110108101884765M

地址：北京市海淀区万寿路2号

邮政编码：100036

法定代表人：韦国

委托代理人：

电话：0351-2666081

传真：0351-2666079

电子信箱：

开户银行：交通银行股份有限公司北京定

慧寺支行

账号：110060544018001830581



承包人：联合体成员委（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）



统一社会信用代码：

91370100163198787U

地址：济南市高新区工业南路 59 号 8 号楼

邮政编码：250101

法定代表人：朱军华

委托代理人：

电话：010-83326338

传真：010-83326337

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司

济南铁道支行

账号：37050161550100000431

中铁六局所占比例的情况说明

临汾市政府工程建设服务中心

临工务函[2021] 98 号

五一路快速通道项目各标段工程造价 情况说明

临汾市五一路快速通道工程总承包（EPC）建设项目由山西一建集团有限公司、西安市政设计研究院有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁十局集团建筑工程有限公司组成联合体共同实施，施工总承包合同额为 896230338.5 元，其中建筑安装工程费用为 877376376.5 元，设计费 18853962.0 元；根据投资估算暂将合同价分劈如下，最终以审计金额为主。

（1）山西一建集团有限公司

山西一建集团有限公司负责 K0+960-K1+960 范围内的合同额为 230303723.66 元；

（2）中铁六局集团有限公司

中铁六局集团有限公司负责 K1+960-K3+629.015 范围内的合同额为 340592624.7 元；

（3）中铁十局集团建筑工程有限公司

中铁十局集团建筑工程有限公司负责 K0+000-K0+960 范围内合同额为 306480028.14 元。

（4）西安市政设计研究院有限公司

西安市政设计研究院有限公司负责全线施工图设计、技术交底、现场技术服务合同额为 18853962.0 元

特此说明

临汾市政府工程建设服务中心
2021 年 11 月 9 日

竣工验收报告

竣工报告

工程名称	临汾市五一路快速通道工程总承包 (EPC)		项目名称	临汾市五一路快速通道工程总承包 (EPC)		建设单位	临汾市政府工程建设服务中心	
工程地点	五一东路（体育街-木材巷）		合同编号	GF-2020-0216		监理单位	山西华夏建设工程咨询有限公司	
决算总值	万元		施工许可证			施工单位	中铁六局集团有限公司	
计划开工日期	2021年7月1日	实际开工日期	2021年7月2日	计划竣工日期	2022年12月31日	实际竣工日期	2022年8月31日	
合同开工日期	2021年7月1日		实际日期	2021年7月2日		验收时间	年 月 日	
工程竣工内容	建设项目主要内容包括道路工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、给水工程、照明工程、交通工程、通信工程、电力工程、绿化工程等配套工程 桥梁部分为一条主线高架桥两条上下行匝道桥，主线桥梁起讫里程为K2+321.744-K3+270.75，全长99.006m，全宽17.5m；E、F匝道起讫里程为K2+796-K2+898.75，全长108.75m。道路红线宽：48-55m，局部路段适当加宽（平行匝道段加宽至61m）；设计速度：主路设计速度50km/h；辅路设计速度40km/h；E、F匝道设计速度30km/h。		检查验收情况		验收合格			
			现场清理情况		现场清理已干净			
			交工资料整理情况		施工资料整理齐全、完整、有效			
			工程质量验收情况		质量验收合格			
			未完工程盘点情况		无			
审核意见	建设单位		监理单位		施工单位			
	业主要负责人： 		总监理工程师： 		项目经理： 			

竣工验收证书

工程名称	临汾市五一路快速通道工程总承包 (EPC)	开工日期	年 月 日	对工程的质量评价	
施工单位	中铁六局集团有限公司	竣工日期	年 月 日	工程已按施工合同要求完成, 经验收检查, 外观项目、量测项目及资料核查均符合有关标准的规定, 全部达到合格, 同意验收。	
合同造价 (万元)	34059.26247万元	施工决算 (万元)			
验收范围及数量:			竣工验收日期 年 月 日		
临汾市五一路快速通道工程东段起讫里程K1+960-K3+629.015, 全长1669.015米, 道路红线宽48-61米。包括道路工程、桥梁工程 (人行天桥)、雨水工程、污水工程、给水工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化工程、配套工程、工程。从工程设计开始到质保期结束为止所涉及到的所有工作, 包括工程施工图设计、工程施工及相关采购、竣工验收和最终交付等所有工作。					
存在问题及处理意见: 外观检查中未发现明显的缺陷, 量测项目全部合格, 质量保证资料真实、完整。					
建设单位	临汾市五一路快速通道工程总承包 (EPC)	监理单位	山西华厦建设工程有限公司	设计单位	山西华厦建设工程有限公司
监理单位	山西华厦建设工程有限公司	勘察单位	山西华厦建设工程有限公司	施工单位	山西华厦建设工程有限公司
勘察单位	山西华厦建设工程有限公司	邀请单位	山西华厦建设工程有限公司	邀请单位	山西华厦建设工程有限公司

获奖证书



2、新泉州东站站前广场及市政配套工程项目工程总承包（EPC） 中标通知书

中 标 通 知 书

招标编号：泉台招字[2020]第8号

中铁六局集团有限公司【联合体成员：中铁第四勘察设计院集团有限公司】：

你方于2020年3月6日10:00所递交的新泉州东站站前广场及市政配套工程工程总承包（EPC）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

招标范围：新泉州东站站前广场及市政配套工程工程总承包（EPC），包括项目范围内的勘察、设计、施工图预算、施工等内容；招标人有权根据实际需要，对招标范围进行调整。

勘察主要内容包含：项目的初步勘察和详细勘察。

设计主要内容包含：站前广场工程、轨道交通预埋工程、匝道桥工程、道路工程、雨水工程、污水工程、电力电信工程、景观照明、园林绿化工程等的方案设计、初步设计、施工图设计、施工图预算，相关方案及施工图设计需经发包人同意方可实施。

施工范围：以施工图审查合格后的图纸为准。

中标价：勘察费按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格〔2002〕10号）规定的收费标准的40%计取；设计费按《工程勘察设计收费标准管理规定》（计价格〔2002〕10号）规定的收费标准的70%计取；建安工程费按泉州台商投资区财政投资评审中心审核的预算造价下浮8.00%。

总工期：本工程总承包（EPC）总工期为730个日历天（含勘察、设计、施工）；工期自合同签订之日起算。

工程质量：1. 勘察要求的质量标准：符合现行国家、行业及地方的勘察标准和规范要求，勘察成果文件应通过施工图审查机构等有关部门的审查并审查合格。2. 设计要求的质量标准：符合现行国家、行业及地方的设计、技术规范和规程、技术标准的规定，设计成果文件应通过有关专家和施工图审查机构等有关部门的审查并审查合格。3. 施工要求的质量标准：符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准。

项目负责人：韩柏青，一级市政公用工程专业注册建造师：京111060811067。

请你方在接到本通知书后的15个工作日内到泉州台商投资区城市建设发展有限公司与我方签订合同协议书，在此之前按招标文件第2章“投标人须知”第7.4.1条规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

黄友印

招标代理机构：（盖章）

法定代表人：（盖章）

陈盛

见证单位：（盖章）

年 月 日

合同协议书

新泉州东站站前广场及 市政配套工程

工程总承包合同

发 包 人1: 泉州台商投资区城市建设发展有限公司

发 包 人2: 泉州台商投资区水务投资经营有限公司

发 包 人 3: 泉州台商投资区市政管理有限责任公司

承 包 人: 中铁六局集团有限公司(联合体成员: 中铁第四勘察设计院集团有限公司)

签订日期: 2020 年 5 月 18 日

合同协议书

发包人 1：泉州台商投资区城市建设发展有限公司

发包人 2：泉州台商投资区水务投资经营有限公司

发包人 3：泉州台商投资区市政管理有限责任公司

承包人：中铁六局集团有限公司（联合体成员：中铁第四勘察设计院集团有限公司）

泉州台商投资区城市建设发展有限公司、泉州台商投资区水务投资经营有限公司、泉州台商投资区市政管理有限责任公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施新泉州东站站前广场及市政配套工程，已接受中铁六局集团有限公司（联合体成员：中铁第四勘察设计院集团有限公司）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目工程总承包（EPC）投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）合同履行中双方签署的补充协议；
- （2）合同协议书；
- （3）中标通知书；
- （4）投标函及其附录；
- （5）专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）经批准的初步设计文件及概算；
- （8）招标文件（除专用合同条款、通用合同条款外）及澄清、修改、补遗等；
- （9）投标文件；
- （10）技术标准和规范；
- （11）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：勘察设计费详见专用条款 1.1.5.1；建安工程费签约价暂定为人民币（大写）壹拾捌亿捌仟玖佰壹拾伍万柒仟玖佰元整（¥1889157900 元）【建安工程费签约价暂按建安工程设计限额 205343.25 万元*（1-8%）计】。如本项目今后因省、市、区级审计或巡查等，决算中发现财政审核的结算价有误的，双方同意按审计结果或决算的结果为最终结算价，并进行工程价款多还少补。

4. 工程范围：新泉州东站站前广场及市政配套工程工程总承包（EPC），包括项目范围内的勘察、设计、施工图预算、施工等内容；在合同实施过程中发包人有权根据实际需要，对范围进行调整。（1）勘察

主要内容包含：项目的初步勘察和详细勘察；（2）设计主要内容包含：站前广场工程、匝道桥工程、轨道交通预埋工程、道路工程、雨水工程、污水工程、电力电信工程、景观照明、园林绿化工程等的方案设计、初步设计、施工图设计、施工图预算，相关方案及施工图设计需经发包人同意方可实施；（3）涉铁专项评估一下穿新建福厦铁路工程安全风险影响评估报告编制，由承包人自行委托，费用在报价中综合考虑，发

包人不另付费，其它专题由发包人另行委托；（4）施工范围：以施工图审查合格后的图纸为准。

5. 工程质量符合的标准和要求：（1）勘察要求的质量标准：符合现行国家、行业及地方的勘察标准和规范要求，勘察成果文件应通过施工图审查机构等有关部门的审查并审查合格；（2）设计要求的质量标准：符合现行国家、行业和地方设计、技术规范和规程、技术标准的规定，设计成果文件应通过有关专家和施工图审查机构等有关部门的审查并审查合格；（3）施工要求的质量标准：符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的勘察、设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 本工程设计施工总承包总工期为自合同签订之日起 730 个日历天（含勘察、设计、施工）。

9. 本协议书一式 贰拾 份，合同双方各执 肆 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人一：泉州台商投资区城市建设发展有限公司（盖章）

住所：泉州台商投资区通港路大创商厦 7 层

邮政编码：362122

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：惠安县农村信用合作社泉州台商投资区信用社

账号：9070 3100 2001 000000 1046

电话：0595-27393171

电子邮箱：

发包人二：泉州台商投资区水务投资经营有限公司（盖章）

住所：泉州台商投资区通港路大创商厦 10 层

邮政编码：362122

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：兴业银行泉州台商投资区支行

账号：1527 3010 0100 000232

电话: 0595-27393150

传真: 0595-27393157

电子邮箱: 568110619@qq.com

发包人三: 泉州台商投资区市政管理有限责任公司 (盖章)

住所: 泉州台商投资区通港路大创商厦 9 层

邮政编码: 362122

法定代表人或其授权的代理人: 官晓红 (签字)

开户银行: 台商投资区信用社

账号: 9070310020010000000936

电话: 0595-27393161

传真: 0595-27393160

电子邮箱:

承包人联合体牵头人: 中铁六局集团有限公司 (盖章)

住所: 北京市海淀区万寿路 2 号

邮政编码: 100036

法定代表人或其授权的代理人: 李 伟 (签字)

开户银行: 交通银行股份有限公司北京定慧寺支行

账号: 110060544018001830581

电话: 010-68231632 0351-2666079

传真: 010-68231521

电子邮箱:

联合体成员: 中铁第四勘察设计院集团有限公司 (盖章)

住所: 湖北省武汉市武昌区和平大道 745 号

邮政编码: 430063

法定代表人或其授权的代理人: 何新程 (签字)

开户银行: 建设银行湖北省武汉市杨园支行

账号: 4200 1237 0360 5000 7090

电话: 027-51156164, 0591-87577950

传真: 027-86811444

电子信箱:

竣工验收报告

福建省市政基础设施工程 竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制



填 表 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。
- 5、工程竣工验收报告应附下列复印件：
 - (1) 施工许可证；
 - (2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；
 - (3) 施工单位的工程竣工报告；
 监理单位的工程质量评估报告；
 勘察、设计单位的质量检查报告；
 - (4) 规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；
 - (5) 施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表 1

工程名称	新泉州东站站前广场及市政配套工程 (第三期)	工程地址	泉州台商投资区东园镇
建设单位	泉州台商投资区城市建设发展有限公司、泉州台商投资区水务投资经营有限公司、泉州台商投资区市政管理有限责任公司		
勘察单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	结构形式	沥青道路
设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	工程规模	道路施工长度1.1km,城市次干路,标准路幅宽度30m,最大排水管径1.5m.
监理单位	福建源恒工程监理有限公司 (联合体成员:上海建科工程咨询有限公司)	开工日期	2023年7月18日
施工单位	中铁六局集团有限公司	竣工日期	2024年7月17日
施工许可证号	350599202304280102	总造价	188915.79万元
审查项目及内容		审查情况	
一、完成设计项目情况 (一) 道路工程 1、路基部位 2、结构层部位 3、路面部位 4、附属工程 (二) 桥梁工程 1、基础部位 2、下部结构 3、上部结构 4、桥面结构 5、附属工程 (三) 排水工程 1、雨水工程 2、污水工程 (四) 其他专业 1、电力、通信工程 2、照明工程 3、给水、中水工程 4、交通、绿化工程 5、其他工程		道路工程 路基部位、结构层部位、路面部位、附属工程均已按设计图纸、合同要求完成。 桥梁工程 基础部位、下部结构、上部结构、桥面结构、附属工程均已按设计图纸、合同要求完成。 排水工程 雨水工程、污水工程均已按设计图纸、合同要求完成。 其他专业 电力、通信工程、照明工程、给水、中水工程、交通、绿化工程、其他工程均已按设计图纸、合同要求完成。	

续表 1

二、完成合同约定情况 (一) 总包合同约定 (二) 分包合同约定 (三) 专业承包合同约定	已按合同约定完成
三、技术档案和施工管理资料 (一) 建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 (二) 监理技术档案和管理资料 (三) 施工技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全,有效
四、进场试验报告 (一) 主要建筑材料 (二) 构配件 (三) 设备 (四) 工程质量检测和功能性试验资料	主要建筑材料、构配件、设备进场试验报告及工程质量检测和功能性试验资料齐全,有效。
五、质量评价文件 (一) 勘察单位质量检查报告 (二) 设计单位质量检查报告 (三) 施工单位竣工报告 (四) 监理单位质量评估报告	勘察单位、设计单位质量检查报告,监理单位质量评估报告,施工单位竣工报告齐全,有效,质量评价均符合要求。
六、工程质量保修书 (一) 总、分包单位 (二) 专业承包单位	工程质量保修书已签订,保修范围内保修期限已约定。
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	建设单位已按合同约定支付工程款
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	各部门责令整改的问题已按要求全部整改反馈完毕
审查结论: 该工程已按照设计图纸及合同条款规定完成施工,无违约现象,施工过程中管理文件及竣工验收文件齐全;工程质量符合预定质量目标的要求,符合竣工验收条件。	
建设单位工程负责人:  峰 晏 燕 印  超 辽 印  利 黄 友 印 2024 年 7 月 17 日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

(一) 领导层

表 2

主 任	王图强
副主任	林金淑、林金钊、陈江杰
成 员	庄冠鸿、黎小云、兰培超、刘峰、张清峰、周军、张晋平

(二) 专业组

验收专业组	组 长	组 员
道路工程	庄冠鸿	蔡燕峰、何永江、张清峰、周军、何昆艺、潘江、韩伟
桥梁工程	刘 峰	吴培山、杨跃强、严圣皓、张晋平、徐亮、韩伟
排水工程	杨浅勇	黎小云、林琅、张慧坚、樊黎明、郭跃平
给水工程	黎小云	杨浅勇、林琅、张慧坚、樊黎明
通信工程	黎小云	林琅、杨浅勇、林平强、卢琦、郭跃平
电力工程	林 琅	赵维芳、郭龙杰、林平强、卢琦
路灯工程	陈江杰	王志攀、林平强、张晋平、韩伟
交通工程	陈江杰	王志攀、林平强、张晋平、伊凡、韩伟
绿化工程	兰培超	庄子炎、吴基强、刘峰、卢琦

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

- (一) 建设单位主持验收会议
- (二) 施工单位介绍施工情况
- (三) 监理单位介绍监理情况
- (四) 各验收专业组核查质保资料、并到现场检查
- (五) 各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录
- (六) 验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论
- (七) 其他单位发言

工程质量评定

表 3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
道路工程	合格	共核查32项,其中 符合要求32项,经鉴定 符合要求32项. 结论: 合格	应得100分 实得86分 得分率86%
桥梁工程	合格		
排水工程	合格		
给水工程	合格		
通信工程	合格		
电力工程	合格		
路灯工程	合格		
交通工程	合格		
绿化工程	合格		



单位工程评定等级: **工程质量验收质量等级: 合格**

建设单位项目负责人: **利黄印友** (公章)

2024年7月17日

执行标准	执行标准
道路工程	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008
桥梁工程	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008
给、排水工程	《给水排水管道工程施工与质量验收规范》GB50268-2008
电力、通信工程	《通信管道工程施工及验收规范》GB/T50374-2018 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB50168-2018
照明工程	《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012
交通、绿化工程	《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012 《园林绿化养护标准》CJJ/T287-2018 《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T16311-2009 《道路交通标志板及支撑件》GB/T23827-2009及相关验收规范

续表 3

验收 机构 意见	建设单位	同意验收			
	勘察单位	同意验收			
	设计单位	同意验收			
	施工单位	自评合格			
	监理单位	同意验收			
竣工验收结论： 由建设、设计、勘察、监理和施工单位组成的工程竣工验收机构，在经各方情况汇报，现场实地查验和审阅工程档案资料后一致认为： 该工程完成了设计和合同约定的各项内容，其工程质量符合设计文件、合同要求和有关法律法规的工程建设强制性标准，工程技术档案完整，观感质量一般，单位工程质量等的评定为合格。 符合竣工验收条件，同意竣工验收。					
建设单位 (公章) 项目负责人： (签字) 		勘察单位 (公章) 项目负责人： (签字) 		设计单位 (公章) 项目负责人： (签字) 	
					
监理单位 (公章) 总监理工程师： (签字) 		施工单位 (公章) 项目经理： (签字) 			
					
2024年7月17日		2024年7月17日		2024年7月17日	

福建省市政基础设施工程 竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

填 表 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。
- 5、工程竣工验收报告应附下列复印件：
 - (1) 施工许可证；
 - (2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；
 - (3) 施工单位的工程竣工报告；
 监理单位的工程质量评估报告；
 勘察、设计单位的质量检查报告；
 - (4) 规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；
 - (5) 施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表 1

工程名称	新泉州东站站前广场及市政配套工程 (第一期)		工程地址	泉州台商投资区东园镇
建设单位	泉州台商投资区城市建设发展有限公司、泉州台商投资区水务投资经营有限公司、泉州台商投资区市政管理有限公司			
勘察单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	结构形式		
设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	工程规模	市政道路总长1.83km;渡湖北路为城市主干路;最大排水管径1.5m;桥梁总长2.4km,城市互通式立交桥,分为钢箱梁、预应力箱梁结构,单跨最长60m;景观绿化造价约1300万元。	
监理单位	福建源恒工程监理有限公司 (联合体成员:上海建科工程咨询有限公司)	开工日期	2020年12月24日	
施工单位	中铁六局集团有限公司	竣工日期	2023年8月24日	
施工许可证号	3505912001070201-SX-001	总造价		
审查项目及内容		审查情况		
一、完成设计项目情况 (一) 道路工程 1、路基部位 2、结构层部位 3、路面部位 4、附属工程 (二) 桥梁工程 1、基础部位 2、下部结构 3、上部结构 4、桥面结构 5、附属工程 (三) 排水工程 1、雨水工程 2、污水工程 (四) 其他专业 1、电力、通信工程 2、照明工程 3、给水、中水工程 4、交通、绿化工程 5、其他工程		道路工程 路基部位、结构层部位、路面部位、附属工程均已按设计图纸、合同要求完成 桥梁工程 基础部位、下部结构、上部结构、桥面结构、附属工程均已按设计图纸、合同要求完成 排水工程 雨水工程、污水工程均已按设计图纸、合同要求完成 其他专业 电力、通信工程、照明工程、给水、中水工程、交通、绿化工程、其他工程均已按设计图纸、合同要求完成		

续表 1

二、完成合同约定情况 (一) 总包合同约定 (二) 分包合同约定 (三) 专业承包合同约定	已按合同约定完成
三、技术档案和施工管理资料 (一) 建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 (二) 监理技术档案和管理资料 (三) 施工技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全、有效
四、进场试验报告 (一) 主要建筑材料 (二) 构配件 (三) 设备 (四) 工程质量检测和功能性试验资料	主要建筑材料、构配件、设备进场试验报告及工程质量检测和功能性试验资料齐全、有效
五、质量评价文件 (一) 勘察单位质量检查报告 (二) 设计单位质量检查报告 (三) 施工单位竣工报告 (四) 监理单位质量评估报告	勘察单位、设计单位质量检查报告、监理单位质量评估报告、施工单位竣工报告齐全、有效,质量评价均符合要求
六、工程质量保修书 (一) 总、分包单位 (二) 专业承包单位	工程质量保修书已签订,保修范围及保修期限已约定
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	建设单位已按合同约定支付工程款
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	各部门责令整改的问题已按要求全部整改反馈完毕
审查结论: 该工程已按照设计图纸及合同条款规定完成施工,无违约现象; 施工过程管理文件及竣工验收文件齐全,工程质量符合预定质量目标的要求,符合竣工验收条件。 建设单位工程负责人:	
年 月 日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

(一) 领导层

表 2

主 任	王图强
副主任	林金淑、黄志钦、陈仁杰
成 员	庄冠鸿、黎小云、兰培超、刘峰、张清峰、周革、张晋平

(二) 专业组

验收专业组	组 长	组 员
道路工程	庄冠鸿	蔡燕峰、庄雄洪、张清峰、何永江、孔志鹏、张晋平
桥梁工程	刘 峰	张鑫平、庄雄洪、周革、李计强、黄景东、杨庆强、黄嘉川
排水工程	林金钊	杨茂勇、张慧坚、丁光文、黄瑞通、肖晓松、樊黎明
给水工程	陈燕忠	杨茂勇、张慧坚、丁光文、黄瑞通、孔志鹏、樊黎明
通信工程	林 琅	曾少萍、张慧坚、严圣皓、张和棋、肖晓松、卢琦
电力工程	黎小云	曾少萍、张慧坚、严圣皓、张和棋、孔志鹏、卢琦
路灯工程	陈仁杰	庄雄洪、薛永山、梁龙标、张和棋、何永江、张晋平
交通工程	陈仁杰	庄雄洪、薛永山、梁龙标、王禹轩、黄景东、张晋平
绿化工程	兰培超	庄子炎、郭成林、严圣皓、黄景东、卢琦、韩伟

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

- (一) 建设单位主持验收会议
- (二) 施工单位介绍施工情况
- (三) 监理单位介绍监理情况
- (四) 各验收专业组核查质保资料、并到现场检查
- (五) 各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录
- (六) 验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论
- (七) 其他单位发言

工程质量评定

表 3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
道路工程	合格	共核查 27 项, 其中 符合要求 27 项, 经鉴定 符合要求 27 项。 结论: 合格	应得 100 分 实得 分 得分率 %
桥梁工程	合格		
排水工程	合格		
给水工程	合格		
通信工程	合格		
电力工程	合格		
路灯工程	合格		
交通工程	合格		
绿化工程	合格		
单位工程评定等级: 合格    年 月 日			
执行标准	道路工程	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008	
	桥梁工程	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ-2008	
	给、排水工程	《给水排水管道工程施工与质量验收规范》GB50268-2008	
	电力、通信工程	《通信管道工程施工及验收规范》GB/T 50374-2018 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2016	
	照明工程	《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012	
	交通、绿化工程	《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012 《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009 《道路交通标志和支撑件》GB/T 23827-2009 及相关验收规范	

续表 3




验收 机构 意见	建设单位	同意验收
	勘察单位	同意验收
	设计单位	同意验收
	施工单位	自评合格
	监理单位	同意验收

竣工验收结论:

由建设、设计、勘察、监理和施工单位组成的工程竣工验收机构,在听过各方情况汇报、现场实地查验和审阅工程档案资料后一致认为:

该工程完成了设计和合同约定的各项内容,其工程质量符合设计文件、合同要求和有关法律法规及工程建设强制性标准;工程技术档案完整,观感质量一般,单位工程质量等级评定为合格。

符合竣工条件、同意竣工验收。

 建设单位 (公章) 项目负责人: (签字)	 勘察单位 (公章) 项目负责人: (签字)	 设计单位 (公章) 项目负责人: (签字)	 监理单位 (公章) 总监理工程师: (签字)	 施工单位 (公章) 项目经理: (签字)
 年 月 日	 年 月 日	 年 月 日	 年 月 日	 年 月 日

附件1:

福建省房屋建筑工程 竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制



填写说明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、勘察、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后为有效。
- 5、工程竣工验收报告应附下列复印件：
 - (1) 施工许可证；
 - (2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；
 - (3) 施工单位的工程竣工报告；
 监理单位的工程质量评估报告；
 勘察、设计单位的质量检查报告；
 - (4) 规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件；
 - (5) 施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表1

工程名称	新泉州东站站前广场及市政配套工程 (第二期)	工程地址	泉州市台商投资区东园镇		
建设单位	泉州台商投资区城市建设发展有限公司	结构形式	框架		
勘察单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	层 数	地下2层、地上4层	幢数	6
设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	工程规模	站前广场总建筑面积230377.41m²，地上四层、地下两层，其中地下部分187869.34m²，地上部分42508.07m²；站前广场绿化风景园林工程总投资约4800万元。		
监理单位	福建源恒工程监理有限公司（联合体成员：上海建科工程咨询有限公司）	开工日期	2021年6月12日		
施工单位	中铁六局集团有限公司	竣工日期	2024年4月2日		
施工许可证号	3505912001070201-SX-002	总造价(万元)	188915.79		
审 查 项 目 及 内 容		审 查 情 况			
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程、防水工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电力安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程		1、基础、主体、室内外装饰工程、防水工程已按设计完成。 2、给排水工程、消防工程已按设计完成。 3、建筑电力安装工程已按设计完成。 4、通风与空调工程已按设计完成。 5、电梯、电扶梯安装工程已按设计完成。 6、室外工程已按设计完成。			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		均按合同约定履行			
三、技术档案和施工管理材料 1、建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料		技术档案和施工管理资料齐全完整、有效。			

续表1:

四、进场试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备 4、主要使用功能检验报告	各项主要建筑材料、设备进场试验报告及主要使用功能检验报告齐全、有效。
五、质量评价文件 1、勘察单位质量检查报告 2、设计单位质量检查报告 3、施工单位竣工报告 4、监理单位质量评估报告	质量评价、质量检查报告齐全。
六、工程质量保修书 1、总、分包单位 2、专业承包单位	工程质量保修书已签定。
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	工程款已按合同约定支付。
八、住宅工程是否已进行分户验收并验收合格，建设单位是否已按户出具《住宅工程质量分户验收表》	/
九、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	已全部按责令整改单要求整改完毕
审查结论: 经对本工程项目施工审查，工程均按照图纸设计要求及合同约定进行施工，质保资料齐全，技术档案和施工管理资料齐全完整、有效，各方质量评价文件齐全，评价明确，工程质量保修书已按要求填写，文件齐全，该工程施工情况良好，符合设计及施工规范要求，具备竣工验收条件，同意组织验收。 建设单位工程负责人:  2019年4月2日	

竣工验收组织实施情况

表2

一、验收机构

(一) 领导层

主 任	王图强	副 主 任	林金淑
成 员	杨跃强、周革、杨芳龙、刘峰、韩柏青、叶志雄、朱毅、朱荣钊、张德康、兰培超、陈球叶		

(二) 专业组

验收专业组	组 长	组 员
建筑工程	杨跃强	周革、杨芳龙、韩柏青、叶志雄、陈球叶、孟俊杰
给排水、燃气工程	刘 峰	张慧坚、朱毅、余子全
建筑电气、智能化安装工程	张德康	陈俊杰、朱荣钊、马建普
通风与空调工程	张德康	张慧坚、朱毅、余子全
电梯安装工程		
室外工程	兰培超	高根妙、姚亚晓、林小煌、吴述发

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

(一) 建设单位主持验收会议

(二) 施工单位介绍施工情况

(三) 监理单位介绍监理情况

(四) 各验收专业组核查质保资料，并到现场检查

(五) 各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录

(六) 验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

(七) 其他单位发言

工程质量评定

表3

分部工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
地基与基础	合格	共核查 34 项, 其中 符合要求 34 项, 经鉴定符合要求 0 项 结论: 合格	应得 86 分 实得 86 分 得分率 86 % 
主体结构	合格		
建筑装饰装修	合格		
屋面	合格		
建筑给水排水及供暖	合格		
通风与空调	合格		
建筑电气	合格		
智能建筑	合格		
建筑节能	合格		
电梯	合格		
单位工程评定等级		  (公章) 建设单位负责人  2017 年 6 月 2 日	
执行标准情况	建筑工程	符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)	
	给排水、燃气工程	符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)	
	电气、智能化工程	符合《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015》、《智能建筑工程施工规范GB50606-2010》	
	通风、空调工程	符合《通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2016》	
	电梯工程	符合《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002	
验收机构意见	建设单位	符合设计及合同要求, 同意验收。	
	勘察单位	符合设计要求, 同意验收。	
	设计单位	符合设计要求, 同意验收。	
	施工单位	符合图纸设计及国家规范要求, 同意验收。	
	监理单位	符合设计及合同要求, 施工过程严格执行国家规范要求, 同意验收。	

续表3:

竣工验收结论:

本工程由建设单位组织设计单位、施工单位、监理单位等各参建责任主体单位共同对本工程现场进行工程质量验收评定及内业资料的核查:经验收组认真、严格的实地检查后,一致认为本工程已完成设计图纸内各项施工任务和及施工合同内的各项工作。未见违反建设工程管理条例及工程建设强制性条文规定,工程施工符合图纸设计要求及施工质量验收规范规定,安全和使用功能检验检测合格,质控资料完整有效,各项手续齐备,验收组织程序真实有效,经验收组共同评定本工程质量为合格等级,同意竣工验收。

建设单位 (签章)	勘察单位 (签章)	设计单位 (签章)	监理单位 (签章)	施工单位 (签章)
项目负责人: (签字)	项目负责人: (签字)	项目负责人: (签字)	总监理工程师: (签字)	项目经理: (签字)
2024年4月2日	年月日	2024年4月2日	2024年4月2日	2024年4月2日

福建省市政基础设施工程 竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

填 表 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。
- 5、工程竣工验收报告应附下列复印件：
 - (1) 施工许可证；
 - (2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；
 - (3) 施工单位的工程竣工报告；
 监理单位的工程质量评估报告；
 勘察、设计单位的质量检查报告；
 - (4) 规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；
 - (5) 施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表 1

工程名称	新泉州东站站前广场及市政配套工程（第四期）	工程地址	泉州台商投资区东园镇
建设单位	泉州台商投资区城市建设发展有限公司		
勘察单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	结构形式	
设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司	工程规模	地铁 2 号线设于站前广场下，地下一层为站厅层，地下二层设置车库，地下三层为岛式站台层，地铁车站长度为 634.74m；预留建设双线分离式地铁隧道，长度 70.764m，隧道断面面积 102 平方米。
监理单位	福建源恒工程监理有限公司（联合体成员：上海建科工程咨询有限公司）	开工日期	2021 年 11 月 13 日
施工单位	中铁六局集团有限公司	竣工日期	2023 年 12 月 27 日
施工许可证号	3505912001070201-SX-003	总造价	
审查项目及内容		审查情况	
一、完成设计项目情况		地铁 1-64 轴交 A-D 轴及连接通道	
(一) 地铁区间 1-64 轴交 A-D 轴及连接通道		1、地基与基础分部已按合同要求完成	
1、地基与基础分部工程		2、主体结构分部工程已按合同要求完成	
2、主体结构分部工程		3、建筑电气分部工程已按合同要求完成	
3、建筑电气分部工程		4、给排水和采暖分部已按合同要求完成	
4、给排水和采暖分部		隧道工程	
(二) 隧道工程		1、开挖与支护工程已按合同要求完成	
1、开挖与支护工程		2、钢筋混凝土结构工程已按合同要求完成	
2、钢筋混凝土结构工程			

续表 1

二、完成合同约定情况 (一) 总包合同约定 (二) 分包合同约定 (三) 专业承包合同约定	已按合同约定完成。
三、技术档案和施工管理资料 (一) 建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 (二) 施工技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全、有效。
四、进场试验报告 (一) 主要建筑材料 (二) 构配件 (三) 设备 (四) 工程质量检测和功能性试验资料	主要建筑材料、构配件、设备进场试验报告及工程质量检测和功能性试验资料齐全、有效。
五、质量评价文件 (一) 勘察单位质量检查报告 (二) 设计单位质量检查报告 (三) 施工单位竣工报告 (四) 监理单位质量评估报告	勘察单位、设计单位质量检查报告、监理单位质量评估报告、施工单位竣工报告齐全、有效，质量评价均符合要求。
六、工程质量保修书 (一) 总、分包单位 (二) 专业承包单位	工程质量保修书已签订，保修范围及保修期限已约定。
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	建设单位已按合同约定支付工程款。
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	各部门责令整改的问题已按要求全部整改反馈完毕。
审查结论： 该工程严格按照设计图纸及合同条款规定完成施工，无违约现象，施工过程中管理文件及竣工文件齐全，工程质量符合预定质量目标要求，符合竣工验收条件。	
建设单位工程负责人： 年 月 日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构 (一) 领导层

表 2

主 任	王图强
副主任	林金叔
成 员	庄冠鸿、杨跃强、刘峰、张清峰、周革、张晋平、陈球叶

(二) 专业组

验收专业组	组 长	组 员
地铁区间 1-64 轴交 A-D 轴及连接通道	杨跃强	吴培山、刘峰、张清峰、周革、张晋平、陈球叶
隧道工程	庄冠鸿	郑东先、张清峰、周革、张晋平、郭伟劲、林贵福
/	/	/

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序



- (一) 建设单位主持验收会议
- (二) 施工单位介绍施工情况
- (三) 监理单位介绍监理情况
- (四) 各验收专业组核查质保资料、并到现场检查
- (五) 各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录
- (六) 验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论
- (七) 其他单位发言

工程质量评定

表 3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
地铁区间 1-64 轴交 A-D 轴及连接通道	合格		
隧道工程	合格	共核查 15 项, 其中符合要求 15 项, 经鉴定符合要求 15 项; 结论: 合格	应得 100 分 实得 83 分 得分率 83%
单位工程评定等级: 工程质量验收质量等级: 合格  建设单位工程负责人: 年 月 日			
执行标准	地铁区间 1-64 轴交 A-D 轴及连接通道	《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015》	
	隧道工程	《地下铁道工程施工质量验收标准 GB/T50299-2018》 《混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015》	

续表 3

验收机构意见	建设单位	同意验收			
	勘察单位	同意验收			
	设计单位	同意验收			
	施工单位	同意验收			
	监理单位	同意验收			
竣工验收结论： 由建设、设计、勘察、监理和施工单位组成的工程竣工验收机构，在经过各方情况汇报，现场实地查验和审阅工程档案资料后一致认为： 该工程完成了设计和合同约定的各项内容，其工程质量符合设计文件、合同要求和有关法律法规以及工程建设强制性标准；工程技术档案完整，观感质量一般，单位工程质量等评定为合格。 符合竣工条件，同意竣工验收。					
 建设单位 (公章) 项目负责人： (签字)		 勘察单位 (公章) 项目负责人： (签字)		 设计单位 (公章) 项目负责人： (签字)	
 监理单位 (公章) 总监理工程师： (签字)		 施工单位 (公章) 项目经理： (签字)			
 年 月 日		 年 月 日		 年 月 日	

3、广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目、湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目（EPC）设计施工总承包

中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2020]第[04346]号

(主)中铁六局集团有限公司(成)中铁工程设计咨询集团有限公司:


经评标委员会推荐,招标人确定你单位为广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目、湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目(EPC)设计施工总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标下浮率为0.5%。


其中:


项目负责人姓名:聂海岩

招标人(盖章):  2020年8月24日

法定代表人或其委托代理签章:  2020年8月24日

招标代理机构(盖章):  2020年8月24日

法定代表人或其委托代理签章:  2020年8月24日

广州公共资源交易中心
见证(盖章)
 2020年8月24日(2)
交易确认章

 广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE TRADING CENTER
Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



合同协议书

正本

广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目、湛江奋勇高新区
军民融合示范基地基础设施建设一期项目（EPC）设计施工
总承包

设计施工总承包合同

发 包 人（甲 方）：广东惠侨投资开发有限公司

承包人（联合体主办方）：中 铁 六 局 集 团 有 限 公 司

（联合体成员）：中铁工程设计咨询集团有限公司

合同协议书

广东惠侨投资开发有限公司(项目法人名称,以下简称“发包人”)为建设广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目、湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目,已接受中铁六局集团有限公司(联合体主办方)、中铁工程设计咨询集团有限公司(联合体成员)联合体(施工单位名称,以下简称“承包人”)对广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目、湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目(EPC)设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

一、本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 协议书(包括补充协议);
- (2) 中标通知书;
- (3) 投标报价书;
- (4) 投标文件;
- (5) 专用合同条款;
- (6) 通用合同条款
- (7) 招标文件;
- (8) 发包人要求:图纸及各阶段提供的设计资料;施工图预算价;投标阶段价格清单;投标函及投标函附录;承包人建议书;
- (9) 经双方确认进入合同的其他文件。

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

二、工程概况:

1. 广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目:本工程建设内容共计 7 条城市次干路和一条临时连接线;7 条城市次干路分别为规划的裕廊北路、吉隆坡南路、清迈南路、文莱北路、曼谷南路、清迈中路和东盟北路,路线长度分别为:0.309km、0.605km、0.802km、0.33km、1.075km、0.696km 和 1.02km,路线总长约 4.836km,本次实施道路宽度除桥梁外均按 26m;采用沥青混凝土路面结构。另外为了路网闭合,增设巴厘南路和东盟北路连接线工程,全长约 1.1km,采用水泥混凝土路面结构,参照城市支路标准实施。工程实施内容包括:道路、桥涵、给排水、交通安全设施(道路标志标线)、照明和绿化工程等,以规划部门审批的方案内容为准。

2. 湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目：本项目位于湛江市奋勇高新区，建设范围包含新建巴厘路（包含巴厘北路和巴厘南路）、下龙湾路、万象中路、达沃西路和万隆西路共 5 条道路，以及与万象中路相接的 X706 临时改路工程。5 条新建道路路线总长约 5.601km，其中巴厘路、下龙湾路、达沃西路和万隆西路路基宽度均为 26m，万象中路路基宽度 34m，机动车道和非机动车道采用沥青混凝土路面，两侧人行道面砖采用高压透水砖；沿线处理交叉口 5 处。X706 临时改路工程：路基宽度按 14.5m 进行改线扩建，路线长度约 0.464km。巴厘路（包含巴厘北路和巴厘南路）、下龙湾路、达沃西路和万隆西路为城市次干路，设计速度 40km/h，双向四车道。X706 改路工程为县道。万象中路远期规划为城市主干路，近期按城市次干路进行设计。巴厘路（包含巴厘北路和巴厘南路）、下龙湾路、万象中路、达沃西路和万隆西路根据规划线型进行布线，五条新建道路线型无交点，竖曲线最小半径 5000m，最小竖曲线长度 38.22m，最小坡长 115.25m；X706 改路工程为三级公路，设计速度 30km/h，平面设置一个交点，半径 100m，缓和曲线长度 35m，曲线长度 117.35，竖曲线最小半径 4500m，最小竖曲线长度 92.327m，最下坡长 96.585m。建设内容含道路、管线综合、给水、排水、交通、照明、绿化工程等，以规划部门审批的方案内容为准。

三、**承包范围：**完成本标段的施工图阶段设计（含施工图预算）、相应建筑安装工程的施工和材料设备采购、试运行及验收服务等内容。

四、**签约合同价：**

（一）**签约合同价：**人民币（大写）伍亿零捌佰陆拾肆万零玖佰贰拾叁元柒角贰分（¥508,640,923.72 元），下浮率 0.50%，其中：广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目签约合同价人民币（大写）贰亿贰仟贰佰捌拾柒万伍仟伍佰零叁元贰角肆分（¥222,875,503.24 元）、湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目签约合同价人民币（大写）贰亿捌仟伍佰柒拾万伍仟肆佰贰拾元肆角捌分（¥285,765,420.48 元）。

1. 设计费：人民币（大写）柒佰柒拾陆万柒仟伍佰贰拾柒元陆角贰分（¥7,767,527.62 元），下浮率 0.54%，其中：广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目设计费人民币（大写）叁佰肆拾万伍仟叁佰壹拾壹元肆角捌分（¥3,405,311.48 元）、湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目设计费人民币（大写）肆佰叁拾陆万贰仟贰佰壹拾陆元壹角肆分（¥4,362,216.14 元）；

2. 建安工程费：人民币（大写）肆亿陆仟陆佰贰拾肆万柒仟零玖拾陆元壹角整

(¥466,247,096.10 元), 下浮率 0.54%, 其中: 广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目建安工程费人民币(大写)贰亿零肆拾捌万柒仟零玖拾壹元柒角陆分(¥200,487,091.76 元)、湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目建安工程费人民币(大写)贰亿陆仟伍佰柒拾陆万零肆元叁角肆分(¥265,760,004.34 元);

3. 预备费: 人民币(大写)叁仟肆佰陆拾贰万陆仟叁佰元整(¥34,626,300.00 元), 下浮率 0%, 其中: 广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目预备费人民币(大写)壹仟捌佰玖拾捌万叁仟壹佰元整(¥18,983,100.00 元)、湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目预备费人民币(大写)壹仟伍佰陆拾肆万叁仟贰佰元整(¥15,643,200.00 元)

(二) 合同工期: 总工期 720 日历天, 承包人设计工期为 60 日历天, 自合同签订之日算起; 施工总工期为 720 日历天, 自发包人或监理单位发出开工手续之日算起。

五、工程建设

1. 本工程采取分期分批建设, 并分期分批进行结算, 最终以财政部门审定的结算价为准。具体分期分批建设及阶段性结算计划, 由发包人确定, 承包人必须无条件服从, 如本合同其他条款与本条款有冲突的地方, 以本条款约定为准。

第一阶段施工约定: 本阶段工程施工金额¥130,000,000 元, 大写壹亿叁仟元整(含建安工程费、设计费、监理费、造价全过程费用、地上附着物、青苗补偿等)(发包人可根据实际资金情况调整该额度), 本阶段具体施工范围及内容在项目开工前由双方共同确定, 承包人不得擅自实施或更改。本阶段工程完工后, 工程暂停施工, 工期按合同约定顺延, 发包人不予任何补偿。该阶段已完成的工程经验收合格后, 双方按照合同约定进行本施工阶段结算。

后续阶段的施工, 由发包人根据实际资金情况确定。如需复工, 发包人应提前 15 天通知承包人, 并明确该复工阶段的施工金额及内容, 承包人收到复工通知后必须 15 天内组织人工、机械设备等进场复工, 因分期分阶段施工造成机械设备、人工等退场及进场费用(退场及进场在 2 次以内)的由承包人承担, 发包人不予补偿; 退场及进场超过 2 次以上的, 退场及进场费用由双方协商解决。

2. 工程建设涉及的施工图预算编制费、竣工图编制费、各种评审费用等费用, 由承包人承担并支付, 不纳入工程结算。安全防护、文明施工措施费按相关规定及定额核定。

3. 项目施工期间, 如因相应单位工程或相应路段尚未全部具备施工条件, 发包人

有权单方决定暂缓相关单位工程或相关路段的施工，发包人不构成违约，承包人必须无条件服从并依照合同协议书、专用条款履行有关义务。涉及施工工期延误问题，施工工期可据实顺延，但不作任何补（赔）偿。

六、承包人项目经理：聂海岩；项目设计负责人：孔骁；

七、质量要求：工程质量符合的标准和要求 1. 设计：符合《建设工程质量管理条例》2. 施工：工程质量标准为合格。

八、承包人承诺：承包人向发包人承诺已阅读理解并接受本合同所有条款，承包人承诺按合同约定承担工程的设计、施工、竣工及工程质量缺陷修复，履行本合同约定全部义务。

九、发包人承诺：发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

十、安全管理目标：全面履行项目建设管理中的安全生产管理职责，避免发生重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故。承包人对项目安全生产负有总责，并承担发生安全事故相应的法律和经济责任。

十一、主体变更事项

本项目进行过程中，如发生投资主体变更情况，承包人必须承认主体变更事实并配合变更后的主体方进行本项目余下工作，须重新签到合同，原合同条款权利和义务不变。

十二、合法性要求

双方确认本项目全过程必须严格依照法律、行政法规、地方性法规、规章和规范性文件等相关操作，本合同的有关内容如与相关规定不一致的，以法律、相关规定为准。

十三、其他事项

项目施工期间，若发包人后续建设资金不足，无法按期支付工程进度款造成工程暂缓施工时，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停指示，工程停工单次满 2 年，本合同自动终止，发包人不构成违约，承包人不得以任何形式要求补（赔）偿，发包人和承包人按照合同约定办理项目结算手续。

十四、本协议书正本叁份，副本壹拾伍份，合同双方各执正本壹份，副本伍份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

十六、合同生效

订立合同时间：2020 年 9 月 26 日，订立合同地点：湛江奋勇高新区。合同双方

约定本合同自双方签字、盖章后生效。

(本页无正文)

发包人：广东惠侨投资开发有限公司(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

承包人联合体主办方：中铁六局集团有限公司(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

联合体成员：中铁工程设计咨询集团有限公司(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

2020年8月26日

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 广东奇勇东盟产业微路网扩展建设项目
(东盟北路、曼谷南路、吉隆坡南路)

建设单位(公章)： 广东惠侨投资开发有限公司

竣工验收日期： 2023 年 7 月 28 日

发出日期： 年 月 日

市政基础设施工程



填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目 (东盟北路、曼谷南路、吉隆坡南路)	工程地点	广东奋勇东盟产业园
工程规模(建筑面积、道路桥梁长度等)	道路建设总长度2.697km	工程造价 (万元)	22287.5503
结构类型	沥青混凝土路面	开工日期	2020年12月1日
施工许可证号	440891202305250102	竣工日期	2023年7月28日
监督单位	湛江奋勇高新区规划与开发建设局	监督登记号	FY2023052501
建设单位	广东惠侨投资开发有限公司	总施工单位	中铁六局集团有限公司
勘察单位	包钢勘察测绘研究院	施工单位(土建)	中铁六局集团有限公司
设计单位	中铁工程设计咨询集团有限公司	施工单位(设备安装)	中铁六局集团有限公司
监理单位	广州龙达工程管理有限公司	工程检测单位	湛江市港嘉工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位) 工程质量竣工验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	440891202305250102		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过		
工程质量情况	土建		
	设备安装		
工程未达到使用功能的部位(范围)			
参加验收单位意见	 项目负责人:  2023年7月25日		
	 总监理工程师: (执业资格证件)  2023年7月28日		
	 项目负责人: (执业资格证件)  2023年7月24日		
	分包单位	设计单位	勘察单位
	 项目负责人: (执业资格证件)  2023年7月29日	 项目负责人: (执业资格证件)  2023年7月29日	

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目
(裕廊北路、清迈南路、文莱北路)

建设单位(公章): 广东惠侨投资开发有限公司

竣工验收日期: 2023 年 7 月 28 日

发出日期: _____ 年 月 日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目 (裕廊北路、清迈南路、文莱北路)	工程地点	广东奋勇东盟产业园
工程规模(建筑面积、道路桥梁长度等)	道路建设总长度1.06km	工程造价 (万元)	22287.5503
结构类型	沥青混凝土路面	开工日期	2020年10月9日
施工许可证号	440891202103080102	竣工日期	2023年7月24日
监督单位	湛江奋勇高新区规划与开发建设局	监督登记号	FY2021030801
建设单位	广东惠侨投资开发有限公司	总施工单位	中铁六局集团有限公司
勘察单位	包钢勘察测绘研究院	施工单位(土建)	中铁六局集团有限公司
设计单位	中铁工程设计咨询集团有限公司	施工单位(设备安装)	中铁六局集团有限公司
监理单位	广州龙达工程管理有限公司	工程检测单位	湛江市港嘉工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位) 工程质量竣工验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	440891202103080102		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过		
工程质量情况	土建		
	设备安装		
工程未达到使用功能的部位(范围)			
参加验收单位意见	建设单位 (公章) 项目负责人: 林... 2023年7月25日	监理单位 (公章) 总监理工程师: (执业资格签章) 2023年7月24日	施工单位 (公章) 项目负责人: 夏... 2023年7月24日
	分包单位	设计单位 (公章) 项目负责人: (执业资格签章) 2023年7月24日	勘察单位 (公章) 项目负责人: (执业资格签章) 2023年7月24日
	年 月 日		

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

姓名: 赵军

注册号: 1500766-AY007

有效期: 至2024年12月

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目

建设单位(公章): 广东惠侨投资开发有限公司

竣工验收日期: 2023年11月28日

发出日期: 2023年11月28日

市政基础设施工程




填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	湛江奋勇高新区军民融合示范基地基础设施建设一期项目	工程地点	湛江市奋勇高新区军民结合产业园
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	3条新建道路总长3280.825m	工程造价（万元）	
结构类型	沥青混凝土道路	开工日期	2021年8月1日
施工许可证号	440891202305100102	竣工日期	2023年1月28日
监督单位	湛江奋勇高新区规划与开发建设局	监督登记号	FY2023051002
建设单位	广东惠侨投资开发有限公司	总施工单位	中铁六局集团有限公司
勘察单位	广州市城建规划设计院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中铁工程设计咨询集团有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广州龙达工程管理有限公司	工程检测单位	广东金港工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2023年9月24日		合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	440891202305100102		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过		
工程质量情况	土建	/	
	设备安装	/	
工程未达使用功能的部位(范围)	 		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2023年11月28日	 (公章) 总监理工程师: (执业资格印章)  2023年11月28日	 (公章) 项目负责人: (执业资格印章)  2023年11月28日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	 (公章) 项目负责人: (执业资格印章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人: (执业资格印章)  2023年11月28日	 (公章) 项目负责人: (执业资格印章)  2023年11月28日

4、淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目
中标通知书

中标通知书 项目编号：2018CG2340SP20-8-15-0065 中航六局集团有限公司（联合体牵头方） 中国能源建设集团安徽有限公司（联合体成员）： 你单位在淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目公开招标中，经评审小组综合评定，确定你单位为中标单位。 项目地点：安徽省淮南市 中标(成交)内容： 1. 合作期限：合作期15年。其中建设期2年，运营期为13年。 2. 服务要求： (1) 项目建设范围 本项目总投资约173899.25万元，建设内容包括中兴路、南纬七路和综合管廊三部分。 1) 中兴路：分南、北两段，中兴北路（国东路-南纬山路）全长6.24公里（扣除铁路段），中兴南路（南纬山路-南纬七路）全长约3.77公里，施工内容主要包括道路、桥涵、雨污水、交通、绿化、照明工程。 2) 南纬七路：南纬七路全长5.977公里，施工内容包括道路、桥涵、雨污水、交通、绿化、照明工程。 3) 地下综合管廊工程：中兴路和南纬七路综合管廊全长6.16公里，施工内容包括土建（控制中心和人员出入口）、市政、安装工程。 (2) 项目运营及维护内容 运营维护内容主要包括道路（含路基、路面、边坡、人行通道等）、桥涵（含桥墩）、地下综合管廊、雨污水管、绿化、附属设施（不含交通标志、信号灯）的日常运营维护和管理及保洁及应急处理（包括除雪、抢险等）等。入册管段由本入册企业自行负责养护、维修等。 3. 相关价格： (1) 建安费工程费：119317822.88元； (2) 年度折现率：1.2倍*五年期以上贷款基准利率（4.9%），即5.88%； (3) 年绩效服务费：10056600.00元 4. 回款计划：政府付费	2019年 1 月 7 日 采购人（盖章） 2019年 1 月 7 日 代理机构（盖章） 说明 1、《中标通知书》是建设工程合同签订的法律依据，其内容不得变更，应作为合同的组成部分。 2、中标单位不得转让、出卖《中标通知书》。
--	---

草 案

淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目

合
同

淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目合同

本 PPP 项目合同（下称“本合同”）根据财政部《财政部关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知》中的《PPP 项目合同指南（试行）》、国家发改委《政府和社会资本合作项目通用合同指南(2014 版)》，结合项目实际情况于 年 月 日由以下双方订立：

(1) 甲 方：淮南市中心工程建设工程管理局

法定代表人：何友法

(2) 乙 方¹：中铁六局集团有限公司

法定代表人：季志华

乙 方²：中国核工业华兴建设有限公司

法定代表人：陈宝智

第一章 总则

第一条 定义和解释

1.1 定义

以下定义适用于本合同：

本合同	指由甲方与乙方签署的项目合同，包括全部附件，以及日后可能签署的任何项目合同之补充修改合同和附件，每一部分都应视为本合同的一部分。
本项目	淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目估算总投资约 173899.25 万元，其中建筑安装工程费 123008.13 万元，工程建设其他费 41741.4 万元，预备费 2302.92 万元，建设期利息 6846.8 万元。 合作内容包括项目投融资、建设、运营管理及维护、移交等，具体包括中兴路、南纬七路和综合管廊三部分（具体以批复为准）： 1) 中兴路：北起国庆路，南至南纬七路，以南沿山路为界，分南、北两段。中兴北路（国庆路-南沿山路）全长 6.24 公里（扣除铁路段），起止桩号为 K0+010.436-AK2+700, AK3+280-K6+826.629，全线设置一座小桥（1*13m）和两座箱涵，分别为 K0+188.952 小桥、K1+930-K1+990 段朝阳路交口箱涵和 K6+350 箱涵；施工内容包括道路、桥涵、雨污水、交通、绿化、照明工程。中兴南路（南沿山路-南纬七路）全长约 3.77 公里，起止桩号为 K0+013.682-K3+780.856，全线设置两座桥梁，分别为 K1+163.524 小桥（1*16m）和 K3+587.800 中桥（3*13m），施工内容主要包括道路、桥涵、雨污水、交通、绿化、照明工程。 2) 南纬七路：南纬七路全长 5.977 公里，起止桩号为 K0+044.52-K6+021.15，全线设置三座中桥和两座箱涵，中桥均采用 1*20m 简支 T 梁，桩号分别为 K0+261、K2+632.5 和 K4+979.5，箱涵分别为 K2+600 雨水箱涵和 K2+816 盖板涵，施工内容包括

淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目合同

	道路、桥梁、雨污水、交通、绿化、照明工程。 3) 地下综合管廊工程：中兴路和南纬七路综合管廊全长 6.36 公里，中兴南路管廊起止桩号为 AK0+020-AK3+695，南纬七路管廊分为两段，起止桩号 BK0+385-BK1+355、BK1+680-BK3+395 段，施工内容包括土建（控制中心和人员出入口）、市政、安装工程。
甲方	指政府方授权实施机构。
乙方	甲方通过公开招标方式选定的本项目的社会资本方。
项目公司	指淮南建设发展控股（集团）有限公司与本项目社会资本方共同出资，为实施投资、建设、运营管理及维护、移交本项目而设立的独立企业法人。
经营权	指政府授予项目公司在一定时间和范围内对某项公用产品或服务进行独占性经营的权利。本合同所指经营权是指投资、建设、运营管理及维护、移交项目资产的权利以及获取由此产生的收益的权利。
合作期	合作期为 2+13 年（建设期+运营期），其中建设期不超过 2 年。 建设期：从监理工程师发出开工令之日起至项目工程竣工验收合格日或经甲乙双方确认的实际交付使用日止（以先发生者为准）。 运营期：从工程竣工验收合格日或经甲乙双方确认的实际交付使用日（以先发生者为准）后一日起至合作期届满日。
项目文件	指包括但不限于下列文件： (1) 本合同及附件； (2) 融资文件；

淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目合同

	(3) 与项目有关的其它文件。
项目设施	指与项目相关的设施。
项目资产	指与项目有关的所有资产，包括但不限于： (a) 项目主体工程等及其他附属设施； (b) 本项目项下乙方拥有所有权的知识产权； (c) 项目文件项下的合同性权利； (d) 运维记录、质量保证计划等文件。
项目运维	指对本项目设施进行运营和维护管理。
法律	指所有适用的中华人民共和国法律、法规、规章、司法解释、政府部门颁布的标准、规范或其他适用的强制性要求、有法律约束力的规范性文件等。
法律变更	指在本合同生效日后颁布、修订、废止或重新解释的任何适用法律导致甲方或乙方在本合同项下的权利义务发生实质性变化。
政府行为	指甲方的任何上级政府部门（省级及以上）的国有化、征收及征用等行为。
批准	指为了使乙方能够履行其在本合同项下的义务和行使其在本合同项下的权利，乙方必须或希望从政府机关依法获得的为项目的投资、建设、运营管理及维护、移交所需要的任何许可、执照、同意、授权、免除或批准。
贷款人	指融资文件中的贷款人或项目资金提供人。
融资文件	指与项目或其任何一部分的建设和运维相关的贷款合同、担保合

淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目合同

	同、保函和其他文件，但不包括股东作出的出资或出资承诺、建设期履约保函、运营维护履约保函以及移交维修履约保函。
建设期履约保函	指乙方按照第 6.3 条的规定提交的、为担保其履行在本合同项下的建设等义务的担保函。建设期履约保函不计利息。
运营维护履约保函	指乙方按照第 18.1 条的规定提交的、为担保其履行在本合同项下运营维护等义务的担保函。运营维护履约保函不计利息。
移交维修履约保函	指乙方按照第 22.6 条的规定提交的、为担保其履行在本合同项下移交、质量保证等义务的担保函。移交维修履约保函不计利息。
建设期	从监理工程师发出开工令之日起至项目工程竣工验收合格日或经甲乙双方确认的实际交付使用日止（以先发生者为准）。
开工日	指项目工程开始施工之日，具体参见本合同 9.2 条。
运营期	指本合同第 15.2 条约定的日期。
谨慎工程和运营惯例	指可以合理期望的对同一项业务在相同或类似情况下熟练和有经验的承包商或操作者的技能、勤勉、谨慎和预见能力的惯例标准。 就本项目而言，谨慎工程和运营惯例应包括但不限于采取合理的步骤，以确使： (a) 在满足正常条件下及合理预测的非正常条件下项目拥有所需要的充足材料、资源和供应品； (b) 拥有足够数量、充足经验并经过适当培训的工作人员，以恰当有效地按照相应的手册和技术规范运营本项目并能够处理紧急情况； (c) 由具备相应专业知识并受过培训和有经验的人员进行预防性日常和非日常维护和修理，以确使本项目长期、可靠和安全地运

淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目合同

	营。
争议解决程序	指本合同第 26 条中提及的解决争议的程序。
终止通知	指双方按照本合同第 25.5 条（b）款向对方发出的通知。
终止意向通知	指双方按照本合同第 25.5 条（a）款向对方发出的通知。
提前终止	指由于政府方或者项目公司违约、政府方选择终止以及不可抗力事件引起的项目提前终止。
生效日	指本合同甲、乙双方盖章并由双方法定代表人或授权委托人签字之日。如引进的社会资本方为外资的，则本项目合同在相应的商务部门审批后生效。
工作日	指除中国法定休息日和法定节日或假日以外的、各机构普遍工作的日期。
合同终止日	指本合同提前终止的日期。
移交日期	指合作期届满之日后的第一个工作日（适用于本合同履行期满），或经双方书面同意的移交项目设施的其他日期。

1.2 解释

本合同中的标题仅为阅读方便所设，不应影响条文的解释。以下的规定同样适用于对本合同进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。

在本合同中：

- (a) 合同或文件包括经修订、更新、补充或替代后的该合同或文件；
- (b) “元”指人民币元；
- (c) 条款或附件：指本合同的条款或附件；
- (d) 一方、各方：指本合同的一方或双方或各方，并且包括经允许的替代该方的

人或该方的受让人；

- (e) 除非本合同另有明确约定，“包括”指包括但不限于；除本合同另有明确约定，“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”不含本数；
- (f) 除非本合同另有约定，提及的一方或双方或各方均为本合同的一方或双方或各方，并包括其各自合法的继任者或受让人；
- (g) 所指的日、月和年均指公历的日、月和年，其中一年以 365 天计，一个月以 30 天计；
- (h) 本合同中的标题不应视为对本合同的当然解释，本合同的各个组成部分都具有同样的法律效力及同等的重要性；
- (i) 本合同并不限制或以其它方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权。在本合同有效期内，如果本合同项下的有关约定届时被纳入相关法律法规规范属于甲方或其他政府部门的行政职权，适用该等法律规定；
- (j) 要求在某一非工作日付款：指该付款应在该日后的第一个工作日支付。

第二条 双方的基本权利和义务

2.1 甲方的基本权利和义务

- (a) 甲方在合作期内的基本权利：
 - (i) 按本合同约定提取建设期履约保函或运营维护履约保函或移交维修履约保函项下的款项的权利；
 - (ii) 对乙方投资、建设、运营管理及维护、移交本项目进行监管的权利；如发现与 PPP 项目合同约定存在不相符合的，有权责成项目公司限期予以纠正，并视情节轻重收取违约金或不予退还有关保证金、提取有关保函；
 - (iii) 有权组织委托中介机构，对乙方的投资、建设、运营管理及维护、安全、质量、服务状况等进行定期评估，并有权定期将评估结果向社会公示，接受公众监督；
 - (iv) 甲方在建设期内有对乙方的建设施工情况进行监督检查的权利，包括但不限于在建设期内甲方可以聘请中介机构对项目进行跟踪审计、专项审计检查，相应的费用由甲方负担，检查周期由甲方合理确定，审计检查范围主要包括对乙方的注册资本和资本金的到位情况、资金使用情况、项目进度情况、项目质量情况、项目实施与本合同执行情况等方面，乙方有义务对审计检查工作给予充分配合，提供完整的所需查看的各种文件资料，并对提供资料的完

整性、真实性负责；

- (v) 对乙方是否遵守本合同的监督检查权及对建设、运维的介入权；
- (vi) 乙方如出现下列行为之一者，甲方有权责令其限期改正，或依法采取有效措施督促其履行义务；逾期不改正的，有权终止本合同，收回本项目经营权；
 - 1) 擅自转让、出租、质押经营权或擅自处置、抵押项目设施、设备的；
 - 2) 擅自停业、歇业，影响到社会公共利益和公共安全的；
 - 3) 因经营管理不善，造成重大质量、安全责任事故，严重影响公众利益的；
 - 4) 被相关部门依法吊销营业执照、注销、关停的；
 - 5) 违反获得经营权时所做的承诺，情节严重的；
 - 6) 法律法规禁止的其他行为。
- (vii) 存在弄虚作假、合同违约等行为的，甲方有权向相关行政监督部门反馈并上传至各行业信用平台系统。建设期内，项目公司管理的承包商合同履行中产生的违约金由项目公司负责收取。
- (viii) 因乙方原因导致工程不可用或部分不可用，限期整改，整改不到质量要求的，甲方视其造成的后果，不可逆的，扣减相应可用性服务费费用或全部费用；
- (ix) 乙方不得转包或擅自分包，否则甲方有权单方部分终止合同或全部终止合同，此部分工程款不予结算，由此而造成的经济损失由乙方承担。
- (x) 在本合同约定的内容（25.1 约定内容）发生时，政府方在项目期限内任意时间可主张终止 PPP 项目合同。
- (xi) 若乙方拒绝甲方或其委托的第三方进入项目场地进行纠正工作，或未能按照甲方的要求偿还甲方为此而付出的成本与费用，则甲方有权从建设期履约保函项下提取相应金额，不足以弥补政府方损失的，政府方有权继续追偿；
- (xii) 乙方发生本合同载明的根本性违约情况，甲方有权提前终止合同。
- (xiii) 本合同载明的甲方拥有的其他权利。
- (b) 甲方在合作期内的基本义务：
 - (i) 协助乙方及时获得相关的许可或批准，包括但不限于施工许可证等；
 - (ii) 协助项目公司进行用于且仅限于本项目的融资活动；政府方及其有关部门不会为社会资本方及项目公司融资而对银行等金融机构提供任何形式的担保、

抵押及承诺；

- (iii) 协调和推进政府部门审批本项目的项目建议书、工程可行性研究报告、土地使用、环境保护等相关文件，确保本项目设计、投融资、建设及运营维护等工作的正常开展；
- (iv) 负责将项目建设用地无偿提供项目公司使用，并协调相关部门配合乙方将本项目所需水、电、通讯线路从施工场地外部接通至指定地点；
- (v) 协调城市供水、排水、燃气、热力、供电、通信、消防等依附于本项目的各种管线、杆线等设施的建设计划，匹配本项目建设进度及年度计划安排等；
- (vi) 负责按照本项目招标文件中确定的征地拆迁计划完成相应的征地拆迁工作，提供项目施工必备的作业场地；本项目土地征用、房屋征收工作由政府方负责。本项目施工作业面并不一次性全部提供，而是按照开工进度的要求，由政府方向项目公司提供阶段性作业面；
- (vii) 按照本合同的约定及时、足额地向乙方支付服务费；甲方应确保财政部门将本项目的服务费用纳入跨年度（涵盖整个合作期）的财政预算（含年度财政预算、中期财政规划及中长期财政规划）。
- (viii) 在项目建设过程中，积极协调相关政府部门，提供良好的施工环境，积极处理施工期间的阻工现象，杜绝强买强卖现象发生，保证工程顺利实施，协助乙方协调与项目场地周边所涉及的有关单位的关系；
- (ix) 工程运营期间，由第三方原因（如车祸、偷盗破坏、专业管线维修等）造成的设施的损坏甲方应协助乙方做好追索工作；
- (x) 如未来甲方利用本项目申请专项资金或基金等的，乙方应提供协助；获得专项资金或基金归政府方所有。在建设期内，专项资金优先用于本项目投资，除资本金投资外，相应抵扣可用性服务费付费基数中建筑安装工程费。在运营期内，专项资金优先用于支付本项目政府付费；
- (xi) 投资控制的监管：可用性服务费计算基数中的建筑安装工程费以经政府结算审计审定的建筑安装工程费为准。

2.2 乙方的基本权利和义务

- (a) 乙方在合作期内的基本权利：
 - (i) 享有投资、建设、运营管理及维护本项目的权利；
 - (ii) 在经甲方及债权人许可后，项目公司可为本项目融资之目的，将其在 PPP 项

目合同项下的各项权益之上设置抵押、质押或以其它方式设置担保权益；

- (iii) 要求甲方按照本合同的约定支付服务费；在合作期限内，享有可能出现的税费优惠权利；
- (iv) 如果因不可归责于乙方的原因导致乙方不能履约的，则乙方有权和甲方就有关事宜进行沟通，如经甲方确认确属不可归责于乙方的原因，且乙方已为避免此种情形采取必要的措施，则甲方不得以此作为对乙方绩效考核不达标的依据，并不得追究乙方的违约责任；
- (b) 乙方在合作期内的基本义务：
 - (i) 乙方在签订 PPP 项目合同后的 30 日内与淮南建设发展控股（集团）有限公司完成注册成立项目公司，在项目入库信息更新完成，甲方确保将本项目政府付费纳入淮南市中长期财政规划并配合满足 PPP 项目融资要件要求条件下 90 日内完成融资交割（宽限期 1 个月）；
 - (ii) 承担项目投资、建设、运营管理及维护、移交的费用和风险，负责项目的投资、建设（按照施工图设计进行建设）、运营管理及维护（包括本项目范围内由乙方建设部分和本项目范围内已由其他单位建设且已验收合格的其他组成部分）、移交；并按照国家、安徽省、淮南市的相关规定办理相应的手续。
 - (iii) 项目公司对项目设施报废等消灭所有权之处分权的行使，以不影响本项目的正常运营及本项目合同规定的移交之要求为前提。项目公司需对项目资产行使出、转、让、出租等转移所有权或可能转移所有权之处分权的，由其与甲方另行协商确定；
 - (iv) 在运营期内严格按法律及本合同规定进行运维，持续、安全、稳定地提供服务，并确保项目达到本合同约定的标准；
 - (v) 接受甲方及其依法聘请的专业第三方机构在建设期的监督管理，并有义务配合建设期监管的相关事宜，由此产生的专业第三方机构的监管服务费用由甲方承担；
 - (vi) 按照本合同约定提交建设期履约保函、运营维护履约保函及移交维修履约保函；
 - (vii) 乙方申请并及时获得从事建设工程所需要的政府部门的各种批准文件，按时完成项目建设工作，确保项目按本合同约定日期竣工，因甲方迟延交付项目建设用地或有关政府部门未依法及时审批各种批准文件等非乙方原因除外；

- (viii) 如未来甲方或政府有关部门或政府授权的有关单位需对依附于本项目的各类管线、杆线等进行维修、维护或抢险需要的，则乙方应积极配合，不得以本项目对抗关乎公共利益或公共安全的事项；申请进行维修、维护或抢险的单位应事先报经政府相关行业主管部门申请授权许可，乙方应根据授权许可，配合其完成相应的维修、维护、抢修工作。如该种情形下的配合影响到乙方绩效考核的，甲方应酌情按照乙方已履行完毕对应的绩效指标来对待，且不应视为乙方违约；
- (ix) 在不可预见的自然灾害等极端环境下，积极配合政府方做好项目范围内及相关范围的防灾减灾等相关工作，不得以本项目对抗关乎公共利益或公共安全的事项；该种情形下配合如影响到项目公司绩效考核的，则政府方应按照项目公司已履行完毕对应的绩效指标来对待，且不应视为项目公司违约；
- (x) 对于重点建设项目施工过程中应设立跟踪审计进行跟踪服务，为顺利结算积累过程资料，在项目竣工验收完成后，乙方应配合政府方审计工作。工程完工后，由乙方组织完成工程竣工结算资料审查汇总并报送甲方，甲方应在收到乙方报送的合格竣工结算资料后原则上 3 个月内完成审定的审计报告，非乙方原因导致逾期未完成审计报告以致影响可用性服务费支付的，甲方暂按中标价作为可用性服务费计算基数先行支付，待审计报告出具后据实调整。

第三条 承诺和确认

3.1 甲方承诺

- (a) 甲方应确保对向乙方提供的与本工程相关的材料、信息或数据的准确性、完整性或适宜性负责；除国家政策等不可抗力外，甲方应确保本项目在合作期内始终处于全国 PPP 综合信息平台项目管理库；甲方或其他任何政府部门对向乙方提供的其他材料、信息或数据的准确性、完整性或适宜性，未作出任何承诺和保证；
- (b) 在签署合同时，甲方应获得政府方明确的授权文书，同时淮南建设发展控股（集团）有限公司也应有政府方授权出资的文书；
- (c) 按约定完成本合同第 6.1 条规定的前期工作；

如果甲方的承诺被证明在做出时存在不实或不能兑现，则乙方有权根据第 24.1 条要求甲方赔偿，并有权根据第 25.2 条的规定终止本合同。

3.2 乙方承诺

- (a) 乙方是依据中国法律正式成立的独立企业法人，其公司章程不与本合同的内

容相冲突。乙方为签署本合同已经依据适用法律及公司章程之规定完成所有必要的公司内部行为，其有权签署本合同并履行本合同项下的义务。

- (b) 乙方应确保本项目建设资金按照本项目建设进度以及融资匹配资金的要求，足额、及时到位。
- (c) 按约定完成本合同第 6.1 条规定的前期工作。

如果乙方的承诺被证明在做出时存在不实或不能兑现，则甲方有权根据本合同第 24.2 条要求乙方赔偿，并有权根据本合同第 25.1 条规定终止本合同。

3.3 乙方确认

- (a) 在签署本合同之前，乙方已为自身的利益进行了必要的调查及检查，包括但不限于对项目场地进行细致而全面的检查、评估，充分知悉了项目的现状和风险；
- (b) 在签署本合同时，乙方只是参考但并未依赖由甲方或其他任何政府部门作出或提供的任何材料、信息或数据。

第二章 项目公司

第四条 项目公司

4.1 项目公司成立

乙方与淮南建设发展控股（集团）有限公司为实施投资、建设、运维管理及维护、移交本项目而按照本合同约定设立项目公司。

乙方在签订 PPP 项目合同后的 30 日内与淮南建设发展控股（集团）有限公司完成注册成立项目公司。项目公司的组织形式为有限责任公司。项目公司以自身的全部资产为限承担项目公司责任。自项目公司成立日起各方以各自出资的项目资本金为限对项目公司承担责任，并分担风险及亏损；各方按其实缴的出资比例分享利润。

4.2 项目公司经营范围

项目公司负责 PPP 项目合同项下的投资、融资、建设、运维管理及维护、移交业务。非经甲方书面同意，项目公司的经营范围不得超出本合同约定的内容。

4.3 项目公司注册资本、资本金和股权比例

项目公司的注册资本设定为人民币伍仟万元整（按股权比例认缴到位）。

项目资本金（约项目总投资的 20%）为【347798500.00】元整（按股权比例出资）。

淮南建设发展控股（集团）有限公司出资的资本金为【34779850.00】元整，占项目资本金总额的百分之十[10%]；乙方出资的资本金为【313018650.00】元整，占项目资本金总额的百分之九十[90%]（其中，中铁六局集团有限公司出资的资本金为【156509325.00】元整，占项目资本金总额的百分之四十五[45%]；中国核工业华兴建设有限公司出资的资本金为【156509325.00】元整，占项目资本金总额的百分之四十五[45%]）。

股权比例：淮南建设发展控股（集团）有限公司方占股比例为 10%，乙方占股比例为 90%（其中，中铁六局集团有限公司占股比例为 45%，中国核工业华兴建设有限公司占股比例为 45%）。

淮南建设发展控股（集团）有限公司和乙方均应以货币方式出资，双方承诺将根据适用法律及当地有关部门的规定依法缴纳注册资本。项目资本金的到位时间应满足本合同项下铺底流动资金等需求。

4.4 项目公司股权转让

项目公司的股东应确保在本合同生效日期之日起至竣工验收完成后 2 年之内(含),任何原始股东都不得转让(包括向项目公司其他股东和/或任何股东的关联公司和/或任何第三方)其在项目公司中的全部或部分股权(如属联合体中标的,则允许联合体参与方向联合体牵头方转让),除非应法律要求或报经市政府批准。

自竣工验收完成后二(2)年之后,经市政府事先书面同意,项目公司的股东可以转让其在项目公司中的全部或部分股权,但受让方应满足合同约定的技术能力、财务信用、运营经验等基本条件,并以书面形式明确承继原股东方在项目公司项下的权利及义务

第三章 项目经营权

第五条 经营权

5.1 经营权的授予

- (a) 甲方通过与乙方签订本合同，授予乙方投资、融资、建设运营管理及维护本项目施工图纸范围内的路基、路面、桥涵、地下综合管廊、雨污水管道、给排水管道、杆管线改迁、电力、边坡支护、绿化、照明、交通设施等工程，并负责道路（含路基、路面、边坡、人行道等）、桥涵（含检测）、地下综合管廊、雨污管网、照明设施、绿化、附属设施（不含交通标志、信号灯）的日常维护管理和保洁及应急处理（包括除雪、抢险等）等（其中，运营维护内容包括本项目范围内由乙方建设部分和本项目范围内已由其他单位建设且已验收合格的其他组成部分）。如涉及特许经营权的，按特许经营管理规定执行。

如未来乙方根据适用法律及 PPP 项目合同指南、本合同的规定拟利用本项目资产或项目设施开展本合作内容范围以外的经营性业务的，必须事先报经甲方或市政府事先书面同意，未来收益分享等有关事宜由甲乙双方届时协商确定。未经甲方事先书面同意的，乙方不得开展本款所述相关经营性业务，且乙方必须保证此等经营性业务不得影响本项目的实施，也不得有任何影响公共利益或公共安全的行为。否则甲方有权全额提取建设期履约保函或运营维护履约保函或移交维修履约保函项下的全部金额。

- (b) 政府方授予项目公司经营权，进入运营前，向政府方提交运营方案，经政府方和相关部门审批同意后，方可进入正式运营。
- (c) 项目合作期 2+13 年，分为建设期和运营期，其中建设期不超过 2 年。

5.2 合作期的延长

- (a) 如发生下列事件，项目合作期可适当延长：
- (i) 因本合同约定的可归责于甲方的原因导致的完工延误情形出现的；
- (ii) 由于法律变更或政府行为导致乙方在项目合作期内受到影响并使乙方遭受实质性损失的。
- (b) 乙方在 5.2 (a) 描述的事件发生之后，希望延长项目合作期的，应在事件发生后 30 日内向甲方递交要求延长合作期的申请，以便甲方可以及时对该申请的情况进行核查。甲方 30 日内对核查意见给予书面回复，否则视为甲方同意延长乙方的项目合作期。

- (c) 延长项目合作期需经双方书面确认，因过失方原因造成对方损失的，过失方应予以赔偿损失。

5.3 经营权的担保及转让

- (a) 出于本项目融资的目的，乙方可根据国务院《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发[2014]60号）的规定将本合同项下的预期收益等作为本项目的融资抵押等担保，乙方设置该担保权益不应损害甲方的权利或利益；若未来项目公司不能顺利完成项目融资的，则由乙方通过其他合法合规的方式解决，甲方在政策范围内应及时提供相应的配合与支持。
- (b) 除本项目的融资外，乙方不得为本合同项下的各项权益（如政府购买服务的预期收益权、保险受益权等）设置担保权益。
- (c) 除本合同另有规定外，未经甲方同意，乙方在项目合作期内不得将本项目经营权出租或以任何形式转让、承包给第三人。

5.4 项目合作期满移交

1、期满终止移交

● 补偿方式：

无偿移交。

● 移交内容：

本项目在合作期内项目资产所有权都归属于政府方或其指定机构，项目公司保留运营权、维护权等权利至项目合作期限届满。项目合作期届满后，项目公司应按照项目合同约定的机制、流程和资产范围，办妥法律过户和管理权移交手续，将满足性能测试要求的全部项目设施、资产的经营权、知识产权和技术法律文件等无偿移交给淮南市人民政府或其指定机构，且项目公司需确保移交的项目设施不存在任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权。社会资本或项目公司应配合做好项目运营平稳过渡相关工作。

● 移交标准

➢ 项目公司应确保最后一次运营期基本绩效考核指标中总评分达到得分标准的百分之八十（80%）及以上，此为项目公司通过移交验收的标准。如发现存在缺陷的，未能达到移交标准的，则项目公司应及时修复。如任一方对是否达到移交标准有异议的，则由移交委员会聘请第三方机构进行评定，所需费用由责任方承担。

➢ 移交质量缺陷责任期：1年。

第四章 前期工作及建设期履约保函

第六条 前期工作及建设期履约保函

6.1 前期工作

在开工日或先于开工日，下列各项前期工程约定如下：

- (a) 甲方负责完成相关前期工作，前期工作包括由政府方负责征迁、土地（含林地）报批、设计、前期审批（含用地、环评、规划、可研、立项等）、监理、检测等前期工作。
- (b) 乙方与淮南建设发展控股（集团）有限公司负责成立项目公司，承担相关费用，相关费用按审计结算价计入可用性服务费计算基数。
- (c) 施工所需的水、电、电讯线路接驳点及道路位置以现状为准，乙方在投标前已踏勘，并应在开工前 7 日内由乙方自行接至施工现场，费用已包含在签约合同价之中。水、电由乙方装表计量，由承包人按实承担。
- (d) 融资交割：是指项目公司已为项目建设融资的目的签署并向融资方提交所有融资文件，并且融资文件要求的就本项目获得资金的所有前提条件得到满足或被豁免。就本项目而言指资本金已经到位或投资协议等已经签署且资金能随项目要求随时到位，并且资本金以外的资金已经到位或借款合同等已经签署且资金能随项目要求随时到位，项目公司需向实施机构提供融资交割证明文件。项目公司成立后，在项目入库信息更新完成，甲方确保将本项目政府付费纳入淮南市中长期财政规划并配合满足 PPP 项目融资要件要求条件下 90 日内完成融资交割（宽限期 1 个月），项目公司的社会资本股东方负责协助项目公司获得融资，因项目公司项目融资未能按建设资金需求全部到位，且影响工程建设的，则由社会资本股东方提供全部差额融资资金。若社会资本股东方无法提供全部差额融资资金，则视为项目公司单方面违约，政府方有权取消其合同履约资格，项目公司向政府方支付相当于本项目资本金的 20% 的违约金。项目公司在融资过程中政府方应予以配合与支持。

6.2 前期工作费用

(1) 已确定工程建设其他费用（用 F_1 表示）：

1) 金额：暂定 36000 万元（ F_1 和 F_2 合计最高不超过总投资的 25%，超过部分由甲方负责，其中 F_1 额度不足时，经双方协商同意后可使用 F_2 额度），限额内具体根据审计实际支付金额计入本项目可用性服务费的计算基数范围内。此费用由项目公司按照项目进度及政府方要求支付，资金不占用淮南建设发展控股（集团）有限公司资本金。

2) 内容：包括土地（含林地）报批费、征地拆迁、环评费用、测绘费用、电力排管迁改、燃气次高压迁改、设计费、造价咨询费、监理费等。

3) 到位时间：项目公司在其成立后三十（30）个工作日内一次性向实施机构支付人民币壹亿捌仟万元整（¥180000000.00）；剩余人民币壹亿捌仟万元（¥180000000.00），项目公司在其成立后一百八十（180）日内支付给实施机构。

(2) 待定工程建设其他费用（用 F_2 表示）：

1) 金额：不超过 5741.4 万元，待政府方同意后计入可用性服务费的计算基数范围内。

2) 内容：包括但不限于场地准备费及临时设施费、建设单位管理费、办公及生活家具购置、职工培训及提前进场费、联合试运转费、高可靠性供电费、研究实验费、总承包管理费、报建报监费、竣工验收费、合同印花费、社会资本方承担的采购咨询服务费、招标代理服务费等，除 F_1 以外的所有费用。

3) 到位时间：

到位时间：为确保前期工作及建设期工作顺利开展，项目公司在接到实施机构通知后 10 个工作日内向政府方指定账户支付或按通知代付。如到位时间违约，社会资本方承担以应付金额为计算基数、以央行 5 年期贷款基准利率上浮 30% 为利率计算的违约金。

(3) 提示：政府方可根据实际需要推迟到位时间或不再需要此部分费用，社会资本自行考虑并承担此风险。

6.3 建设期履约保函

(a) 建设期履约保函的提供。中标社会资本/项目公司自领取中标通知书十五（15）天内提交，向甲方提供符合下列要求的建设期履约保函，作为其履行在本合同下的建设义务和其他违约赔偿义务的担保：

(i) 符合本合同附件 4《建设期履约保函》规定的格式；

(ii) 金额为人民币 陆仟万元整（小写 ¥60000000.00）。

(b) 建设期履约保函的解除。建设期履约保函在乙方提交运营维护履约保函之日到期，甲方应在到期日后五（5）个工作日内解除建设期履约保函。

(c) 因乙方原因造成甲方损失的，甲方有权要求乙方进行赔偿或从乙方提交履约保函中直接提取（提取后不足原履约保函部分由乙方在被提取 1 个月内自行补足）。

- (d) 当已完工程量达到合同价款的 30%时，由项目公司提出申请，经政府方同意后可退还履约保函的 30%。当已完工程量达到合同价款的 60%时，由项目公司提出申请，经政府方同意后可退还至履约保函的 60%，剩余部分应在到期日后五（5）个工作日内解除。

6.4 不提供建设期履约保函

如乙方未按第 6.3 条提交建设期履约保函，则构成乙方违约，甲方有权终止本合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

第五章 双方的一般责任

第七条 甲方的一般责任

7.1 法律变更

(a) 重要的法律变更

除本合同另有明确约定外，在合作期内，对于单项工程，由于一项或多项法律变更使乙方对项目的固定资产投资累计增加等于或超过单项工程 5%，并且上述增加未因对乙方有利的其他法律变更而得到补偿，则本合同第 7.1 条 (c) 款的规定可适用。

(b) 通知和减少影响

如果乙方希望获得本合同第 7.1 (c) 条规定的补偿，乙方应在知道第 7.1 (a) 条规定的法律变更后书面通知甲方。

乙方应在作出投资或发生开支之前给予甲方合理机会减少法律变更对其造成的影响。

(c) 取得补偿的权利

在第 7.1 (a) 条所描述的情况下，乙方有权要求甲方给予补偿，以使其达到未发生这些法律变更的情况下基本相同的经济状况。

(d) 法律变更影响履约

如果因法律变更使乙方无法履行其本合同项下的义务，包括因法律变更使乙方履行其在本合同项下的重要义务按照适用法律成为不合规，乙方应有权按 25.3 款规定的程序终止履行其在本合同项下的义务。

(e) 在合作期内，如遇国家或地方政策法规调整，按相关政策、法规执行。

7.2 获得和保持批准

(a) 在乙方提出请求后，甲方应协助乙方从政府相关部门获得、保持和延续项目建设和运维所需的相关批准。

(b) 甲方按照本条的规定给予协助不应免除乙方在本合同项下第 8.5 条应当获得所需批准的义务。

7.3 不当提取保函

如果甲方提取乙方提交的建设期履约保函、运营维护履约保函以及移交维修履约保函中的相应金额之后确定甲方属不当提取，甲方应及时向乙方退还提取的款项，并支付

该款项自提取之日起至退还之日止的利息，利率按央行公布的同期（与保函期限一致）金融机构人民币贷款基准利率上浮 30% 计算。

第八条 乙方的一般责任

8.1 遵守适用法律

乙方应始终遵守所有适用法律，应经常及时性获取所有适用于项目的已颁布实施的法律法规，乙方应被视为始终了解这些法律。

8.2 法律变更

(a) 重要的法律变更

在遵守第 8.2 (b) 条的前提条件下，除本合同另有明确约定外，在合作期内，对于单项工程，由于一项或多项法律变更使乙方对项目的固定资产投资累计减少等于或超过单项工程的 5%，并且上述减少未因其他法律变更而相应抵消，甲方可以书面形式通知乙方要求根据第 8.2 (b) 条对本合同项下的计费依据进行调整。

(b) 重要法律变更的调整

第 8.2 (a) 条提及的调整应采用降低相对应服务费或减少届时应付的任何费用的形式，其结果应使乙方保持如没有发生法律变更的情况下基本相同的经济状况。

8.3 安全保障

乙方应遵守法律及本合同技术规范和要求及国家规定的所有健康和安全生产标准，建立、健全和完善安全生产制度及安全运行保障体系，确保项目设施安全运行，防止安全事故的发生。在合作期内，乙方应对其自身原因导致的安全事故承担全部责任，并应当在出现安全责任事故 1 小时内按照有关规定向淮南市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全监督管理职责的有关部门报告。

应急处置：乙方应针对自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏等突发情况建立相应的应急预案和相应的组织、指挥、设备等保障体系，并保证在出现重大意外事件时其保障体系能够正常启动。且应急预案应同时考虑随附的地下地上工程（包括但不限于地下各类管线爆管等）发生重大或紧急事故时，能随时启动响应机制，配合相关责任或实施主体，完成相应抢修、抢险责任等。

乙方制定的应急预案应征求政府方的意见并报经市政府同意后实施。

8.4 环境保护

乙方不应因项目设施的建设或运维而造成环境污染。乙方在项目设施的建设、运营期间应根据本合同技术要求及国家的有关规定，采取一切合理措施来避免或尽量减少对

项目周围设施、建筑物和居民区的干扰。

8.5 获取批准

乙方应尽最大努力保持项目建设、运维所要求的所有批准，并应促使每一建设承包商和运维承包商（如适用）取得并保持需要的一切此类批准。

8.6 项目文件的协调

乙方应使融资文件、乙方章程以及其他由乙方签订的与项目有关的任何其他合同符合本合同的规定。

8.7 税收及筹划

乙方应依照税法要求及时缴纳税费。

本项目政府付费（含可用性付费及绩效服务费）为含税价。本项目，征地拆迁费不超过总投资 20%，前期费用中已确定工程建设其他费用（F₁）若不超过本项目总投资 30%（此费用仅用于本项目前期工作），则由甲方提供行政事业性收费收据及部分增值税发票，增值税抵扣不足部分由乙方自行承担；已确定工程建设其他费用（F₁）若超过本项目总投资的 30%，则该部分前期费用所产生的税费甲方应承担部分，具体由甲乙双方协商解决。

8.8 保险

乙方在充分评估项目投资和运维风险后，应根据中国的保险法等相关法律和行政法规的规定，并结合项目的实际情况，购买项目建设和运营期间的保险险种。在合理的商业条件下，应遵照可保风险均应投保的原则进行投保。其购买保险后，应将保险合同复印件交甲方备案。

(a) 乙方所投险种包括但不限于：

(i) 建筑/安装工程一切险；

(ii) 财产险（设备、设施、构筑物及附属建筑物）；

(iii) 第三者责任险；

(iv) 工程所在地行政部门规定的应交险种（包括但不限于安全生产责任险等）。

(b) 以上各种险种的保险均必须足额投保。

(c) 在合作期内，乙方应自费购买上述约定的保险，并始终使保险单保持有效。未经甲方书面同意，乙方投保的险种和数额不得随意变更。在法律许可和承

保人能提供的服务范围内，乙方有权在和保险公司之间签署的保险合同中明确保险利益归利益归属方。

- (d) 保险单的附加条款中必须规定：未提前三十（30）日未经甲方同意且书面通知甲方，保险人不得取消、延展或对保险单作重大变更。
- (e) 乙方应向甲方提供保险证明书以证实已获得上述所列保险单及附加条款。如果乙方未购买或维持上述保险始终有效，则甲方有权根据本合同从对乙方应付款项中扣除其应付的保险金（或者直接提取建设期履约保函或运营维护履约保函或移交维修履约保函项下的相应金额）。
- (f) 乙方应向甲方及时通报保险人的报告通知并提交相应的副本，如果乙方未及时提供通知而造成保险单失效应承担违约责任。

8.9 对承包商的责任

(a) 乙方的承包商

乙方依法选择承包商，包括但不限于施工承包商、设备供应商和运维承包商，不应解除乙方在本合同项下的任何义务。乙方对于其承包商或其聘用的人员的任何作为或不作为对甲方承担全部的责任。

(b) 与承包商的合同

乙方应确保与承包商签订的合同符合本合同的规定，承包合同和设备供应合同应按照本合同约定提交甲方备案。

8.10 监理及相关

本项目的监理方由政府方委托，在本项目的管理中实施机构及其委托的监理单位均可对项目公司全过程进行管理，监理方有权按监理合同对工程建设进行管理，在获得实施机构授权的情况下可以对整个项目建设进行管理，项目公司不得干扰监理工作。

8.11 资金使用监管

在本合同签署生效后，每季度资金支付使用计划由乙方负责制定，经实施机构审核后，报股东会备案。在资金使用计划范围内资金由乙方负责支配使用。

乙方收入除支付项目投资外，应优先偿还银行贷款，乙方不得为本项目融资以外的目的提供任何担保，不得对外拆借资金。

8.12 财务报表

乙方每年均应委托经甲方认可的会计师事务所对其进行年度财务审计，审计应在年度结束后的 4 个月内完成，乙方应在审计完成后 10 个工作日内向甲方提交经注册会计

师审核签字的审计报告。

8.13 融资文件应具备的条款

乙方的贷款合同中应包含有贷款人承诺的下述条款：

- (a) 只要本合同（含附件）有效，贷款人不得采取任何行动影响、干扰、损害或终止甲方在本合同项下的权利；或以其他方式对本合同履行造成不利影响；
- (b) 当乙方违反贷款合同或乙方出现重大经营或财务风险，威胁或侵害债权人利益时，贷款人可以代位行使乙方股东权利和经营管理权利，要求乙方改善管理、增加投入，或请求甲方认可的合格机构接管本项目。
 - (i) 贷款人通过书面方式将乙方在贷款合同下的违约通知甲方；
 - (ii) 给予甲方在收到上述违约通知后九十（90）日内纠正乙方此类违约的权利；
 - (iii) 在上述纠正期间不行使贷款人对违约的任何权利或补救；
 - (iv) 纠正期满时，乙方违约事件持续的，贷款人行使权利应以不妨碍和损害甲方在本合同下的权利和项目的正常运维为前提。如在纠正期内，触发贷款人直接介入的重大风险解除的或者提供贷款人能接受的补充担保措施后，贷款人应停止介入。

8.14 培训

在甲方保证严格履行本合同规定的保密义务的情况下，乙方对甲方在监督与评估乙方时需要掌握的或者在项目移交后运维本项目所需要掌握的工艺原理、技术诀窍和其他技术信息资料，应给予提供，并对甲方的有关管理人员每年组织必要的免费培训。

8.15 项目管理机制

（1）项目建设管理体系

本项目应建立合理的项目管理体系，优化项目参与各方的权责配置。

1) 本项目由淮南市重点工程建设管理局作为实施机构负责政府方项目合作期内监督管理工作。

2) 本项目政府方有权委托项目管理公司或造价咨询机构，负责对项目公司及施工总承包单位的建设质量、进度、造价等进行全流程跟踪审计及检查。

（2）履约采购管理

本项目应严格控制项目分包，成交社会资本不得将本项目工程主体部分施工内容进

行分包，其余专业分包在符合法律法规的条件下项目公司可自主进行分包，但需取得甲方认可。

(3) 价格管理

1) 在项目建设期间，政府方有权委托政府审计机构或中介机构跟踪审计。

2) 完善工程资料管理，工程量的确认和工程变更造成的造价调整必须取得监理单位、实施机构的审核确认。

(4) 资金管理与财务

1) 项目公司严格按照合同进度付款，并实施节点验收。

2) 设立建设资金专项账户，为保证本项目工程建设按计划进度执行，建立项目公司的资金专户，对资金到位进度、使用流向等进行管理。

第六章 项目建设

第九条 建设要求

9.1 建设责任

本项目按以下内容约定由甲乙双方共同承担工程建设风险，乙方应按以下要求完成全部工程建设任务，并承担相应费用，甲方根据政府最终竣工审计结算价的变化调整项目可用性服务费：

工程变更的监管：

- (a) 本项目工程造价参照《安徽省建筑工程工程量清单计价办法》(2018 版) 执行。工程造价按照综合单价计算，除市场价格波动引起的调整和法律变化引起的调整外，综合单价不予调整。现场施工时由于乙方原因，造成措施费增加的，费用均不予调整；如因甲方原因造成措施费用增加的，经甲方认可后，费用应予以调整。
- (b) 本项目工程变更均按淮南市相关法律法规及规定执行。本项目工程变更必须取得政府方或其授权实施机构同意；
- (c) 本项目工程人、材、机价格风险分担原则按下述规定执行：国家政策性调整由甲方承担；其他具体按附件 8 其他计价规则执行。
- (d) 本条所述项目工程建设费用、以及除本合同明确约定应由甲方或政府方相关主体承担的费用外，均由乙方承担；
- (e) 乙方应尽最大努力申请并及时获得从事建设工程所需要的政府部门的各种批准，并使其保持有效，并承担所有获得上述批准所需要的费用和支出；
- (f) 在开工日或之前开始建设工程；
- (g) 根据下列规定实施建设工程：
 - (i) 符合法律规定的要件和程序；
 - (ii) 经甲方审核后的施工图；
 - (iii) 本合同下对项目建设的其他所有要求。
- (h) 在施工过程中注意安全以保护生命、健康、财产和环境，避免安全事故；
- (i) 在施工期间采取一切合理措施减少对公众、居民和商业的干扰和不便；
- (j) 在项目施工期间，甲方可采用飞行检查等方式进行监督，一旦发现违法转包、

擅自分包，对此部分工程甲方不予认可和结算。

- (k) 在本合同期内，甲方可与乙方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同构成不可分割的整体，具有同等法律效力。

9.2 建设期限

工程进度的监管：

- (a) 本项目主要进度日期如下：

- (i) 开工时间：不迟于 年 月 日 开工建设（实际开工时间以本项目监理工程师发出的开工令为准）；因 PPP 合同签订时间延迟导致实际开工时间迟于原招标文件约定时间及投标文件承诺开工时间，开工时间相应顺延，但总工期不得超过 9.2 (a) (ii) 约定的竣工验收日；
- (ii) 竣工验收日：总工期不超过 2 年。政府授权的实施机构根据项目公司提交的经政府方审核同意后的进度计划实施进度节点考核。

未按要求完成阶段性工程任务即视为工期违约，如果给予了相应的整改时间，项目公司仍然不能依约履行合同，则属于根本性违约，政府方有权解除合同。自开工令载明开工日期算起，若项目完工日超过总工期，则社会资本方应承担相应的违约责任，具体见第十章违约和终止“24.2 乙方违约及赔偿”。

若因政府方未能按承诺移交作业场地的，工期相应顺延；截止目标完工日已完成 90%及以上工程量，由政府批准进入可用性服务费支付期。

若因本协议 9.2 (b) 条款而导致工期延误，截止目标完工日已完成工程量不足 90%的，对于已完工验收且具备运营条件的亦应视为运营期开始，由政府批准进入可用性服务费支付期，此阶段可用性服务费的计算基础为项目公司已完成的工程量的审计结算结果；对于未完成的工程量应在双方协商的工期内完成后再另行计算支付相应的可用性服务费。

因项目公司原因导致的工期延误，带来的建设期利息增加和财务费用增加由项目公司承担。

- (iii) 合作范围内项目如不同子项目分批实施的，如不同子项目分批实施的，则按不同批次子项目分别计算合同期限和结算费用。

- (b) 工程进度如果因下列情况受阻，上述进度日期可相应顺延：

- (i) 不可抗力事件;
 - (ii) 因甲方原因导致的延期;
 - (iii) 法律规定或其他政府部门的原因导致的延误;
 - (iv) 本合同规定的其他事项。
- (c) 当 9.2 (b) 款的事件发生后, 乙方要求延长进度日期, 应在前述事件发生后十 (10) 个工作日内向甲方提出书面报告, 报告应包括以下内容:
- (i) 事件的种类;
 - (ii) 预计延误的日期;
 - (iii) 乙方采取的减少延误的合理措施;
 - (iv) 乙方要求延长的日期。

甲方应在收到乙方的书面报告后十 (10) 个工作日内予以回复, 逾期未提出书面意见的, 视为同意乙方的延期要求。

9.3 质量保证与质量控制

- (a) 乙方工程的施工、质量管理、安全管理、竣工验收等应符合相关法律和强制性标准, 且应符合本合同规定的所有要求;
- (b) 本项目主体工程应由乙方 (如乙方具有相应资质) 完成; 本项目应严格控制项目分包, 乙方不得将本项目工程主体部分施工内容进行分包, 其余专业分包在符合法律法规的条件下项目公司可自主进行分包, 但需取得甲方认可;
- (c) 乙方在开始建设工程之前, 须建立一套完整的质量保证和质量控制方案交甲方审查确认后执行, 并作为验收依据之一。甲方在收到该质量保证与质量控制方案后的十 (10) 个工作日内, 应提出审查意见; 甲方在收到乙方的方案后的十 (10) 个工作日内没有提出审查意见则视为认可该方案。如甲方的审查意见要求乙方进行修改的, 则乙方应当在收到甲方通知后的十 (10) 个工作日内修正该方案并将其重新提交给甲方审查确认后方可执行;
- (d) 在不影响乙方履行本合同项下义务的情况下, 甲方有权在工作时间内对乙方或承包商履约情况进行检查, 以保证乙方工程的任何部分均符合本合同的要求。乙方须对此项检查予以协助;
- (e) 若甲方有足够的证据证明乙方建设工程或其他任何部分与本合同所规定的或其他相关部门所规定的质量或安全要求严重不符, 甲方有权立即通知乙方, 乙方应按要求进行整改。若乙方在收到甲方通知后 5 个工作日内未进行整

改，则甲方有权自己进行或委托第三方进行必要的纠正，一切风险与费用由乙方承担。在这种情况下，乙方须允许甲方或其委托的第三方为此目的而出入项目场地。若乙方拒绝甲方或其委托的第三方进入项目场地进行纠正工作，或未能按照甲方的要求偿还甲方为此而付出的成本与费用，则甲方有权从建设期履约保函项下提取相应金额，不足以弥补政府方损失的，政府方有权继续追偿；

(f) 除本合同另有规定外，对乙方提交的质量保证与质量控制方案，甲方的任何作为或不作为，均不会：

(i) 减轻或影响乙方遵守本合同或法律所要求的与质量保证有关的义务或责任；

(ii) 被视为甲方应对质量保证与质量控制方案承担任何责任。

9.4 设备与材料采购

乙方应负责依法购置本项目工程建设所需要的一切临时性或永久性的设备、材料及其他物品，本项目工程建设所需的一切设备、材料的采购、供应、进口应当按照法律实施并符合国家的规范和标准及本合同的约定。

主要材料、大宗材料、设备的采购须经政府方委派实施机构代表等全程参与监督管理，其单价须由政府方与项目公司共同询价或参考当地信息价确定。由政府方与乙方共同确定的材料和设备价格不计入建筑安装工程费下浮的范围。

第十条 土地使用

10.1 场地范围

甲方应依法提供本项目建设工程场地红线图，并以政府有关部门批准的测量数据为准。

10.2 土地使用权

本项目用地由甲方获得土地使用权后，在合作期内无偿提供给项目公司，并以甲方名义办理因此所需的各种证件、审批、手续文件，乙方不拥有土地使用权，合作期限内项目公司不支付土地使用税。

10.3 土地使用权的限制

未经甲方书面同意，乙方不得将项目所用土地用于本项目之外的任何目的。

10.4 土地的适用性和土地的状况

乙方已察看并检查了项目场地，充分了解了该宗土地及其周围的状况，包括前期工

作所包含的地下土壤状况、通道和设施关联物等情况，自愿接受该宗土地的现状（包括地下地质条件）以及所有缺陷，甲方未就土地状况向乙方做出任何声明和保证。

10.5 有关土地状况的资料

乙方对甲方提供的有关项目场地或其周围的状况的文件、材料或任何其他资料中可能含有的任何错误、不正确、遗漏均已充分知悉。

10.6 甲方对项目场地的出入权

甲方以及有关政府部门有权：

- (a) 经合理通知而出入项目场地（因行政管理工作出入除外）；
- (b) 有权为了解建设进度或检查乙方履行本合同项下的其他义务的目的行使此项出入权；
- (c) 本合同规定的其他出入的权利。

第十一条 设计及相关

11.1 设计

甲方负责规划设计、方案设计、初步设计、施工图设计工作。乙方在不改变设计主要要素的情况下，如果乙方认为变更设计将加快建设速度、降低建设或维护成本、提高项目的质量和环保标准，可以对设计进行提出优化的建议，但应遵守本合同第 14 条的规定，报经甲方认可后实施。

第十二条 建设

12.1 工程质量

乙方应保证本项目工程质量达到适用法律、规范及本合同约定的设计要求。

在工程开始施工后，乙方应严格执行各项质量保证和质量控制计划。甲方有权参加或检查乙方以及分包商的质量控制过程及方法，以确保工程的质量要求。

12.2 工程进度

乙方应严格按照本合同所规定的时间进行施工，于每月 5 日前向甲方提交工程进度报告，详细说明如下事项：

- (a) 工程进度实际完成的百分比与计划完成的百分比的比较；
- (b) 工程投资完成情况；
- (c) 存在的问题及处理意见，包含与进度计划的差异、原因分析及正在采取的纠

正措施。

12.3 工程延误

- (a) 如果乙方合理预计工程不能达到本合同所要求的进度日期，应立即书面通知甲方，并就延误的原因、预计的可能超出进度日期的天数和其他可合理预见的对建设工程不利的影响、已采取或建议采取的解决或减少延误及其影响的措施等内容向甲方进行合理详细的描述。
- (b) 乙方发出上述通知并不能免除其在本合同中的任何义务。如果乙方提出或实施的补救措施不能解决逾期的延误，甲方可要求乙方采取甲方认为必要的其他措施以达到进度计划的要求。

12.4 甲方对工程的监督检查

- (a) 甲方有权随时检查乙方的建设是否符合本合同的要求；
- (b) 若发现任何部分不符合要求，甲方有权通知乙方，指出缺陷或不符合规定之处；
- (c) 若乙方对甲方根据上述第(b)款所发出的通知有异议，则须于接到甲方通知后的七日内将其异议通知甲方，否则应提出整改方案和措施报甲方批准后对工程进行整改。甲方与乙方须尽合理努力以求解决此项事宜。若在此后七日内，该事宜不能得到解决，则依据争议解决程序就该事宜作出裁决；
- (d) 甲方是否监督、检验本项目建设工程均不能减免乙方在本合同下的任何义务、责任。

第十三条 甲方要求的变动

13.1 甲方的变动通知

甲方认为需要对项目建设进行变动，应书面通知乙方。

13.2 乙方对变动的回复

乙方在收到甲方要求变动的通知后的十四日(或甲方同意的延长期限)内，须就变动向甲方作出书面答复。如果乙方未按规定的时间回复，则视为乙方已接受了变动。

13.3 甲方的答复

在收到乙方对变动的回复后十四日内，甲方须：

- (a) 以书面方式确认乙方对变动的回复中所包含的事项，在此情况下，第 13.5 条将适用；

(b) 以书面形式表明不同意乙方对变动的回复，并列明不同意的具体事由，在此情况下，该变动将依照争议解决程序的规定进行解决。

13.4 甲方对变动通知的确认

依照争议解决程序对变动的争议事项作出裁决后的二十八日内及时予以确认。逾期不回复视为甲方同意。

13.5 变动的实施

在变动被确认之后：

- (a) 本合同被视为在当日作出了修改，且甲方与乙方须遵守在修改后的本合同项下所应承担的义务；
- (b) 乙方须按甲方变动通知所要求的方式或前述争议解决结果，实施该项变动；
- (c) 除本合同另有明确约定外，甲方的变动引起的工程量增减的，工程数量由乙方提出，经监理工程师初审，报经甲方审核通过后，相应增减可用性服务费计算基数，由乙方负责实施。

13.6 批准

- (a) 乙方应根据勤勉尽责的原则准备、并向政府部门(或其他有关机构)提交适当的申请及其他相关文件，尽力获得实施变动所必需的任何批准；
- (b) 如果乙方遵守了其在上述第(a)款项下的义务，但乙方的申请被政府有关部门拒绝，甲方要求变动的通知应视为已被放弃。

13.7 减轻损失的义务

- (a) 乙方应始终尽一切合理的努力，以减轻或降低乙方和甲方因变动而花费的支出和发生的损失。
- (b) 因变动所致的延误。因甲方要求的变动而导致竣工验收日的迟延，乙方有权要求给予相应的宽展期限，在合理宽展期内甲方不得因此行使其在本合同第25.1条下所规定的权利。

第十四条 乙方要求的变动

14.1 乙方的变动通知

乙方在开工日后，认为需要对项目建设进行变动（但乙方提出的工程变动要求，必须是出于优化方案、节省开支等合理或经济性考虑），应书面通知甲方并经其同意后实施，否则不得变动。

14.2 甲方的回复

甲方在收到乙方要求变动的通知后的二十八日内，须就变动向乙方作出书面回复，否则视为同意。

14.3 批准

根据法律规定，变动应经过批准的，乙方应负责办理报批手续并自行承担所有的相关费用，甲方可以协助乙方取得相关批准手续。

14.4 乙方要求的变动的实施

当甲方书面同意乙方要求的变动时，本合同应视为在当日作出了修改，双方须遵守其各自在修改后的本合同项下的义务。

第十五条 竣工验收

15.1 竣工验收

乙方应按照适用法律及本合同的要求组织本项目竣工验收以及在竣工验收合格后完成竣工验收备案。竣工验收的程序应符合国家、行业、项目所在地相关法律、法规、规范和规定的要求。

15.2 运营期

- (a) 从工程竣工验收合格日或经甲乙双方确认的实际交付使用日（以先发生者为准）后一日起至合作期届满日。
- (b) 进入运营期，甲方须根据绩效考核结果及时、足额支付可用性服务费和绩效服务费。
- (c) 建设期满 2 年时，非因社会资本方原因导致无法及时竣工验收的，按项目实施前确定的工程费用等计算可用性服务费并支付，待竣工验收后，当年一次性调整（多退少补）。非因社会资本方原因导致无法及时竣工验收的，超过建设期一定期限，双方可另行商议调整建设内容。

第十六条 建设的延迟、放弃和甲方介入

16.1 延迟

延迟是指乙方自身违约、甲方违约、不可抗力、法律变更或变动等事件导致建设工程不能如期开工或完工。

- (a) 乙方在获悉可能导致项目在竣工验收日前不能完工的任何事件发生时，应于五日内以书面方式向甲方发出延迟通知，通知内容包括但不限于：

- (i) 延迟事件发生的原因、时间、过程；
 - (ii) 延迟或延迟事件的责任者；
 - (iii) 预计延迟时间；
 - (iv) 对本合同的任何违约或预期违约；
 - (v) 乙方关于减轻和纠正延迟或延迟事件影响的计划。
- (b) 乙方在发出延迟通知后，应定期(至少应每星期)就相关情况向甲方提供事件的最新进展报告。

除了第 13 条、第 7.1 条、第 23 条和 24.1 (a) 明确规定的情况外，乙方无权从甲方获得因延迟而产生的任何责任的免除或补偿。

16.2 放弃

乙方以书面形式表示放弃本项目建设或运维。

16.3 视为放弃

除不可抗力或甲方违约的情况外，如果乙方出现下列情况，则本项目的建设应视为已被放弃：

- (a) 书面通知甲方其已终止任一建设工程，且打算重新开始施工；
- (b) 由于乙方原因未能在开工日期之后三十（30）日内开始项目的建设；
- (c) 由于乙方原因未能在任何不可抗力事件结束后三十（30）日内恢复建设工程施工；
- (d) 乙方出于任何其他原因在运维日前停止工程建设（含测试），直接或通过分包商撤走场地全部或大部分的工作人员。

16.4 甲方介入完成建设

- (a) 甲方介入的条件

乙方出现下列情况之一的，则甲方有权指定第三方取代乙方承担项目的任何必要的建设，以便实现完工：

- (i) 书面表示放弃项目；
 - (ii) 被视为放弃项目建设。
- (b) 甲方介入建设后，乙方应与甲方及其指定第三方合作，向其提供所有合理的协助。

- (c) 甲方介入项目的建设，不应被视为根据本合同受让了项目资产或承担了乙方的义务。
- (d) 除本合同另有规定外，甲方及其指定第三方介入建设所产生的一切费用和 risk 由乙方承担。甲方有权在向乙方提供详细的费用和支出记录后，从建设期履约保函项下提取该部分款项，不足以弥补政府方损失的，政府方有权继续追偿。
- (e) 如果乙方已采取了切实可行的措施或提供了有效担保，甲方应撤出项目的建设。乙方应在此时恢复承担全部责任，直至任何一方发出终止通知为止。

第七章 项目的运维

第十七条 运维要求

17.1 乙方的主要责任

- (a) 在整个运营期内，乙方应自行承担费用和风险，管理、运维项目设施。
- (b) 在进入运营期前，乙方应制定包括运维质量保证和质量控制的运维手册，提交甲方备查。
- (c) 乙方应确保在整个运营期内，始终根据下列规定运维项目设施：
 - (i) 符合法律法规和规范性文件规定的要件和程序；
 - (ii) 本合同的规定；
 - (iii) 维护手册以及与项目设施有关的设备的制造商提供的一切有关手册、指导和建议；
 - (iv) 谨慎工程和运营惯例。
- (d) 乙方应确保项目设施始终处于良好营运状态并能够以安全、连续和稳定的方式提供符合适用法律和本合同要求的服务。

17.2 运维和修理记录

乙方应确保：

- (a) 对运维和修理项目的情况进行详细记录；
- (b) 准许甲方在给予合理通知后于正常工作时间对其运维情况进行检查并查阅和复制上述记录。

甲方承诺若乙方的上述记录可能包含商业秘密的，其应尽合理努力予以保密。

17.3 监督与检查

- (a) 甲方有权派出监督员或者指定任何代表经合理通知进入项目场地，以监察项目设施的运维。但是，甲方监督员或其指定代表进入项目场地或乙方的办公场所不应不适当地干涉乙方对项目的正常运维工作。
- (b) 应甲方的要求，乙方应在十日内提供：
 - (i) 自进入运维日起，在每个季度结束后的十日内提交的一份关于项目运维的报告；

- (ii) 甲方认为必要的任何其他运维资料和信息。

17.4 甲方介入运维

如果甲方认为：乙方未能按照本合同的规定运维本项目，且乙方在收到甲方通知后的三十日内或双方另行商定的合理期限内未能就上述情况进行补救的，则甲方有权自行或者委托第三方介入项目运维工作，费用和 risk 均由乙方承担。甲方有权在向乙方提供详细的费用和支出记录后，从运营维护履约保函项下提取该款项。当运营维护履约保函不足以支付运维费用时，甲方有权从可用性服务费中支取该费用。

当甲乙双方对运营期间绩效考核结果产生争议时，由双方认可的第三方机构或组织对运维绩效考核进行评定。

乙方连续两年运维考核未达标，政府方有权终止合同，视为乙方违约。

17.5 对项目进行变动

在运营期内，乙方征得甲方书面同意后可以对项目进行更新改造，改造程序和费用适用本合同第 14 条(乙方要求的变动)的规定。

17.6 运维承包商

- (a) 乙方在报经甲方事先书面同意后，可选择第三方运维承包商负责项目的运维的，应按照经甲方事先书面认可的遴选方式、资格条件、业绩要求等，依法选择一家在相同项目性质方面具有丰富经验的专业运维商，并将有关结果报甲方备案。乙方委托指定单位进行运维的不免除乙方应当承担的运维责任。
- (b) 乙方对甲方的责任
- (i) 甲方对运维承包商的认可并不解除乙方在本合同项下的任何义务。乙方对于运维承包商或由其有关人员的任何作为或不作为对甲方承担完全的责任。
- (ii) 运维合同应包含使运维承包商能够履行本合同项下的义务所必需的条款或规定。
- (c) 乙方直接负责本项目的运维，并自行承担项目的所有费用和 risk。乙方应保证在合作期内完全有能力按谨慎工程和运营惯例运维本项目，使本项目处于良好的运维状态并能够安全稳定地进行运维。

第十八条 运营维护履约保函

18.1 运营维护履约保函交纳

乙方应自正式开始运营之日起十五(15)个工作日内向甲方交纳运营维护履约保函：

- (i) 符合本合同附件 5《运营维护履约保函》规定的格式；
- (ii) 金额为人民币壹仟贰佰万元整（小写：¥12000000.00）。

18.2 恢复运营维护履约保函的数额

如果甲方在项目合作期内根据本合同的有关规定提取运营维护履约保函项下的款项，乙方应确保在甲方提取后的十个工作日内，将运营维护履约保函的数额恢复到本合同第 18.1 条规定的数额，且应向甲方提供运营维护履约保函已足额恢复的证据。甲方提取运营维护履约保函的权利不影响甲方在本合同项下的其他权利，并且不解除乙方因不履行维护本项目义务而对甲方所负的任何进一步的责任和义务。

18.3 运营维护履约保函的退还

除第 18.4 条的情形外，运营维护履约保函应于提交移交维修履约保函之后 1 个月内退还，不计利息。

18.4 未恢复运营维护履约保函的约定

- (a) 如果乙方没有遵守第 18.2 条的规定，并且乙方在收到甲方要求其履行义务的书面通知后七个工作日内未予以纠正，甲方有权：
 - (i) 提取届时有效的运营维护履约保函下的全部款项；
 - (ii) 扣留在本合同下由甲方或其指定机构应支付给乙方的款项，直至乙方完全履行其在第 18.2 条项下的义务或直至所扣留的金额和在(i)项下提取的数额总共达到本合同 18.1 条规定的运营维护履约保函最高额为止。
- (b) 甲方应保证按第 18.4(a)条提取或扣留的所有款项，用于承担运营维护履约保函担保的相同义务，并且应在下述两个日期中的较早的一个日期将该等款项未使用的余额交予乙方：
 - (i) 乙方完全履行其在第 18.2 条项下的义务之日；
 - (ii) 提交移交维修履约保函之次日，如果本合同提前终止，则在终止日后的第三个月届满之日。

第八章 项目绩效指标及政府付费

第十九条 项目可用性绩效指标及服务费

19.1 项目可用性绩效指标

详见本合同附件 3 绩效考核办法（本绩效考核办法在签署正式 PPP 合同前，由甲乙双方依据国家、省市最新相关标准并参考同类项目绩效考核办法修改完善后执行。）。

19.2 项目可用性服务费

(a) 本项目可用性服务费计算公式

运营期当年可用性服务费 = [项目全部建设成本 × (1 + 合理利润率) × (1 + 年度折现率)ⁿ] / 运营补贴周期 (年)，运营期第 1 年 n=1。

(1) 项目全部建设成本 = 建筑安装工程费 + 工程建设其他费 + 预备费 + 建设期利息

其中，

建筑安装工程费：中标社会资本投标报价中为人民币壹拾壹亿玖仟叁佰壹拾柒万捌仟贰佰贰拾贰元捌角捌分（小写：¥1193178222.88），最终以政府方审定的实际金额为准；

工程建设其他费：暂定 41741.4 万元，最终以政府方审定的实际金额为准；

预备费：暂定 2302.92 万元，最终以政府方审定的实际金额为准；

建设期利息：暂定 6846.80 万元，建设期利息按以下方式调整，据实结算：

- 1) 计算基数：建筑安装工程费 + 工程建设其他费 + 预备费 - 项目资本金
- 2) 年利率：同投标人所报年度折现率；
- 3) 计息期：2 年；
- 4) 资金投入方式：均匀投入（年借款额 = 计算基数 / 计息期）；
- 5) 各年应计利息：（年初借款本息累计 + 本年借款额 / 2）× 年利率；
- 6) 计算公式：∑ 各年应计利息。

(2) 合理利润率：本项目合理利润率为 6.37%。

(3) 年度折现率：中标社会资本投标报价中为 1.200 倍 * 五年期以上贷款基准利率（4.9%），即 5.88%；

(4) 运营补贴周期：本项目运营期为 13 年。

(5) 本项目合作期内项目可用性服务费总额为【2762981490.20】元（具体结算时按照经政府结算审计的建筑安装工程费带入公式计算即可）。可用性服务费在运营期内

每年支付一次。可用性服务费最终支付金额须根据本项目绩效考核办法确定。

(b) 本项目可用性服务费支付时间

可用性服务费自运营期开始之日起，按每年计取支付，第一次支付时间为项目全部工程完（竣）工验收完成1年后的2个月内，第二次支付时间为项目完（竣）工验收2年后的2个月内，以此类推。

如非乙方原因导致工期延误，则甲方应自运营期开始之日起1年后的2个月内支付首笔可用性服务费。

(c) 可用性服务费调价方式：

本项目可用性服务费除工程变更、利率变动、工程造价政策性调整和主材价格变化外不予调整；审计结束后以政府审定总投资调整可用性服务费计算基数。

(i) 工程变更：工程量的确认和工程变更造成的造价调整必须取得监理单位 and 市重点局按相关规定给予的审核确认；投标报价中有相同或类似综合单价的，按相同或类似中标综合单价计量；投标报价中无相同或类似综合单价的，按约定的造价编制原则重新组价后的综合单价*（本项目建筑安装工程费中标价/本项目建筑安装工程费控制价）进行结算。重新组价按以下原则进行：材料价格执行编制控制价时采用的同期信息价，信息价中若没有，按造价管理部门备案价格执行；机械台班单价按上述机械台班费用定额执行；人工费单价按安徽省最新政策文件规定执行。

项目公司出于优化方案、节省开支等合理或经济性考虑提出的工程变更要求，在报实施机构审核通过后实施，工程量增加导致的成本费用由项目公司自行承担，工程量减少所带来的直接成本减少及对应产生的收益由政府方和项目公司按 30%：70%比例分享。

(ii) 工程造价政策性调整和主材价格变化：项目实施过程中，对于市场波动发生的变化，人工定额、规费发生政策性调整时，按照安徽省建设工程造价管理部门发布的工程有关最新文件（含地方政府出台的相关文件）进行调整；主材价格变化（变化指项目从监理工程师签发开工令之日起至项目主体工程完工之日期间淮南市建设工程信息价发布的主材信息价）参照淮南市相关规定执行。

(iii) 利率变化：每年调整一次，当运营期内央行（中国人民银行，下同）规定的贷款基准利率调整时，以每个运营年度第一天的贷款基准利率为准，按本须知前附表规定的计算方式，调整该年度可用性服务费。

项目进入运营期之日指该项目第1个运营年度第一天，第2年当月当日为第2个运营年度第一天，如发生闰年，则向前追溯1天，以此类推。

当央行取消贷款基准利率时，后续付费按取消前最后一次公布的基准利率执行。

第二十条 项目运维绩效指标与考核

20.1 项目运维绩效指标

本项目运维绩效考核指标详见附件3绩效考核办（本绩效考核办法在签署正式PPP合同前，由甲乙双方依据国家、省市最新相关标准并参考同类项目绩效考核办法修改完善后执行。）。

20.2 项目绩效服务费

中标社会资本投标报价中年度绩效服务费为人民币 壹仟零伍万陆仟陆佰元（小写：¥10056600.00）。

本项目合作期内项目绩效服务费总额为 人民币壹亿叁仟零柒拾叁万伍仟捌佰元（¥130735800.00）（运营期按13年计，如遇运营期调整，绩效服务费总额的调整由双方协商确定，具体以审定金额为准）。政府付费与乙方运维绩效表现挂钩，如果乙方未能达到约定的绩效标准，则会扣减绩效服务费。

支付时间：运维绩效服务费自运营期开始之日起，按年计取支付，第一次支付时间为项目工程完（竣）工验收1年后2个月内，第二次支付时间为项目完（竣）工验收2年后的2个月内，以此类推。

绩效服务费调价方式：

1) 项目验收合格进入运营期后，运维绩效服务费每二（2）年调整一次，主要针对居民消费价格指数（淮南市统计局公布的当期CPI数值）等因素变化进行定期调整，调整公式如下：

$$PO_{m+1}' = PO_m \times CPI_m \times CPI_{m-1} \times 10^{-4}$$

$$PO_{m+2}' = PO_{m+1}'$$

$$(m=2,4, 6, 8, 10,12)$$

PO_m 为中标人在第 m 个运营年度适用的运维绩效服务费；

PO_2 为中标人在投标文件中报出的第2个运营年度的运维绩效服务费；

CPI_m 为由淮南市统计局公布的第 m 个运营年度淮南市居民消费价格指数；

CPI_{m-1} 为由淮南市统计局公布的第 $m-1$ 个运营年度淮南市居民消费价格指数；

PO_{m+1}' 为调整后第 $m+1$ 个运营年度适用的运维绩效服务费；

PO_{m+2} 为调整后第 $m+2$ 个运营年度适用的运维绩效服务费，与 PO_{m+1} 相等。

当 $CPI_m \times CPI_{m-1} \times 10^{-4}$ 大于 115% 时，按 115% 计算。

第二十一条 政府付费程序

政府方授权实施机构根据乙方的考核情况，将服务费用支付给乙方。

政府付费支付具体程序：

淮南市重点工程建设管理局根据项目公司的考核情况核定服务费用，并按以下程序进行支付：

- (1) 淮南市重点工程建设管理局告知项目公司的考核情况并由项目公司予以确认；
- (2) 项目公司将根据考核结果确定的政府应付费账单（附相关计算明细及实施机构出具的服务质量合格，同意支付价款的文件）报淮南市重点工程建设管理局审核；
- (3) 淮南市重点工程建设管理局审核确认无误后向淮南市财政局申请拨付资金；
- (4) 淮南市财政局将相关款项拨付给淮南市重点工程建设管理局，由淮南市重点工程建设管理局支付给项目公司。具体费用支付方式由淮南市财政局按照相关法律法规规定执行。

第九章 项目移交

第二十二条 项目移交

22.1 移交范围

在移交日期，乙方应向接收人无偿移交，包括但不限于以下内容：

- (a) 乙方项目设施或项目资产的所有设备、资产、专利及非专利技术、法律文件等一切与项目稳定运营相关的资产或者权利；
- (b) 甲方可以合理要求的且此前乙方未曾按照本合同规定交付的运营、维护、修理记录、移交记录和其他资料，以使甲方或其指定机构能够继续本项目的稳定运维。

乙方向接收人移交项目设施或项目资产时，应解除和清偿完毕乙方设置的所有债务、抵押、质押、留置、担保物权，以及源自本项目的建设、运维的由乙方引起的环境污染及其他性质的请求权。

22.2 移交委员会和移交程序

移交之日1年前，甲方和乙方应成立移交委员会，由乙方三（3）名代表和甲方三（3）名代表（包括至少一名接收人的代表）组成，各方代表应取得相应授权并提交授权委托书备案。移交委员会应定期会谈，必要时经双方同意可随时会谈，以便于商定以下事项：

共同商定项目设施移交的详细程序、培训计划的实施和移交清单（设施、设备、物品、文件资料、权利或权益凭证、零配件和备品备件详细清单等）；

项目移交委员会应严格按照性能测试方案和移交标准对移交资产进行性能测试。性能测试结果不达标的，移交委员会应要求项目公司进行恢复性修理、更新重置或提取移交维修履约保函。

22.3 移交验收

22.3.1 移交验收

在最后恢复性修理后并在移交日期之前，甲方应在接收人和乙方代表在场时对本项目进行移交验收。如发现存在缺陷的，则乙方应及时修复，如果乙方不能自前次验收日起三十日或双方同意的更长时间内修正任何上述缺陷，则甲方可以自行修正，由乙方承担风险和费用。甲方应有权从移交维修履约保函中或在可用性付费中支取费用以补偿修正上述缺陷的支出，但是需将发生的支出详细记录提交给乙方。

22.4 备品备件

22.4.1 移交的备品备件

在移交日期，乙方应向接收人无偿移交十二个月内正常运营需要的消耗性备件和修理备品备件，备品备件清单双方另行商议确定。

22.4.2 移交程序

- (a) 移交委员会应在移交日期前会谈并商定移交项目资产清单（包括备品备件的详细清单）和移交程序。
- (b) 乙方应提供移交必要的文件、记录、报告等数据，作为移交时双方的参考。
- (c) 除本合同另有规定外，双方在完成项目资产移交程序前，均应继续履行其本合同项下的义务。

22.5 保证期

22.5.1 移交日期本项目的状况

在移交日期，乙方应保证本项目：

- 1) 处于良好的运维状况，得到良好维护，正常损耗除外；
- 2) 符合本合同所规定的安全和环境标准；
- 3) 符合本合同中所规定的移交标准。

22.5.2 质量保证期

乙方进一步保证在移交日期后十二个月届满日期间，修复由原材料、工艺、施工、运维或管理缺陷或合作期内乙方的任何违约造成的项目设施任何部分出现的任何缺陷或损坏(正常磨损除外)，并承担因环境污染引起的责任。

甲方发现任何上述缺陷或损坏及环境污染责任后应及时通知乙方。在任何情况下，上述通知最迟应在十二个月的保证期结束前送达。收到该通知后，乙方应尽快自费修正缺陷。如果乙方在收到甲方通知后三十日内不能或拒绝修正缺陷，甲方有权自己或请第三方修正上述缺陷。在这种情况下，乙方应向甲方支付合理且必要的修理费用，而且甲方有权提取移交维修履约保函中相应金额以补偿此项费用，移交维修履约保函不足以弥补政府方损失的，甲方有权继续追偿。

除非因乙方严重不当行为，根据第22.5.2款乙方对甲方的责任应限于移交维修履约保函项下的金额。

22.5.3 未能修复缺陷或损害的赔偿

如果乙方为符合本合同规定的标准所需进行的对本项目设施缺陷或环境污染等修复无法实现或代价过高而不经济的，则甲方有权因本项目的性能指标降低而获得赔偿。

甲方有权提取移交维修履约保函获得上述赔偿，不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。

22.6 移交维修履约保函

22.6.1 移交维修履约保函的提供及有效期

(a) 移交维修履约保函的提供。乙方应当从运营期结束开始至至合作期结束后 12 个月退还，在此期间内，乙方应保证移交维修履约保函的持续有效。乙方应于自运营期结束前 10 日向甲方提供符合下列要求的移交维修履约保函，作为其履行在本合同下移交期间的修复义务和其他违约赔偿义务的担保：

(i) 符合本合同附件 5《移交维修履约保函》规定的格式；

(ii) 金额为人民币陆仟万元整（小写：¥60000000.00）。

(b) 移交维修履约保函的有效期。移交维修履约保函在乙方应于自运营期结束前第 12 个月开始之日提交至合作期结束后 12 个月退还期间始终有效。

22.6.2 恢复移交维修履约保函的数额

如果甲方在移交维修履约保函担保期限内根据本合同的有关规定提取移交维修履约保函项下的款项，乙方应确保在甲方提取后的十四日内，将移交维修履约保函的数额恢复到本合同前款约定的数额，且应向甲方提供移交维修履约保函已足额恢复的证据。甲方提取移交维修履约保函的权利不影响甲方在本合同项下的其他权利，并且不解除乙方因不履行维护本项目义务而对甲方所负的任何进一步的责任和义务。

乙方未在前述期限内补足或恢复移交维修履约保函相应金额的，甲方有权发出催告，乙方应在三十日内予以补足；乙方在前述期限内仍未补足的，则甲方有权提取移交维修履约保函项下的余额。

22.7 保险和承包商保证的转让

在移交时，乙方应将所有承包商和供应商提供的尚未期满的担保及保证无偿转让给接收人，并且将所有保险单、暂保单和保险单批单转让给接收人。接收人应支付或退还上述移交之后保险期间的保险费。

22.8 技术转让

乙方应在移交日期将届时使用的运维本项目所必须的乙方享有所有权的所有技术和专利技术，无偿移交给甲方或其指定的接收人，并确保甲方或其指定的接收人不因此遭受损失。如果该等技术和专利技术为第三方所有的，则乙方应当协助甲方或其指定的接收人按照实际使用费用取得这些技术和专利技术的使用权。

22.9 人员及培训

合作期结束的六（6）个月之前，乙方应提交一份当时乙方员工名单，包括每位员工的资格、职位和收入的细节。甲方有权选择在移交日之后优先继续聘用全部或部分员工。

甲方或其指定机构需要在移交日之前派驻人员到项目设施所在地进行培训或学习的，应在移交日六个月之前向乙方说明情况及拟派驻人员名单，乙方免费负责为上述人员提供培训，使之达到熟练操作和管理要求。作为移交的一部分，甲方和乙方应联合考试，以确定被指定人员经过培训合格，可以接管本项目的独立运维。

22.10 乙方与第三方合同期限及相关

乙方在与第三方签订运维合同、设备合同及其他合同时，应使得该等合同的有效期限届满日不超过本项目合作期限届满日。

如在移交日前，乙方需签订运维合同、设备合同及其他合同，且该等合同在本项目合作期届满后仍为有效的，则乙方同样应在该等合同签订前报经甲方同意。未经甲方同意的，由乙方承担相应责任。

22.11 移走乙方相关的物品

除非双方另有合同，乙方应于移交日期之后六十日内，自费从场地移走仅限于乙方员工的个人用品以及与本项目运维无关的物品，不包括移交清单所列的项目设备、备品备件、技术资料或者项目设施营运和维护的必需物品。如果乙方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方之后，可以移走并将物品转运至适当的地点以便安全保管。乙方应承担搬移、运输和保管的合理费用和 risk。

22.12 风险转移

除按本合同约定的风险承担方式外，乙方应承担移交日期前项目设施的全部或部分损失或损坏的风险。

22.13 移交费用和批准

乙方及甲方应负责各自因向接收人移交和转让发生的费用和支出。甲方应自行负责其获得所有的批准并使之生效，并采取其他可能为移交和转让所必需的行动，并且应支付与移交和转让有关的所有印花税、税收、收费和类似的费用。如果乙方未按第22条规定的范围和内容进行移交，甲方为此发生支出或遭受损失，甲方有权从运营维护履约保函及移交维修履约保函中扣除。

第十章 违约和终止

第二十三条 不可抗力

23.1 不可抗力引起的中止、终止履行

(a) 不可抗力事件

任何一方由于出现不可抗力事件使该方无法全部或部分履行其本合同项下的义务致合同目的不能实现时，该方应有权中止履行本合同项下的义务。

不可抗力应包括但不限于下列事件：

- (i) 雷电、干旱、火灾、地震、火山爆发、山崩、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、台风或龙卷风；
- (ii) 流行病、饥荒或瘟疫；
- (iii) 战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用、禁运、暴乱或民众骚乱、恐怖行为、军事演习或政变；
- (iv) 不能合理预见的重大交通阻滞或停运；
- (v) 化学或放射性污染或核辐射。

(b) 适用于乙方的例外情况

乙方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行本合同或不完全履行本合同项下义务：

- (i) 乙方的承包商或其他与乙方建立合同关系的第三方在履行合同方面发生延误；
- (ii) 项目设施的故障或正常磨损。

(c) 适用于甲方的例外情况

甲方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行或不完全履行本合同项下义务：

淮南市人民政府及其上级部门对项目设施或其任何部分实行的不予退还、充公或国有化。

(d) 通知

声称受到不可抗力影响的一方应在知道不可抗力之后十四日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，根据对方要求提供证明，并及时采取措

施减少损失范围。

(e) 损失承担原则

发生不可抗力时。物权所有人承担物权灭失风险，双方各自承担自身人员、机械设备、停工损失及相应费用，工期顺延，清理、修复费用物权所有人承担。

(f) 减少损失的责任和协商

受到不可抗力影响的一方应努力减少不可抗力的影响。双方应协商采取合理的补救措施尽量减少不可抗力给各方带来的损失。

声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

(g) 不可抗力造成的终止

当不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续九十日以上时，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者终止本合同。如果自不可抗力发生后一百八十日之内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本合同。

第二十四条 违约及赔偿

除本合同已有规定外，双方的违约及赔偿按以下规定执行：

24.1 甲方违约及赔偿

(a) 征地拆迁违约

若因政府方未能按承诺移交作业场地的，则免除乙方相应的延误违约责任，工期相应顺延。

(b) 可用性服务费及绩效服务费支付的违约

甲方未按照本合同及有关规定，向乙方支付相应的服务费，则乙方有权向甲方发出催告，如在催告通知后三十日内甲方仍未能支付的，则甲方除应支付应付未付的可用性服务费或绩效服务费外，还应以应还金额为基数按当期央行规定的金融机构五年期以上贷款基准利率上浮 30%（按年）和延误时间（按年）计算支付违约金。不满 1 年的，按日折算。

24.2 乙方违约及赔偿

(a) 因乙方原因，乙方在签订 PPP 项目合同后的 30 日内未完成注册成立项目公司，项目公司成立后，在项目入库信息更新完成，甲方确保将本项目政府付

费纳入淮南市中长期财政规划并配合满足 PPP 项目融资要件要求条件下 90 日内完成融资交割（宽限期 1 个月），项目公司的社会资本股东方负责协助项目公司获得融资，因项目公司项目融资未能按建设资金需求全部到位，且影响工程建设的，则由社会资本股东方提供全部差额融资资金。若社会资本股东方无法提供全部差额融资资金，则视为项目公司单方面违约，政府方有权取消其合同履行资格，项目公司向政府方支付相当于本项目资本金的 20% 的违约金。

(b) 延迟开工、竣工

未按要求完成阶段性工程任务即视为工期违约，如果给予了相应的整改时间，仍然不能依约履行合同，则属于根本性违约，政府方有权提前终止合同。

对政府提供的单个项目，若无合理原因乙方延迟开工达七日及以上，以及项目完工日自开工令载明开工日期之日起计算超过约定建设工期，则乙方应承担相应的违约责任，按照 5 万元/日计算违约金，违约金最高金额为单个项目工程费用的 2%。

未按要求完成阶段性工程任务即视为工期违约，如果给予了相应的整改时间，项目公司仍然不能依约履行合同，则属于根本性违约，政府方有权解除合同。自开工令载明开工日期之日起计算，若项目完工日超过总工期，则社会资本方应承担相应的违约责任，按照 5 万元/日计算违约金，最高不超过实际损失的 30%。若社会资本方承诺了完工时间，超过承诺时间的按前述标准执行；若社会资本承诺了项目开工时间，未按时开工参照前述标准执行。

(c) 运维绩效不达标

甲方根据附件 3 约定运维绩效指标进行绩效考核，如乙方未在规定的时间内改正或改正的效果未能达到本合同约定的标准的，则甲方有权视情形提取运营维护履约保函项下的相应金额。

24.3 不减免和影响的事项

违约方对违约责任的承担并不能减免其在本合同下的其他任何义务。

双方获得上述违约赔偿的权利不影响其在本合同项下的终止权。

24.4 减轻损失的措施

由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理措施减少损失、防止损失扩大。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能减少的损失金额。受损害的一方有权从另一方获得因采取减轻和减少损失措施而发生的任何合理费用。

24.5 受损害方造成的损失

如果损失部分是由于受损害方的不恰当的作为或不作为造成的，则另一方赔偿的数额中应扣除该损失部分。

第二十五条 终止和终止补偿

25.1 甲方发出的终止

下述任一行为发生时，甲方有权立即发出终止意向通知：

- (a) 乙方在本合同 3.2 条的承诺被证明在做出时存在虚假或未兑现，严重影响其履约能力；
- (b) 乙方未能根据本合同约定提交建设期履约保函、运营维护履约保函或移交维修履约保函（并使得上述保函保持有效）；
- (c) 乙方出现本合同第 16.2 条及第 16.3 条约定的放弃建设或视为放弃建设情形的；或者因乙方出现 24.2（a）、（b）约定的导致合同终止情形的；
- (d) 乙方被依法吊销营业执照、责令停业、清算或破产；
- (e) 贷款人开始行使其担保合同项下的担保权利并可能造成项目无法正常运维；
- (f) 除报经甲方同意的计划内维修外，未经甲方事先书面同意，乙方擅自停止对项目的运维的（如属紧急情况的除外，但应在发生的同时口头告知甲方，并应在发生后 1 日内书面报告甲方）；
- (g) 未经甲方同意，乙方擅自出租、质押、转让项目经营权或擅自进行股权转让的等。

25.2 乙方发出的终止

下述任一事件发生时，乙方有权立即发出终止意向通知：

- (a) 甲方在本合同第 3.1 条的承诺及其他任何声明和保证被证明是虚假的或未兑现，使乙方履行本合同的能力受到严重不利影响；
- (b) 甲方无正当理由在逾期六个月（自应付日起算）后仍未支付可用性服务费和/或绩效服务费。

25.3 法律变更或政府行为

如果在本合同生效后，因法律变更及政府行为导致乙方部分或全部不能履行本合同项下主要义务，而这种变化和影响又不以甲方的意志为转移，甲乙双方应尽力就继续履行本合同进行协商，若不能达成一致，则一方可向另一方发出终止意向通知。

25.4 协商一致终止

在合作期内，由各方协商一致可提前终止本合同，此种情形下的终止及对应提前终止补偿的计算问题等，由各方届时协商一致。

25.5 终止意向通知和终止通知

(a) 终止意向通知

按照第 25.1 或 25.2 或 25.3 条发出的任何终止意向通知均应同时向贷款人发出一份复印件。在终止意向通知发出之后，双方应在三十日内协商避免本合同终止的措施。

如果乙方和甲方就将要采取的措施达成一致意见，或者乙方或甲方(视情况而定)在相应的协商期或双方可能同意的更长的时间内纠正了违约行为，终止意向通知即自动失效。

(b) 终止通知

在协商期届满之时，如果

- (i) 双方未达成一致；
- (ii) 导致发出终止意向通知的违约行为未得到纠正。

则发出终止意向通知的一方可以向另一方和贷款人就此发出终止通知，本合同在终止通知送达对方之日终止。

25.6 甲方基于本条享有的权利

(a) 对设施的运维权利

- (i) 在项目合作期内，如果乙方发生第 25.1 条所述行为，甲方发出终止意向通知之后，甲方或其指定机构有权接管项目设施的运维，但在任何情况下无义务替代乙方接管项目设施的运维，以使项目设施继续运维或完成任何必要的修理以保证项目设施继续运维。乙方保证与甲方或其指定机构合作，并应在与贷款人的融资文件中作出具有同样内容的承诺。
- (ii) 任何情况下，甲方选择运维项目设施不应被视为经营权的转让或承担乙方作为项目设施经营权所有人的义务。
- (iii) 在甲方或其指定机构运维项目设施期间，乙方无义务支付在甲方及其指定机构接管项目设施的运维之日以后发生的运维费用（但因乙方原因导致的甲方或其指定机构运维费用增加、超支由乙方负责补足）。甲方无义务向乙方支付任何服务费，直至乙方按照本合同接替或承担项目设施的运维。

(iv) 甲方应有权在任何时候退出项目设施的运维，在此情况下乙方应全面负责项目设施运维，直到任何一方发出终止通知。

(b) 终止本合同的权利。

如果在第 25.1 条所述事件发生之后，甲方已发出终止意向通知，并且乙方违约行为在协商期期满之日前未得以补救，则甲方应有权在上述日期之后合同履行期满前的任何时间发出终止通知终止本合同。

25.7 终止的后果

本合同终止后，双方在本合同项下不再有任何进一步的义务，但到期应付的款项除外；本合同的终止不影响本合同中争议解决条款和任何在本合同终止后仍然有效的其他条款的效力。

25.8 终止后的补偿

在 PPP 项目运作中，政府或者项目公司违约将导致项目合同实施受阻，如果违约方在预定限期内（3 个月）无法补救，则合同相对方有权提前终止 PPP 项目合同。

(1) 提前终止条件

根据违约方的不同，所触发的提前终止条件和各方的权利义务有所差异。

1) 政府方违约而导致项目提前终止

在约定政府方违约事件时，应谨慎考虑这些事件是否处于政府方能够控制的范围内并且属于项目项下政府应当承担的风险。发生政府方违约事件，并且政府方在一定期限内未能补救的，项目公司可根据合同约定主张提前终止 PPP 项目合同。

2) 项目公司违约而导致项目提前终止

项目公司违约事件是指发生项目公司没有履行或者没有完整履行项目合同下项目公司应当承担的义务，并且项目公司和融资方或融资方指定的第三方均未能规定的期限内对该违约进行补救，政府方可根据合同约定主张终止 PPP 项目合同。

3) 政府方选择终止

由于 PPP 项目涉及公共产品或服务供给，关系社会公共利益，因此 PPP 项目合同中，政府方应当享有在特定情形下（如项目所提供的公共产品或服务已经不合适或者不再需要，或者会影响公共安全和公共利益）单方面决定终止项目的权利。

4) 不可抗力事件而导致项目提前终止

淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目合同

发生不可抗力事件的状态持续或累计达到一定期限，政府或项目公司任何一方均可主张提前终止项目。由于自然不可抗力属于双方均无过错的事件，因此对于自然不可抗力导致的项目提前终止，由政府和项目公司共同承担。

若本合同终止，甲方选择提前终止时按照如下标准向乙方支付补偿（终止时，甲方对于乙方的提前终止补偿须以乙方还清其届时之所有负债为前提）：

表 1 提前终止补偿情形及终止补偿金表

条款号	本合同提前终止之情形	终止补偿金
1	项目公司违约	建设期终止时，为 $0.95A_1+E$
		运营期终止时，为 $0.95A_2-B+E$
2	政府方违约	建设期终止时，为 A_1+B+E
		运营期终止时，为 A_2+E
3	法律变更或政府行为	建设期终止时，为 $A_1+35\%B+E$
		运营期终止时，为 $A_2+35\%B+E$
4	不可抗力	按资产所有权归属各自承担，扣除项目公司可获得的保单价值部分

其中：

A_1 为项目已完工程总投资，以结算政府审计为准；

A_2 为项目公司尚未收回的可用性服务费现值（不考虑合理利润，折现率按竞争所确定数值计算）；

B 取值为 3500 万元；

E 为终止后根据本合同的约定，项目公司应向政府方移交运维所需的零部件、备品备件等的合理评估值。

政府方有权自本项目终止日起算 2 年内分期分批次向项目公司支付终止补偿金，具体分批次的支付比例及时间进度安排由政府方确定。

若属建设期项目公司违约造成中止的，政府方有权在建设期履约保函中提取全部担保金额作为项目公司违约金，不足以弥补政府方损失的政府方有权向项目公司继续追偿。

政府方与项目公司就提前终止补偿事宜达成协议后，项目公司对该项目的相关权益转归政府方所有。

第十一章 争议的解决

第二十六条 争议的解决

26.1 争议解决

因解释或履行本合同过程中产生的任何协商难以解决的争议时，由双方各选定 1-2 名具有相应资质和能力的专家，并随机抽取 1 位具有相应资质和能力的专家，共同成立技术与争议解决委员会，专门负责解答项目技术重点和难点，解决争议。若不能解决争议，双方约定将争议提交项目所在地有管辖权的人民法院。

26.2 争议解决期间的继续履行

在争议提交人民法院解决期间，各方应继续履行其在本合同项下的各项义务并继续享有其在本合同项下的所有权利，确保不因争议影响项目本身的稳定运行。

26.3 继续有效

第 26 条规定的争议解决条款在本合同终止后继续有效。

第十二章 其它

第二十七条 解释规则

27.1 合同文件构成及优先顺序

- (a) 本合同包括全部附件内容，每一份附件都应被视为本合同的一部分。
- (b) 双方约定合同文件的地位和优先顺序如下：本合同及附件；招标文件（含补充文件及澄清答疑文件）；中标供应商的投标文件等。

27.2 合同变更

1. 未经双方书面同意，不对本合同进行重大修改或变更。
2. 本合同任何修改、补充或变更必须经双方协商一致并签字盖章后方具有法律约束力。如果根据届时有效的相关法律或法规的规定而需要政府有关部门审查批准的，则自政府有关部门审查批准之日起对甲乙双方产生约束力。
3. 本合同履行期间，双方可根据届时有效的相关法律或法规的规定，对本合同的某一部分进行修改、补充或变更；双方确认的对本合同有效的修改、补充或变更的书面文件或书面材料，均与本合同具有同等法律效力。如其内容与本合同存在冲突或矛盾的部分，以修改、补充或变更的内容为准：

(1) 合同变更触发条件

- 1) 适用法律的变化，影响任一方主要权利义务的；
- 2) 国家、行业及地方有关项目建设、运维方面的标准提高；
- 3) 因不可抗力或非因合同任一方的原因，导致合同部分条款无法履行；
- 4) 一方当事人丧失履约能力；
- 5) 因情况发生变化，当事人双方协商一致同意。

(2) 合同变更的启动（双方协商确定）

定期变更：本项目竣工验收完成时，如届时项目合作的外部条件与 PPP 项目合同签署时的相比发生了重大变动，则双方可于竣工验收完成后 1 个月内启动一次变更。另外，如项目运营期 3 年后项目合作的外部条件与 PPP 项目合同签署时的相比发生了重大变动，则双方亦可以启动一次变更。

临时变更：如果法律变更、规划调整或者项目公司本身（较合同签署时）发生重大变更，影响任一方重大利益的或者影响公共利益或安全的，则任一方可发起变更程序。

(3) 合同变更规则

各方应在 PPP 项目合同签署时明确变更规则，对不可变更或谈判的条款，原则上在项目合同期限内不允许变更或协商修订，仅针对导致变更的情形所带来的重大变化协商相应的解决机制，并据此修订合同文本。

(4) 合同变更的效力

合同变更未涉及的条款仍持续有效，变更条款和原 PPP 项目合同约定不相一致的，以变更后文本约定为准。

如果本合同的任何条款不合法、无效或不能执行，则

- (i) 并不影响其他条款的效力和执行；
- (ii) 双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效并可执行；修改或更改应尽可能平衡双方之间的利益。

27.3 合同展期

在以下情形发生时，合同双方可考虑对合同期限进行适当的延长：

- (1) 因可归责于政府方的原因导致工期延误的；
- (2) 因政府财政预算的调整，使得相应的支付能力受到影响；
- (3) 项目公司在经营期内履约记录良好，在符合届时适用法律规定的前提下，双方协商一致同意展期的。

27.4 项目新增改扩建需求等应对措施

如果未来政府方规划设计调整，或者政府方进行技术优化的，在不违反届时法律规定，且项目公司履约记录良好的情况下，报政府方书面批准后，可由项目公司负责相应的改扩建工程。

因规划调整、改扩建或技术优化所导致的增加的资本性支出和（或）者运营成本的，由项目公司与政府方按照相关法律法规规定，通过延长经营期、另行支付相应费用、调价或双方认可的其他方式予以平衡。

第二十八条 文件权利及保密

28.1 对文件的权利

(a) 甲方的文件

由甲方向乙方提供的文件和计算机程序及其他一切文件，或者主要在这些文件和计算机程序的基础上制作的文件和程序，应属于甲方的财产。这一规定适用于上述文件和

计算机的程序的所有复制件。这些文件、计算机程序或其复制件只能由乙方用于项目之目的。除非甲方和乙方另有合同，否则这类文件、计算机程序或复制件应在项目合作期结束之际归还甲方。

(b) 乙方的文件

由乙方向甲方提供的文件和计算机程序及其他文件，应属于乙方的财产。这些文件、计算机程序或其复制件只能由甲方用于项目之目的。

(c) 遵守规定

双方应确保各自接触到这些文件、计算机程序及其复制件的有关人员遵守本第 28.1 条的规定和 28.2 条的保密规定。

28.2 保密

任何一方或其员工、承包商、顾问获得的所有资料 and 文件(不论是财务、技术或其他方面)，未经另一方事先书面同意，在项目合作期最后一日之后的五(5)年期间不得向第三方透露或公开，但是法律要求的除外。

第二十九条 其他条款

29.1 日常事务代表

- (a) 在本项目合作期内，双方应各自指派一名日常事务代表，代表各方与对方进行日常事务的联系和沟通，日常事务代表应取得相应授权并提交授权委托书备案。
- (b) 各方应将自己的日常事务代表书面通知对方，若需变更，则应提前三十(30)日将继任人书面通知对方，否则视为未变更。

29.2 通知

- (a) 本合同项下的通知应以中文书写，并通过特快专递、邮寄或传真方式按下述地址送至或发至各方：

甲方：

地址：

邮编：

收件人：

传真:

乙方:

地址:

邮编:

收件人:

传真:

(b) 下述情况应视为已送达:

- (i) 若采用专人递交或邮寄方式(挂号、要求回执),在送寄至上述地址时;
- (ii) 如采用传真形式,在准确发送至上述传真号码,并收到对方的确认函时;
- (iii) 如果一方的地址或收件人更改时,应在新地址或新收件人启用五日前以上述通知方式通知另一方,否则应仍以原地址和收件人作为准。

29.3 适用法律

本合同适用中国法律。

29.4 合同文字

本合同以中文书写。合同正本一式捌份,各执肆份,各份合同书具有同等法律效力。

本合同由双方各自法定代表人或正式授权的代表在其签名下注明的日期签署。双方愿受本合同的法律约束。

29.5 改建扩建情形

在项目合作期内,政府方或第三方提出改建项目设施的,本项目合作期设施管理的原则为保证淮南市公用设施更新和发展的便利性,同时不增加项目公司对资产维护的责任范围,对维护工作量不产生重大影响的改建工作,项目公司具有质量监督义务和接收维护义务。涉及后期改建内容,目前尚无法预见可能出现的情况,因此设置为双方协商确定。

29.6 合同生效

本合同自双方签字盖章之日正式生效,其中需要政府审批才能生效的条款除外。

29.7 补充说明

本合同条款未尽事宜,双方另行协商签订补充协议,补充协议与本合同构成不可分割的整体,具有同等法律效力。

签署页（本页无正文）

甲 方：淮南市重点工程建设管理局



法定代表人：

日期： 年 月 日

乙 方：中铁六局集团有限公司



法定代表人：

日期： 年 月 日

乙 方²：中国葛洲坝集团建设有限公司



法定代表人：

日期： 年 月 日

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部 制 定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：淮南市路兴工程建设投资有限公司

承包人（全称）：中铁六局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目。

2.工程地点：淮南市。

3.工程立项批准文号：（淮重建管【2016】22 号、淮重建函【2014】102 号、淮重建函【2014】103 号）。

4.资金来源：自有 20%资金，其余 80%银行贷款。

5.工程内容：中兴北路及中兴南路的道路、桥梁、雨污水、交通、绿化、照明、地下综合管廊工程。

6.工程承包范围：中兴北路起止桩号 K0+000-K6+826.62、中兴南路道路起止桩号 K0+000-K3+034 的道路、桥梁、雨污水、交通、绿化、照明工程。中兴南路管廊起止桩号 AK0+000-AK2+880。

二、合同工期

计划开工日期：2019 年 7 月 15 日。

计划竣工日期：2021 年 7 月 14 日。

工期总日历天数： 731 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同总价为：人民币（大写） 伍亿玖仟陆佰伍拾捌万玖仟壹佰壹拾壹元肆角肆分 (¥596589111.44 元)，【其中不含税价：（大写） 伍亿肆仟柒佰叁拾贰万玖仟肆佰陆拾元零肆分 (¥547329460.04 元)，增值税税率为 9%，增值税额人民币（大写） 肆仟玖佰贰拾伍万玖仟陆佰伍拾壹元肆角 (¥49259651.4 元)】；其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写） 捌佰零肆万叁仟伍佰陆拾肆元玖角捌分 (¥8043564.98 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） \ (¥ \ 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） \ (¥ \ 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） 贰仟捌佰零柒万叁仟陆佰元整 (¥28073600 元)。

2. 合同价格形式： 采用综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理： 薄占朋。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 《淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目》合同文件；
- (2) 《淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目》中标通知书；
- (3) 《淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目》投标函及其附录；
- (4) 《淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目合同》专用合同条款及其附件；
- (5) 《淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目合同》通用合同条款；
- (6) 《淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊 PPP 项目投标文件》中关于建设的技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 《淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目投标文件》中关于建设的已标价工程量清单和预算书；
- (9) 其他合同文件、重点局及政府相关部门关于工程建设管理的相关办法规定、发包人针对本项目制定的规章制度和管理办法；

在合同订立及履行过程中形成的与《淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目合同》有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在安徽省淮南市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方盖章签 生效。

十三、合同份数

本合同一式 12 份，均具有同等法律效力，发包人执 7 份，承包人执 5 份。

(以下无正文)



(签字盖章页无正文)

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



组织机构代码: 3491340400MA2TULB2D

地 址: 安徽省淮南市大通区工业园

邮政编码: _____

法定代表人: 赵志明

委托代理人: _____

电 话: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____


账 号: _____



承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



组织机构代码: 91110108101884765M

地 址: 北京市海淀区万寿路2号

邮政编码: _____

法定代表人: 季志华

委托代理人: _____

电 话: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

开户银行: 交通银行北京定慧寺支行

账 号: 110060544018001830581

竣工验收报告

编号:

工程竣工验收报告

工程名称: 中一路南段(南纬山路-南纬十三路)建设工程

竣工日期: 2022年7月28日

验收组织单位(章)_____



搞好工程竣工验收与备案管理工作，对确保工程质量，维护建筑市场秩序，保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件，是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》由安徽省住房和城乡建设厅统一印制，任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式三份，由建设单位、施工单位、质量监督单位分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。

一、未经竣工验收的工程；

二、竣工验收不合格的工程（含无《工程竣工验收报告》的工程）；

三、对不合格的建设工程按照合格工程验收的；

四、工程质量监督机构责令停止使用，重新组织竣工验收的工程。

规划、城建档案、质量监督等工程竣工验收有关部门应当按照国家有关规定认真履行自己的职责；并应增强服务意识，提高办事效率，方便竣工验收工作。

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	铁路南段(南沿山路-南纬十二路)建设工程		工程地点	安徽省淮南市山南新区	
工程规划许可证号	地字第340400201600031	工程施工许可证号	340403191203001-SX-001	质量监督注册号	皖质监-XS-340403-2018-12-12
工程用途	市政公路	设计能力	城市主干道	造价	2988.97(元)
工程主要内容	淮南市中央路、南纬路及综合管廊PPP项目、中央路南段(南沿山路-南纬十二路)全长3.27km,主要构筑物包括各心板小桥和中桥各一座,施工内容包含道路、桥梁、雨污水、立交、绿化、照明等工程,为淮南市南北走向的主干路,路面设计宽度60m,双向六车道,外侧为辅道及人行道,设计时速60km/h,全线采用沥青混凝土路面。				
开工日期	2019.12.26	竣工日期	2022.7.28		
建设单位	淮南市重点工程建设项目管理中心(淮南市政工程设计研究院有限公司)	法定代表人	张永强		
单位地址	淮南市山南新区南纬路150米	项目负责人	盖勇		
勘察单位	淮南市勘察测绘设计研究院	资质等级	工程勘察	项目负责人	吴国三
设计单位	淮南市市政工程设计研究院有限公司	资质等级	工程勘察	项目负责人	纳辛
施工总承包单位	中国铁建重工集团有限公司	资质等级及证书号	市政公用工程总承包一级 9117010810188476519 130000134750500		
法定代表人	韦国 张仁兵	项目经理及证书号	张玉龙 皖1142016201708523 张文峰 1900359489		
分包单位	/	资质等级及证书号			
分包单位	/	资质等级及证书号			
分包单位	/	资质等级及证书号			
监理单位	国机中央工程咨询有限公司	资质等级及证书号	工程监理单位综合资质 E141001962-8/1		
法定代表人	李振文	总监及岗位证书号	段晓军 41001282		
工程质量监督机构					

注:本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	杭州余杭（南庄山） 一期安置房工程		结构类型	道路	工程规模	226800.00平方米
施工单位	中国核工业集团建设有限公司 杭州分公司		技术负责人	王红超, 赵云	开工日期	2019.02.26
项目经理	张国龙, 张华	项目技术负责人	李如堂, 丁峰	完成日期	2021.12.26	
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部工程	共 6 分部, 经查 6 分部, 符合标准及设计要求 6 分部			所有分部工程质量验收合格	
2	质量控制资料核查	共 13 项, 经审查符合要求 13 项, 经核定符合规范要求 13 项			质量控制资料即符合规定	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 6 项, 符合要求 6 项, 共抽查 6 项, 符合要求 6 项, 经返工处理符合要求 0 项			抽查再抽查项目即符合规定	
4	观感质量结论	共抽查 7 项, 符合要求 7 项, 不符合要求 0 项			好	
5	综合验收结论				工程质量合格	
建设单位		监理单位		施工单位	设计单位	
(公章)		(公章)		(公章)	(公章)	
参加验收单位	单位(项目)负责人	总监理工程师	单位负责人	单位(项目)负责人		
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	

注: 该表由施工单位填写, 验收结论由监理(建设)单位填写, 综合验收结论由参加验收单位共同商定, 建设单位填写。

工程竣工验收意见

淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目，中兴路中段（南纬山路—南纬七路）建设工程由中铁六局集团有限公司与中国核工业华兴建设有限公司组成的联合体施工，经参与竣工验收各单位共同商定，验收意见如下：

1. 设计功能基本满足使用要求，设计标准符合有关规定。
2. 建设单位要求严格，按相关建设规范要求办事，手续齐全，遵守国家有关规定，标准化执行国家有关强制性标准。
3. 勘察和设计单位认真履行职责，热情服务，施工单位按照设计规范要求施工，执行有关操作规范、行业标准，按设计文件施工，监理单位严格把关，公平公正，热情服务，严格按规范要求认真履行职责。

4. 经各参建单位协商，中铁六局集团有限公司施工的中兴路中段（南纬山路—南纬七路）建设工程验收如下：

本工程各分部工程均符合验收规范要求，质保资料齐全，符合要求，安全和使用功能符合要求，观感质量好。

5. 本工程未发现质量缺陷和难以修补的问题，满足正常使用要求。

验收组组长（签名）：姚永强

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

验收组成名单

[illegible]

专业管理部门验收意见

单 位	验 收 意 见
公安消防部门	年 月 日
规划部门	年 月 日
环保部门	年 月 日
城建档案管理机构	年 月 日

监督验收意见：

工程质量监督站（公章）

年 月 日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章；或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料 and 工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

编号:

工程竣工验收报告

管廊



工程名称: 淮南市中环路综合管廊工程、淮南市寿州大街综合管廊工程
(中环路综合管廊工程、寿州大街综合管廊工程)

竣工日期: 2022年7月28日

验收组织单位(章) 淮南市市政工程集团有限公司



搞好工程竣工验收与备案管理工作，对确保工程质量，维护建筑市场秩序，保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件，是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》由安徽省住房和城乡建设厅统一印制，任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式三份，由建设单位、施工单位、质量监督单位分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。

一、未经竣工验收的工程；

二、竣工验收不合格的工程（含无《工程竣工验收报告》的工程）；

三、对不合格的建设工程按照合格工程验收的；

四、工程质量监督机构责令停止使用，重新组织竣工验收的工程。

规划、城建档案、质量监督等工程竣工验收有关部门应当按照国家有关规定认真履行自己的职责；并应增强服务意识，提高办事效率，方便竣工验收工作。

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	淮南市市政综合管廊工程(淮南市 中大街综合管廊工程(中大街综合 管廊、中大街综合管廊))		工程地点	淮南市中大街、中大街	
工程规划 许可证号	建字第2004012 1900114号	工程施工 许可证号	3604031912030007 -SX-001	质量监督 注册号	建质监-XS- 360403-2019-12-105
工程用途	城市综合管廊	设计能力	市政公用管廊	造价	51123.38万元
工程主要 内容	本项目综合管廊长6.33km,最大埋深11m。管廊采用混凝土 现浇施工,标准断面,敷设高压电缆、电信、给排水管道的 综合舱(尺寸3100mm×3300mm)和敷设天然气管道的天然舱(尺寸1800mm ×3300mm)组成。				
开工日期	2019.12.26	竣工日期	2022.7.28		
建设单位	淮南市重点工程建设项目 淮南市市政工程投资建设 有限公司	法定代表人	张永强		
单位地址	淮南市田家庵区南湖路 东150米	项目负责人	孟勇		
勘察单位	安徽省地质工程勘察院	资质等级	工程勘察甲级	项目负责人	肖天阳
设计单位	淮南市市政设计研究院	资质等级	市政设计甲级	项目负责人	胡平
施工总包 单位	中国铁工业华兴建设有 限公司	资质等级 及证书号	市政公用工程贰级 13201001347565607		
法定代表人	中核工业集团有限公司 张仁兵 书记	项目经理 及证书号	张兴华 1900359489 新42016201708523		
分包单位	/	资质等级 及证书号	/		
分包单位	/	资质等级 及证书号	/		
分包单位	/	资质等级 及证书号	/		
监理单位	国机工程咨询有限公司	资质等级 及证书号	工程监理单位 E14100962-2/1		
法定代表人	李振文	总监及 岗位证书号	段晓宇 41061032		
工程质量 监督机构					

注:本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	淮南市公路局综合办公楼	结构类型	现浇钢筋混凝土	工程规模	43216.44
施工单位	中国铁建华东建设股份有限公司	技术负责人	赵玉刚	开工日期	2019-12-26
项目经理	张义华	项目技术负责人	丁峰	完成日期	2022-5-20
序号	项 目	验收记录	验收结论		
1	分部工程	共4分部, 经审查5分部, 符合标准及设计要求2分部	合格, 同意验收		
2	质量控制资料核查	共2项, 经审查符合要求2项, 经核定符合规范要求2项	资料齐全, 同意验收		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查2项, 符合要求2项, 共抽查2项, 符合要求2项, 经返工处理符合要求0项	报告齐全, 同意验收		
4	观感质量结论	共抽查2项, 符合要求2项, 不符合要求0项	观感质量好, 同意验收		
5	综合验收结论	工程施工质量验收文件符合设计及规范要求	同意验收		
建设单位		监理单位	施工单位	设计单位	
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	
参加验收单位 单位(项目)负责人		总监理工程师	单位负责人	单位(项目)负责人	
年 月 日		年 月 日	年 月 日	年 月 日	

注: 该表由施工单位填写, 验收结论由监理(建设)单位填写, 综合验收结论由参加验收单位共同商定, 建设单位填写。

工程竣工验收意见

淮南市中关路综合管廊工程、淮南市春申大街综合管廊工程（中关路段综合管廊、春申大街段综合管廊），经参与竣工验收各单位共同商定验收意见如下：

1. 设计功能满足使用要求，设计标准符合有关规定。
2. 建设单位要求严格，按照相关建设规范要求办事，手续齐全，遵守国家有关规定，标准化执行国家有关强制性标准。
3. 勘察和设计单位认真负责，热情服务。施工单位按照设计和规范要求施工，执行有关操作规范和企业标准化，按施工设计文件施工，监理单位严格把关，公平公正，热情服务，严格执行规范要求，认真负责。

4. 经各参验单位协商，中国林业岩土建设工程有限公司施工的淮南市中关路综合管廊、春申大街综合管廊工程验收如下：

本工程划分为25个分部符合验收规范要求，质保资料齐全，符合要求，且全和使用功能符合要求，观感质量好。

5. 本工程未发现质量缺陷和难以修补的问题，满足正常使用要求。

验收组组长（签名）：姚冰

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

验收组成名单

[illegible]

业绩证明



淮南市中兴路、南纬七路及综合管廊PPP项目工程建设由中铁六局集团有限公司和中国核工业华兴建设有限公司联合体承建，道路等级城市主干道，设计时速60km/h；标段长度9.24km。本工程于2019年7月8日签订合同协议书，合同总额119317.82万元（中铁六局集团有限公司59658.91万元，中国核工业华兴建设有限公司59658.91万元）。开工日期2019年7月28日，竣工验收日期2022年7月28日，工程质量合格。工程施工内容如下：

一、工程内容总述

1、**中兴路**：北起国庆路，南至南纬七路。以南沿山路为界，分南、北两段。

中兴北路（国庆路-南沿山路）全长6.24公里（扣除铁路段：中兴路下穿合阜铁路580m），主要构筑物包括两座箱涵，分别为K0+202钢波纹箱涵和K6+350箱涵。均由中铁六局集团有限公司施工。

中兴南路（南沿山路-南纬七路）全长3.77公里，中铁六局集团有限公司施工2.991km，中核华兴施工823米。主要构筑物包括两座桥梁，分别为K1+163.524小桥（中铁六局集团有限公司施工）以及K3+587.800（中国核工业华兴建设有限公司施工）。

2、**南纬七路**：南纬七路全长5.977公里，全线设置三座中桥和两座箱涵，中桥均采用1×20m简支T梁，箱涵分别为K2+600雨水箱涵和K2+816盖板涵。均由中国核工业华兴建设有限公司施工。

3、**地下综合管廊工程**：中兴路和南纬七路综合管廊全长6.36km，施工内容包括土建（含人员出入口）、市政、安装等工程。其中：中兴南路综合管廊长3.66km，中铁六局集团有限公司施工2.795km，中核华兴施工0.865米。南纬七路管廊长2.7km，分为两段，均由中国核工业华兴建设有限公司施工。

二、中铁六局集团有限公司施工的专业工程

1、**道路工程**：路基长度9.274 km，面积556440 m²，特殊路基有：采煤沉陷区，处理方式清淤换填。路面长度9.274km，类型：沥青混凝土。

2、**桥梁工程**：桥梁1座，总面积960 m²。

K1+163.524 小桥，1×16m 预应力混凝土空心板梁，桩基16根，预制空心板梁32片。

3、**地下综合管廊工程**：总长度2795 m。

地下综合管廊2.795km，16490.5 m²，人员通道1座，中兴路综合管廊敷设在道路中央分隔带内，标准段断面分为综合舱和燃气舱两个舱室，综合舱内尺寸为310cm×330cm（宽×高），管廊内敷设有高低压电缆、通信、给水三种管

道；燃气舱内尺寸为 180cm×330cm（宽×高），管廊内敷设有燃气管道。最大单舱全截面面积 10.23 m²。

4、**管道工程**：雨污水管道总长度 35.476km，雨水管管径为：圆管 d500-d2000，污水管管径为：圆管 d400-d800。

5、**其他工程**：交安工程标线长度 75190.723m，面积 19537.821 m²；照明工程长度 9.274km；绿化工程绿化面积 157658 m²。

特此证明。

建设单位名称：淮南市中路兴工程建设投资有限公司



建设单位联系人：周国庆

联系电话：13935151307

地址：安徽省淮南市大通区大通工业新区内淮矿商贸有限公司厂房

5、黄石新港（物流）工业园区村镇改造设计施工EPC总承包 中标通知书

中 标 通 知 书

中铁六局集团有限公司 (中标人):

自 2020 年 12 月 15 日定标后, 经定标委员会评定, 确定
黄石新港（物流）工业园区村镇改造设计施工 EPC 总承包 (项
目名称) 由你单位为中标人。

中标费率: 设计费用下浮率: 31% 建筑安装工程费用下
浮率: 6.5%

项目负责人: 田文强

中标人收到中标通知书后, 请于 2021 年 1 月 15 日 10
时前到黄石新港开发有限公司与招标人签订承发包合同, 并
同时报监管机构备案。在限期内不来草拟合同者作放弃中标
处理。

招标人 (盖章): _____



招标代理机构(盖章): _____



日期: 2020 年 12 月 15 日

正本

黄石新港（物流）工业园区村镇改造

设计施工 EPC 总承包合同



第一部分 合同协议书

发包人(全称) 黄石新港开发有限公司

承包人(全称) 中铁六局集团有限公司(牵头人)、南京市市政设计研究院有限责任公司(成员)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就黄石新港（物流）工业园区村镇改造设计施工EPC总承包工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：黄石新港（物流）工业园区村镇改造设计施工 EPC 总承包

工程批准、核准或备案文号: _____

工程内容及规模：春湖村、三洲村、广言村和凡庄村道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、外立面改造、安装工程、修建停车场、其它零星工程等。

工程所在省市详细地址：黄石新港（物流）工业园韦源口镇内春湖村、三洲村、广言村、凡庄村。

工程承包范围：设计、施工总承包，具体如下：

1、设计：①春湖村，根据已完成得方案设计及评审、初步设计，限额进行施工图设计（含预算）；②广言村，完成方案设计、初步设计（含概算）及批复限额进行施工图设计（含预算）；③凡庄村，完成方案设计、初步设计（含概算）及批复限额进行施工图设计（含预算）；④三洲村前期已完成方案设计、初步设计及施工图设计，本项目设计、设计变更及后期服务中不含三洲村。⑤并提供春湖村、广言村及凡庄村设计技术交底，并解决施工中的设计技术问题，施工全过程配合服务等；包通过方案设计评审、初步设计评审批复、施工图审查并出具审查意见合格书（含图审费用）。

2、施工：完成春湖村、三洲村、广言村、凡庄村所有施工工作、施工实施建设阶段、设备采购、安装、试验、检测（仅包含原材料见证取样）、送检、运营调试阶段、资料编制归档、施工至工程竣工验收、结算编制、竣工图编制、工程保修以及项目移交并配合业主办报建、报批、相关部门结（决）算审计工作，包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包竣工验收通过及相关配合服务。

3、项目总投资约14660万元。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

春湖村（不含方案设计和初步设计）、广言村及凡庄村的全部设计（方案设计、初步设计、施工图设计以及变更设计）由承包人完成提供，符合现行国家规范、标准及发包人要求。

三、主要日期

设计开工日期（绝对日期或相对日期）：以发包人书面通知为准；

施工开工日期（绝对日期或相对日期）：以监理工程师书面开工令为准；

工程竣工日期（绝对日期或相对日期）：设计期 60 日历天，施工工期 540 日历天。（如因甲方原因造成工期延误，施工工期顺延）

四、工程质量标准

工程设计质量标准：合格，符合国家现行相关技术规范、标准及规程要求，并通过相关审查。

工程施工质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。

五、合同价格和付款货币

合同价格包括设计费和建筑安装工程费两部分组成，各部分合同价格确定方式如下：

一、设计费：依据国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格【2002】10 号）标准下浮 31% 计算。计取基数为全过程造价咨询单位审定完送财政评审结果为施工图预算价。

其中，专业调整系数为 1.1，工程复杂程度调整系数及附加调整系数不计取。

二、建筑安装工程费：按经全过程造价咨询单位审定完送财政评审后的施工图预算价下浮 6.5% 计算，施工图预算价确定方式以本合同专用条款约定为准。

除根据合同约定的在工程实施过程中需增减的款项外，合同价格不作调整。

六、定义与解释

本协议书中有词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：合同自双方签署盖章后生效

发包人：
(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：

(签字或签章)

工商注册住所：

企业组织机构代码：

邮政编码：

承包人(联合体牵头人、施工单位)：
(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：

(签字或签章)

工商注册住所：

企业组织机构代码：

邮政编码：

法定代表人：

授权代表：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

开户银行：

账 号：

法定代表人：

授权代表：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

开户银行：

账 号：

承包人（联合体设计单位）：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

工商注册住所：

企业组织机构代码：

邮政编码：

法定代表人：

授权代表：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

开户银行：

账 号：



合同订立时间： 2021 年 01 月 12 日

合同订立地点： 黄石新港开发有限公司

项目经理变更文件

附件 1

项目经理变更申报审批表

项目名称	黄石新港工业园区村镇改造设计施工 EPC 总承包项目					
单位名称 (盖章)	中铁六局集团有限公司					
被变更人员	姓 名	田文强	变更后人员	姓 名	孙岩	
	资格证号	201603411034 201511070200 1323		资格证号	201809034110 004816	
	证书注册 号	京 111171743116		证书注册号	京 111181901486	
	专 业	市政公用工程		专 业	市政公用工程	
	身份证号	622102198505 168610		身份证号	220421198203 010075	
监理单位 审查意见	 签字并盖章： 年 月 日					
建设单位 审查意见	 签字并盖章： 年 月 日					

备注：1、变更人员的资格等级及相关业绩等要求不得低于变更前人员条件，并应符合招标文件要求。

- 1 -

竣工验收报告

竣工验收证书

竣工验收表 2

工程名称	黄石新港（物流）工业园区区村镇改造设计施工 EPC 总承包工程	开工日期	2021 年 6 月 2 日	对工程的质量评价 本工程经自检，符合设计、规范及合同要求，达到了竣工验收标准。	
施工单位	中钦六局集团有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 26 日		
合同造价（万元）	14660 万	竣工验收日	/	年 月 日	
参加竣工验收单位意见					
验收范围及内容： 一、验收范围： 本次验收部位为春湖村改造工程 二、主要工程内容： 春湖村改造工程内容包括：给排水工程、道路工程、景观工程、电气工程、建筑工程五个分部工程。 给排水施工完成：部分住户给水、村内污水主管网、雨水主管网、入户支管网、雨水检查井、雨水收集井、排水边沟、提升泵站、A 线闸门。 道路施工完成：柯家湾及邱家湾村内道路和塔村道路 A 线、C 线、D 线原有道路改造和新建道路的路基填筑、混凝土硬化及沥青刷黑。 景观工程完成：村内柯家湾祠堂左侧山体改造，土地庙前改造、邱家湾祠堂前改造，新建公厕、篮球场、活动中心、篮球场广场、木栈道、亲水平台、停车场、文化长廊和柯家湾、邱家湾范围内绿化等施工内容。 电气工程完成：村道路两侧及篮球场太阳能路灯安装架设。 建筑工程完成：村内居民房屋外立面改造、门楣更换等系列施工内容。		建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位
存在问题及处理意见：					

164

竣工验收证书

随管表2

工程名称	黄石新港（物流）工业园区村镇改造设计施工EPC总承包工程	开工日期	2021年4月1日	对本工程的质量评价 本工程经自检，符合设计、规范及合同要求，达到了竣工验收标准。	
施工单位	中软六局集团有限公司	竣工日期	2022年8月30日		
合同造价（万元）	14660万	竣工决算（万元）	/	竣工验收日	2022年9月1日
验收范围及数量： 一、验收范围： 本次验收部位为三洲村街道改造工程，主要为复兴街、金三路及背街小巷雨水污水升级改造、复兴街主路路面刷黑、人行道铺装及配套设施绿化照明工程。 二、主要工程内容： (1) 给排水工程。污水工程完成主路DN400（HDPE）污水管道3277m，完成背街小巷DN300（HDPE）污水管道8147m；完成DN200PVC四级管网4283m。雨水工程完成混凝土承插雨水管道4185m；完成0.4m*0.4m排水边沟6095m，0.3m*0.3m排水边沟700m。 (2) 道路工程。道路工程人行道铺装完成60422m²，路缘石安装6837.52m，沥青混凝土路面完成2874312m²；背街小巷完成新建道路硬化251942m²。 (3) 绿化工程。绿化工程完成桂花树（胸径12cm）350颗，（胸径10cm）241颗；红花继木栽种22002m²，红叶石楠栽种完成22002m²。 (4) 照明工程。照明工程完成配电箱1座，完成路灯（5/7m双臂路灯）80盏，完成电缆铺设2619米。 (5) 交通工程。标线6.6km；斑马线1321m；地面导向线52m²；停车线66m；人行道盲道43m²；公交停车线84m²；车行道中心线填充60m²。					
		建设单位	项目负责人  (盖章)	设计单位	项目负责人  (盖章)
		监理单位	总监理工程师  (2) (盖章)	勘察单位	项目负责人  (盖章)
无		施工单位	项目负责人  (盖章)		

竣工验收证书

通管表 2

工程名称	黄石新港（物流）工业园区村镇改造设计施工 EPC 总承包工程	开工日期	2021 年 10 月 22 日	对工程的质量评价 本工程经自验，符合设计、规范及合同要求，达到了竣工验收标准。	
施工单位	中铁六局集团有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 26 日		
合同造价（万元）	14660 万	竣工决算（万元）	/	竣工验收日	年 月 日
收范围及内容： 一、验收范围： 本次验收范围为广吉村改造工程 二、主要工程内容： 广吉村改造工程内容包括：排水工程、道路工程、景观工程、电气工程、建筑工程五个分部工程。 排水施工完成：村内污水主管网、雨水主管网、入户支管网、排水边沟、雨水收集井、化粪池、沉沙池施工。 道路施工完成：村内内环路道路改造、沥青路面施工。 景观工程完成：凤水池塘改造、文化长廊、篮球场、古树保护、古井保护、停车位、公厕、步道铺装、车行栈桥、休闲娱乐广场等系列园建内容，以及村内苗木栽植、草坪铺设等绿化施工。 电气工程完成：村道路两侧及篮球场太阳能路灯安装架设施工。 建筑工程完成：村内居民房屋外立面改造、门管更换系列施工。					
存在问题及处理意见：					
无					
建设单位		监理单位		设计单位	
施工单位		监理单位		设计单位	
参加竣工验收单位意见 建设单位：（盖章） 监理单位：（盖章） 设计单位：（盖章） 施工单位：（盖章）					

6、天龙山路（西中环南延-滨河西路）建设工程一标段

中标通知书

中标通知书

编号:202005066

工程编码: E1401000267015737

中 标 人: 中铁六局集团有限公司

天龙山路（西中环南延-滨河西路）建设工程一标段项目，于2020年05月18日经公平竞争，符合法定程序，贵单位中标，请收到中标通知书后30日内与招标人签订合同，具体中标内容如下：

中标价	25820.215601万元		质量标准	合格	
总工期	214日历天	开工时间	2020年06月10日	竣工时间	2021年01月09日
建设规模	起点西中环南延，终点毕家营，道路全长约1.74公里	结构	/	层数	/
项目经理	陈颖	身份证号	131026198403106548		
项目副经理	侯爱臣	身份证号	110103196206190653		
技术负责人	于庆柱	身份证号	140202197408305518		
建设单位 (盖章)	招标代理机构 (盖章)		市公共资源交易中心 (盖章)		
2020年5月19日		2020年5月19日		2020年5月22日	

注：本中标通知书一式四份，建设单位、中标单位、招标代理机构、太原市公共资源交易中心各一份。

合同协议书

副 本

建设工程施工合同

天龙山路（西中环南延-滨河西路）建设工程一标段

合同编号：TLSL(SG)-03 号

签订日期： 2020 年 5 月 25 日

第一部分 协议书

发包人(全称): 太原市城市建设管理中心

法定代表人: 范永刚

法定注册地址: 太原市大同路 80 号

承包人(全称): 中铁六局集团有限公司

法定代表人: 韦国

法定注册地址: 北京市海淀区万寿路 2 号

发包人为建设天龙山路(西中环南延-滨河西路)建设工程一标段工程施工(以下简称“本工程”),已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称: 天龙山路(西中环南延-滨河西路)建设工程一标段

工程地点: 起点西中环南延, 终点桩号 K2+880

工程内容: 天龙山路(西中环南延-滨河西路)建设工程一标段:

本项目起点西中环南延, 终点桩号 K2+880, 道路全长约 1.4 公里, 规划红线宽 50 米, 其中包含: 上跨铁路西南环线, 主线桥梁采用钢箱梁结构, 分两幅, 跨径为 50+70+45m, 重量约 3200 吨, 建设内容: 道路、排水、电力、桥梁等。

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件 1)

工程立项批准文号: 并住建字[2018]84、115 号

资金来源: 市本级政府筹措解决

二、工程承包范围

承包范围: 施工图纸范围内的全部工程施工。

三、合同工期:

计划开工日期: 2020 年 06 月 10 日

计划竣工日期：2021 年 01 月 09 日

合同工期总日历天数 214 天，实际工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同形式

本合同采用 单价 合同形式。

六、签约合同价

根据中招神舟项目管理有限公司 2020 年 5 月 18 日公开招标, 中标金额（大写）：贰亿伍仟捌佰贰拾万零贰仟壹佰伍拾陆元零壹分
（小写）¥：258202156.01 元

其中：安全文明施工费：3630896.17 元

暂列金额：36710000 元（共中计日工金额 / 元）

材料和工程设备暂估价： / 元

专业工程暂估价： / 元

（最终结算以太原市相关政府审核部门审定的价款为准）

七、承包人项目经理

姓名：陈颖； 职称：高级工程师；

身份证号：131026198403106548；

建造师执业资格证书号：JY00363480；

建造师注册证书号：00479516；

建造师执业印章号：京 111151636058；

安全生产考核合格证书号：京建安 B（2016）0131478。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标标函附录；
- 4、专用合同条款；
- 5、通用合同条款；
- 6、本工程的技术标准和要求：详见招投标文件

- 7、本工程图纸；
8、本工程工程量清单；
9、本工程报价单或预算书；
10、其他合同文件：工程质量保修书、安全施工与文明现场协议、工程建设廉政协议、工程资金管理协议书、不拖欠农民工工资承诺、扬尘污染防治承诺书等。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式贰份，合同双方各执一份；副本一式陆份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：太原市城市建设管理中心 承包人：中铁六局集团有限公司

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

2020年 5 月 25 日

2020年 5 月 25 日

签约地点：太原市城市建设管理中心（太原市大同路 80 号）。

竣工验收报告

竣工验收证书

工程名称	天龙山路（西中环南延-滨河西路）建设工程一标段		开工日期	2020年6月10日		对工程的质量评价
施工单位	中铁六局集团有限公司		竣工日期	2021年7月30日		
合同造价 (万元)	25820.2156		施工决算 (万元)	/		
验收范围及数量:						
天龙山路（西中环南延-滨河西路）建设工程一标段，起讫里程K1+566.096~K2+878，其中下穿大运高速K2+005~K2+199不属于本工程范围，全长约1.1km，主要施工内容包含道路、桥梁、管线及市政配套附属等。 主要工程量: 桥梁工程：主线桥梁463米，人非桥梁RA和RB桥梁793米，地面桥2座，人非楼梯2座。 道路工程：主线道路（含辅路及人行通道）655米，其中包括121mU型槽工程，环形辅路445.138米，RA和RB道路284.546米。 雨水工程：雨水管线971米，雨水检查井38座 电力工程：电力管线1406.75米，电力检查井30座 存在问题及处理意见: 外观检查中未发现明显的缺陷，量测项目全部合格，质量保证资料真实、完整。						
建设单位			设计单位		监理单位	
监理单位			施工单位		接收单位	
勘察单位			接收单位		接收单位	

7、京密路（太阳宫北街-机场南线）道路工程5#标段 中标通知书

中标通知书

中铁六局集团有限公司：

你方于 2020年11月17日 所递交的 京密路（太阳宫北街-机场南线）道路工程5#标段
(工程名称)施工投标文件已被我方接收，被确定为中标人。

工程名称	京密路（太阳宫北街-机场南线）道路工程 5#标段		建设规模	长度约1.1公里
建设地点	北京市朝阳区，东北环线铁路南至马泉营西路南			
中标范围	道路工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、给水工程、中水工程等工作内容。			
中标价格	小写：388036699.89 元 大写：叁亿捌仟捌佰零叁万陆仟陆佰玖拾玖元捌角玖分			
中标工期	697 日历天	计划开工日期	2020年12月18日	
		计划竣工日期	2022年11月15日	
工程质量	合格			
项目经理	宋福元	注册建造师执业资格	注册建造师一级	
备 注				

请你方在接到本通知书后的 30 日内到（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：北京市首都公路发展集团有限公司
(盖章)

法定代表人：张阔 (签字或盖章)

2020年12月02日

合同协议书

项目编号: F0SG202000297

正本

京密路（太阳宫北街-机场南线） 道路工程 5#标段

施工合同



发包人: 北京市首都公路发展集团有限公司



承包人: 中铁六局集团有限公司

第一部分 合同协议书

编号: F0SG202000297

发包人(全称): 北京市首都公路发展集团有限公司

法定代表人: 张闯

法定注册地址: 北京市丰台区六里桥南里甲9号

承包人(全称): 中铁六局集团有限公司

法定代表人: 韦国

法定注册地址: 北京市海淀区万寿路2号

发包人为建设京密路(太阳宫北街-机场南线)道路工程5#标段(以下简称“本工程”),已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称: 京密路(太阳宫北街-机场南线)道路工程5#标段

工程地点: 北京市朝阳区,东北环线铁路南至马泉营西路南

工程内容: 京密路(太阳宫北街-机场南线)道路工程5#标段设计图纸范围内的道路工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、给水工程、中水工程等工作内容。

工程立项批准文号: 京发改(审)(2020)462号

资金来源: 政府投资(地方)

二、工程承包范围

承包范围: 京密路(太阳宫北街-机场南线)道路工程5#标段设计图纸范围内的道路工

程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、给水工程、中水工程等工作内容。

详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期: 2020年12月18日

计划竣工日期: 2022年11月15日

总日历天数 697 天,自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标

六、合同形式

本合同采用单价合同形式。

七、签约合同价

金额（大写）：叁亿捌仟捌佰零叁万陆仟陆佰玖拾玖元捌角玖分（人民币）

（小写）¥：388036699.89 元

其中：安全文明施工费（含税）：21412883.22 元

建筑垃圾运输处置费（含税）：6131922.15 元

赶工增加费（含税）：0 元

农民工工伤保险费：164120 元

暂列金额（含税）：0 元

专业工程暂估价（含税）：0 元

八、承包人项目经理：

姓名：宋福元；

职称：高级工程师；

身份证号：130103197010300935； 建造师执业资格证书号：京 Y00363058；

建造师注册证书号：京 136151510059；

建造师执业印章号：京 136151510059 (00)；

安全生产考核合格证书号：京建安 B (2018) 0153313。

合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、中标通知书；

3、投标函及投标函附录；

4、合同条款专用部分；

5、合同条款通用部分；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

本协议书有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十三、本协议连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式八份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第九条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：北京市首都公路发展集团有限公司 承包人：中铁六局集团有限公司

地址：北京市丰台区六里桥南里甲9号 地址：北京市海淀区万寿路2号

法定代表人或其

委托代理人：

经办人：

联系电话：

统一社会信用代码：91110000700221058P

开户行名称：工商银行北京方庄支行

开户行账号：0200053809024556593

法定代表人或其

委托代理人：

经办人：

联系电话：

统一社会信用代码：91110108101884765M

开户行名称：交通银行股份有限公司北京定慧寺支行

开户行账号：110060544018001830581

2020 年 12 月 15 日





2020 年 12 月 15 日

签约地点：北京市



竣工验收报告

单位（子单位）工程质量竣工验收记录 (表C8-1)				编号	
工程名称	京密路（太阳宫北街-机场南线）道路工程5#标段-排水工程			合同造价	2246.334万元
施工单位	中铁六局集团有限公司			项目经理	宋福元
施工单位技术负责人	王东旭			项目技术负责人	高静
监理单位	北京京博通工程咨询有限公司			总监理工程师	张伏波
结构类型	现浇钢筋混凝土、预制混凝土结构、模块砌筑	开工日期	2022年7月28日	完工日期	2025年1月6日
验收范围和数量	桩号: K6+503.5-K7+580 排水工程: D=0.3m管道138m, D=0.4m管道589m, D=0.6m管道188.9m, D=1.0m管道124m, D=1.2m管道121.1m, D=1.6m管道427.3m, D=1.8m管道180.5m, D=1.0m过路管58m, D=1.6过路管91.5m。 A=2.4×1.04m混凝土模块方沟43m, A=1.6×1.4m混凝土模块方沟1171.5m, A=2.8×1.2m混凝土模块方沟10m, A=2.8×2.8m混凝土模块方沟30m。 附属构筑物: 雨水检查井63座, 雨水篦子434个, 八字出水口2座。				
序号	项目	验收记录 (施工单位填写)		验收结论 (监理或建设单位填写)	
1	分部工程	共 4 分部, 经查 4 分部, 符合标准及设计要求 4 分部。		验收合格	
2	质量控制资料核查	共 7 项, 经审查符合要求 7 项。		验收合格	
3	安全和主要使用功能核查结果	共核查 5 项, 符合要求 5 项。		验收合格	
4	安全和主要使用功能抽查结果	共抽查 5 项, 符合要求 5 项, 其中经处理后符合要求 0 项。		验收合格	
	观感质量验收	共抽查 4 项, 达到“好”和“一般”的 1 项, 经返修处理符合要求的 0 项。		验收合格	
6	综合验收结论 (建设单位填写)	经验收, 各分部分项工程符合设计要求, 施工质量满足有关质量验收规范和标准要求, 验收合格。			
参加验收单位	建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	施工单位 (公章)	监理单位 (公章)
	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位负责人 (或项目经理)	总监理工程师:
竣工验收日期		2025年4月23日			

单位（子单位）工程质量竣工验收记录 (表C8-1)				编号	
工程名称		京密路（太阳宫北街-机场南线）道路工程5#标段-道路工程		合同造价	4958.1909万元
施工单位		中铁六局集团有限公司		项目经理	宋福元
施工单位技术负责人		王东旭		项目技术负责人	高静
监理单位		北京京博通工程咨询有限公司		总监理工程师	张伏波
结构类型	沥青混凝土路面	开工日期	2022年7月28日	完工日期	2025年1月6日
验收范围和数量	道路工程：主路K7+187.727-K7+380，左辅路ZK5+307.43-ZK6+381，右辅路YK5+260-YK6+382。 机动车道：主路K7+187.727-K7+380，路宽24.6-32.6m，面积11976m²；辅路ZK5+307.43-ZK6+381、YK5+260-YK6+382，路宽11-14m，面积33382m²。 非机动车道：路宽3-5.4m，面积3262m²。 人行步道：路宽3m，面积6139m²。 路缘石：甲1型混凝土路缘石2841m，乙1型混凝土路缘石2725m，乙2型混凝土路缘石2101m，树池框342套，混凝土大方砖16488.77m²。 挡墙：扶壁式挡墙272m。 边坡：生态护坡1304m				
序号	项目	验收记录 (施工单位填写)		验收结论 (监理或建设单位填写)	
1	分部工程	共 14 分部，经查 14 分部，符合标准及设计要求 14 分部，		验收合格	
2	质量控制资料核查	共 7 项，经审查符合要求 7 项。		验收合格	
3	安全和主要使用功能核查结果	共核查 4 项，符合要求 4 项。		验收合格	
4	安全和主要使用功能抽查结果	共抽查 4 项，符合要求 4 项，其中经处理后符合要求 0 项，		验收合格	
5	观感质量验收	共抽查 6 项，达到“好”和“一般”的 5 项，经返修处理符合要求的 0 项。		验收合格	
6	综合验收结论 (建设单位填写)	经验收，各分部分项工程符合设计要求，施工质量满足有关质量验收规范和标准要求，验收合格。			
参加验收单位	建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	施工单位 (公章)	监理单位 (公章)
	单位(项目)负责人： 	单位(项目)负责人： 	单位(项目)负责人： 	单位负责人 (或项目经理)： 	总监理工程师： 
竣工验收日期		2025年4月23日			

单位（子单位）工程质量竣工验收记录 (表C8-1)				编号	
工程名称		京密路（太阳宫北街-机场南线）道路工程5#标段-五环路互通式立交D匝道桥		合同造价	849.2396万元
施工单位		中铁六局集团有限公司		项目经理	宋福元
施工单位技术负责人		王东旭		项目技术负责人	高静
监理单位		北京京博通工程咨询有限公司		总监理工程师	张伏波
结构类型	钢筋混凝土结构	开工日期	2022年7月28日	完工日期	2025年1月6日
验收范围和数量	城市互通立交D匝道桥起讫桩号：K0+450.294-K0+561.814，桥长111.52m，共3跨（11-主线4轴） 地基与基础：桩基14颗，承台4个。 下部结构：柱系梁2个，墩柱6棵，盖梁2片，盆式支座8个。 上部结构：现浇箱梁1联 桥梁附属结构：防撞护栏334.56m，PVC（D=174）排水设施126m，160伸缩缝16.3m，桥面防水层1181.7㎡，桥面铺装层1181.7㎡，防护网208.5m。				
序号	项目	验收记录 (施工单位填写)		验收结论 (监理或建设单位填写)	
1	分部工程	共 4 分部，经查 4 分部，符合标准及设计要求 4 分部，		验收合格	
2	质量控制资料核查	共 7 项，经审查符合要求 7 项，		验收合格	
3	安全和主要使用功能核查结果	共核查 5 项，符合要求 5 项，		验收合格	
4	安全和主要使用功能抽查结果	共抽查 5 项，符合要求 5 项，其中经处理后符合要求 0 项。		验收合格	
5	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项，		验收合格	
6	综合验收结论 (建设单位填写)	经验收，各分部分项工程符合设计要求，施工质量满足有关质量验收规范和标准要求，验收合格。			
参加验收单位	建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	施工单位 (公章)	监理单位 (公章)
	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位负责人 (或项目经理)	总监理工程师:
竣工验收日期		2025年4月23日			

单位（子单位）工程质量竣工验收记录 (表C8-1)				编号	
工程名称	京密路（太阳宫北街-机场南线）道路工程5#标段-四环至五环高架桥			合同造价	29102.6131万元
施工单位	中铁六局集团有限公司			项目经理	宋福元
施工单位技术负责人	王东旭			项目技术负责人	高静
监理单位	北京京博通工程咨询有限公司			总监理工程师	张伏波
结构类型	钢筋混凝土结构	开工日期	2022年7月28日	完工日期	2025年1月6日
验收范围和数量	四环至五环高架桥起讫桩号：K6+503.500-K7+187.727，桥长684.227m，共19跨（0-19轴）。 地基与基础：桩基224颗，承台55个。 下部结构：桥台1座，墩柱54棵，盖梁18片，板式橡胶支座164个，盆式支座230个。 上部结构：钢筋混凝土梁1联，预制小箱梁189片。 桥梁附属结构：桥头搭板1个，防撞护栏3123.181m，PVC（D=200）排水设施420m，PVC（D=160）排水设施100m，PVC（D=174）排水设施588m，80伸缩缝33.6m，160伸缩缝388.48m，桥面防水层25908.88㎡，桥面铺装层25703.88㎡，防护网474.5m。				
序号	项目	验收记录 (施工单位填写)		验收结论 (监理或建设单位填写)	
1	分部工程	共 4 分部，经查 4 分部，符合标准及设计要求 4 分部。		验收合格	
2	质量控制资料核查	共 7 项，经审查符合要求 7 项。		验收合格	
3	安全和主要使用功能核查结果	共核查 5 项，符合要求 5 项。		验收合格	
4	安全和主要使用功能抽查结果	共抽查 5 项，符合要求 5 项，其中经处理后符合要求 0 项。		验收合格	
5	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项。		验收合格	
6	综合验收结论 (建设单位填写)	经验收，各分部分项工程符合设计要求，施工质量满足有关质量验收规范和标准要求，验收合格。			
参加验收单位	建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	施工单位 (公章)	监理单位 (公章)
	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位负责人 (或项目经理)	总监理工程师:
竣工验收日期		2025年4月23日			

单位（子单位）工程质量竣工验收记录 (表C8-1)				编号	
工程名称	京密路（太阳宫北街-机场南线）道路工程5#标段 -北小河辅路桥			合同造价	1647.292万元
施工单位	中铁六局集团有限公司			项目经理	宋福元
施工单位技术负责人	王东旭			项目技术负责人	高静
监理单位	北京京博通工程咨询有限公司			总监理工程师	张伏波
结构类型	钢筋混凝土结构	开工日期	2022年7月28日	完工日期	2025年1月6日
验收范围和数量	城市北小河左辅路桥起讫桩号：FK5+662.249-FK5+732.329，桥长70.08m，共3跨（0-3轴）。 城市北小河右辅路桥起讫桩号：FK5+689.45-FK5+768.53，桥长70.08m，共3跨（0-3轴）。 地基与基础：桩基36棵，地系梁4个。 下部结构：桥台2座，墩柱16棵，盖梁4片，板式橡胶支座72个。 上部结构：预制小箱梁36片。 桥梁附属结构：桥头搭板4个，防撞护栏288m，PVC（D=174）排水设施94.56m，80伸缩缝93m，桥面防水层2023.6m²，桥面铺装层2183.6m²。				
序号	项目	验收记录 (施工单位填写)		验收结论 (监理或建设单位填写)	
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部，符合标准及设计要求 8 分部。		验收合格	
2	质量控制资料核查	共 7 项，经审查符合要求 7 项。		验收合格	
3	安全和主要使用功能 核查结果	共核查 5 项，符合要求 5 项。		验收合格	
4	安全和主要使用功能 抽查结果	共抽查 5 项，符合要求 5 项， 其中经处理后符合要求 0 项。		验收合格	
5	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项。		验收合格	
6	综合验收结论 (建设单位填写)	经验收，各分部分项工程符合设计要求，施工质量满足有关质量验收规范和标准要求，验收合格。			
参加验收单位	建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	施工单位 (公章)	监理单位 (公章)
	单位(项目) 负责人:	单位(项目) 负责人:	单位(项目) 负责人:	单位负责人 (或项目经理)	总监理工程师:
竣工验收日期		2025年4月23日			

二、企业获奖情况

序号	奖项名称	获奖工程名称	颁奖机构	获奖时间
1	2022-2023 年度国家优质工程奖	临汾市五一路快速通道工程总承包（EPC）	中国施工企业管理协会	2023.12
2	2020-2021 年度国家优质工程奖	淮南孔李淮河大桥工程	中国施工企业管理协会	2021.12
3	第十九届中国土木工程詹天佑奖	太古供热项目（古交兴能电厂至太原供热主管线及中继能源站工程）	中国土木工程学会 北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会	2022.01

1、临汾市五一路快速通道工程总承包（EPC）——2022-2023年度国家优质工程奖
获奖证书



合同协议书

山西一建集团有限公司
施工合同 2021 年 149 号 -2

正本

GF-2020-0216

建设工程总承包合同

(示范文本)

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 临汾市政府工程建设服务中心

承包人(全称): 山西一建集团有限公司·西安市政设计研究院有限公司·中铁六局集团有限公司·中铁十局集团建筑工程有限公司联合体

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就临汾市五一路快速通道工程总承包(EPC)项目的工程总承包及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 临汾市五一路快速通道工程总承包(EPC)。
2. 工程地点: 临汾市五一路。
3. 工程审批、核准或备案文号: 临行审发【2021】269号。
4. 资金来源: 市财政筹措解决。

5. 工程内容及规模: 新建快速通道西起现状滨河东路,东至现状脸谱桥西桥头,全长 3884.871m,红线宽 55m。包括道路工程、桥梁工程(桥梁、下穿通道)、雨水工程、污水工程、给水工程、照明工程、交通工程、电力工程、通信工程、绿化工程等配套工程。

6. 工程承包范围: 从工程设计开始到质保期结束为止所涉及到的所有工作,包括工程施工图设计、工程施工及相关采购、竣工验收和最终交付等所有工作。

二、合同工期

计划开始工作日期：2021 年 7 月 1 日。

计划开始现场施工日期：以发包人或发包人委托的监理工程师下发的开工通知书为准。

计划竣工日期：2022 年 6 月 30 日。

工期总日历天数：365 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和招标文件要求的设计深度；工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）捌亿玖仟陆佰贰拾叁万零叁佰叁拾捌元伍角（¥ 896230338.5 元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）壹仟捌佰捌拾伍万叁仟玖佰陆拾贰元整（¥ 18853962.00 元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）壹佰零陆万柒仟贰佰零伍元肆角（¥1067205.4 元）；

（2）设备购置费（含税）：

人民币（大写）（¥ 元）；适用税率：%，税金为人民币（大写）（¥ 元）；

（3）建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）捌亿柒仟柒佰叁拾柒万陆仟叁佰柒拾陆元伍

角(¥877376376.5元);适用税率: 9 %,税金为人民币(大写)柒仟贰佰肆拾肆万叁仟玖佰贰拾壹元(¥72443921元);

(4) 暂估价(含税):

人民币(大写)_____ (¥_____元)。

(5) 暂列金额(含税):

人民币(大写)_____ (¥_____元)。

(6) 双方约定的其他费用(含税):

人民币(大写)_____ (¥_____元);适用税率: _____%,税金为人民币(大写)_____ (¥_____元)。

2. 合同价格形式:

固定综合单价,在投标报价中列出的任何工程量和价格数据应仅限用于暂定合同价格的参考资料,而不能用于其他目的。中间计价按财评评审报告中的综合单价计算。最终结算按审计部门审计认定的金额为准。

设计费的计量按财政评审报告中的金额为准,最终结算价按审计部门审计认定的金额为准。

合同当事人对合同价格形式的其他约定: /。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理: 武生。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及投标函附录(如果有);

- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件;
- (4) 通用合同条件;
- (5) 承包人建议书;
- (6) 价格清单;
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2021 年 6 月 30 日订立。

九、订立地点

本合同在 临汾市政府工程建设服务中心 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立,并自 发包人、承包人双方签字盖章后 生效。

十一、合同份数

本合同一式 叁拾 份,均具有同等法律效力,发包人执 玖 份,承包人执 贰拾 份,监理人 壹 份。

发包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:
(签字)



统一社会信用代码: _____
地址: _____
邮政编码: _____
法定代表人: _____
委托代理人: _____
电话: _____
传真: _____
电子信箱: _____
开户银行: _____
账号: _____

承包人 (联合体牵头人): (公
章)



法定代表人或其委托代理人:
(签字)



统一社会信用代码: 911400001131517291
地址: 山西示范区新化路8号1幢B座五层
邮政编码: 030032
法定代表人: 杨韶勇
委托代理人: 武生
电话: 0351-8720055
传真: 0351-8721165
电子信箱: sxyjvfgsvsk@126.com
开户银行: 中国建设银行股份有限公司侯
马支行
账号: 14001716208050013800

承包人：联合体成员一（公章）



法定代表人或其委托代理人：

（签字）

高中俊印

统一社会信用代码：91610103220736087X

地址：西安市碑林区朱雀大街100号

邮政编码：710068

法定代表人：高中俊

委托代理人：

电话：029-88426296

传真：029-88422024

电子信箱：xmedri@163.com

开户银行：中国工商银行股份有限公司西

安含光路支行

账号：3700023109089348566

承包人：联合体成员二（公章）



法定代表人或其委托代理人：

（签字）

韦国印

统一社会信用代码：

91110108101884765M

地址：北京市海淀区万寿路2号

邮政编码：100036

法定代表人：韦国

委托代理人：

电话：0351-2666081

传真：0351-2666079

电子信箱：

开户银行：交通银行股份有限公司北京定

慧寺支行

账号：110060544018001830581



承包人：联合体成员委（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）



统一社会信用代码：

91370100163198787U

地址：济南市高新区工业南路 59 号 8 号楼

邮政编码：250101

法定代表人：朱军华

委托代理人：

电话：010-83326338

传真：010-83326337

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司

济南铁道支行

账号：37050161550100000431

中铁六局业绩所占比例的情况说明

临汾市政府工程建设服务中心

临工务函[2021] 98 号

五一路快速通道项目各标段工程造价 情况说明

临汾市五一路快速通道工程总承包（EPC）建设项目由山西一建集团有限公司、西安市政设计研究院有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁十局集团建筑工程有限公司组成联合体共同实施，施工总承包合同额为 896230338.5 元，其中建筑安装工程费用为 877376376.5 元，设计费 18853962.0 元；根据投资估算暂将合同价分劈如下，最终以审计金额为主。

（1）山西一建集团有限公司

山西一建集团有限公司负责 K0+960-K1+960 范围内的合同额为 230303723.66 元；

（2）中铁六局集团有限公司

中铁六局集团有限公司负责 K1+960-K3+629.015 范围内的合同额为 340592624.7 元；

（3）中铁十局集团建筑工程有限公司

中铁十局集团建筑工程有限公司负责 K0+000-K0+960 范围内合同额为 306480028.14 元。

（4）西安市政设计研究院有限公司

西安市政设计研究院有限公司负责全线施工图设计、技术交底、现场技术服务合同额为 18853962.0 元。

特此说明

临汾市政府工程建设服务中心
2021 年 11 月 9 日



扫描全能王 创建

2、淮南孔李淮河大桥工程——2020-2021年度国家优质工程奖
获奖证书



合同协议书

正

淮南市孔李淮河大桥建设项目 施工总承包合同协议书

甲方（发包人）： 江苏舜天船舶股份有限公司
乙方（承包人）： 中铁六局集团有限公司

合同编号：

日期：2013.2.18

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“发包人”）为实施淮南市孔李淮河大桥建设项目，已接受中铁六局集团有限公司（以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包方和承包方共同达成如下协议。

1. 第 ZB1 标段由 K0+000~K10+280.555，长约 10.28km，公路等级为一级，设计时速为 80km/h，沥青混凝土路面，有淮河特大桥 1 座长 5.317km，中桥 1 座，通道 1 座，涵洞 9 道，以及其他工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

第一章 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

第二章 中标通知书；

第三章 补遗书；

第四章 投标函及投标函附录；

第五章 项目专用合同条款；

第六章 公路工程专用合同条款；

第七章 通用合同条款；

第八章 技术规范；

第九章 图纸

第十章 重新核定的已标价工程量清单；

第十一章 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

第十二章 合同其他文件

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 合同价：人民币（大写）壹拾亿零玖仟捌佰肆拾伍万壹仟叁佰叁拾捌元（¥ 1098451338）。

5. 承包人项目经理姓名：夏生祥，注册建造师注册号：京 111060811115，注册专业：铁路、公路，级别：一级；承包人总工程师姓名：王俊生。
6. 工程质量符合第八章技术规范和图纸规定标准。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人应按照业主监理人指示开工，工期为 36 月。
10. 本协议在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止后失效。
11. 本协议正本二份，副本肆份，合同双方各正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：江苏舜天船舶股份有限公司

承包人：中铁六局集团有限公司

法定代表人

法定代表人

或

或

其委托代理人：

其委托代理人：

日期：2013 年 2 月 18 日

日期：2013 年 2 月 18 日

3、太古供热项目（古交兴能电厂至太原供热主管线及中继能源站工程）
——第十九届中国土木工程詹天佑奖

获奖证书



合同协议书

合同号：_____

副本

古交兴能电厂至太原供热主管线及
中继能源站工程隧道段隧道工程

合同协议书

合同名称：古交兴能电厂至太原供热主管线及中继能源站工程隧道段 隧道工程第三标段施工合同协议书			
甲方：太原市热力公司			
乙方：中铁六局集团有限公司			
签订日期	2014年2月10日	编号	R20131110014

古交兴能电厂至太原供热主管线及
中继能源站工程隧道段隧道工程第三标段
山西省·太原市

合 同 协 议 书

太原市热力公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施古交兴能电厂至太原供热主管线及中继能源站工程隧道段隧道工程第三标段，已接受中铁六局集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目第三标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第三标段由 K10+400 至 K15+550，长约 5150m，供热 3 号隧道、道路、防排水及附属工程的预埋结构等土建工程的施工。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

（4）项目专用合同条款（含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

（8）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

（9）已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（11）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币(大写)
贰亿陆仟陆佰肆拾壹万壹仟柒佰玖拾伍元（¥266411795）。

5. 承包人项目经理：牛德元；承包人项目总工：林斌。

6. 工程质量符合：竣工验收的质量评定为合格。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 454 日历天。（根据市政府纪要要求，工期延长为 731 天，后附市政府纪要）

10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满后签发缺陷责任终止证书后失效。

11. 本协议书正本二份、副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：太原市热力公司（盖单位章）

承包人：中铁六局集团有限公司（盖单位章）

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人：

或其委托代理人：

传 真：0351-4158803

传 真：0351-2666083

电子邮箱：

电子邮箱：78219519@163.com

开户银行：

收款单位名称：中铁六局集团太原铁路建设有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司晋中铁道支行

账 号：

账 号：14001708839050500084

邮政编码：030001

邮政编码：030600

承办人：

承办人：

二〇一四年二月十日

投标报价汇总表

工程名称：古交兴能电厂至太原供热主管线及中继能源站工程隧道段隧道工程第三标段

第1页共1页

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	11011896
2	200	路基	9393108
3	300	路面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	500	隧道	234006791
6	600	安全设施及预埋管线	
7	700	绿化及环境保护设施	
8	第100章～第700章清单合计		254411795
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专项工程暂估价合计		
10	清单合计减去材料、工程设备、专项工程暂估价合计 (即8-9=10)		254411795
11	计日工合计		
12	暂列金额(不计日工总额)		12000000
13	投标报价(8+11+12)=13		266411795

注：材料、工程设备、专业工程暂估价已包括在清单合计中，不应重复计入投标报价。

三、项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况

项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	孙岩	性别	男	年龄	44 岁
职务	项目经理	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	220421198203010075	手机号码	13811589512
参加工作时间	2004 年		从事项目经理（建造师）年限	7 年	
项目经理（建造师）资格证书编号		京 1112018201901486			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
黄石新港开发有限公司	黄石新港（物流）工业园区村镇改造设计施工 EPC 总承包	黄石市韦源口镇的三洲村、春湖村、广言村以及太子镇的凡庄村在内的四个乡村街道改造工程。包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、外立面改造、安装工程、修建停车场、其它零星工程。项目总投资14660万元。	2021.04.01-2023.05.26	已完	合格
北京城市副中心投资建设集团有限公司	东古城街（K0+135-景行路）、涌翠西路（东古城街-兆善大街）道路工程□	东古城街设计范围西起东古城街K0+135处，东至景行路，设计长度约1232米。涌翠西路设计范围南起兆善大街，北至东古城街，设计长度200.221米。项目建设内容包括：道路工程、照明工程、绿化工程、雨水工程、污水工程、再生水工程、桥梁工程和文物保护等。合同金额：57567933.79元。	2024.05.16-2025.02.22	已完	合格

承诺书

我单位郑重承诺，我单位拟派往岗头西站地下连通通道工程（项目名称）的项目经理孙岩（项目经理姓名）现阶段未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

我单位保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我单位就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人： 中铁六局集团有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2026 年 07 月 14 日

项目经理（建造师）孙岩相关证件



1198

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

		系 列	工程
		Series	
		专 业	市政工程
		Profession	
		评审委员会	中国铁路工程集团有限公司
		Evaluation Committee	2023 年工程系列高级评委会
		评审通过时间	2023. 11
		Date of Approval	
		证书编号	2023050201279
		Certificate No.	
			
		中国铁路工程集团有限公司 职称改革领导小组办公室颁发 Issued by Office of Leading Group for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation	
姓 名	孙 岩		
Name			
性 别	男		
Sex			
出生年月	1982. 03		
Date of Birth			
技术资格	高级工程师		
Technical Qualification			
工作单位	中铁六局集团有限公司		
Place of work			



一级建造师

Constructor

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。



姓名：孙岩

证件号码：220421198203010075

性别：男

出生年月：1982 年 03 月

专业：市政公用工程

批准日期：2018 年 09 月 16 日

管理号：201809034110004816



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
住房和城乡建设部



使用有效期: 2026年04月15日
- 2026年10月12日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 孙岩

性 别: 男

出生日期: 1982年03月01日

注册编号: 京1112018201901486

聘用企业: 中铁六局集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2025-08-18至2028-08-17)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 孙岩

签名日期: 2026.4.15



中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期: 2019年11月18日

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

孙岩

证件类型	居民身份证	证件号码	220421*****75	性别	男
注册证书所在单位名称	中铁六局集团有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册建造师

注册单位: 中铁六局集团有限公司 注册编号/执业印章号: 京 1112018201901486
注册专业: 市政公用工程 有效期: 2028年08月17日

2025-08-18 - 延续注册 - 市政公用工程
中铁六局集团有限公司

2022-11-01 - 延续注册 - 市政公用工程
中铁六局集团有限公司

2019-11-18 - 重新注册 - 市政公用工程
中铁六局集团有限公司

2019-05-15 - 初始注册 - 市政公用工程
中铁六局集团北京铁路建设有限公司

查看证书变更记录 (4)

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问量

2 9 5 9 0 7 9 3 2 7

网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码: bm18000002 备案编号: 京ICP备10036469号 技术支持: 安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2019）0177259

姓 名：孙岩

性 别：男

出 生 年 月：1982年3月1日

企 业 名 称：中铁六局集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019年12月26日

有 效 期：2025年12月26日 至 2028年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2025年12月26日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110108101884765M 校验码: l3ip1w
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M 查询流水号: 11010820260706082630
单位名称: 中铁六局集团有限公司 查询日期: 2025年06月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1044	刘洋	220523198308262410	失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1045	刘涛	220422198212025312	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
1046	李世棋	220421199711013314	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
1047	王雷	220421198210050411	医疗保险	2025年06月	2025年09月	4
			生育保险	2025年06月	2025年09月	4
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
1048	孙岩	220421198203010075	工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
1049	刘忠海	220421198112142312	失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1050	刘松林	220402198202103633	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
1051	赵云龙	220382198303165338	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12

第 146 页 (共 531 页)



3826	穆鑫洁	110101199304092513	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3827	白瑞	110101198410270518	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期：2026年07月06日

项目经理（建造师）孙岩业绩

1、黄石新港（物流）工业园区村镇改造设计施工EPC总承包
中标通知书

中 标 通 知 书

中铁六局集团有限公司 (中标人):

自 2020 年 12 月 15 日定标后, 经定标委员会评定, 确定
黄石新港(物流)工业园区村镇改造设计施工 EPC 总承包 (项
目名称) 由你单位为中标人。

中标费率: 设计费用下浮率: 31% 建筑安装工程费用下
浮率: 6.5%

项目负责人: 田文强

中标人收到中标通知书后, 请于 2021 年 1 月 15 日 10
时前到黄石新港开发有限公司与招标人签订承发包合同, 并
同时报监管机构备案。在限期内不来草拟合同者作放弃中标
处理。

招标人 (盖章): _____



招标代理机构(盖章): _____



日期: 2020 年 12 月 15 日

正本

黄石新港（物流）工业园区村镇改造

设计施工 EPC 总承包合同



第一部分 合同协议书

发包人（全称）黄石新港开发有限公司

承包人(全称) 中铁六局集团有限公司(牵头人)、南京市市政设计研究院有限责任公司(成员)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就黄石新港（物流）工业园区村镇改造设计施工EPC总承包工程总承包事宜协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 黄石新港(物流)工业园区村镇改造设计施工 EPC 总承包

工程批准、核准或备案文号: _____

工程内容及规模：春湖村、三洲村、广言村和凡庄村道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、外立面改造、安装工程、修建停车场、其它零星工程等。

工程所在省市详细地址：黄石新港（物流）工业园韦源口镇内春湖村、三洲村、广言村、凡庄村。

工程承包范围：设计、施工总承包，具体如下：

1、设计：①春湖村，根据已完成得方案设计及评审、初步设计，限额进行施工图设计（含预算）；②广言村，完成方案设计、初步设计（含概算）及批复限额进行施工图设计（含预算）；③凡庄村，完成方案设计、初步设计（含概算）及批复限额进行施工图设计（含预算）；④三洲村前期已完成方案设计、初步设计及施工图设计，本项目设计、设计变更及后期服务中不含三洲村。⑤并提供春湖村、广言村及凡庄村设计技术交底，并解决施工中的设计技术问题，施工全过程配合服务等；包通过方案设计评审、初步设计评审批复、施工图审查并出具审查意见合格书（含图审费用）。

2、施工：完成春湖村、三洲村、广言村、凡庄村所有施工工作、施工实施建设阶段、设备采购、安装、试验、检测（仅包含原材料见证取样）、送检、运营调试阶段、资料编制归档、施工至工程竣工验收、结算编制、竣工图编制、工程保修以及项目移交并配合业主办报建、报批、相关部门结（决）算审计工作，包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包竣工验收通过及相关配合服务。

3、项目总投资约14660万元。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

春湖村（不含方案设计和初步设计）、广言村及凡庄村的全部设计（方案设计、初步设计、施工图设计以及变更设计）由承包人完成提供，符合现行国家规范、标准及发包人要求。

三、主要日期

设计开工日期（绝对日期或相对日期）：以发包人书面通知为准；

施工开工日期（绝对日期或相对日期）：以监理工程师书面开工令为准；

工程竣工日期（绝对日期或相对日期）：设计期 60 日历天，施工工期 540 日历天。（如因甲方原因造成工期延误，施工工期顺延）

四、工程质量标准

工程设计质量标准：合格，符合国家现行相关技术规范、标准及规程要求，并通过相关审查。

工程施工质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。

五、合同价格和付款货币

合同价格包括设计费和建筑安装工程费两部分组成，各部分合同价格确定方式如下：

一、设计费：依据国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格【2002】10 号）标准下浮 31% 计算。计取基数为全过程造价咨询单位审定完送财政评审结果为施工图预算价。

其中，专业调整系数为 1.1，工程复杂程度调整系数及附加调整系数不计取。

二、建筑安装工程费：按经全过程造价咨询单位审定完送财政评审后的施工图预算价下浮 6.5% 计算，施工图预算价确定方式以本合同专用条款约定为准。

除根据合同约定的在工程实施过程中需增减的款项外，合同价格不作调整。

六、定义与解释

本协议书中有词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：合同自双方签署盖章后生效

发包人：
(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：

(签字或签章)

工商注册住所：

企业组织机构代码：

邮政编码：

承包人(联合体牵头人、施工单位)：
(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：

(签字或签章)

工商注册住所：

企业组织机构代码：

邮政编码：

法定代表人：

授权代表：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

开户银行：

账 号：

法定代表人：

授权代表：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

开户银行：

账 号：

承包人（联合体设计单位）：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

工商注册住所：

企业组织机构代码：

邮政编码：

法定代表人：

授权代表：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

开户银行：

账 号：





合同订立时间： 2021 年 01 月 12 日

合同订立地点： 黄石新港开发有限公司

项目经理变更文件

附件 1

项目经理变更申报审批表

项目名称	黄石新港工业园区村镇改造设计施工 EPC 总承包项目					
单位名称 (盖章)	 中铁六局集团有限公司					
被变更人员	姓 名	田文强	变更后人员	姓 名	孙岩	
	资格证号	201603411034 201511070200 1323		资格证号	201809034110 004816	
	证书注册 号	京 111171743116		证书注册号	京 111181901486	
	专 业	市政公用工程		专 业	市政公用工程	
	身份证号	622102198505 168610		身份证号	220421198203 010075	
监理单位 审查意见	  签字并盖章： 年 月 日					
建设单位 审查意见	  签字并盖章： 年 月 日					

备注：1、变更人员的资格等级及相关业绩等要求不得低于变更前人员条件，并应符合招标文件要求。

竣工验收报告

竣工验收证书

竣工表2

工程名称	黄石新港（物流）工业园园区村镇改造设计施工EPC总承包工程	开工日期	2021年6月2日	对工程的质量评价 本工程经自检，符合设计、规范及合同要求，达到了竣工验收标准。	
施工单位	中钦六局集团有限公司	竣工日期	2023年5月26日		
合同造价（万元）	14660万	竣工验收日	/	年 月 日	
参加竣工验收单位意见					
验收范围及内容： 一、验收范围： 本次验收部位为香洲村改造工程 二、主要工程内容： 香洲村改造工程内容包括：给排水工程、道路工程、景观工程、电气工程、建筑工程五个分部工程。 给排水工程施工完成：部分住户给水、村内污水主管网、雨水主管网、入户支管网、雨水检查井、雨水收集井、排水边沟、提升泵站、A线闸门。 道路施工完成：柯家湾及邱家湾村内道路和塔村道路A线、C线、D线原有道路改造和新建新建道路路基填筑、混凝土硬化及沥青刷黑。 景观工程完成：村内柯家湾祠堂左侧山体改造，土地庙前改造、邱家湾祠堂前改造，新建公厕、篮球场、活动中心、篮球场广场、木栈道、亲水平台、停车场、文化广场和柯家湾、邱家湾范围内绿化等施工内容。 电气工程完成：村道路两侧及篮球场太阳能路灯安装架设。 建筑工程完成：村内居民房屋外立面改造、门楣更换等系列施工内容。		建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位
存在问题及处理意见：					

竣工验收证书

工程名称	黄石新港（物流）工业园区村镇改造设计施工EPC总承包工程	开工日期	2022年8月2日	对工程的质量评价 本工程经自验，符合设计、规范及合同要求，达到了竣工验收标准。	
施工单位	中软六局集团有限公司	竣工日期	2023年5月26日		
合同造价（万元）	14660万	施工决算（万元）	/	竣工验收日	年 月 日
参加竣工验收单位意见					
一、验收范围： 本次验收部位为凡庄村改造工程		建设单位	监理单位	设计单位	施工单位
二、主要工程内容： 凡庄村改造工程内容包括：排水工程、道路工程、景观工程、电气工程、建筑工程五个分部工程。		项目负责人	总监理工程师	项目负责人	项目负责人
排水施工完成：村内污水主管网、雨水主管网、入户支管网、排水边沟、雨水收集井、化粪池施工。		项目负责人	项目负责人	项目负责人	项目负责人
道路施工完成：村内内部道路改造、沥青路面施工。		项目负责人	项目负责人	项目负责人	项目负责人
景观工程完成：风水池塘改造、文化长廊、篮球场、景观亭、古树保护、停车位、公厕等系列园建内容，以及村内苗木栽植、草坪铺设等绿化施工。		项目负责人	项目负责人	项目负责人	项目负责人
电气工程完成：村道路两侧及篮球场太阳能路灯安装架设施工。		项目负责人	项目负责人	项目负责人	项目负责人
建筑工程施工完成：茶叶加工厂一座，村内居民房屋外立面改造、门窗更换系列施工。		项目负责人	项目负责人	项目负责人	项目负责人
存在问题及处理意见：					

竣工验收证书

编号: 2

工程名称	黄石新港(物流)工业园区村镇改造设计施工EPC总承包工程	开工日期	2021年4月1日	对本工程的质量评价 本工程经自检,符合设计、规范及合同要求,达到了竣工验收标准。	
施工单位	中软六局集团有限公司	竣工日期	2022年8月30日		
合同造价(万元)	14660万	竣工决算(万元)	/	竣工验收日	2022年9月1日
验收范围及数量:					
一、验收范围: 本次验收部位为三洲村街道改造工程,主要为复兴街、金三路及背街小巷雨水污水升级改造、复兴街主路路面刷黑、人行道铺装及配套设施绿化照明工程。 二、主要工程内容: (1) 给排水工程。污水工程完成主路DN400(HDPE)污水管道3277m,完成背街小巷DN300(HDPE)污水管道8147m;完成DN200PVC四级管网4283m。雨水工程完成混凝土承插雨水管道4185m;完成0.4m*0.4m排水边沟6095m,0.3m*0.3m排水边沟700m。 (2) 道路工程。道路工程人行道铺装完成60422m²,路缘石安装6837.52m,沥青混凝土刷黑完成2874312m²;背街小巷完成新建道路硬化251942m²。 (3) 绿化工程。绿化工程完成桂花树(胸径12cm)350颗,(胸径10cm)241颗;红花继木栽种22002m²,红叶石楠栽种完成22002m²。 (4) 照明工程。照明工程完成配电箱1座,完成路灯(5/7m双臂路灯)80盏,完成电缆铺设2619米。 (5) 交通工程。标线6.6km;斑马线1321m;地面导向线52m²;停车线66m;人行道盲道线43m²;公交停车线84m²;车行道中心线填充60m²。					
建设单位:		监理单位:	设计单位:	勘察单位:	
项目负责人: (盖章)		总监理工程师: (2) (盖章)	项目负责人: (盖章)	项目负责人: (盖章)	
施工单位		监理单位			
项目负责人: (盖章)		项目负责人: (盖章)			
无					

竣工验收证书

通管表 2

工程名称	黄石新港（物流）工业园区村镇改造设计施工 EPC 总承包工程	开工日期	2021 年 10 月 22 日	对工程的质量评价 本工程经自验，符合设计、规范及合同要求，达到了竣工验收标准。	
施工单位	中铁六局集团有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 26 日		
合同造价（万元）	14660 万	竣工决算（万元）	/	年 月 日	
参加竣工验收单位意见					
收范围及内容： 一、验收范围： 本次验收范围为广言村改造工程 二、主要工程内容： 广言村改造工程内容包括：排水工程、道路工程、景观工程、电气工程、建筑工程五个分部工程。 排水施工完成：村内污水主管网、雨水主管网、入户支管网、排水边沟、雨水收集井、化粪池、沉沙池施工。 道路施工完成：村内内环路道路改造、沥青路面施工。 景观工程完成：凤水池塘改造、文化长廊、篮球场、古树保护、古井保护、停车位、公厕、步道铺装、车行栈桥、休闲娱乐广场等系列园建内容，以及村内苗木栽植、草坪铺设等绿化施工。 电气工程完成：村道路两侧及篮球场太阳能路灯安装架设施工。 建筑工程完成：村内居民房屋外立面改造、门管更换系列施工。		建设单位	项目负责  (盖章)	设计单位	项目负责  (盖章)
		监理单位	总监理工程师  (盖章)	勘察单位	项目负责人  (盖章)
无		施工单位	项目负责  (盖章)		
存在问题及处理意见：					

2、东古城街（K0+135-景行路）、涌翠西路（东古城街-兆善大街）道路工程

中标通知书

中标通知书

中铁六局集团有限公司：

你方于 2024年04月07日 所递交的 东古城街（K0+135-景行路）、涌翠西路（东古城街-兆善大街）道路工程（工程名称）施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

工程名称	东古城街（K0+135-景行路）、涌翠西路（东古城街-兆善大街）道路工程		建设规模	东古城街（K0+135-景行路）道路工程，规划为城市支路，道路全长1232.379米，红线宽25米；涌翠西路（兆善大街-东古城街）道路工程，规划为城市支路，道路全长200.221米，红线宽25米。
建设地点	东古城街（K0+135-景行路）、涌翠西路（东古城街-兆善大街）			
中标范围	东古城街（K0+135-景行路）、涌翠西路（东古城街-兆善大街）的道路工程、绿化工程、照明工程、雨水工程、污水工程、再生水工程、桥梁工程、文物保护等施工图纸所示全部内容。			
中标价格	小写：57567933.79元 大写：伍仟柒佰伍拾陆万柒仟玖佰叁拾叁元柒角玖分			
中标工期	282 日历天	计划开工日期	2024年05月16日	
		计划竣工日期	2025年02月22日	
工程质量	合格			
项目经理	黄木田	注册建造师执业资格	注册建造师一级	
备 注	格			

请你方在接到本通知书后的 30 日内到（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

招标人（盖章企业CA电子印章）北京城建设计中心

投资建设集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（盖个人CA电子印章

）

2024年04月18日

合同协议书

副本

北投(合)建建字[2024]-50号

东古城街 (K0+135-景行路)、涌翠西路 (东古城街-

兆善大街) 道路工程

施工合同

BIG

发包人: 北京城市副中心投资建设集团有限公司

承包人: 中铁六局集团有限公司

签订日期: 2024 年 4 月 30 日

第一部分 合同协议书

编号：_____

发包人（全称）：北京城市副中心投资建设集团有限公司

法定代表人：李长利

法定注册地址：北京市通州区潞城镇运河东大街临6号

承包人（全称）：中铁六局集团有限公司

法定代表人：刘胜尧

法定注册地址：北京市海淀区万寿路2号

发包人为建设东古城街（K0+135-景行路）、涌翠西路（东古城街-兆善大街）道路工程（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：东古城街（K0+135-景行路）、涌翠西路（东古城街-兆善大街）道路工程。

工程地点：东古城街（K0+135-景行路）、涌翠西路（东古城街-兆善大街）。

工程内容：东古城街（K0+135-景行路）、涌翠西路（东古城街-兆善大街）的道路工程、绿化工程、照明工程、雨水工程、污水工程、再生水工程、桥梁工程、文物保护等施工图纸所示全部内容。

工程立项批准文号：京通州发改（核）（2023）39号、京通州发改（核）（2023）40号

资金来源：企业自筹。

二、工程承包范围

承包范围：东古城街（K0+135-景行路）、涌翠西路（东古城街-兆善大街）的道路工程、绿化工程、照明工程、雨水工程、污水工程、再生水工程、桥梁工程、文物保护等施工图纸所示全部内容。

详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：2024年05月16日

计划竣工日期：2025年02月22日

工期总日历天数 282 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。工期总日历天数与

根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

工程质量标准：合格。

五、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标。

六、合同形式

本合同采用 固定单价合同形式。

七、签约合同价（含税）

金额（大写）：伍仟柒佰伍拾陆万柒仟玖佰叁拾叁元柒角玖分

（小写）¥：57567933.79元

其中：安全文明施工费（含税）：3109440.1元

材料和工程设备暂估价金额：0元；

建筑垃圾运输处置费（含税）：5219630.45元

暂列金额（含税）：4928447.94元

农民工工伤保险费：75615.00元；

专业工程暂估价（含税）：4500000元

八、承包人项目经理：

姓名：黄木田；

职称：正高级工程师；

身份证号：412321198006123339；

建造师执业资格证书号：0102943；

建造师注册证书号：京 1112006200811367。

建造师执业印章号：京 1112006200811367(00)。

安全生产考核合格证书号：京建安 B (2011) 0076637。

九、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、合同条款专用部分及附件；
- 5、合同条款通用部分；
- 6、已标价工程量清单；

7、技术标准和要求；

8、图纸；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

十、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十三、本协议连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式捌份，合同双方各执肆份。

十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第九条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：北京城市副中心投资建设集团有限公司 承包人：中铁六局集团有限公司

(盖单位章)

(盖单位章)

法定代表人或其

委托代理人：王银峰 (签字)

法定代表人或其

委托代理人：刘时亮 (签字)

2024 年 6 月 30 日

2024 年 4 月 30 日

签约地点：北京市通州区

项目经理变更文件

项目负责人信息变更填报表

工程名称		东古城街（K0+135-景行路）、涌翠西路（东古城街-兆善大街）道路工程	
工程地点		东古城街（K0+135-景行路）、涌翠西路（东古城街-兆善大街）	
经合同双方协商一致，变更原签订工程（ ☒ 施工、 ☐ 监理）合同，现报送项目负责人变更信息。			
变更前信息：合同协议书承包人项目经理 姓名：黄木田 变更后信息：合同协议书承包人项目经理 姓名：孙岩			
变更原因：			
相关材料详见附件			
报送单位			
			
发包人：（加盖单位印章）		承包人或监理人：（加盖单位印章）	
申 办 人	发包人：北京城市副中心投资建设集团 有限公司	联系 电话	
	承包人或监理人： 中铁六局集团有限 公司	联系 电话	

北京市建设工程招标投标管理办公室制

正本

施工合同补充协议（二）

发包人：北京城市副中心投资建设集团有限公司

承包人：中铁六局集团有限公司

鉴于：

2024年4月30日，发包人、承包人签订了合同编号为北投（合）建建字[2024]-50号的《东古城街（K0+136-景行路）、涌翠西路（东古城街-兆善大街）道路工程施工合同》、2024年5月29日，发包人与承包人签订了合同编号为北投（合）建建字[2024]-85号《施工合同补充协议书》（以下简称：“原合同”），原合同中委托的项目经理黄木田同志从承包人处离职，无法继续担任东古城街（K0+135-景行路）道路、跨河（线）桥、排水、再生水工程，涌翠西路（兆善大街-东古城街）道路、排水工程的项目经理，现需变更项目经理人选。

经甲、乙双方友好协商，就变更项目经理事宜签订本协议，具体内容如下：

一、双方同意将东古城街（K0+135-景行路）道路、跨河（线）桥、排水、再生水工程，涌翠西路（兆善大街-东古城街）道路、排水工程项目经理黄木田同志（身份证号码：412321198006123339，注册号：00123526，注册专业：市政公用工程）变更为孙岩同志（孙岩，身份证号码：220421198203010075，注册号：00806436，注册专业：市政公用工程），变更后的项目经理资质、业绩及信誉值均不低于原项目经理。

二、孙岩同志未同时担任其他项目项目经理职务。

三、本协议签署生效前，黄木田履行的承包人项目经理职责发包人与承包人均予以认可；本协议签署生效之日起，由孙岩履行承包人项目经理职责。

四、本补充协议（二）为原合同的修改或补充，与原合同具有同等法律效力，与原合同不一致之处以本补充协议（二）为准。原合同其他内容不变。

六、本补充协议（二）一式拾份，委托人执伍份，承包人执伍份，具有同等法律效力。

七、本补充协议（二）自发包人、承包人各方法定代表人签字或盖人名章（或委托代理人签字）并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

（以下无正文，为签章页）

(本页为签章页)


发包人: 北京城市副中心投资建
设集团有限公司 (盖章)

营业执照号: 911100007577013516

住所: 北京市通州区潞城镇
运河东大街临 6 号

邮政编码: 101100

法定代表人或其委托

代理人: (签字或盖章) 

开户银行: _____

账号: _____ / _____

电话: 010-89538611

传真: _____ / _____

电子邮箱: _____ / _____

承包人: 中铁六局集团有限公司
(盖章)


营业执照号: 91110108101884765M

资质证书编号: D111044715

住所: 北京市海淀区万寿路 2 号

邮政编码: 100036

法定代表人或其委托

代理人: (签字或盖章) 

开户银行: 交通银行股份有限公

司北京定慧寺支行

账号: 1100 6054 4018 0018 30581

电话: 010-68151295

传真: 010-68151295

电子邮箱: kfgs111@163.com

竣工验收报告

附件 1:

工程名称	东古城街（X0+135-渠行路）、道路、跨河（线、桥）、排水、雨水工程、清淤西路（苏嘉大街-东古城街）道路、给水工程		
	110112202405310052 [2024]施（通）市政字 0055 号		
	1432.6m		
	15756.363379万元		
建设单位	姓名	单位	职务
	刘小东	北京城市中心投资建设集团有限公司	项目负责人
	程胜利	中材地质工程勘察研究院有限公司	项目负责人
	陈瑞	北京市市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人
监理单位	孙岩	中铁六局集团有限公司	项目经理
	张秀莲	北京方圆工程监理有限公司	总监监理工程师
	专家:		
	序号	验收项目	验收情况
工程竣工验收内容	1	是否已完成工程设计+合同约定各项内容	是
	2	是否有完整的技术档案和施工管理资料；是否有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告、工程重量检测和功能性能试验报告资料；是否已取得城建档案管理部门出具确认文件	是
	3	工程所含单位工程竣工验收是否合格	是
	4	建设单位是否已按合同约定支付了工程款	是
	5	施工单位是否已签署工程质量保修书	是
	6	是否有规划行政管理部门出具的规划核实确认相关文件	是
	7	无障碍设施是否已验收合格	是
	8	对于住宅工程，质量分户验收是否合格	不涉及
	9	对于民用建筑工程，建设单位是否已组织设计、施工、监理单位对节能工程进行了专项验收	不涉及
	10	商品住宅小区和保障性住房工程，建设单位是否已按分期建设方案要求，组织勘察、设计、施工、监理等有关单位对市政公用基础设施和公共服务设施进行了验收	不涉及
	11	规划许可中注明规划绿地情况的建设工程，对雨污分离工程的验收是否合格	不涉及
	12	是否已在工程明显位置设置了永久性标牌	是
	13	建设单位主管部门及工程重量监督机构责令整改的问题是是否已全部整改完毕	是
	14	法律、法规规定的其他验收条件完成情况	全部完成

[illegible]

四、项目管理机构设置及其他人员配备要求

1.项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	孙岩	高级工程师	建造师注册证	一级	京1112018201901486	市政公用工程	中铁六局集团有限公司	0	无
技术负责人	杜子君	高级工程师	职称证	高级	340607180232082	市政工程	中铁六局集团有限公司	0	无
质量负责人 (质量主任)	邵华	高级工程师	质量员证	高级	1012410600008000005	暖通工程	中铁六局集团有限公司	0	无
安全负责人 (安全主任)	张景飞	高级工程师	安全生产考核合格证	高级	京建安C2(2013)0158564	建筑工程	中铁六局集团有限公司	0	无
专职安全员	吴健	工程师	安全生产考核合格证	中级	京建安C2(2013)0158525	物资设备	中铁六局集团有限公司	0	无
专职安全员	郑昱	工程师	安全生产考核合格证	C 中级	京建安C2(2015)0200427	企业供电	中铁六局集团有限公司	0	无

劳资专管员	高志朋	工程师	劳务员证	中级	1012111300005000517	工程造价	中铁六局集团有限公司	0	无
施工员	张英伟	工程师	施工员证	中级	1012210100009000334	建筑工程	中铁六局集团有限公司	0	无
施工员	赵自硕	工程师	施工员证	中级	1012610400006000020	给排水	中铁六局集团有限公司	0	无
质检员	杜楷	工程师	质量员证	中级	1012610900006000020	市政工程	中铁六局集团有限公司	0	无
质检员	孔德俊	助理工程师	质量员证	初级	1012210600001000150	/	中铁六局集团有限公司	0	无
预算员	段松华	工程师	注册造价师证	中级	建[造]11241100029976	工程造价	中铁六局集团有限公司	0	无
材料员	张虎进	助理工程师	材料员证	初级	1012211100002000250	/	中铁六局集团有限公司	0	无
资料员	滕家星	工程师	资料员证	中级	1012111400002001142	建筑工程	中铁六局集团有限公司	0	无
项目副经理	裴强	高级工程师	建造师注册证	一级	京1142013201303039	市政公用工程	中铁六局集团有限	0	无

							公司		
造价工程师	陈艳格	高级 工程师	注册造价师证	高级	建[造]11261100044016	建筑工程	中铁六局 集团有限 公司	0	无
道路专业工程师	楚浩冲	高级 工程师	职称证	高级	340607190022082	市政工程	中铁六局 集团有限 公司	0	无
岩土专业工程师	马杰	高级 工程师	职称证	高级	340607160012082	岩土工程	中铁六局 集团有限 公司	0	无
机电专业工程师	刘彦章	高级 工程师	职称证	高级	340607180123082	机电工程	中铁六局 集团有限 公司	0	无
交通专业工程师	武云龙	高级 工程师	职称证	高级	340607190004082	交通工程	中铁六局 集团有限 公司	0	无

2. 项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	孙岩	性别	男	年龄	44 岁
职务	项目经理	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	220421198203010075	手机号码	13811589512
参加工作时间	2004 年		从事项目经理（建造师）年限		7 年
项目经理（建造师）资格证书编号		京 1112018201901486			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
黄石新港开发有限公司	黄石新港（物流）工业园区村镇改造设计施工 EPC 总承包	黄石市韦源口镇的三洲村、春湖村、广言村以及太子镇的凡庄村在内的四个乡村街道改造工程。包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、外立面改造、安装工程、修建停车场、其它零星工程。项目总投资 14660 万元。	2021.04.01-2023.05.26	已完	合格
北京城市副中心投资建设集团有限公司	东古城街（K0+135-景行路）、涌翠西路（东古城街-兆善大街）道路工程□	东古城街设计范围西起东古城街K0+135处，东至景行路，设计长度约1232米。涌翠西路设计范围南起兆善大街，北至东古城街，设计长度200.221米。项目建设内容包括：道路工程、照明工程、绿化工程、雨水工程、污水工程、再生水工程、桥梁工程和文物保护等。合同金额：57567933.79元。	2024.05.16-2025.02.22	已完	合格

承诺书

我单位郑重承诺，我单位拟派往岗头西站地下连通通道工程（项目名称）的项目经理孙岩（项目经理姓名）现阶段未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

我单位保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我单位就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人： 中铁六局集团有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）



2026 年 07 月 14 日

项目经理（建造师）孙岩相关证件



1198

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

		系 列	工程
		Series	
		专 业	市政工程
		Profession	
		评审委员会	中国铁路工程集团有限公司
		Evaluation Committee	2023 年工程系列高级评委会
		评审通过时间	2023. 11
		Date of Approval	
姓 名	孙 岩	证书编号	2023050201279
Name		Certificate No.	
性 别	男		
Sex			
出生年月	1982. 03		
Date of Birth			
技术资格	高级工程师		
Technical Qualification			
工作单位	中铁六局集团有限公司	中国铁路工程集团有限公司	
Place of work		职称改革领导小组办公室颁发	
		Issued by Office of Leading Group for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation	



一级建造师

Constructor

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。



姓名：孙岩

证件号码：220421198203010075

性别：男

出生年月：1982 年03月

专业：市政公用工程

批准日期：2018年09月16日

管理号：201809034110004816



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
住房和城乡建设部



使用有效期: 2026年04月15日
- 2026年10月12日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 孙岩

性 别: 男

出生日期: 1982年03月01日

注册编号: 京1112018201901486

聘用企业: 中铁六局集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2025-08-18至2028-08-17)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 孙岩

签名日期: 2026.4.15



中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
签发日期: 2019年11月18日

[首页](#) > [人员数据](#) > [人员列表](#) >

手机查看 

孙岩

证件类型	居民身份证	证件号码	220421*****75	性别	男
注册证书所在单位名称	中铁六局集团有限公司				

[执业注册信息](#) [个人工程业绩](#) [个人业绩技术指标](#) [不良行为](#) [良好行为](#) [黑名单记录](#)

一级注册建造师

注册单位: 中铁六局集团有限公司 注册编号/执业印章号: 京 1112018201901486
注册专业: 市政公用工程 有效期: 2028年08月17日

2025-08-18 - 延续注册 - 市政公用工程
中铁六局集团有限公司

2022-11-01 - 延续注册 - 市政公用工程
中铁六局集团有限公司

2019-11-18 - 重新注册 - 市政公用工程
中铁六局集团有限公司

2019-05-15 - 初始注册 - 市政公用工程
中铁六局集团北京铁路建设有限公司

[查看证书变更记录 \(4\)](#) ^

相关网站导航

[中华人民共和国住房和城乡建设部](#)
[国家工程建设标准化信息网](#)
[住房和城乡建设部执业资格注册中心](#)
[全国建筑工人管理服务信息平台](#)

各省一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量

2 9 5 9 0 7 9 3 2 7

[网站地图](#) [联系我们](#) [管理系统](#)

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码: bm18000002 备案编号: 京ICP备10036469号 技术支持: 安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160120197799>

1/2

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2019）0177259

姓 名：孙岩

性 别：男

出 生 年 月：1982年3月1日

企 业 名 称：中铁六局集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019年12月26日

有 效 期：2025年12月26日 至 2028年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2025年12月26日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110108101884765M
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M
单位名称: 中铁六局集团有限公司

校验码: I3ip1w
查询流水号: 11010820260706082630
查询日期: 2025年06月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
3	刘佟生	654001198201021412	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
4	刘佳慧	653130198006233061	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
5	张辉	652901198403306210	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
6	李梅	652901198302265026	工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1044	刘洋	220523198308262410	失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1045	刘涛	220422198212025312	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1046	李世棋	220421199711013314	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2025年06月	2025年09月	4
			生育保险	2025年06月	2025年09月	4
1047	王雷	220421198210050411	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1048	孙岩	220421198203010075	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
1049	刘忠海	220421198112142312	失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1050	刘松林	220402198202103633	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
1051	赵云龙	220382198303165338	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12



3826	穆鑫浩	110101199304092513	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3827	白瑞	110101198410270518	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

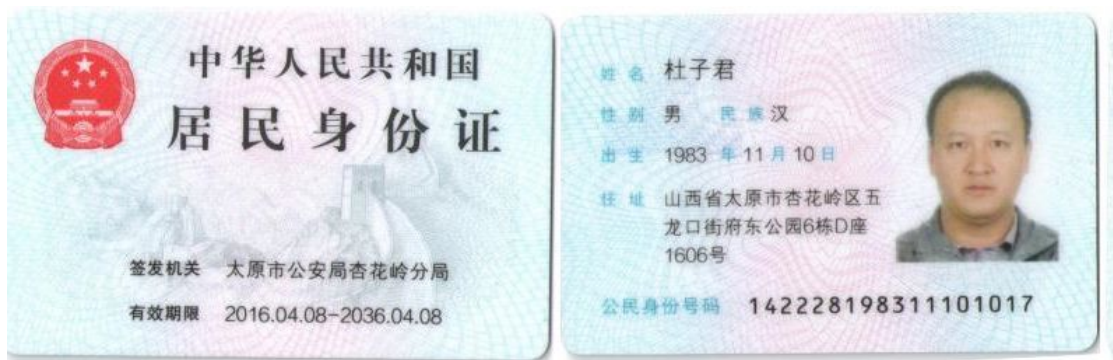
备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期：2026年07月06日

3. 技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	杜子君	性别	男	年龄	43 岁
职务	技术负责人	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	142228198311101017		
手机号码	13653603829		证件号（职称证书编号）	340607180232082	
参加工作时间	2005 年		从事技术负责人年限	10 年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
/	/	/	/	/	/

技术负责人杜子君相关证件





北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110108101884765M 校验码: I3ip1w
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M 查询流水号: 11010820260706082630
单位名称: 中铁六局集团有限公司 查询日期: 2025年06月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1469	白吉美	142230198410270520	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1470	郑鹏宇	142229199609012018	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1471	任志超	142229199507090015	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1472	王俊生	142229197403050511	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1473	安静	142228199804043534	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1474	吕清宇	142228199709260012	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1475	赵旭强	142228199006288510	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1476	杜子君	142228198311101017	养老保险	2025年06月	2026年05月	12

第 205 页 (共 531 页)

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 I3ip1w, 流水号 11010820260706082630, 查询校验结果。



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1476	杜子君	142228198311101017	失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1477	李云丽	142227198706170045	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
1478	张阳阳	14222619961105711X	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
1479	辛晨	142226199609173138	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
1480	张立新	142226199603124917	工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
1481	张永红	142226199505216412	失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1482	殷思远	142226199406011729	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
1483	王森亮	142226199307031716	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12

第 206 页 (共 531 页)



3826	穆鑫浩	110101199304092513	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3827	白瑞	110101198410270518	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12


备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期：2026年07月06日

4. 质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）


姓名	邵华	证件类型	身份证	证件号码	150103196902280035
手机号码	13384879857		证件号（质量员证编号）		1012410600008000005

质量负责人（质量主任）邵华相关证件



证书编码: 1012410600008000005

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 邵华

身份证号: 150103196902280035

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2024年 05月 10 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110108101884765M 校验码: I3ip1w
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M 查询流水号: 11010820260706082630
单位名称: 中铁六局集团有限公司 查询日期: 2025年06月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1296	田嘉英	150105199208134616	失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1297	徐国栋	150105198910224131	养老保险	2025年06月	2025年08月	3
			失业保险	2025年06月	2025年08月	3
			工伤保险	2025年06月	2025年08月	3
			医疗保险	2025年06月	2025年08月	3
			生育保险	2025年06月	2025年08月	3
1298	郭培德	150103199411200110	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
1299	刘鑫	15010319860126011X	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
1300	张悦	150103197903061058	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
1301	孙秀青	150103197004231017	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
1302	邵华	150103196902280035	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
1303	姜文彬	150103196802102012	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12

第 181 页 (共 531 页)

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 I3ip1w, 流水号 11010820260706082630, 查询校验结果。



3826	穆鑫浩	110101199304092513	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3827	白瑞	110101198410270518	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期：2026年07月06日

5. 安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	张景飞	证件类型	身份证	证件号码	610431198301050631
手机号码	15801021123		证件号（C 证编号）		京建安 C2（2013）0158564

安全负责人（安全主任）张景飞相关证件



190-0307



张景飞 610431198301050631

本人签名 张景飞

职业资格
证书管理号 20231004611000002179



姓 名 张景飞

性 别 男

证件号码 610431198301050631

级 别 中 管 级

执业证号 19240361154

发证日期 2024年1月15日



190-0307

注册记录

张景飞 610431198301050631

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 中铁六局集团有限公司

有效期至: 2029年3月15日



注册记录



首页 > 服务 > 办事大厅 > 中级注册安全工程师注册信息查询

中级注册安全工程师

注册信息查询

查询结果

姓名	张景飞
注册证书号	192403611154
聘用单位	中铁六局集团有限公司
证书有效期	2029-03-15
注册类别	建筑施工安全
备注	--

1

网站地图 | 联系我们

主办单位: 应急管理部

网站备案号:bm34000001 京ICP备18056520号-2



建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2013）0158564

姓 名：张景飞

性 别：男

出 生 年 月：1983年1月5日

企 业 名 称：中铁六局集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2013年10月29日

有 效 期：2025年11月29日 至 2028年12月31日



发 证 机 关：北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2025年11月29日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

当前位置: 首页 > 施工安全 > 安全生产管理人员考核合格证书信息详情

安全生产管理人员考核合格证书信息

执业注册信息(0)

安全生产管理人员考核合格证书信息

返回

姓名	张景飞	性别	男
身份证件类型	公民身份号码	身份证件号码	610*****31
安全生产管理人员类型	土建类专职安全生产管理人员		
安全生产管理人员考核合格证书编号	京建安C2 (2013) 0158564	证书状态	有效
所在企业名称	中铁六局集团有限公司	所在企业统一社会信用代码	91110108101884765M
职务	专职安全生产管理人员	发证机关	北京市住房和城乡建设委员会
初次领证日期	2013-10-29	发证日期	2025-11-29
有效期起始日期	2025-11-29	有效期结束日期	2028-12-31

执业注册信息

序号	注册类别	注册执业证号
暂无数据		



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110108101884765M 校验码: I3ip1w
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M 查询流水号: 11010820260706082630
单位名称: 中铁六局集团有限公司 查询日期: 2025年06月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
209	王嘉成	610502199702085235	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
210	赵恩	610502199510055859	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
211	王小鹏	610502198105250218	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
212	张璐	610481198708070523	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
213	张景飞	610431198301050631	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
214	李锦	610425199701030426	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
215	陈艳格	610425198308285022	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
216	董雷	610425198303162410	养老保险			

第 30 页 （ 共 531 页 ）

查询方法：登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，输入校验码 I3ip1w，流水号 11010820260706082630，查询校验结果。



3826	穆鑫浩	110101199304092513	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3827	白瑞	110101198410270518	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期：2026年07月06日

6. 安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	吴健	证件类型	身份证	证件号码	140107198212083619
手机号码	15234176688		证件号（C 证编号）		京建安 C2（2013）0158525

姓名	郑昱	证件类型	身份证	证件号码	62010219800223467X
手机号码	13643464629		证件号（C 证编号）		京建安 C2（2015）0200427

安全员吴健相关证件



建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2013）0158525

姓 名：吴健

性 别：男

出 生 年 月：1982年12月8日

企 业 名 称：中铁六局集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2013年10月29日

有 效 期：2025年11月29日 至 2028年12月31日



发 证 机 关：北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2025年11月29日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

当前位置: 首页 > 施工安全 > 安全生产管理人员考核合格证书信息详情

安全生产管理人员考核合格证书信息

执业注册信息(0)

★ 安全生产管理人员考核合格证书信息

返回

姓名	吴健	性别	男
身份证件类型	公民身份号码	身份证件号码	140*****19
安全生产管理人员类型	土建类专职安全生产管理人员		
安全生产管理人员考核合格证书编号	京建安C2 (2013) 0158525	证书状态	有效
所在企业名称	中铁六局集团有限公司	所在企业统一社会信用代码	91110108101884765M
职务	专职安全生产管理人员	发证机关	北京市住房和城乡建设委员会
初次领证日期	2013-10-29	发证日期	2025-11-29
有效期起始日期	2025-11-29	有效期结束日期	2028-12-31

执业注册信息

序号	注册类别	注册执业证号
暂无数据		



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110108101884765M

校验码: I3ip1w

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M

查询流水号: 11010820260706082630

单位名称: 中铁六局集团有限公司

查询日期: 2025年06月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1685	吴健	140107198212083619	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1686	王斌	140107198210026637	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1687	池叔宝	140107198207010618	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1688	王亚军	140107198001116636	养老保险	2025年07月	2026年05月	11
			失业保险	2025年07月	2026年05月	11
			工伤保险	2025年07月	2026年05月	11
			医疗保险	2025年07月	2026年05月	11
			生育保险	2025年07月	2026年05月	11
1689	宋永喜	140107197410073927	养老保险	2025年06月	2025年06月	1
			失业保险	2025年06月	2025年06月	1
			工伤保险	2025年06月	2025年06月	1
			医疗保险	2025年06月	2025年06月	1
			生育保险	2025年06月	2025年06月	1
1690	闫明玮	140106200004300619	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1691	杜威霖	140106199801092538	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1692	白澜	140106199702162545	养老保险	2025年06月	2026年05月	12

第 235 页 (共 531 页)

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 I3ip1w, 流水号 11010820260706082630, 查询校验结果。

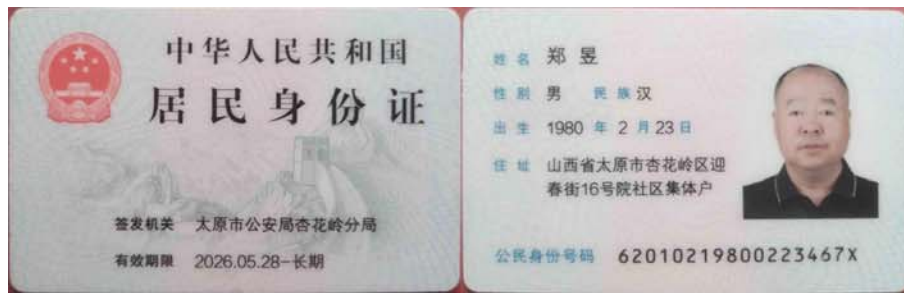


3826	穆鑫浩	110101199304092513	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3827	白瑞	110101198410270518	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期：2026年07月06日

安全员郑昱相关证件



建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2015）0200427

姓 名：郑昱

性 别：男


出 生 年 月：1980年2月23日

企 业 名 称：中铁六局集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2015年9月21日

有 效 期：2024年11月29日 至 2027年12月31日



发 证 机 关：北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2024年11月29日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



社会保险登记号: 91110108101884765M

校验码: I3ip1w

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M

查询流水号: 11010820260706082630

单位名称: 中铁六局集团有限公司

查询日期: 2025年06月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12

第 1 页 (共 531 页)



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
165	李炜	620102198106173613	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
166	郑昱	62010219800223467X	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
167	李文森	612732198603191514	失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
168	惠小龙	612731198509193218	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
169	高军卫	612729198308042139	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
170	丁周周	612727199610241819	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
171	姜恒	612726199710301210	工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
172	高沛锦	612726199702163612	失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

第 24 页 (共 531 页)

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 I3ip1w, 流水号 11010820260706082630, 查询校验结果。



3826	穆鑫浩	110101199304092513	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3827	白瑞	110101198410270518	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期：2026年07月06日

7. 劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	高志朋	证件类型	身份证	证件号码	410185199704030512
手机号码	15093355377		证件号		1012111300005000517

劳资专管员高志朋相关证件



证书编码: 1012111300005000517

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 高志朋

身份证号: 410185199704030512

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2021年 06月 11 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110108101884765M 校验码: I3ip1w
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M 查询流水号: 11010820260706082630
单位名称: 中铁六局集团有限公司 查询日期: 2025年06月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
698	雷春锋	410223199606060554	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
699	宋治杰	410223199402190031	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
700	李潇亚	410221199406102219	失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
701	李婷茹	410221199012074841	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
702	马龙	410221199003173012	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
703	刘勇敢	410221198801048879	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
704	袁海洋	41018519970620351X	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
705	高志朋	410185199704030512	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12

第 98 页 (共 531 页)

查询方法：登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，输入校验码 I3ip1w，流水号 11010820260706082630，查询校验结果。



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
705	高志朋	410185199704030512	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
706	李洋	41018419861029011X	失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
707	吴亚琦	410183199905031017	失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
708	吉鹏英	410183199601014832	失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
709	陈承杰	410183199205083019	失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
710	王璞	410182199602072915	失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
711	王航帆	410181199611211511	失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
712	王松亮	410123197011251816	失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12

第 99 页 (共 531 页)

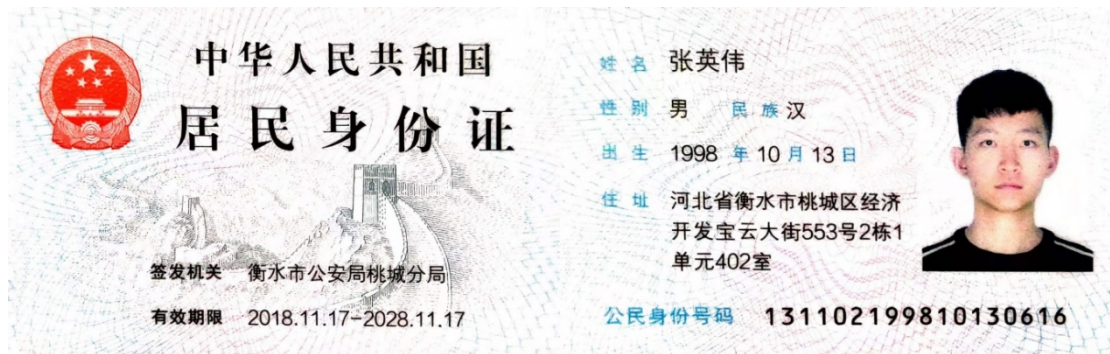


3826	穆鑫浩	110101199304092513	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3827	白瑞	110101198410270518	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rs.j.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期：2026年07月06日

施工员张英伟相关证件



	系列工程 Series
	专业建筑工程 Profession
	评审委员会 Evaluation Committee
	中铁六局集团工程中评委
	评审通过时间 Date of Approval
	2025.07
姓名 Name	张英伟
性别 Sex	男
出生年月 Date of Birth	1998.10
技术资格 Technical Qualification	工程师
工作单位 Place of work	中铁六局集团有限公司
	证书编号 Certificate No:
	2025050304218
	中国铁路工程集团有限公司 Office of Leading Group for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation

证书编码: 1012210100009000334

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 张英伟

身份证号: 131102199810130616

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2022年 08月 08 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110108101884765M 校验码: I3ip1w
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M 查询流水号: 11010820260706082630
单位名称: 中铁六局集团有限公司 查询日期: 2025年06月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1987	句子昂	131102200004014413	工伤保险			
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1988	张英伟	131102199810130616	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险			
1989	扈彦林	131102198603070812	失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1990	冯瑞超	131102198410040414	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
1991	王宇	131082199606120011	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2025年10月	5
			失业保险	2025年06月	2025年10月	5
			工伤保险	2025年06月	2025年10月	5
1992	司泐	131082199509130277	医疗保险	2025年06月	2025年10月	5
			生育保险	2025年06月	2025年10月	5
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
1993	宋琦	13108219931124077X	工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
1994	吴艳青	131082198406260517	失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12

第 277 页 (共 531 页)

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 I3ip1w, 流水号 11010820260706082630, 查询校验结果。



3826	穆鑫浩	110101199304092513	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3827	白瑞	110101198410270518	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期：2026年07月06日

施工员赵自硕相关证件





姓名
Name 赵自硕

性别
Sex 男

出生年月
Date of Birth 1997.01

技术资格
Technical Qualification 工程师

工作单位
Place of work 中铁六局集团有限公司

系列
Series 工程

专业
Profession 给排水

评审委员会
Evaluation Committee 中铁六局集团工程中评委

评审通过时间
Date of Approval 2025.07

证书编号
Certificate No. 2025050304421

中国铁路工程集团有限公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Group
for Reform of Professional Titles of
China Railway Engineering Corporation



证书编码: 1012610400006000020

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 赵自硕

身份证号: 410421199701305036

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2026年04月29日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110108101884765M 校验码: I3ip1w
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M 查询流水号: 11010820260706082630
单位名称: 中铁六局集团有限公司 查询日期: 2025年06月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
662	丰志浩	410482198607107736	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
663	颜鹏飞	410426198801130517	养老保险	2025年09月	2026年05月	9
			失业保险	2025年09月	2026年05月	9
			工伤保险	2025年09月	2026年05月	9
			医疗保险	2025年09月	2026年05月	9
			生育保险	2025年09月	2026年05月	9
			养老保险			
664	王梓硕	410425200104170015	失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
665	闫石磊	410423199804038033	养老保险	2025年06月	2025年08月	3
			失业保险	2025年06月	2025年08月	3
			工伤保险	2025年06月	2025年08月	3
			医疗保险	2025年06月	2025年08月	3
			生育保险	2025年06月	2025年08月	3
666	赵自硕	410421199701305036	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
667	贾鹏超	410421198308084033	失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
668	田园兴	410402199610035596	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
669	董天鹏	410329199609289657	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12

第 93 页 (共 531 页)

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 l3ip1w, 流水号 11010820260706082630, 查询校验结果。



3826	穆鑫浩	110101199304092513	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3827	白瑞	110101198410270518	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期：2026年07月06日

质检员杜楷相关证件

中华人民共和国居民身份证

签发机关 柳林县公安局
有效期限 2017.08.18-2027.08.18

姓名 杜楷
性别 男 民族 汉
出生 1996 年 10 月 16 日
住址 山西省柳林县柳林镇石家沟北路68号西街1组
公民身份号码 142327199610166631



普通高等学校

毕业证书

学生 杜楷 性别 男，一九九六年十月十六日生，于二〇一四年九月至二〇一八年七月在本校 土木工程
专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：山西大同大学
校 长：焦锦
证书编号：101201201805001504
二〇一八年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



姓名 杜楷
性别 男
出生年月 1996.10
技术资格 工程师
工作单位 中铁六局集团有限公司

系列 工 程
专业 市政工程
评审委员会 中铁六局集团工程中评委
评审通过时间 2023.07

证书编号 2023050301211
Certificate No. 2023050301211

中国铁路工程集团有限公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Group
for Reform of Professional Titles of
China Railway Engineering Corporation



证书编码: 1012610900006000020

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 杜楷

身份证号: 142327199610166631

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2026年04月29日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110108101884765M
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M
单位名称: 中铁六局集团有限公司

校验码: I3ip1w
查询流水号: 11010820260706082630
查询日期: 2025年06月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1440	杜志荣	142331199303170010	失业保险	2025年06月	2025年11月	6
			工伤保险	2025年06月	2025年11月	6
			医疗保险	2025年06月	2025年11月	6
			生育保险	2025年06月	2025年11月	6
1441	杨三姓	142330199108063133	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
1442	王全亮	142330197810227215	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
1443	刘志鹏	142329198407250211	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
1444	李伟	142328198805110314	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
1445	杜楷	142327199610166631	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
1446	马月顺	142326199406111418	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
1447	樊经宇	14232619891209293X	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12

第 201 页 （ 共 531 页 ）

查询方法：登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，输入校验码 l3ip1w，流水号 11010820260706082630，查询校验结果。

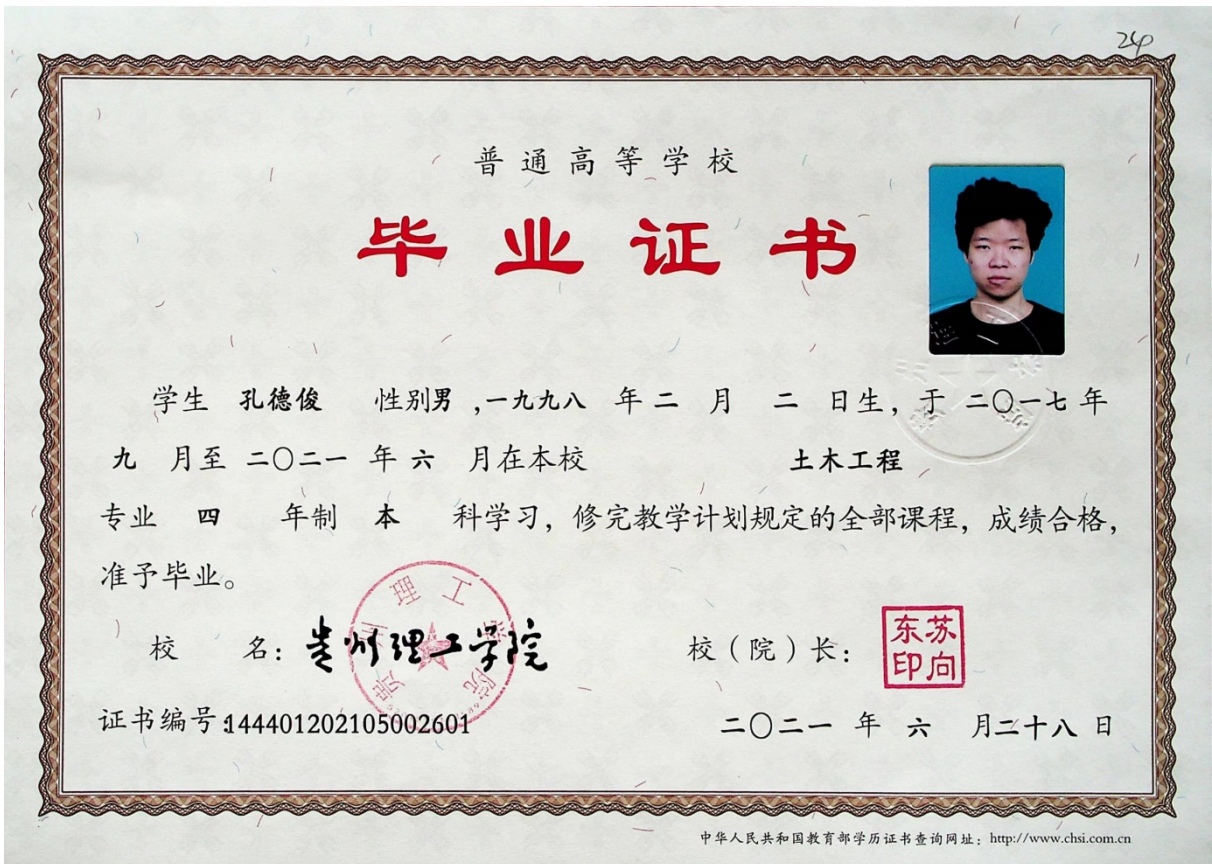


3826	穆鑫浩	110101199304092513	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3827	白瑞	110101198410270518	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期：2026年07月06日

质检员孔德俊相关证件



证书编码: 1012210600001000150

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 孔德俊

身份证号: 52272719980202151X

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2022年 06月 16 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110108101884765M 校验码: I3ip1w
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M 查询流水号: 11010820260706082630
单位名称: 中铁六局集团有限公司 查询日期: 2025年06月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12

北京市社会保险基金管理中心

北京市医疗保险事务管理中心

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

业务专用章

个人权益专用章

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
273	罗生贵	522728199604027544	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
274	孔德俊	52272719980202151X	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
275	犹斌	52272519990405191X	失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
276	彭有静	522724199503292177	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
277	王真贵	522635199402283232	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
278	谌锴	522627198012011210	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
279	程华	522627197701180015	工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
280	韩浪	522428199809024836	失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12



3826	穆鑫浩	110101199304092513	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3827	白瑞	110101198410270518	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rs.j.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期：2026年07月06日

预算员段松华相关证件



使用有效期: 2026年07月06日
- 2026年10月04日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 段松华
性 别: 男
出 生 日 期: 1996年06月01日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11241100029976
有 效 期: 2024年05月15日-2028年05月14日
聘 用 单 位: 中铁六局集团有限公司



段松华

个人签名:

段松华

签名日期:

2026.07.06



发证日期: 2024年04月30日

[首页](#) > [人员数据](#) > [人员列表](#)

手机查看 

段松华

证件类型	居民身份证	证件号码	130682*****37	性别	男
注册证书所在单位名称	中铁六局集团有限公司				

[执业注册信息](#) [个人工程业绩](#) [个人业绩技术指标](#) [不良行为](#) [良好行为](#) [黑名单记录](#)

一级注册造价工程师

注册单位: 中铁六局集团有限公司 证书编号: 建[造]11241100029976 注册编号/执业印章号: 811241100029976
注册专业: 土建 有效期: 2028年05月14日

2024-03-28 - 初始注册 - 土建
中铁六局集团有限公司

[查看证书变更记录 \(1\)](#)

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量

2 9 5 9 3 0 7 4 3 3

 [网站地图](#)  [联系我们](#)  [管理系统](#)

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码: bm18000002 备案编号: 京ICP备10036469号 技术支持: 安徽鼎拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110108101884765M 校验码: I3ip1w
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M 查询流水号: 11010820260706082630
单位名称: 中铁六局集团有限公司 查询日期: 2025年06月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
2253	马长征	130682199608170642	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
2254	段松华	130682199606016937	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险			
2255	安少康	13068219950613571X	失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
2256	王天一	130682199502035412	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
2257	郝晨旭	130682199304110338	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
2258	李磊	130682199109155434	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
2259	郑强	130682198803247852	工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
2260	李朋彬	130682198705096915	失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

第 314 页 (共 531 页)

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 I3ip1w, 流水号 11010820260706082630, 查询校验结果。



3826	穆鑫浩	110101199304092513	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3827	白瑞	110101198410270518	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期：2026年07月06日

材料员张虎进相关证件



证书编码: 1012211100002000250

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 张虎进

身份证号: 620523199706231416

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2022年 07月 18 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110108101884765M 校验码: I3ip1w
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M 查询流水号: 11010820260706082630
单位名称: 中铁六局集团有限公司 查询日期: 2025年06月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
108	田文强	622102198505168610	失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
109	范金刚	622101198606252938	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
110	曹颖	620525198503170463	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
111	车建龙	620524199909063279	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
112	马彦彪	620523199810292593	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
113	蒲若涵	620523199802262896	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
114	张虎进	620523199706231416	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
115	康军胜	620523199501203796	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12

第 16 页 (共 531 页)

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 I3ip1w, 流水号 11010820260706082630, 查询校验结果。



3826	穆鑫浩	110101199304092513	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3827	白瑞	110101198410270518	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rs.j.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期：2026年07月06日

资料员滕家星相关证件



证书编码: 1012111400002001142

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 滕家星

身份证号: 130681199704301014

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2021年 12月 21 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110108101884765M 校验码: I3ip1w
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M 查询流水号: 11010820260706082630
单位名称: 中铁六局集团有限公司 查询日期: 2025年06月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
2268	曹杨	130681199910095813	失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
2269	滕家星	130681199704301014	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
2270	陈李沅鸽	130681199110291242	失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
2271	付梓康	130681199005021259	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
2272	付超	13068119890709281X	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
2273	臧福双	130681198901283818	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
2274	崔娇	130681198610141019	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
2275	王宏伟	130681198404071419	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

第 316 页 (共 531 页)

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 I3ip1w, 流水号 11010820260706082630, 查询校验结果。



3826	穆鑫浩	110101199304092513	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3827	白瑞	110101198410270518	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期：2026年07月06日

项目副经理裴强相关证件



	姓名: 裴强 Full Name 性别: 男 Sex 出生年月: 1981年6月 Date of Birth 专业类别: 建筑工程 Professional Type 批准日期: 2012年9月23日 Approval Date	本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试, 取得一级建造师的执业资格。 This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.
持证人签名: Signature of the Bearer	签发单位盖章: Issued by 签发日期: 2013年4月22日 Issued on	 Ministry of Human Resources and Social Security The People's Republic of China
管理号: File No.:		 Ministry of Housing and Urban-Rural Development The People's Republic of China 编号: No.: 0375745

299

一级建造师

本证明表明持有人已参加中华人民共和国一级建造师相应专业类别考试并取得合格成绩。本证明作为注册时增加执业岗位专业类别的依据。


人力资源和社会保障部
人事考试中心



姓名: 裴强
证件号码: 142322198106111010
性别: 男
出生年月: 1981年06月
专业: 市政公用工程
批准日期: 2018年09月16日
管理号: 201809034140001219



一级建造师

本证明表明持有人已参加一级建造师相应专业类别考试并取得合格成绩。本证明作为注册时增加执业岗位专业类别的依据。


人力资源和社会保障部
人事考试中心



姓名: 裴强
证件号码: 142322198106111010
性别: 男
出生年月: 1981年06月
专业: 铁路工程
批准日期: 2023年03月26日
管理号: 20221203444000005208





使用有效期: 2026年05月26日
- 2026年11月22日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 裴强

性 别: 男

出生日期: 1981年06月11日

注册编号: 京1142013201303039

聘用企业: 中铁六局集团有限公司



注册专业: 建筑工程(有效期: 2025-09-05至2028-09-04)


铁路工程(有效期: 2023-07-20至2026-07-19)

市政公用工程(有效期: 2025-09-05至2028-09-04)

机电工程(有效期: 2025-01-14至2028-01-13)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 裴强

签名日期: 2026.5.26



裴强

证件类型	居民身份证	证件号码	142322*****10	性别	男
注册证书所在单位名称	中铁六局集团有限公司				

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位：中铁六局集团有限公司

证书编号：建[造]11221100013430

注册编号/执业印章号：B11221100013430

注册专业：土建

有效期：2026年06月15日

2022-05-10 - 初始注册 - 土建

中铁六局集团有限公司

查看证书变更记录 (1) ^

一级注册建造师

注册单位：中铁六局集团有限公司

注册编号/执业印章号：京 1142013201303039

注册专业：市政公用工程

有效期：2028年09月04日

注册专业：机电工程

有效期：2028年01月13日

注册专业：铁路工程

有效期：2026年07月19日

注册专业：建筑工程

有效期：2028年09月04日

2025-09-05 - 延续注册 - 建筑工程, 市政公用工程

中铁六局集团有限公司

2025-01-14 - 增项注册 - 机电工程

中铁六局集团有限公司

2023-07-20 - 增项注册 - 铁路工程

中铁六局集团有限公司

2022-11-17 - 延续注册 - 建筑工程,市政公用工程
中铁六局集团有限公司

2019-12-06 - 重新注册 - 建筑工程,市政公用工程
中铁六局集团有限公司

2015-03-05 - 变更注册 - 已注册专业
原聘用企业: 中铁六局集团太原铁路建设有限公司, 现聘用企业: 中铁六局集团建筑安装工程有限公司

2013-12-11 - 初始注册 - 建筑工程
中铁六局集团太原铁路建设有限公司

查看证书变更记录 (7) ^

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量

2828189835

网站地图

联系我们

管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码: bm18000002 备案编号: 京ICP备10036469号 技术支持: 安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160130808203

2/2

330

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2021）0187782

姓 名：裴强

性 别：男

出 生 年 月：1981年6月11日

企 业 名 称：中铁六局集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2021年3月31日

有 效 期：2024年11月29日 至 2027年12月31日



发 证 机 关：北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2024年11月29日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户

住房和城乡建设部

无障碍浏览

登录

首页

信息公示

勘察设计

工程质量

施工安全

城市轨道交通

当前位置: 首页 > 施工安全 > 安全生产管理人员考核合格证书信息详情

安全生产管理人员考核合格证书信息

执业注册信息(2)

★ 安全生产管理人员考核合格证书信息

返回

姓名	裴强	性别	男
身份证件类型	公民身份号码	身份证件号码	142*****10
安全生产管理人员类型	项目负责人		
安全生产管理人员考核合格证书编号	京建安B (2021) 0187782	证书状态	有效
所在企业名称	中铁六局集团有限公司	所在企业统一社会信用代码	91110108101884765M
职务	项目负责人 (项目经理)	发证机关	北京市住房和城乡建设委员会
初次领证日期	2021-03-31	发证日期	2024-11-29
有效期起始日期	2024-11-29	有效期结束日期	2027-12-31

执业注册信息

序号	注册类别	注册执业证号
1	一级造价工程师	B11221100013430
2	注册建造师 (一级)	京1142013201303039

地方网站

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林 / 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西 / 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南 / 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃 / 青海 / 宁夏 / 新疆 / 新疆兵团

联系我们

网站访问量(人次)

53336575

版权所有: 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部工程质量安全监管司 承办单位: 住房和城乡建设部信息中心

技术支持: 国泰新点软件股份有限公司 备案编号: 京ICP备10036469号 建议您使用最新版本的Edge、Firefox或360极速浏览器等主流浏览器访问本系统, 以获得最佳体验。

https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglrydetail?rowguid=3fc44425-bdef-4bad-89c8-6e8ccc... 1/1

332



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110108101884765M 校验码: I3ip1w
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M 查询流水号: 11010820260706082630
单位名称: 中铁六局集团有限公司 查询日期: 2025年06月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12

北京市社会保险基金管理中心

北京市医疗保险事务管理中心

北京市社会保险基金管理中心业务专用章

北京市医疗保险事务管理中心个人权益专用章

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1454	陈磊	142322198402180512	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1455	裴强	142322198106111010	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
1456	任增伟	142321197907244111	失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1457	王泽民	142303199902220117	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
1458	武宝昇	142303199512217633	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
1459	沈建	142303199512205317	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
1460	王嫒	142303198807144529	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
1461	张剑	142303198612160019	生育保险			
			养老保险			
			失业保险			
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12

第 203 页 （ 共 531 页 ）

查询方法：登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，输入校验码 l3ip1w，流水号 11010820260706082630，查询校验结果。



3826	穆鑫浩	110101199304092513	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3827	白瑞	110101198410270518	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期：2026年07月06日

造价工程师陈艳格相关证件




使用有效期: 2026年05月27日
- 2026年08月25日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 陈艳格
性 别: 女
出 生 日 期: 1983年08月28日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11261100044016
有 效 期: 2026年05月22日-2030年05月21日
聘 用 单 位: 中铁六局集团有限公司



个人签名: 陈艳格

签名日期: 2026.5.07



发证日期: 2026年05月22日

[首页](#) > [人员数据](#) > [人员列表](#) >

手机查看 

陈艳格

证件类型	居民身份证	证件号码	610425*****22	性别	女
注册证书所在单位名称	中铁六局集团有限公司				

[执业注册信息](#) [个人工程业绩](#) [个人业绩技术指标](#) [不良行为](#) [良好行为](#) [黑名单记录](#)

一级注册造价工程师

注册单位: 中铁六局集团有限公司

证书编号: 建[造]11261100044016

注册编号/执业印章号: 811261100044016

注册专业: 土建

有效期: 2030年05月21日

2026-04-07 - 初始注册 - 土建
中铁六局集团有限公司

[查看证书变更记录 \(1\)](#) ^

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量

2 9 5 9 0 0 2 0 5 5

[网站地图](#) [联系我们](#) [管理系统](#)

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码: bm18000002 备案号: 京ICP备10036469号 技术支持: 安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002605262351763519>

1/2



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110108101884765M 校验码: I3ip1w
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M 查询流水号: 11010820260706082630
单位名称: 中铁六局集团有限公司 查询日期: 2025年06月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
209	王嘉成	610502199702085235	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
210	赵恩	610502199510055859	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
211	王小鹏	610502198105250218	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
212	张璐	610481198708070523	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
213	张景飞	610431198301050631	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
214	李锦	610425199701030426	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
215	陈艳格	610425198308285022	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
216	董雷	610425198303162410	养老保险			

第 30 页 （ 共 531 页 ）

查询方法：登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，输入校验码 l3ip1w，流水号 11010820260706082630，查询校验结果。



3826	穆鑫浩	110101199304092513	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3827	白瑞	110101198410270518	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期：2026年07月06日

道路专业工程师楚浩冲相关证件



中华人民共和国居民身份证

签发机关 北京市公安局朝阳分局

有效期限 2018.11.23-2038.11.23

姓名 楚浩冲

性别 男 民族 汉

出生 1986 年 2 月 24 日

住址 北京市朝阳区小红门乡博大路25号院1号楼1501号

公民身份号码 130635198602240414



普通高等学校

毕业证书



学生 楚浩冲 性别 男，1986 年 02 月 24 日生，于 二〇〇五年 九月至二〇〇九年 六月在本校 土木工程 专业 四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：石家庄铁道学院四方学院 校（院）长：戴运良

证书编号：135931200905000127 二〇〇九年 六 月 十八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网站：<http://www.chsi.com.cn>



系 列 工 程

Series

专 业 市政工程

Profession

评审委员会 中国铁路工程集团有限公司

Evaluation Committee 工程系列高级评委会

评审通过时间 2019.11

Date of Approval

姓 名 楚浩冲

Name

性 别 男

Sex

出生年月 1986.02

Date of Birth

技术资格 高级工程师

Technical Qualification

工作单位 中铁六局集团有限公司

Place of work

证书编号 340607190032082

Certificate No.

中国铁路工程总公司

职称改革领导小组办公室颁发

Issued by Office of Leading Group for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110108101884765M

校验码: I3ip1w

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M

查询流水号: 11010820260706082630

单位名称: 中铁六局集团有限公司

查询日期: 2025年06月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12

北京市社会保险基金管理中心

北京市医疗保险事务管理中心

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

业务专用章

个人权益专用章

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
2297	楚浩冲	130635198602240414	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
2298	代松涛	130635198505191059	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
2299	张行威	130635198406121610	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
2300	郝晨阳	130634200408182779	养老保险	2025年08月	2026年05月	10
			失业保险	2025年08月	2026年05月	10
			工伤保险	2025年08月	2026年05月	10
			医疗保险	2025年08月	2026年05月	10
			生育保险	2025年08月	2026年05月	10
2301	和伊阳	13063420031019195X	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2025年08月	2026年05月	10
			生育保险	2025年08月	2026年05月	10
2302	高嘉豪	130634200301092730	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
2303	李晨光	130634200206253532	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2025年08月	2026年05月	10
			生育保险	2025年08月	2026年05月	10
2304	郝少伟	130634200108082717	养老保险	2025年06月	2026年05月	12

第 320 页 （ 共 531 页 ）

查询方法：登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，输入校验码 I3ip1w，流水号 11010820260706082630，查询校验结果。



3826	穆鑫浩	110101199304092513	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3827	白瑞	110101198410270518	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期：2026年07月06日

岩土专业工程师马杰相关证件



		系 列	工 程
		Series	
		专 业	岩土工程
		Profession	
		评审委员会	中国铁路工程总公司工程高评委
		Evaluation Committee	
		评审通过时间	2016. 11
		Date of Approval	
		证书编号	340607160012082
		Certificate No:	
姓 名 马杰 Name _____		中国铁路工程总公司 职称改革领导小组办公室颁发 Issued by Office of Leading Group for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation	
性 别 男 Sex _____			
出生年月 1977. 05 Date of Birth _____			
技术资格 高级工程师 Technical Qualification _____			
工作单位 中铁六局集团有限公司 Place of work _____			



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110108101884765M

校验码: I3ip1w

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M

查询流水号: 11010820260706082630

单位名称: 中铁六局集团有限公司

查询日期: 2025年06月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
461	陈红波	43042119860409175X	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
462	肖富春	43042119780924417X	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
463	刘玥岑	430407198706180027	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
464	谭春燕	430403198301011043	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
465	褚建国	430403197810151015	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
466	褚建国	430403197810151015	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
467	马杰	430403197705111038	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
468	王建平	430403197202061016	养老保险	2025年06月	2026年05月	12

第 65 页 (共 531 页)

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 l3ip1w, 流水号 11010820260706082630, 查询校验结果。



3826	穆鑫浩	110101199304092513	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3827	白瑞	110101198410270518	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期：2026年07月06日

机电专业工程师刘彦章相关证件





北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110108101884765M 校验码: I3ip1w
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M 查询流水号: 11010820260706082630
单位名称: 中铁六局集团有限公司 查询日期: 2025年06月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1800	郭红军	132927196910010011	失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1801	李洪均	132927196909153015	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2025年06月	2025年11月	6
1802	张国良	132926196608302914	生育保险	2025年06月	2025年11月	6
			养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
1803	咸瑞庆	132902198009267211	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2026年02月	2026年05月	4
			失业保险	2026年02月	2026年05月	4
1804	付春玲	1329021977108053628	工伤保险	2026年02月	2026年05月	4
			医疗保险	2026年02月	2026年05月	4
			生育保险	2026年02月	2026年05月	4
			养老保险	2026年02月	2026年05月	4
1805	王颖	132829198112272726	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
1806	王磊	132829198011211510	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年10月	2026年05月	8
			失业保险	2025年10月	2026年05月	8
			工伤保险	2025年10月	2026年05月	8
1807	刘彦章	132829198001242719	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12

第 251 页 (共 531 页)

查询方法：登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，输入校验码 I3ip1w，流水号 11010820260706082630，查询校验结果。



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1807	刘彦章	132829198001242719	工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险			
1808	李欢迎	132829197312061515	失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1809	陈振东	132829197305180313	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
1810	王汝才	13282919710428241X	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			
1811	刘桂英	13282919700815272X	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险			
			失业保险			
1812	张希华	132829196706155130	工伤保险			
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险			
1813	王永乐	132828197404068611	失业保险			
			工伤保险			
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1814	郝建国	132828196812011417	养老保险			
			失业保险			
			工伤保险			

第 252 页 (共 531 页)



3826	穆鑫浩	110101199304092513	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3827	白瑞	110101198410270518	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rs.j.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

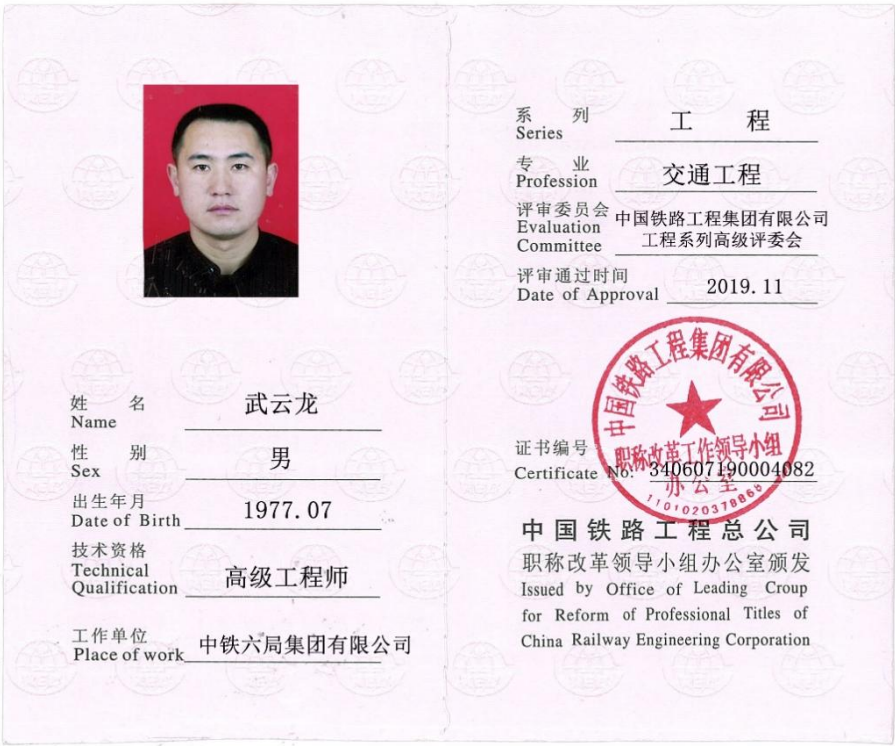
北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期：2026年07月06日

交通专业工程师武云龙相关证件



06412536

No.06 01812954





北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110108101884765M 校验码: I3ip1w
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110108101884765M 查询流水号: 11010820260706082630
单位名称: 中铁六局集团有限公司 查询日期: 2025年06月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	成刚	654301198408152213	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
2	罗虎	654226197903100135	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3	刘佟生	654001198201021412	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
4	刘佳慧	653130198006233061	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
5	张辉	652901198403306210	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
6	李梅	652901198302265026	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
7	丁燕	65272319930120002X	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1317	李军	150102197011264056	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1318	郭全忠	150102196809064550	养老保险	2025年10月	2026年05月	8
			失业保险	2025年10月	2026年05月	8
			工伤保险	2025年10月	2026年05月	8
			医疗保险	2025年10月	2026年05月	8
			生育保险	2025年10月	2026年05月	8
1319	王广厚	150102196808144137	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1320	周继东	150102196611184039	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1321	张永乐	150102196605254010	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1322	姚树民	150102196510144177	养老保险	2025年06月	2026年01月	8
			失业保险	2025年06月	2026年01月	8
			工伤保险	2025年06月	2026年01月	8
			医疗保险	2025年06月	2026年01月	8
			生育保险	2025年06月	2026年01月	8
1323	武云龙	149001197707261018	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
1324	张寅	142733198611100356	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

第 184 页 (共 531 页)

查询方法: 登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 输入校验码 I3ip1w, 流水号 11010820260706082630, 查询校验结果。



3826	穆鑫浩	110101199304092513	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3827	白瑞	110101198410270518	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市海淀区社会保险基金管理中心
日期：2026年07月06日

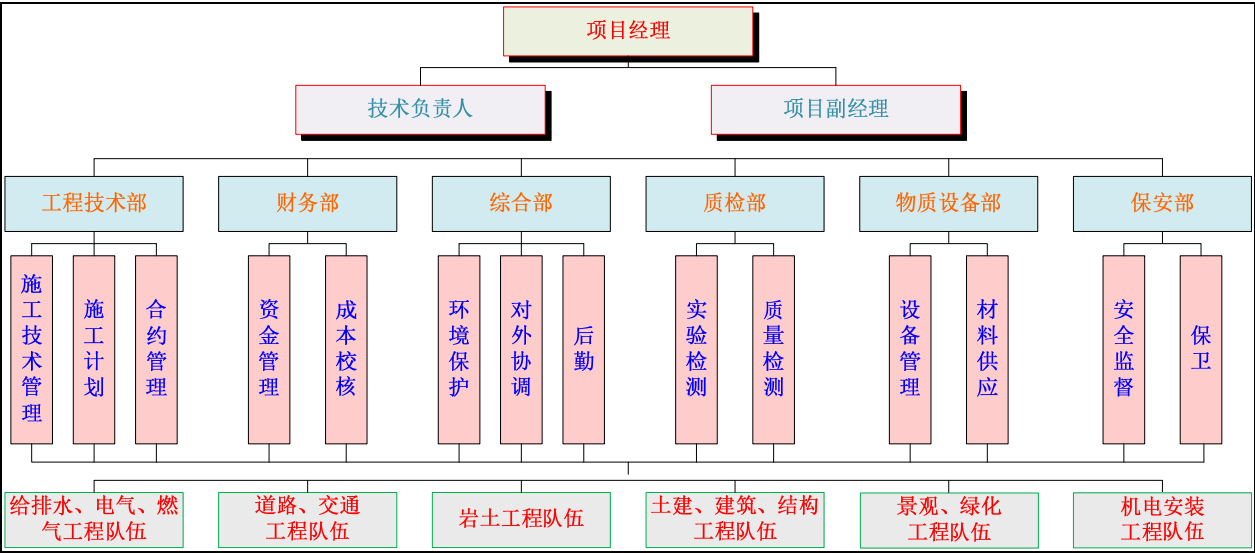
8. 项目管理机构情况辅助证明材料

人员社保证明详见“四、项目管理机构配备情况表后附资料

项目组织机构及职责

我公司现抽调有经验的施工管理人员组建“岗头西站地下连通通道工程”项目部, 实行项目经理负责制, 全权代表承包人履行合同中的权利和义务, 负责本工程的管理和组织指挥。本合同段施工项目较多, 为了在规定工期完成工程, 需组建高效的项目部, 以加强劳动力组织, 配足施工用机械, 落实物资供应, 严格施工工序交接, 周密组织施工, 确保在规定工期内完成。

组织机构图如下：



公司在施工现场设立项目经理部。由企业法定代表人委托项目经理全权管理项目部。项目经理部同时接受公司各业务部门的指导、监督、检查和考核。项目经理部设置项目技术负责人（工程师）负责工程项目施工组织设计，施工技术和质量控制工作，同时设现场负责人，负责施工现场的管理。项目经理部下设：

1.项目经理：

全面负责工程，组织带领项目部人员、班组长进行学习，确保工程质量、进度，完满完成工程。

2.技术负责人：

指导督促现场人员搞好工程的质量、安全检查，参与质量事故的调查、分析及处理。全面负责工程项目施工组织设计，施工技术和质量控制工作。

3.项目副经理：

负责本工程生产组织管理工作的具体实施。加强职工安全生产和技术操作规程的教育，严格执行安全、质量的规章制度，定期组织安全、质量检查，对质量、安全、机械及其它事故和未遂事故组织调查分析及时上报，并研究处理。

4.质量负责人：

工程施工质量负责人是项目质量管理的核心角色，需全面统筹施工全过程的质量控制，确保工程符合国家规范及合同要求。

5.安全负责人：

施工安全负责人是项目安全生产、文明施工及消防保卫工作的核心管理者，需依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法规，结合项目特点构建安全管控体系，并全面落实执行。

6.施工员：

负责施工现场地放线，定位，标高复核等施工技术具体工作。将施工工艺、质量要求向施工班组交底。

7.材料员：

负责工程原料，材料，工具，构配件的订货，供应，运输验收工作。

8.安全员：

负责安全技术措施的编制及安全生产的各项规章制度的落实工作。

9.质检员：

负责进场的原材料，配件，构件，衡器的送检，检验，测试等工作。

10.资料员：

负责记录施工全过程的各类资料的收集，采集并分类组卷，建立与竣工资料目录相符的资料档案。

五、其他资料

投标人履约评价情况表

工程项目履约评价	1	项目名称：宝同路东段、新能源四路东段、宝龙六局北段工程 评价单位：深圳市龙岗区建筑工务署 评价等级：通报表扬 评价时间：2024-07-31
	2	项目名称：市桥水道-沙湾水道流域（中部系统）村居雨污分流改造工程-樟边村 评价单位：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心） 评价等级：优秀 评价时间：2023-11-24
	3	项目名称：番禺区前锋南部流域第二批排水单元配套公共管网完善工程 评价单位：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心） 评价等级：优秀 评价时间：2023-11-24

1、宝同路东段、新能源四路东段、宝龙六路北段工程

深圳市龙岗区建筑工务署

龙岗区建筑工务署 2024 年第二季度履约评价 情况通报

为有效促进各参建单位诚信建设，提高项目建设质量、提升合同履约水平，达到奖优罚劣的目的，根据我署履约管理办法规定，我署组织开展了 2024 年第二季度履约评价工作，对施工、监理、全过程咨询、工程总承包、造价咨询、设计、勘察、代建、技术服务类等共 591 个项目合同、232 家参建单位进行了合同履约评价，其中履约通报表扬项目 14 个（14 家参建单位），名单如下（排名不分先后）：

一、通报表扬单位名单

（一）施工单位

1. 中铁六局集团有限公司〔宝同路东段、新能源四路东段、宝龙六路北段工程〕；

2. 中建三局集团有限公司〔①龙岗中心医院外科综合楼工程、②龙岗区第二人民医院迁址重建工程（罗岗地块）〕；

3. 深圳市建工集团股份有限公司、深圳建工华南建设有限公司〔龙岗区第六人民医院安全隐患整治及节能改造提升工程〕；

4. 深圳市辉熙智能科技有限公司〔深圳市龙岗区第二人民医院（罗岗）门诊医技部、住院部、行政科（物流）〕。

（二）全过程工程咨询/监理单位

1. 重庆联盛建设的项目管理有限公司、中国建筑西南设计研究

院有限公司〔深圳市第二十九高级中学〕；

2. 重庆赛迪工程咨询有限公司〔平大路提升改造工程〕。

（三）造价咨询单位

1. 北京城建设计发展集团股份有限公司〔平大路提升改造工程〕；

2. 深圳市广得信工程造价咨询有限公司〔养老护理院重新选址建设工程项目〕。

（四）代建单位

华润（深圳）有限公司〔龙岗区委党校迁址重建工程〕。

（五）技术服务类单位

1. 法利投资（上海）有限公司〔2022-2024 年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方质量工作技术咨询服务〕；

2. 深圳瑞捷技术股份有限公司〔2024-2026 年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方质量工作技术咨询服务（2024 年 5 月-6 月）〕；

3. 中冶建筑研究总院（深圳）有限公司〔①2022-2024 年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方安全工作技术咨询服务（2024 年 4 月）、②2024-2026 年度龙岗区建筑工务署建设项目第三方安全工作技术咨询服务（2024 年 5 月-6 月）〕。



2、市桥水道-沙湾水道流域（中部系统）村居雨污分流改造工程-樟边村

履约评价情况反馈表

建设单位 (评价单位)	广州市番禺区水务工程建管中心 (广州市番禺区水旱灾害防御中心)		评价期限	2023. 9. 1-2024. 1. 24	
承包商 (评价对象)	中铁六局集团有限公司		承包商地址	北京市海淀区万寿路2号	
法定代表人	刘胜光		项目负责人	曾庆鑫	
工程名称	市桥水道-沙湾水道流域 (中部系统) 村居雨污分 流改造工程-樟边村		承包范围	本工程计划对番禺区南 村镇樟边村村居开展雨 污分流改造。本次实施 改造的村域服务范围约 2.47平方公里, 村居面 积约0.54平方公里	
工程地点	广州市番禺区		工程合同价	9555万元	
合同开工日期	2023. 9. 1	合同竣工日期	2024. 1. 29	合同工期	150
实际开工日期	2023. 9. 1	实际竣工日期	/	实际工期	/
履约评价内容					
序号	内容				
1	市桥水道-沙湾水道流域(中部系统) 村居雨污分流改造工程-樟边村				
建设单位对承包商履约的总体评价:					
评价等级: ☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格 ☐ 不合格					
评价单位 (盖章) 日期: 2023.11.24					
备注	1、评价栏需加盖单位公章, 否则无效 2、履约情况分为优秀、良好、合格、不合格, 请在相应类别前打“√”				

3、番禺区前锋南部流域第二批排水单元配套公共管网完善工程

履约评价情况反馈表

建设单位 (评价单位)	广州市番禺区水务工程建管中心 (广州市番禺区水旱灾害防御中心)		评价期限	2023. 6. 8-2023. 11. 24	
承包商 (评价对象)	中铁六局集团有限公司		承包商地址	北京市海淀区万寿路2号	
法定代表人	刘胜尧		项目负责人	贺勇全	
工程名称	番禺区前锋南部流域第二批排水单元配套公共管网完善工程		承包范围	本工程位于广州市番禺区前锋南部流域, 主要服务于沙湾街道与桥南街道。新建d300-d1350雨水管道4.5km, 新建d150-d600污水管道3.1km, 修复既有管网缺陷0.76km。	
工程地点	广州市番禺区		工程合同价	5115万元	
合同开工日期	2023. 6. 8	合同竣工日期	2023. 12. 9	合同工期	180
实际开工日期	2023. 6. 8	实际竣工日期	/	实际工期	/
履约评价内容					
序号	内容				
1	番禺区前锋南部流域第二批排水单元配套公共管网完善工程				
建设单位对承包商履约的总体评价:					
评价等级: ☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格 ☐ 不合格					
 评价单位 (盖章) 日期: 2023. 11. 24					
备注	1、评价栏需加盖单位公章, 否则无效 2、履约情况分为优秀、良好、合格、不合格, 请在相应类别前打“√”				

企业在深圳市建筑市场主体信用等级

广东政务服务网

建筑行业信用评价系统

用户中心 安全退出 常见问题 操作手册

电话:03682112

深圳住建

建筑行业信用评价

企业良好行为

企业不良行为

人员良好行为

人员不良行为

企业业绩查询

企业得分

人员得分

履约评价

诚信评价得分详情

注明:本市新设或者初次入深企业,1年内信用等级为“B”。

企业名称: 中铁六局集团有限公司

企业类型: 建筑施工 房屋建...

计算时间: 2020-07-13

最新诚信得分: 74

上季度诚信排名: 20

上季度诚信等级: B

■ 建筑施工企业信用评价

+ ■ 良好行为 (+74分)

+ ■ 不良行为

序号	行为编码	有效期	得分/扣分	生效时间
没有找到匹配的记录				

企业排名计算说明:

评分标准请参考《信用评价管理办法》。

企业最终得分为良好行为得分加上不良行为和分。

企业满分值100分,超过100分,按100分进行计算。

诚信得分每天计算一次,申报通过的良好行为或者申诉通过的不良行为,请第二天查看得分详情。

通知

7月14日,星期二
六月初一

2026年7月

一	二	三	四	五	六	日
29 七	30 八	1 九	2 十	3 十一	4 十二	5 一
6 二	7 三	8 四	9 五	10 六	11 七	12 八
13 九	14 十	15 十一	16 十二	17 一	18 二	19 三
20 四	21 五	22 六	23 七	24 八	25 九	26 十
27 十一	28 十二	29 一	30 二	31 三	1 四	2 五
3 六	4 七	5 八	6 九	7 十	8 十一	9 十二

30分钟

开始直播

联系我们

政府网站 权威

热线电话: 0755-03682112

承诺书

我单位郑重承诺采用新材料、新设备、新工艺、新技术的（包括选择首台（套）重大技术装备、节能环保产品、国四及以上排放标准非道路移动机械等）。

特此承诺。

投标人： 中铁六局集团有限公司 （盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

2026 年 07 月 14 日
